




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 08 de noviembre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-84
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.326
C. Baygorria	2.273
C. Palmar	3.023
C. Salto Grande	17.055
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.572
TOTAL Generación	27.139

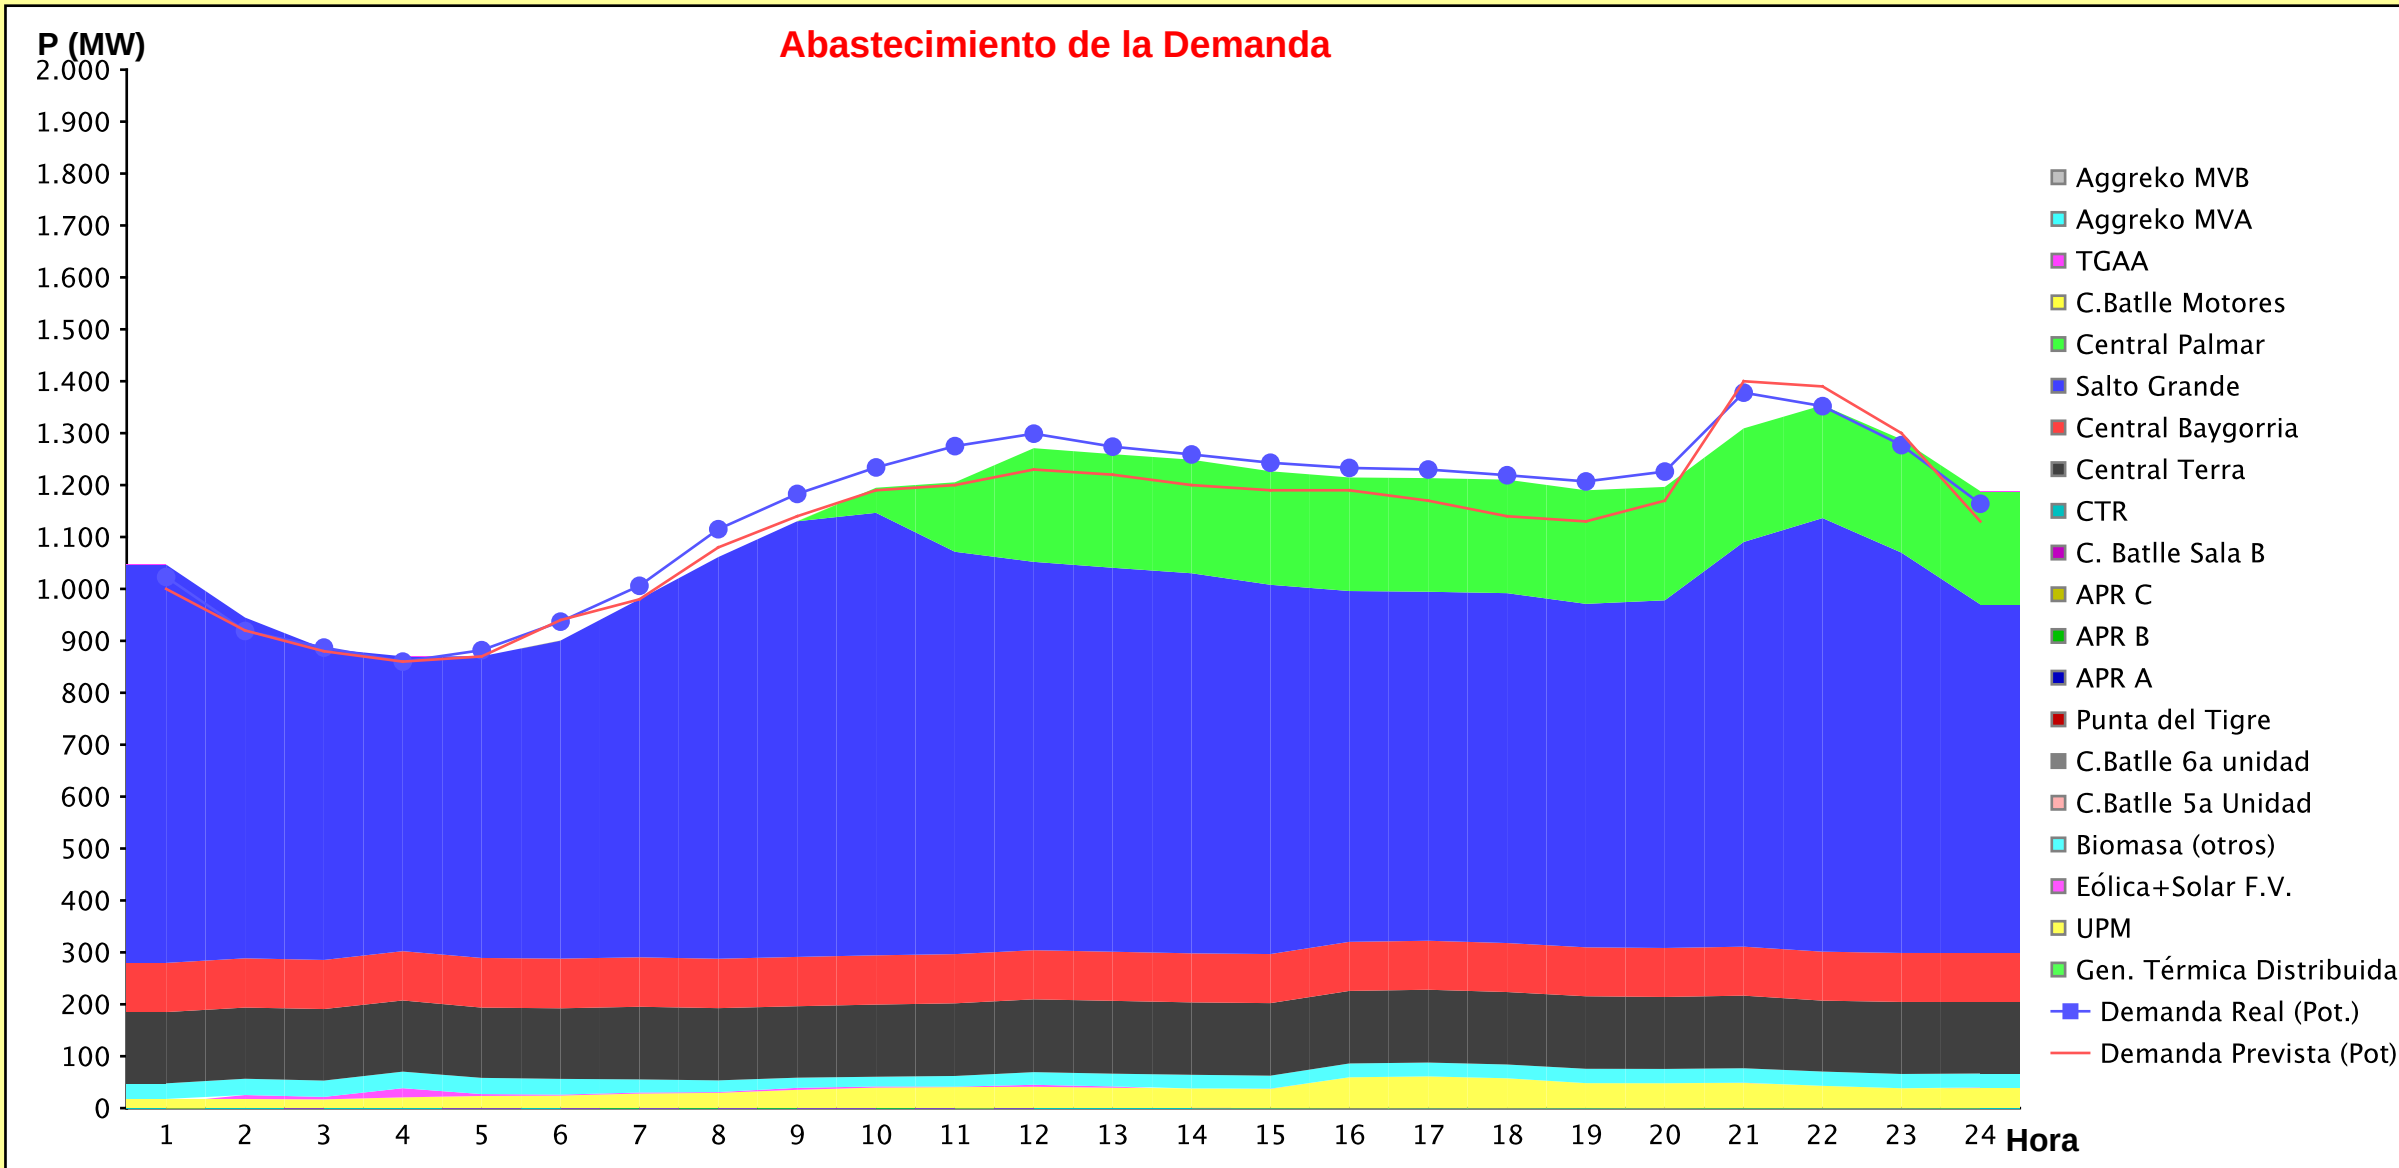

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.139
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.920
Diferencia (MWh)	219
Ejecutada - Programada	0,81 %

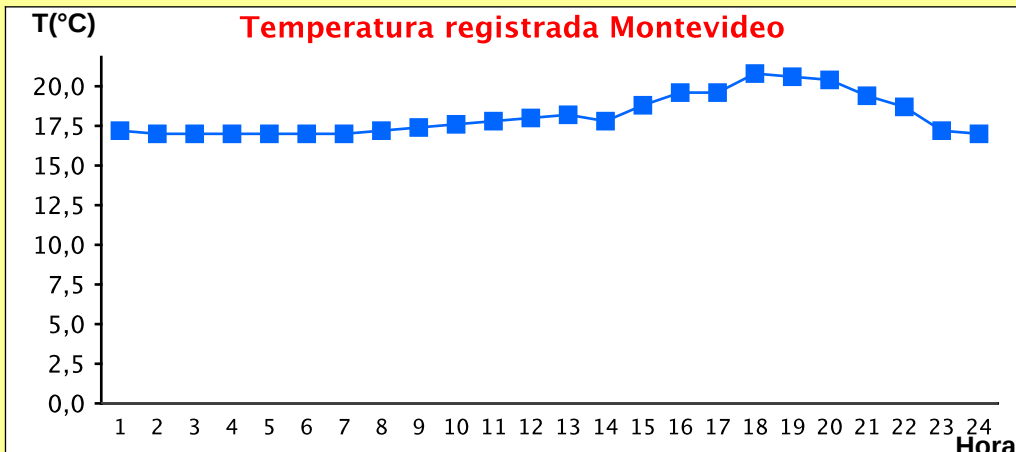



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1329,06 Hora 11:47
Potencia mínima:	862,18 Hora 04:00
Pico noche:	1395,42 Hora 21:24

Generación Media (MW)	
Eólica	2,9
Biomasa	70,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

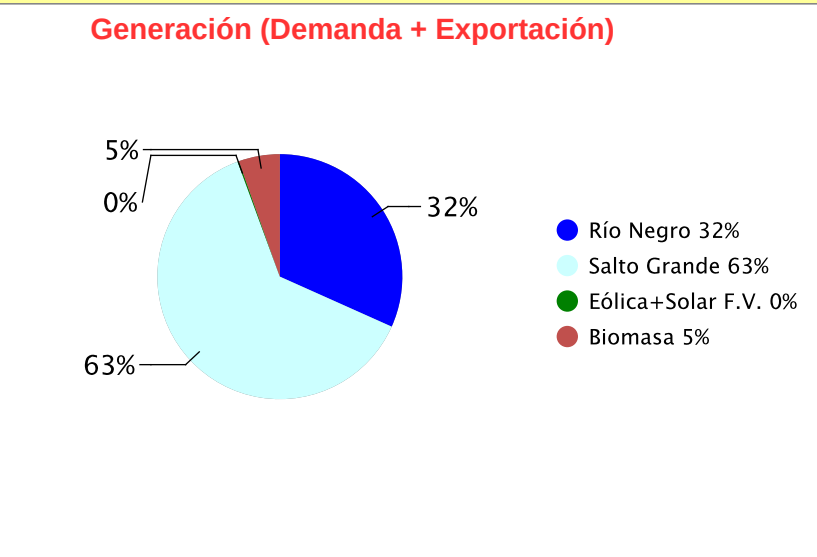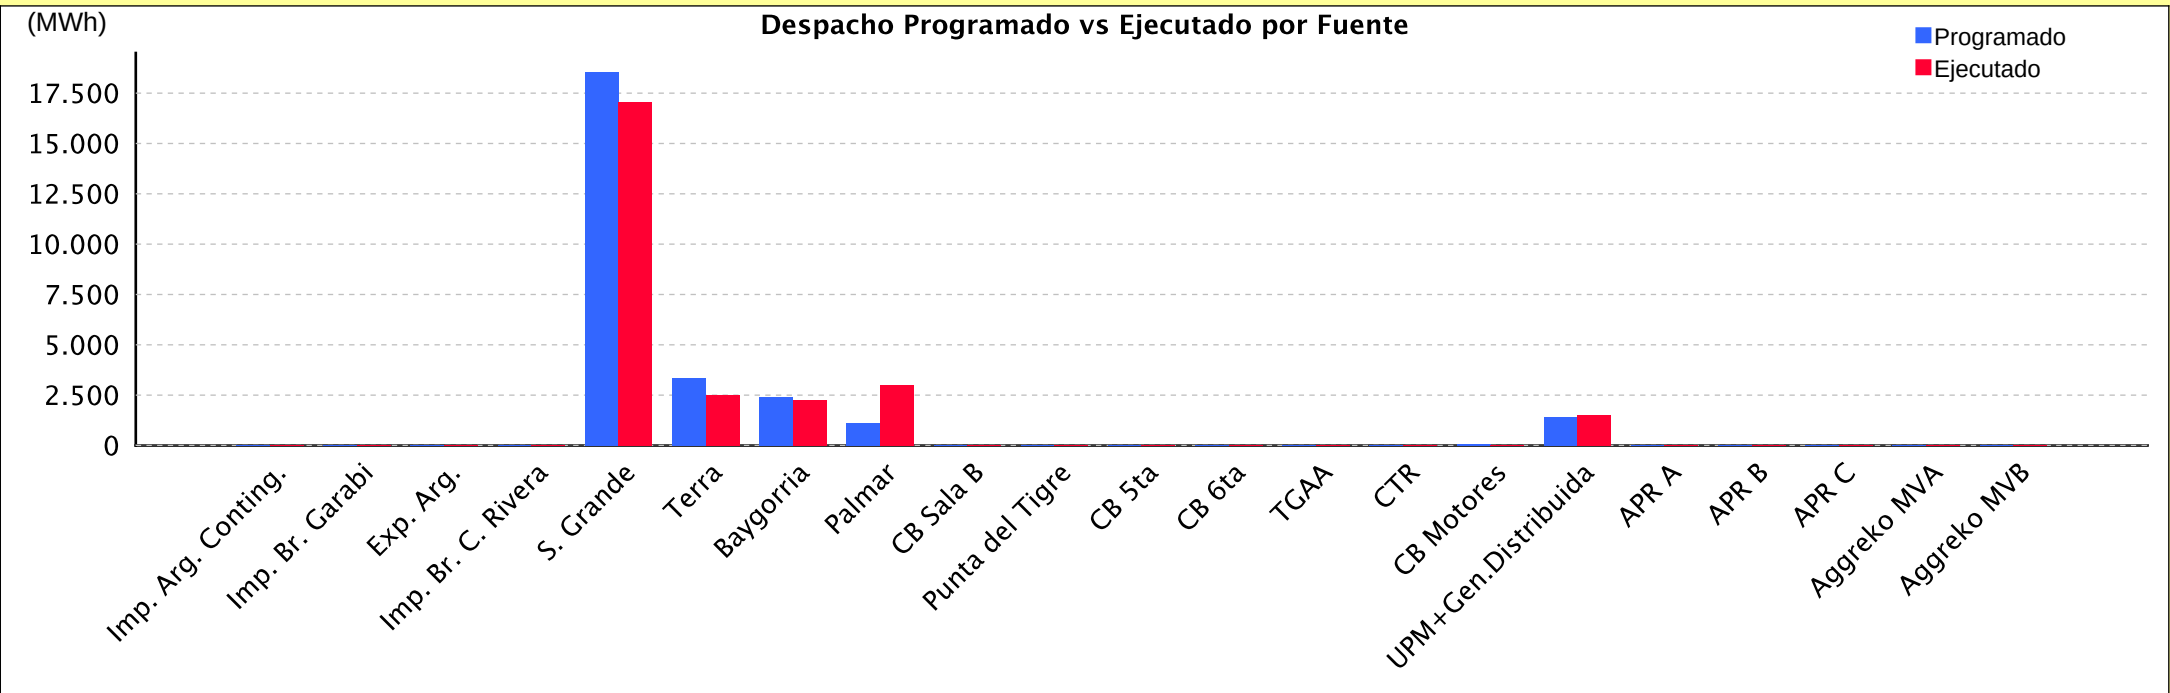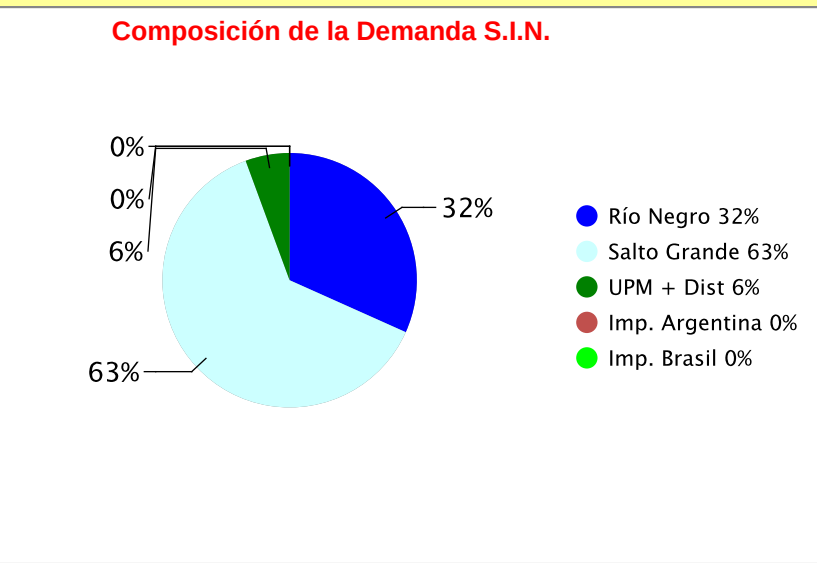



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

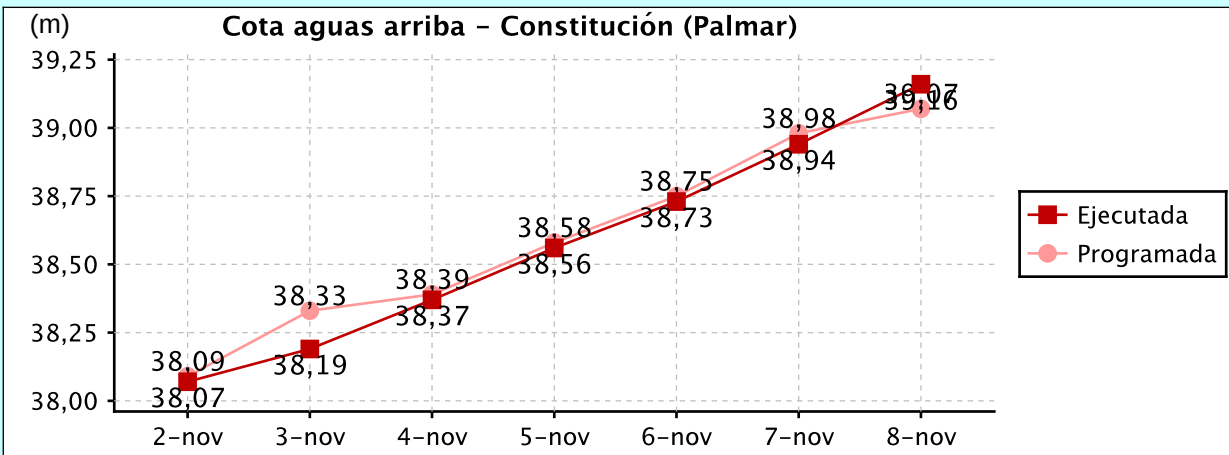
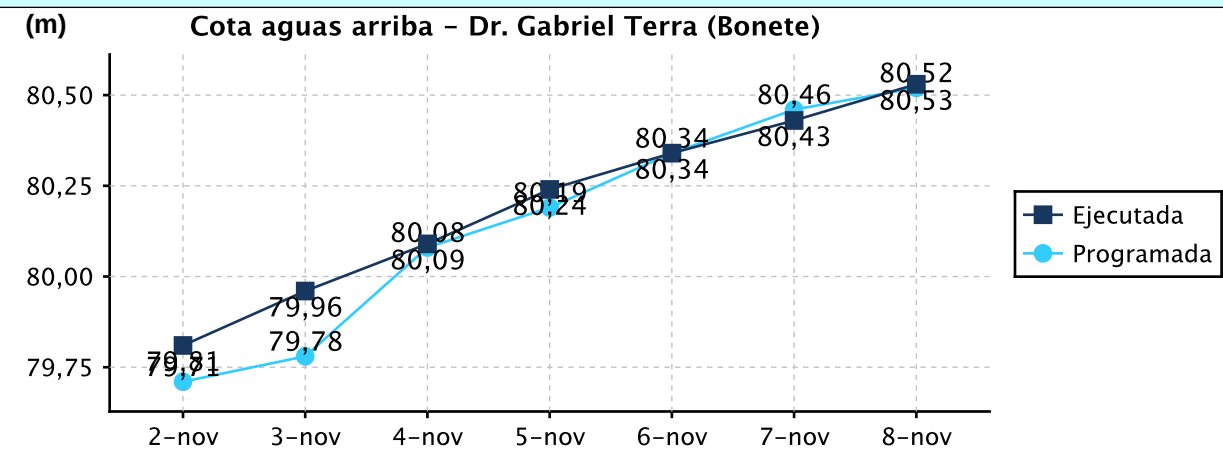


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,52	80,53
Baygorria	53,90	53,88
Palmar	39,07	39,16
SGU	34,69	34,57

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

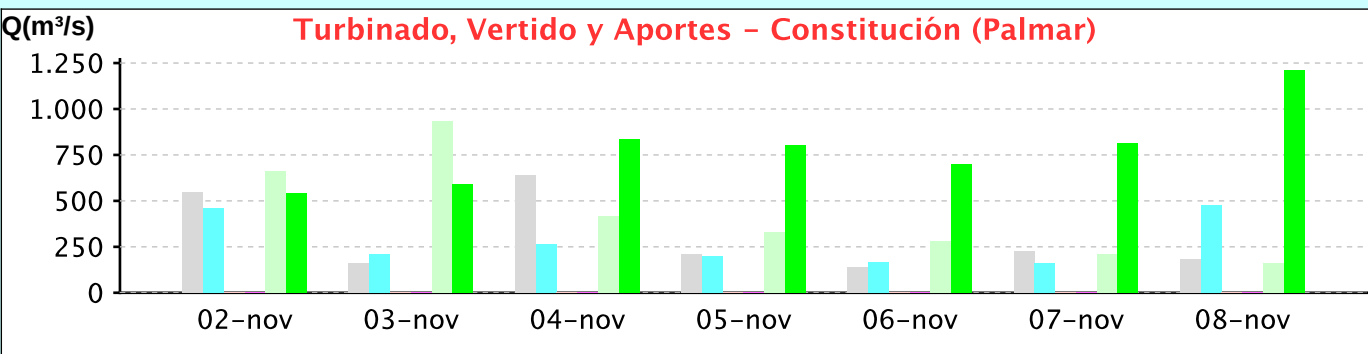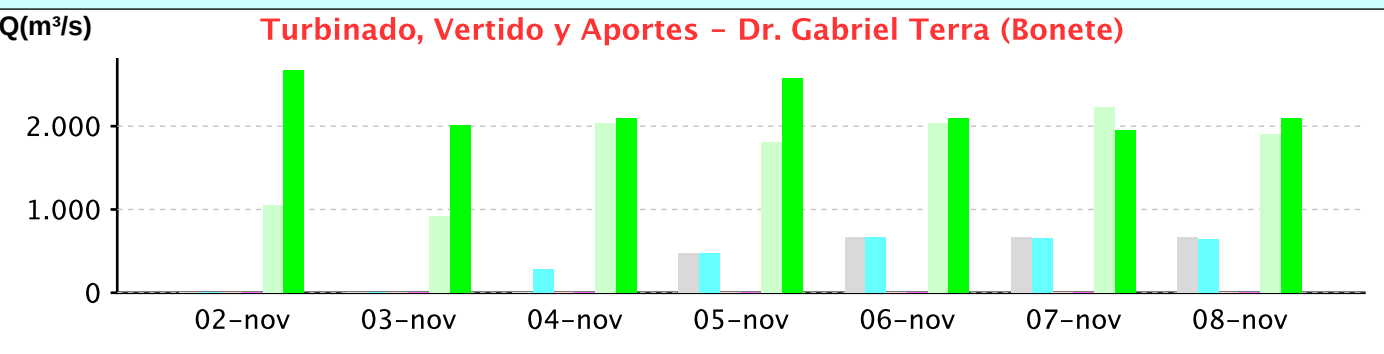

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

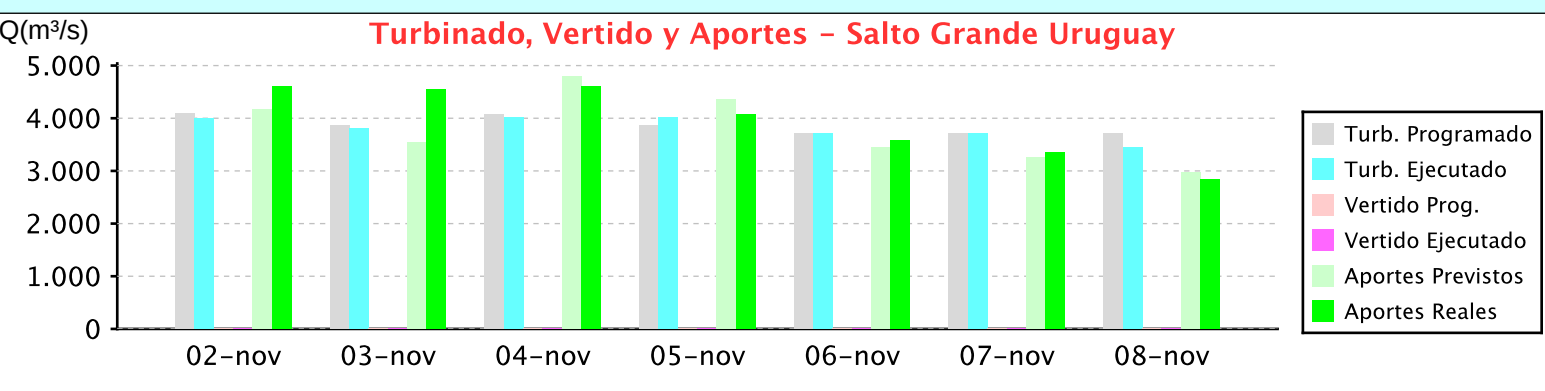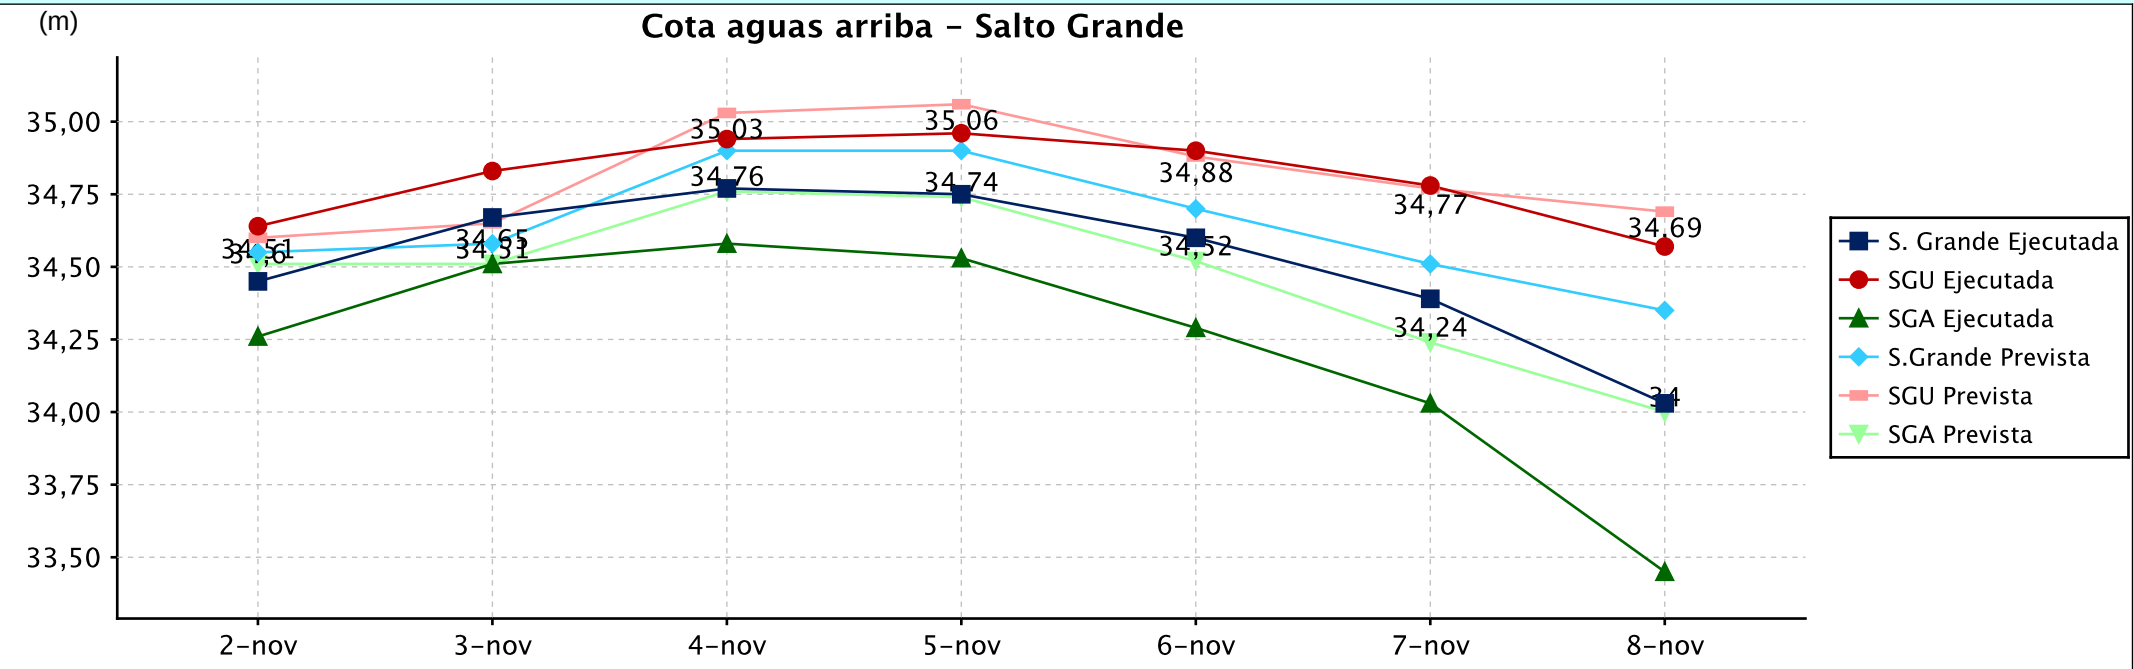

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,57
Cota Vista Arg	33,45
Cota real	34,03
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	23.291

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	640
Baygorria	772	780
Palmar	182	477
SGU	3.719	3.447

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.900	2.100
Baygorria	0	687
Palmar	160	1.210
SGU	2.975	2.840

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
