



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 09 de noviembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-96
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.353
C. Baygorria	2.253
C. Palmar	5.237
C. Salto Grande	12.559
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.726
TOTAL Generación	25.007

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.007
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.020
Diferencia (MWh)	-13
Ejecutada - Programada	-0,05 %

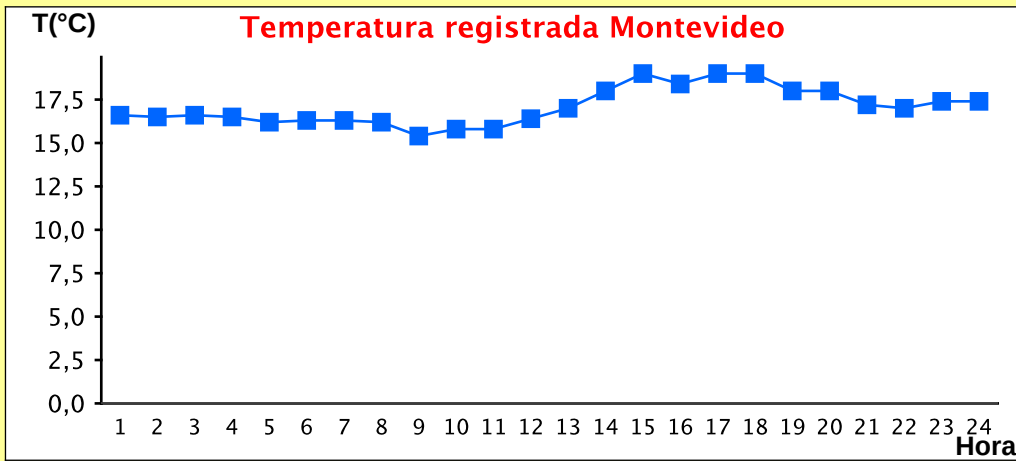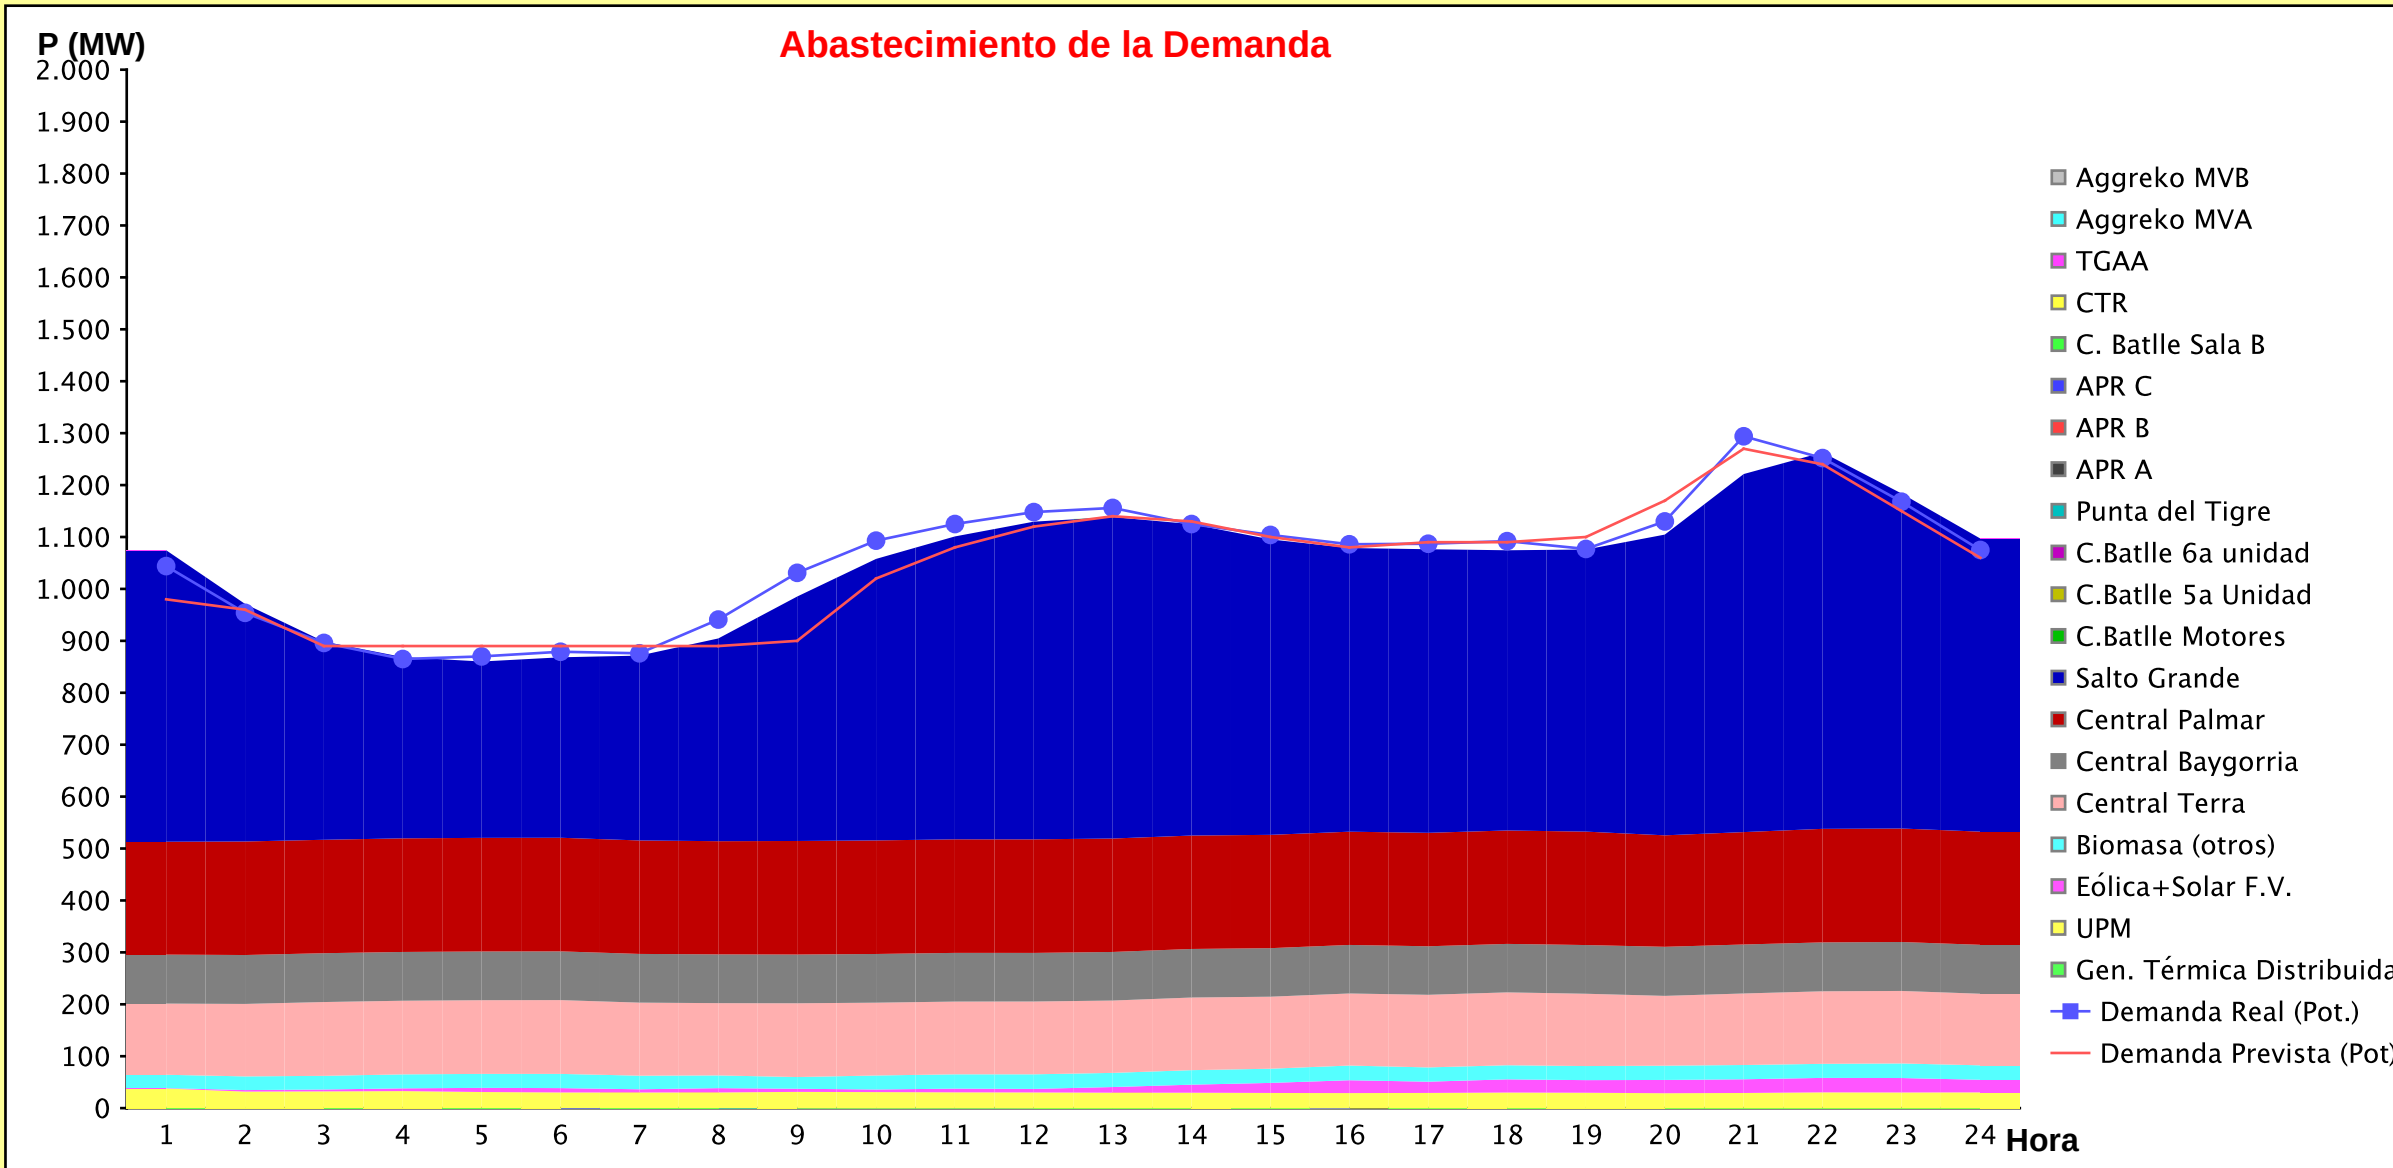



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1155,59 Hora 12:45
Potencia mínima:	851,65 Hora 04:44
Pico noche:	1307,13 Hora 21:13

Generación Media (MW)	
Eólica	14,5
Biomasa	63,1
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

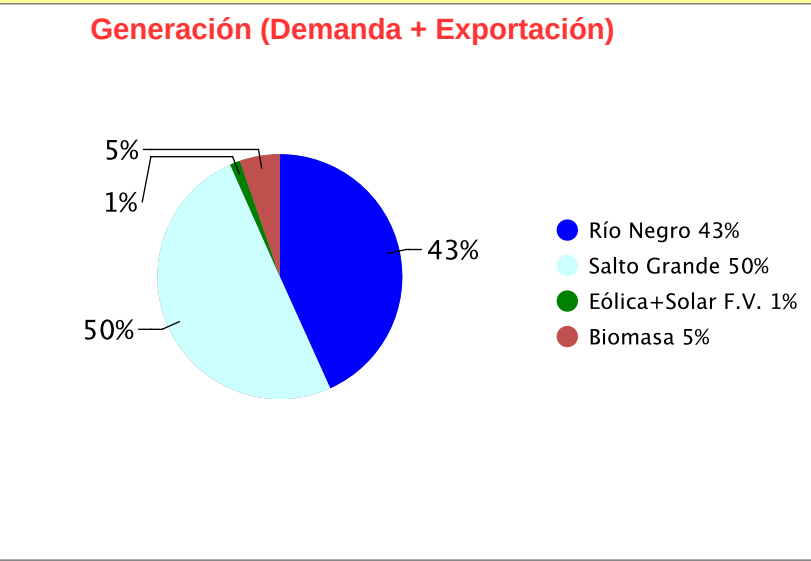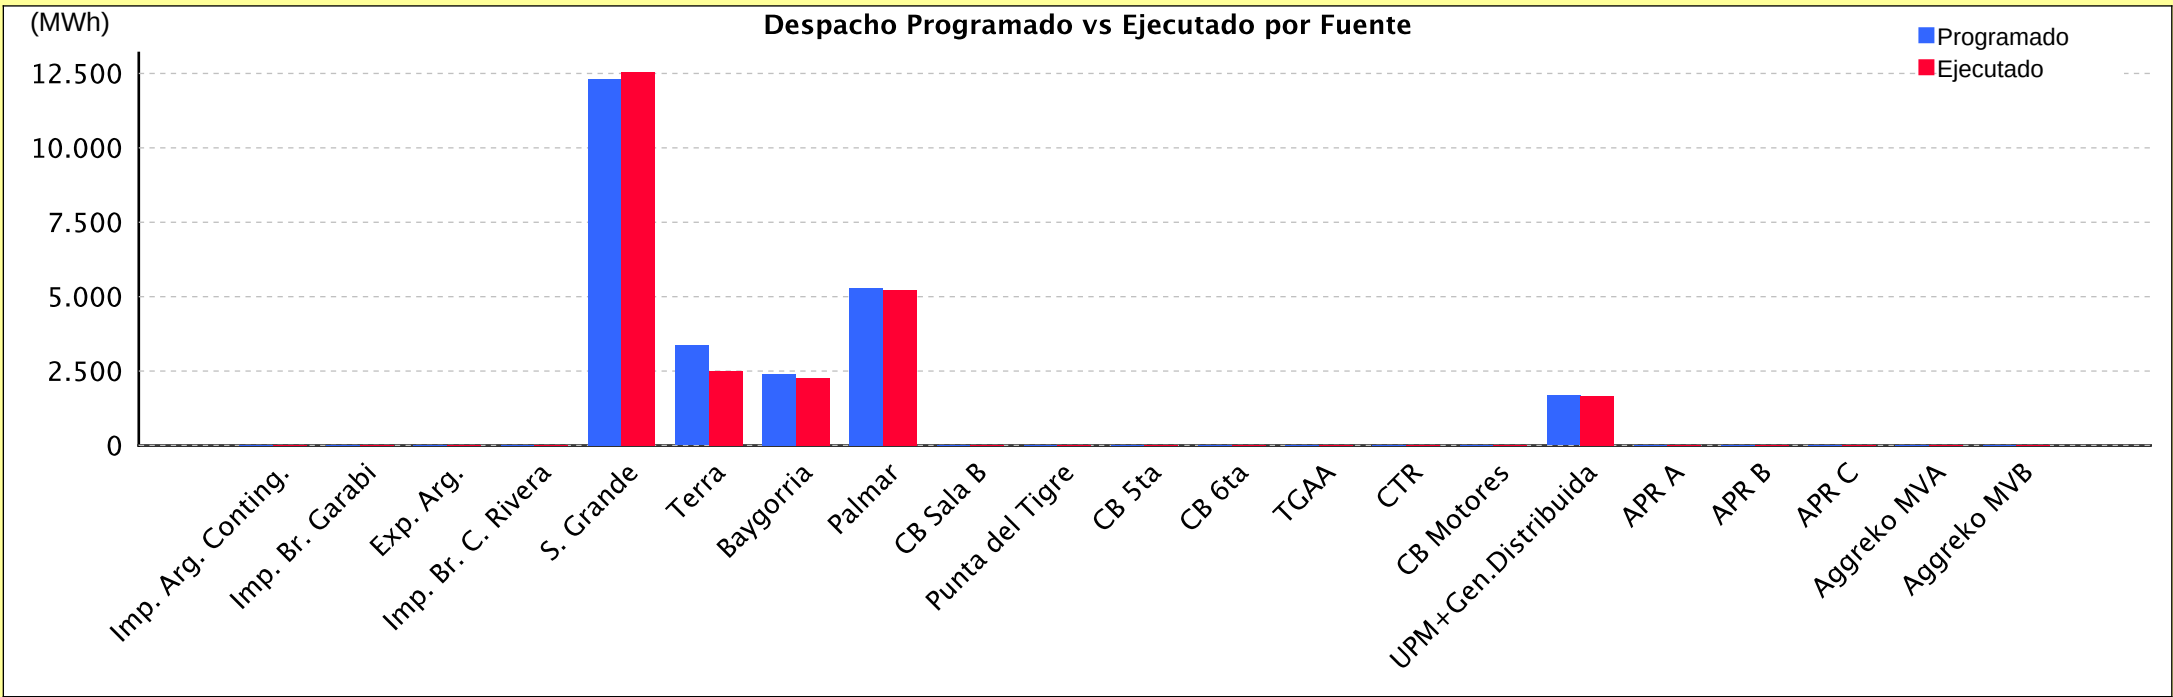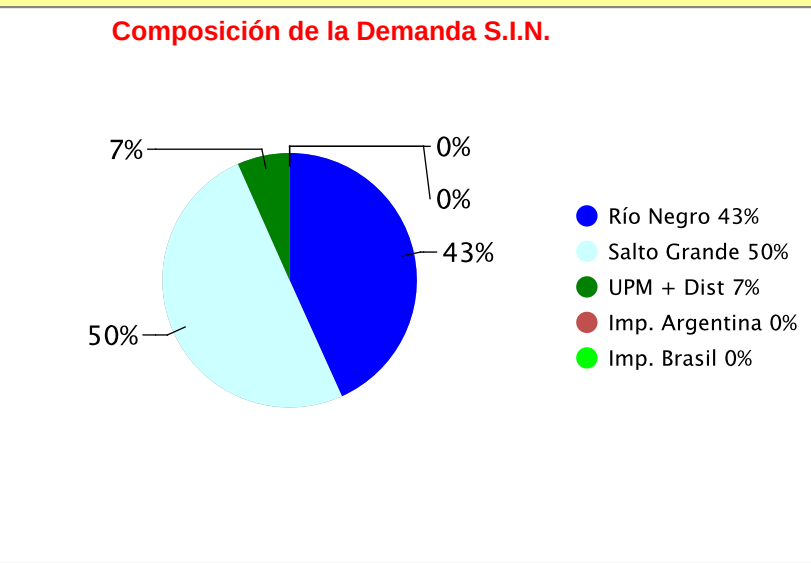



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

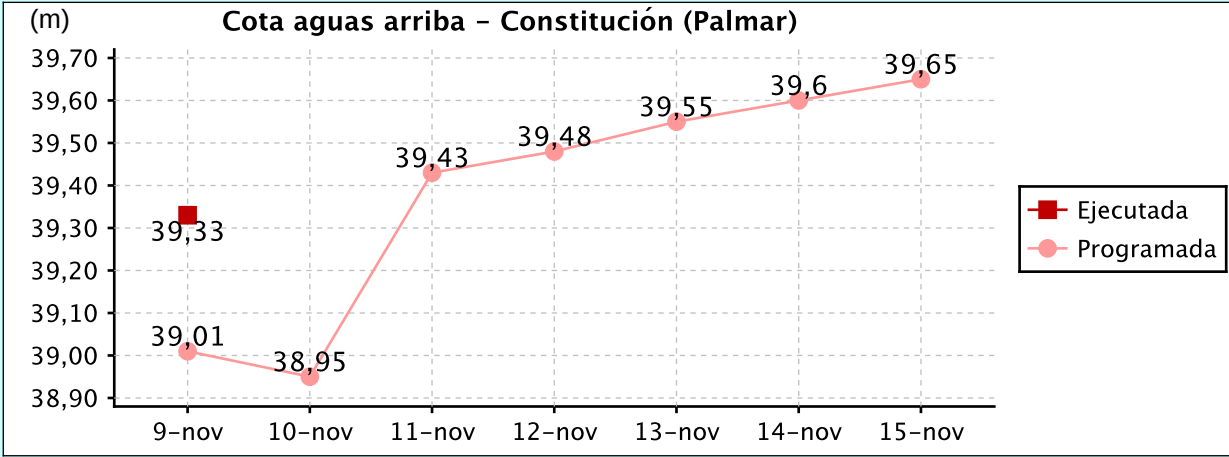
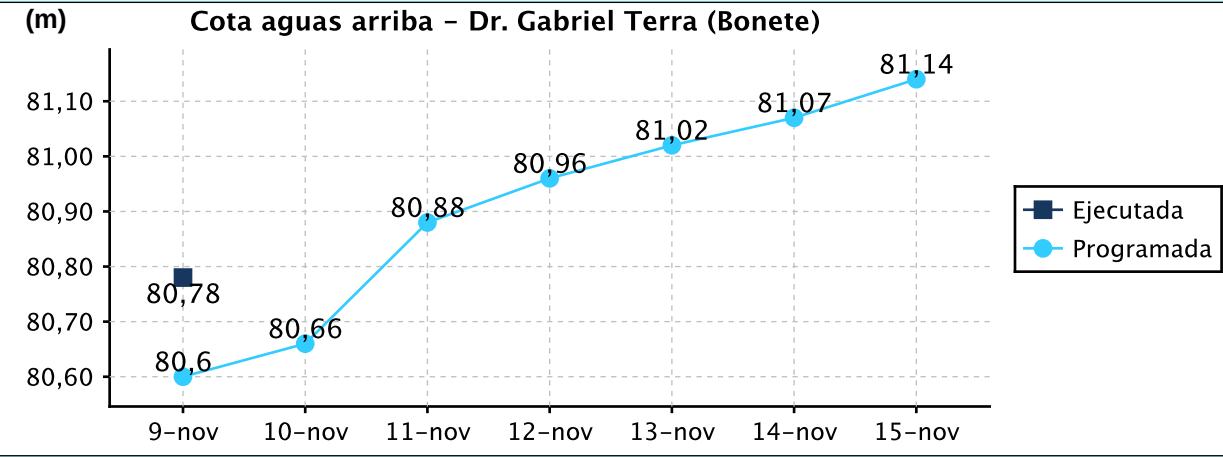


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,60	80,78
Baygorria	53,94	53,85
Palmar	39,01	39,33
SGU	34,76	34,62

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

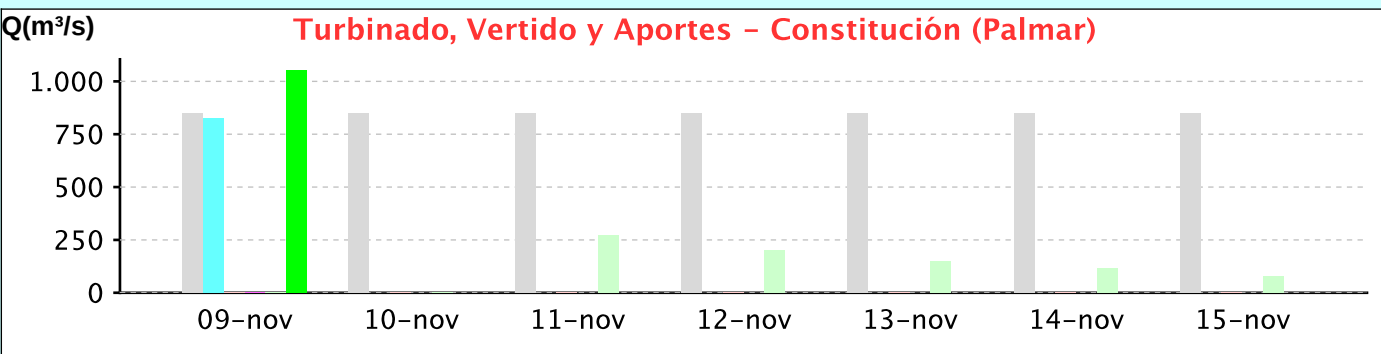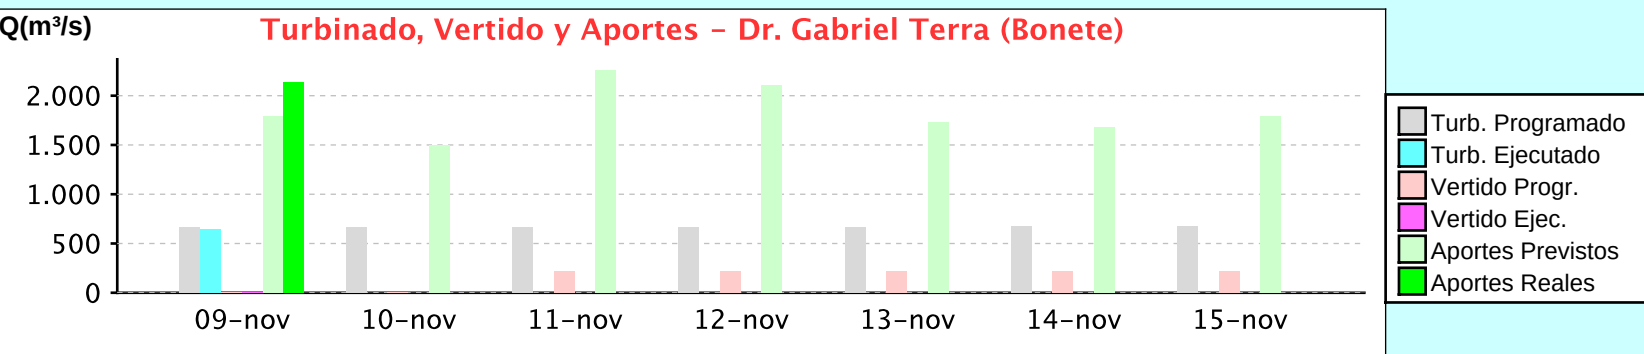

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

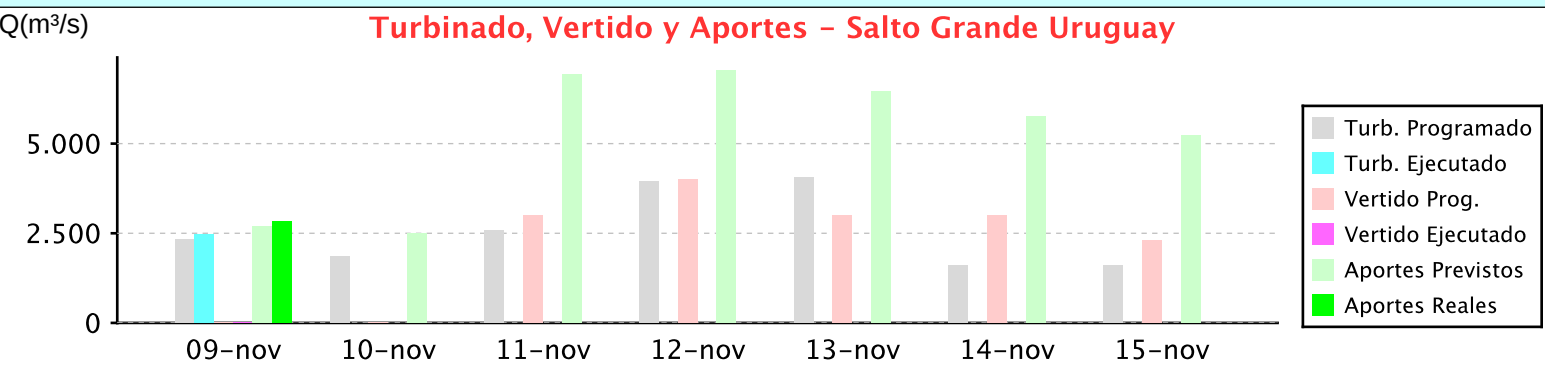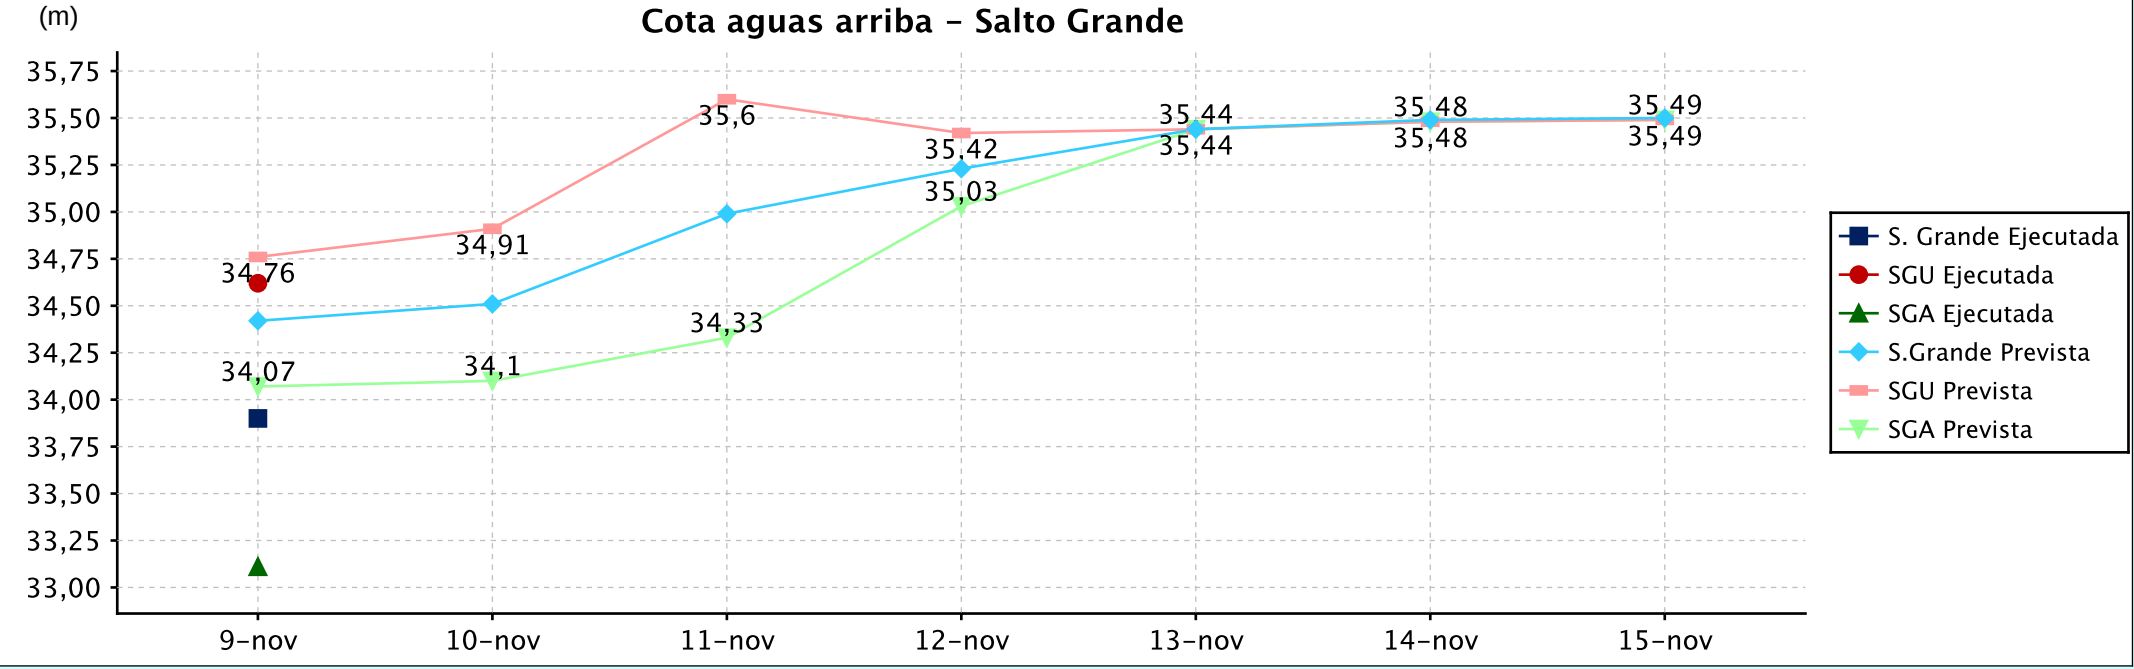

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,62
Cota Vista Arg	33,11
Cota real	33,90
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
30.726	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	641
Baygorria	772	784
Palmar	848	828
SGU	2.339	2.468

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.792	2.136
Baygorria	0	668
Palmar	0	1.052
SGU	2.700	2.823

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
