



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 10 de noviembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-102
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-4
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.350
C. Baygorria	2.265
C. Palmar	5.044
C. Salto Grande	10.727
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.433
TOTAL Generación	22.695

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	22.695
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	22.700
Diferencia (MWh)	-5
Ejecutada - Programada	-0,02 %

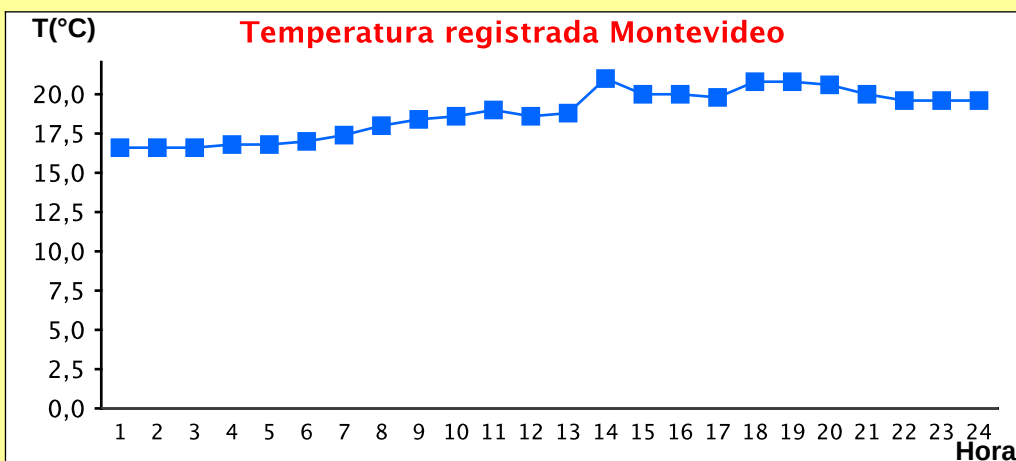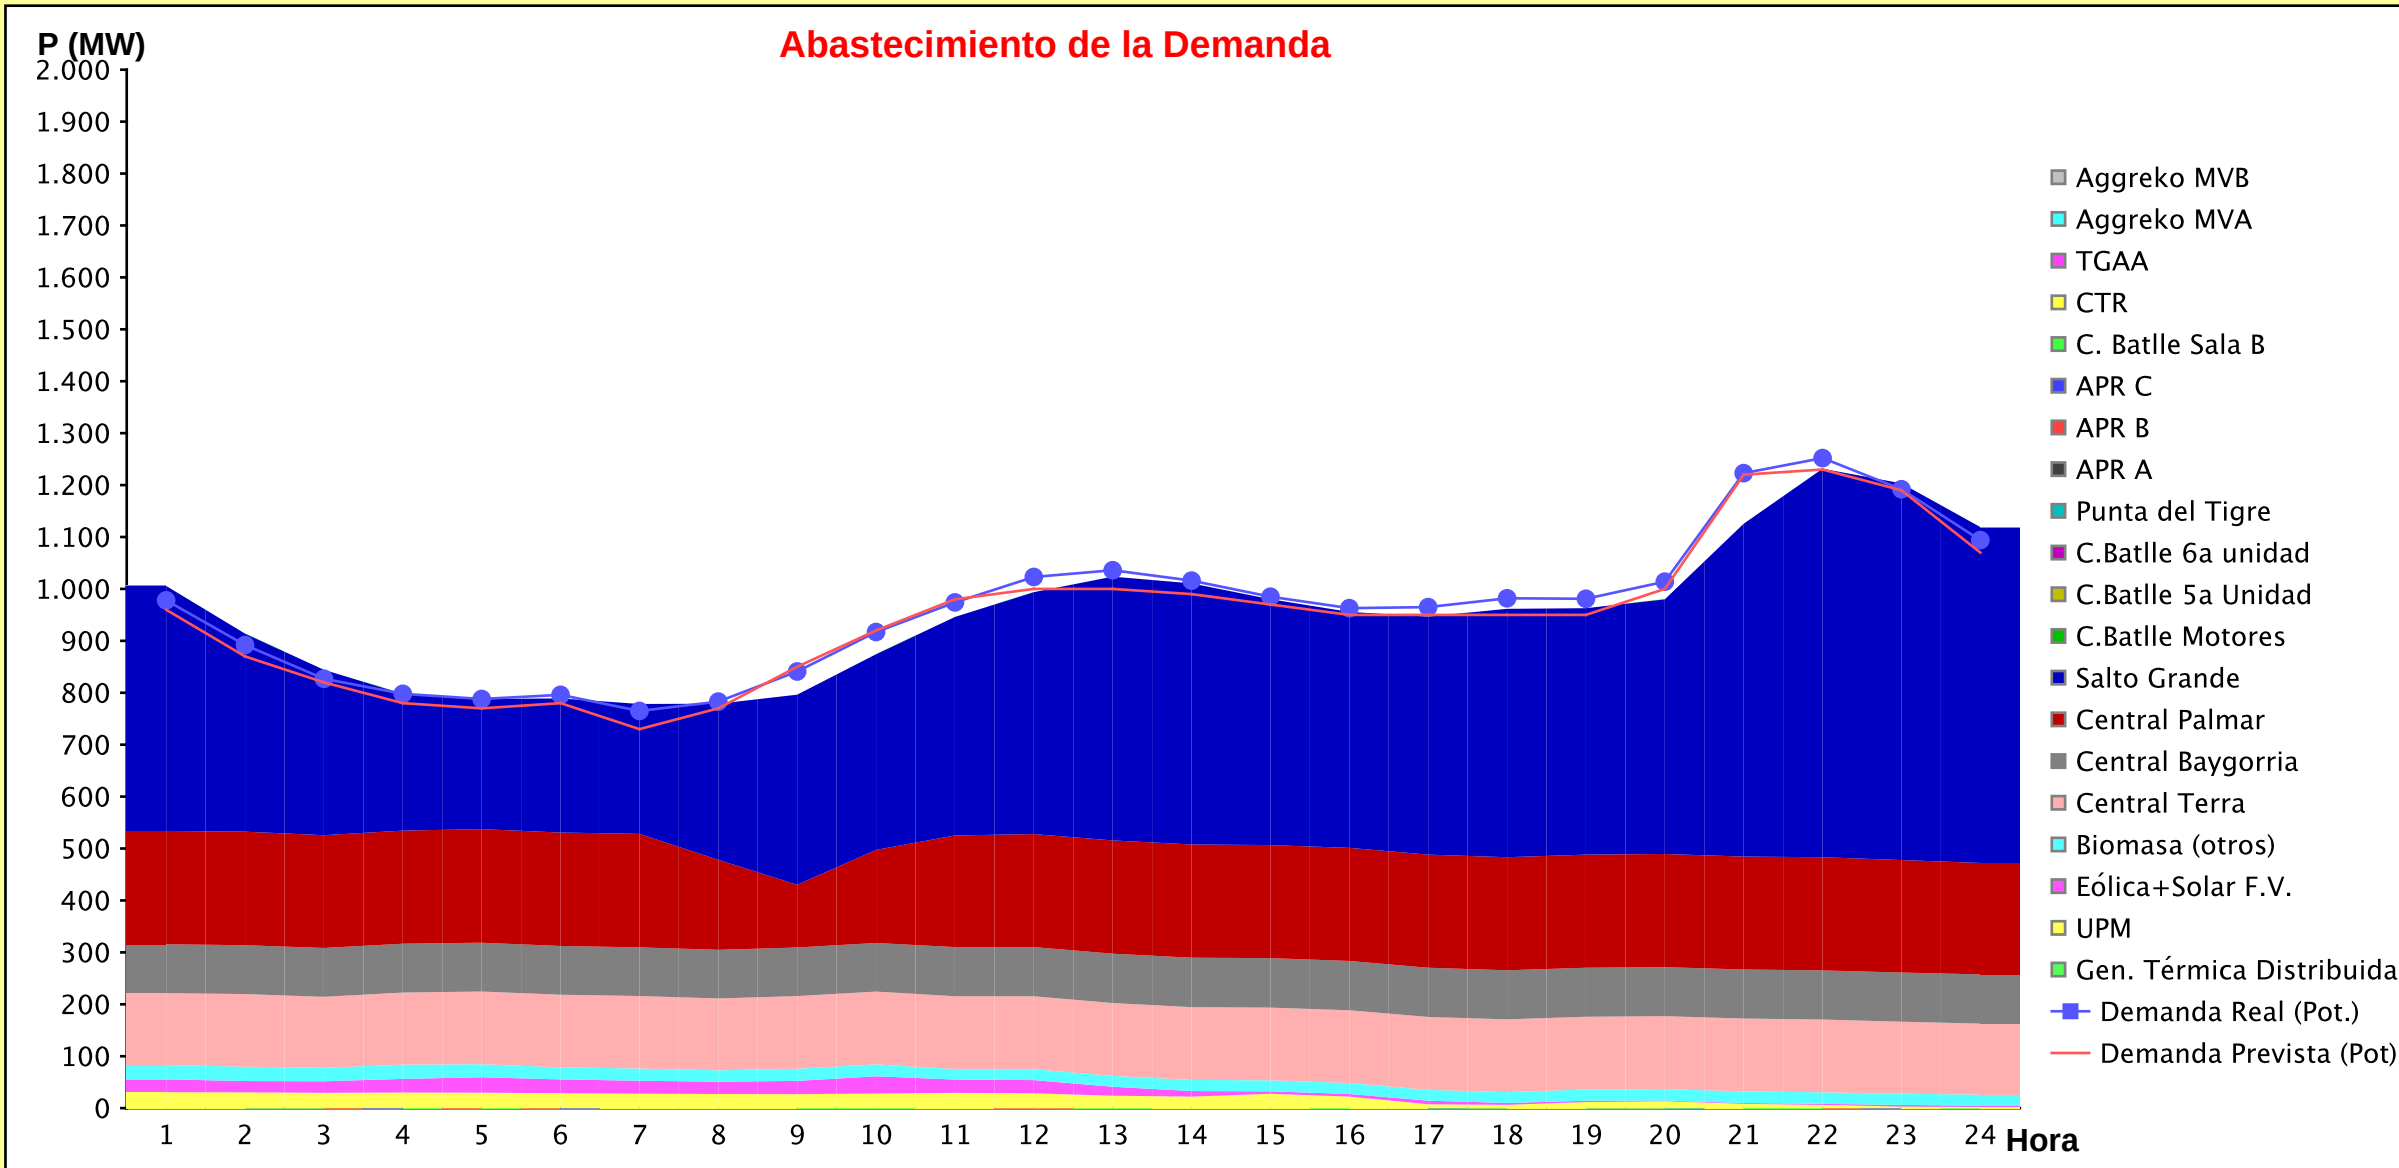



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1060,85 Hora 12:58
Potencia mínima:	761,16 Hora 07:17
Pico noche:	1285,48 Hora 21:42

Generación Media (MW)	
Eólica	15,6
Biomasa	50,0
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

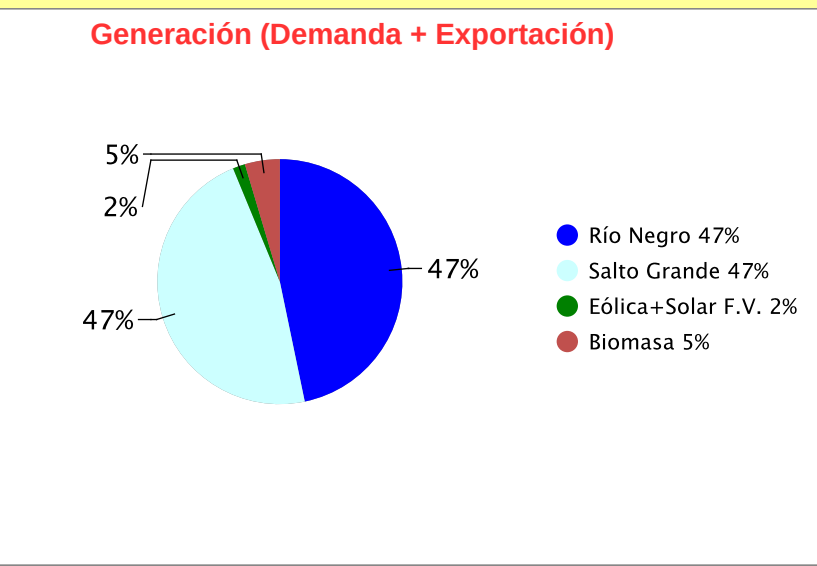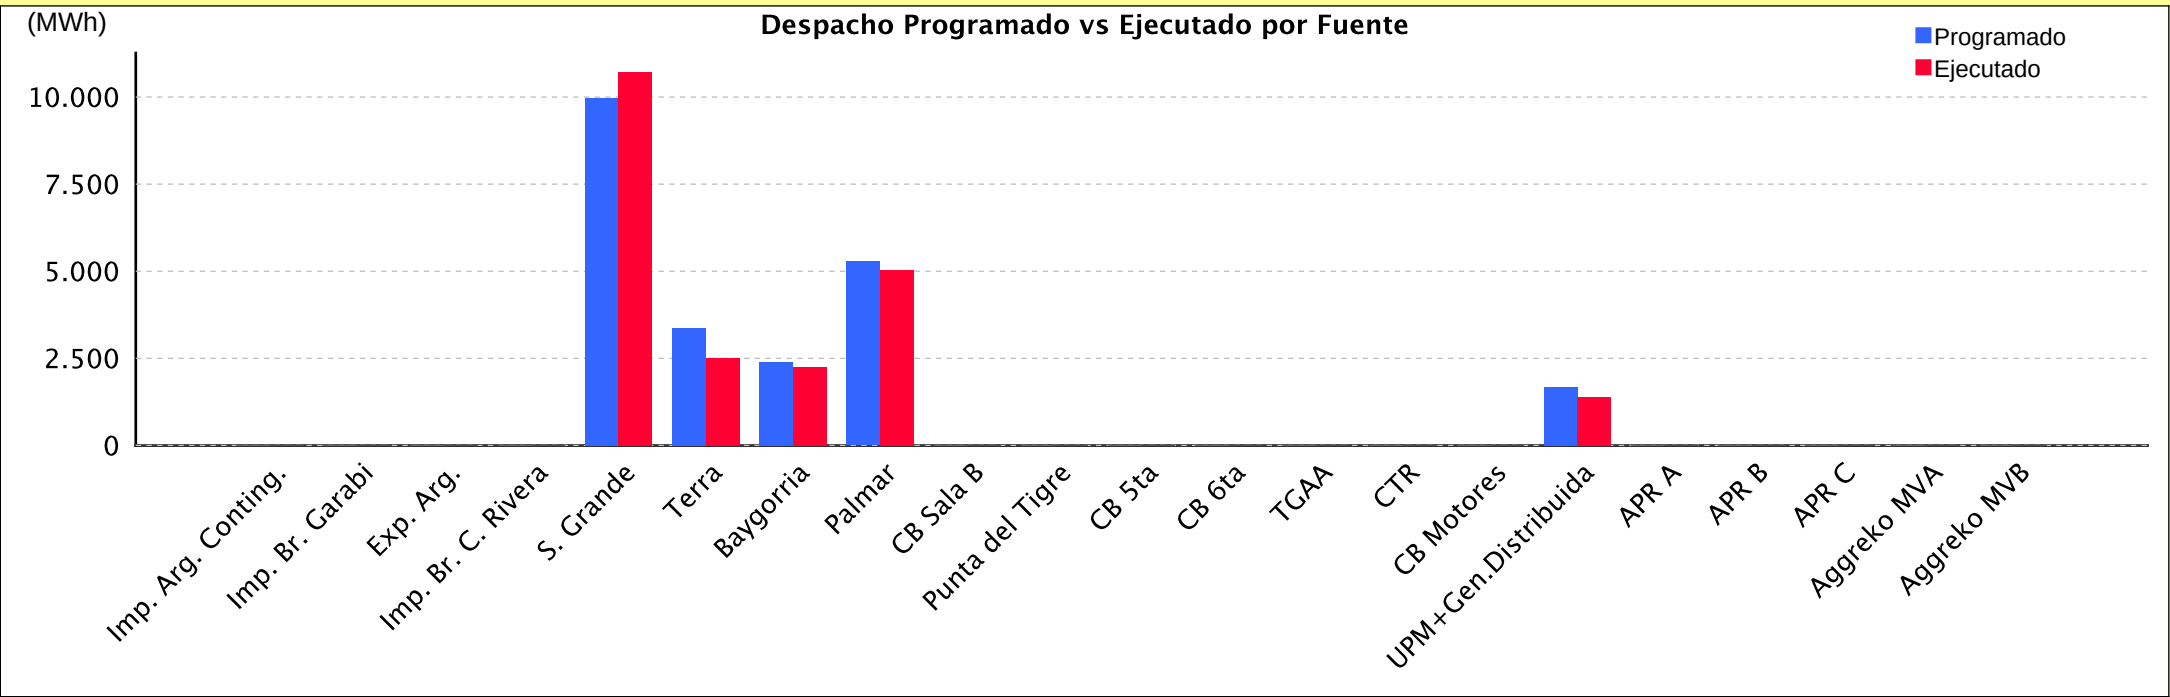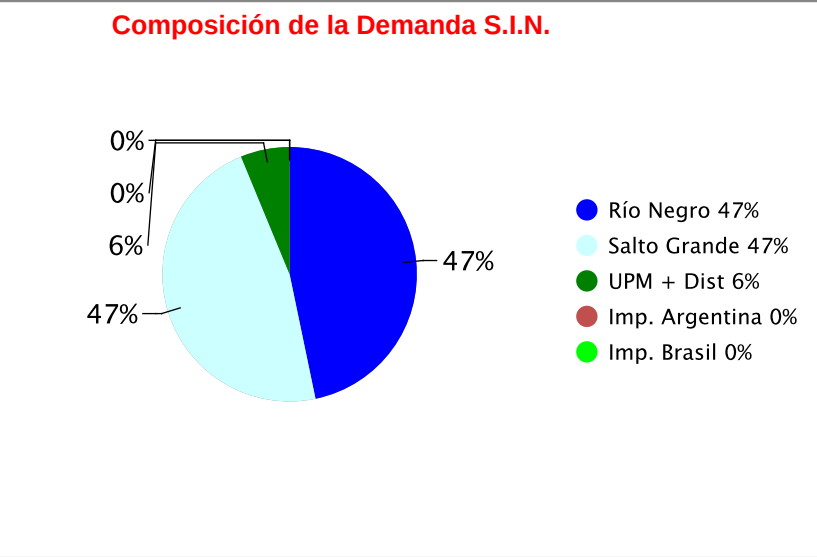



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

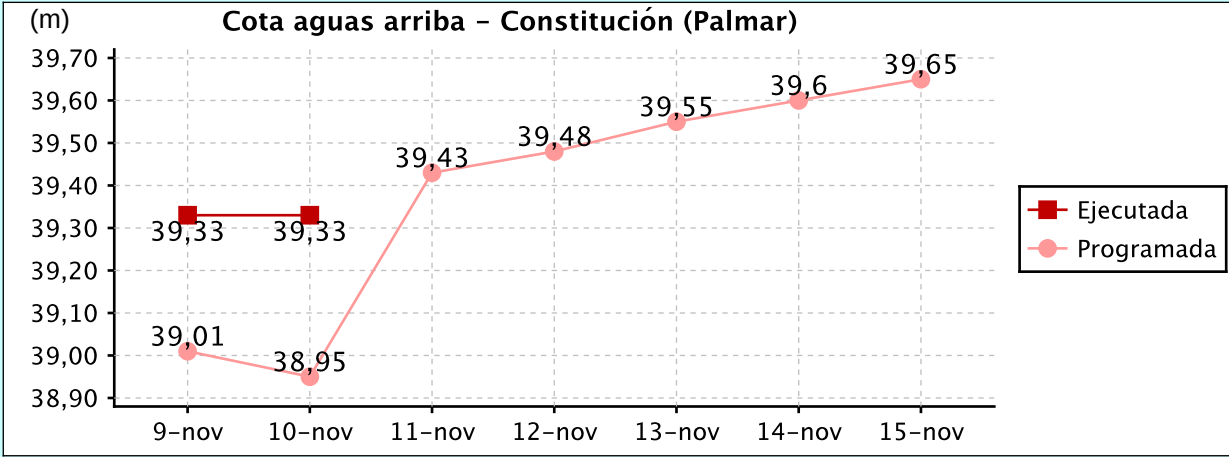
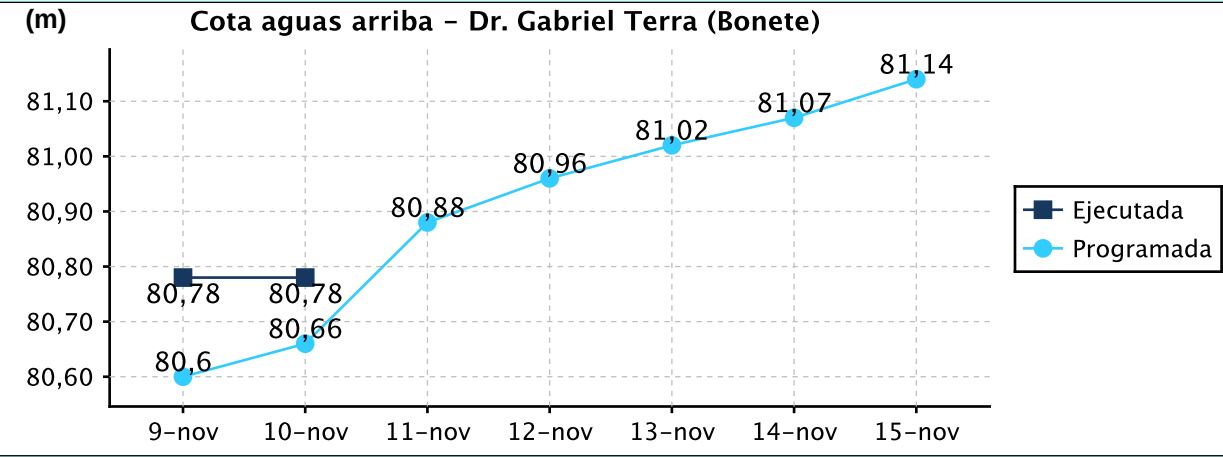


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,66	80,78
Baygorria	53,96	53,85
Palmar	38,95	39,33
SGU	34,91	35,39

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

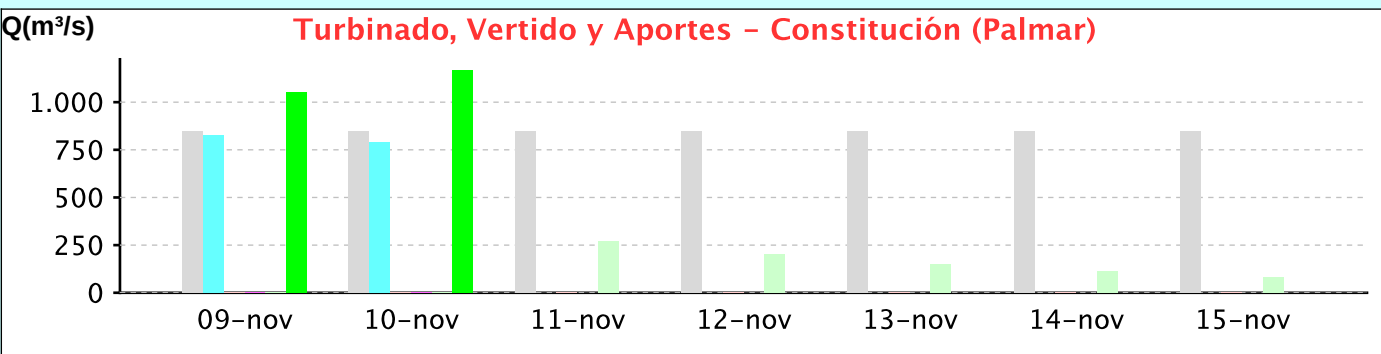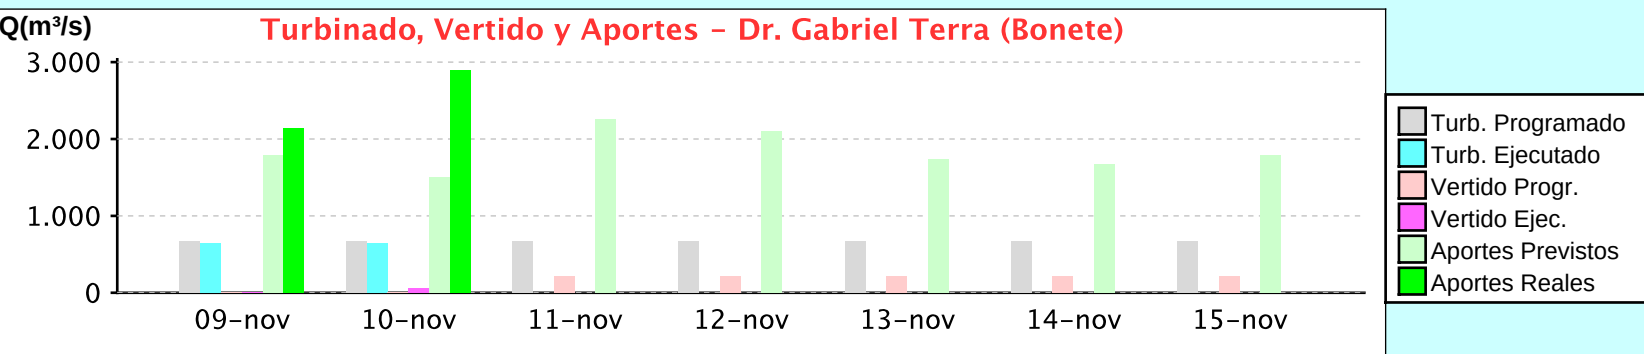

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

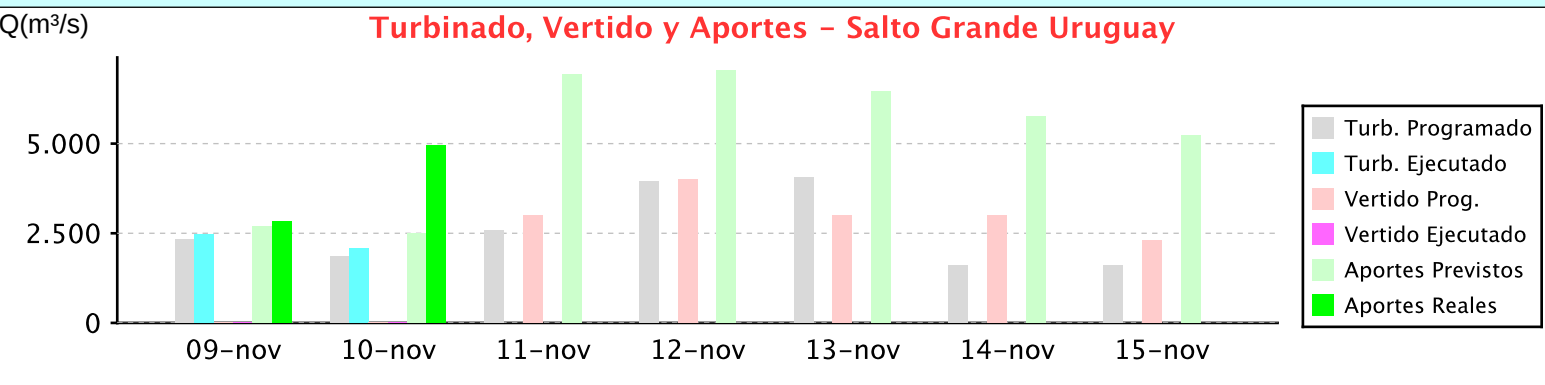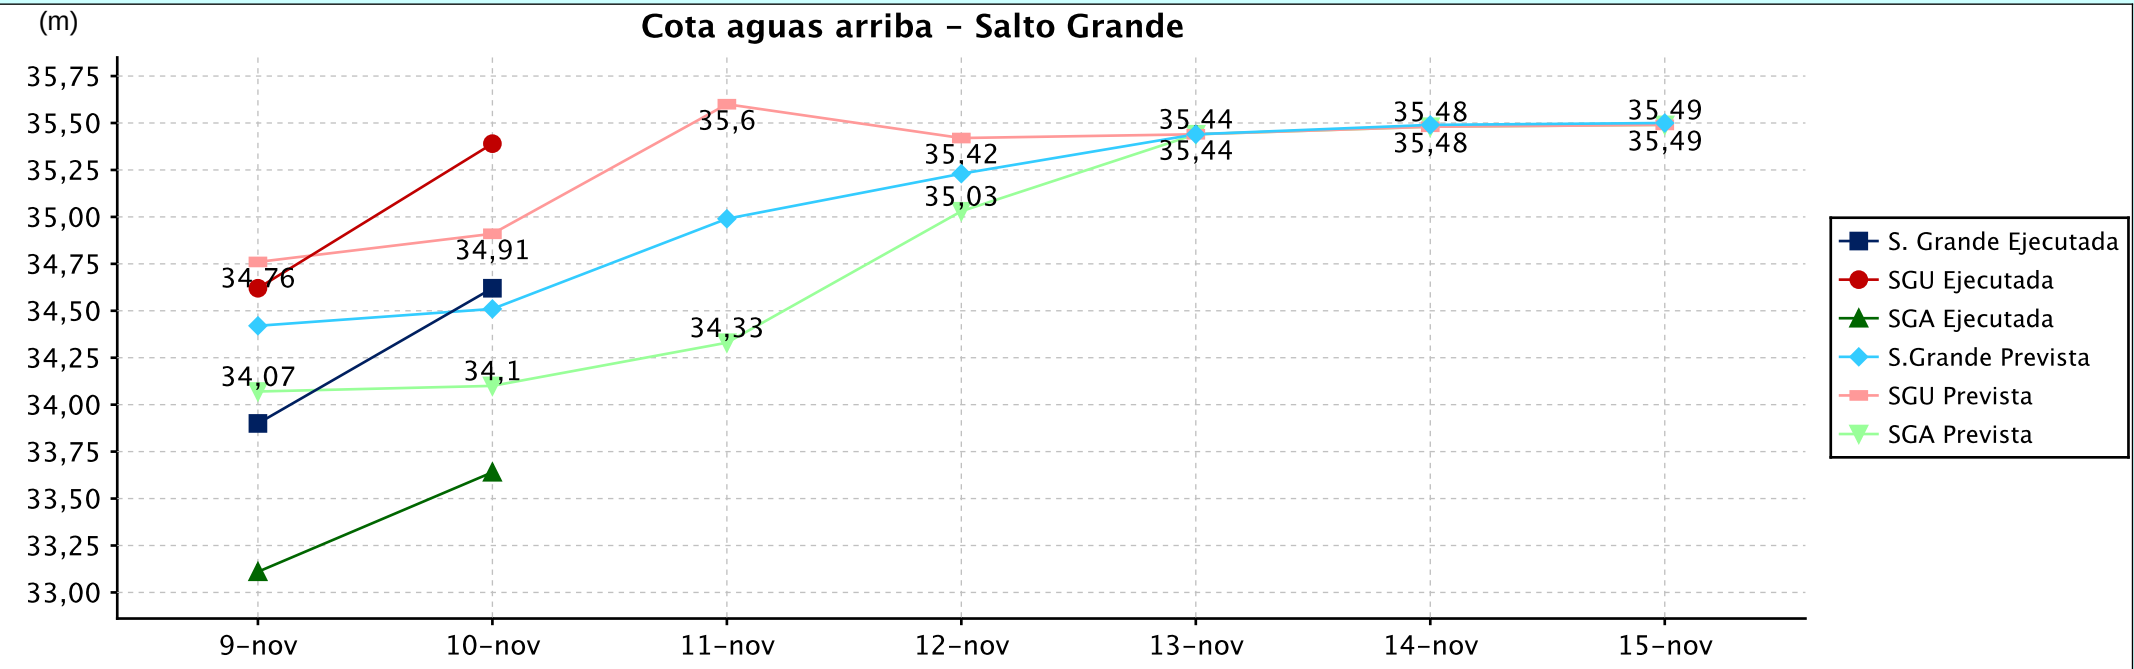

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,39
Cota Vista Arg	33,64
Cota real	34,62

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	38.660
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	638
Baygorria	772	797
Palmar	848	792
SGU	1.863	2.070

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.497	2.892
Baygorria	0	901
Palmar	0	1.167
SGU	2.500	4.960

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	64
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
