




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 21 de noviembre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	-11
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-7
Central La Tablada	-2
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.339
C. Baygorria	1.963
C. Palmar	7.886
C. Salto Grande	21.586
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.447
TOTAL Generación	36.192

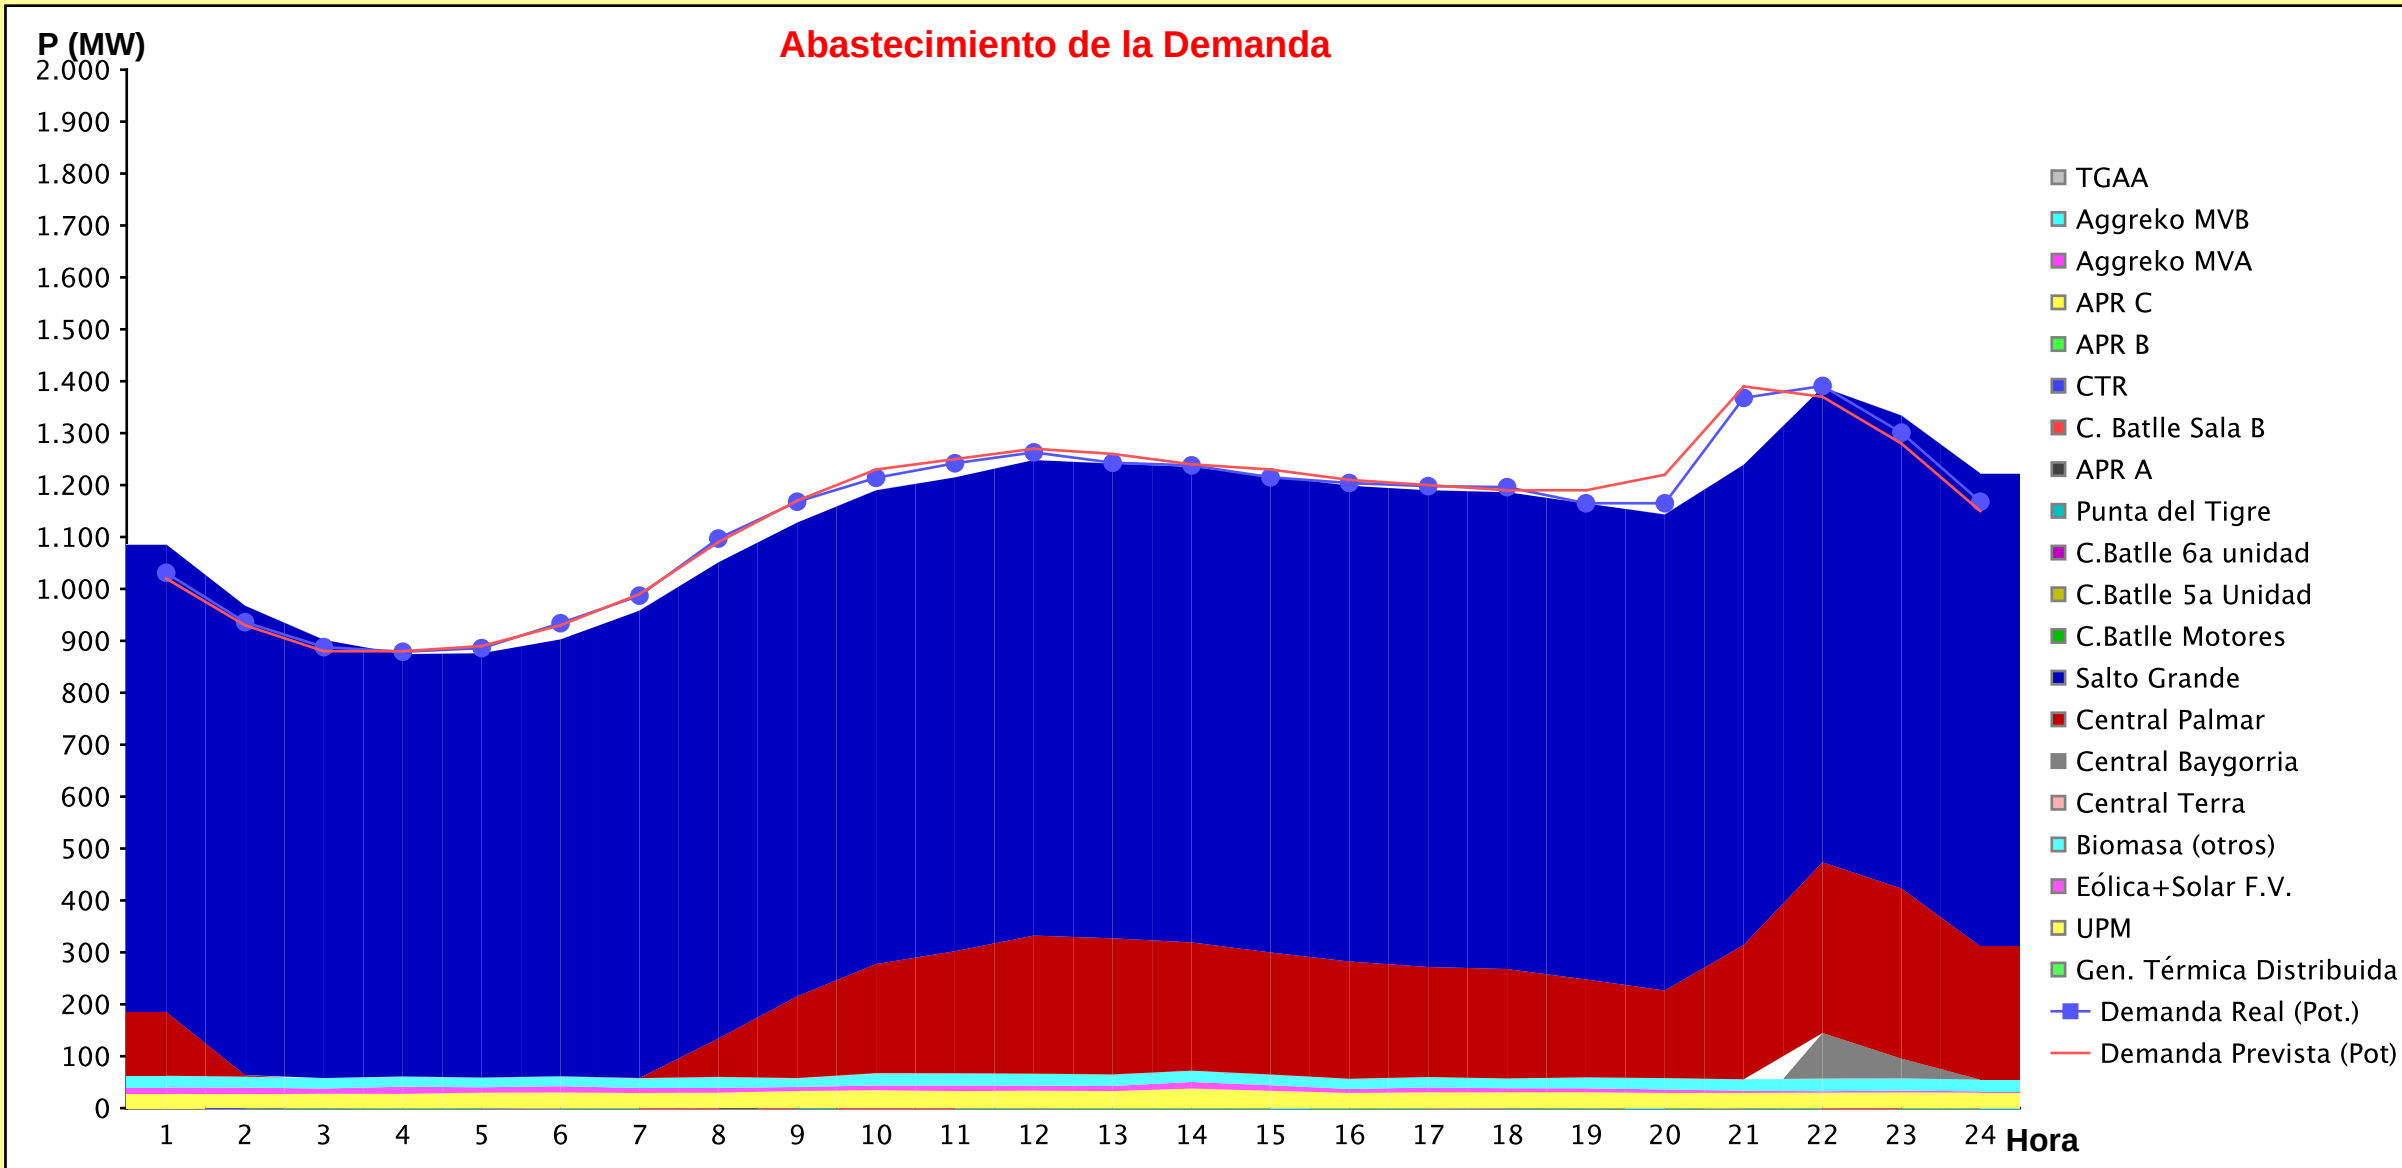

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.399
Hidráulica	9.399
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.399




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.793
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.460
Diferencia (MWh)	-667
Ejecutada - Programada	-2,43 %

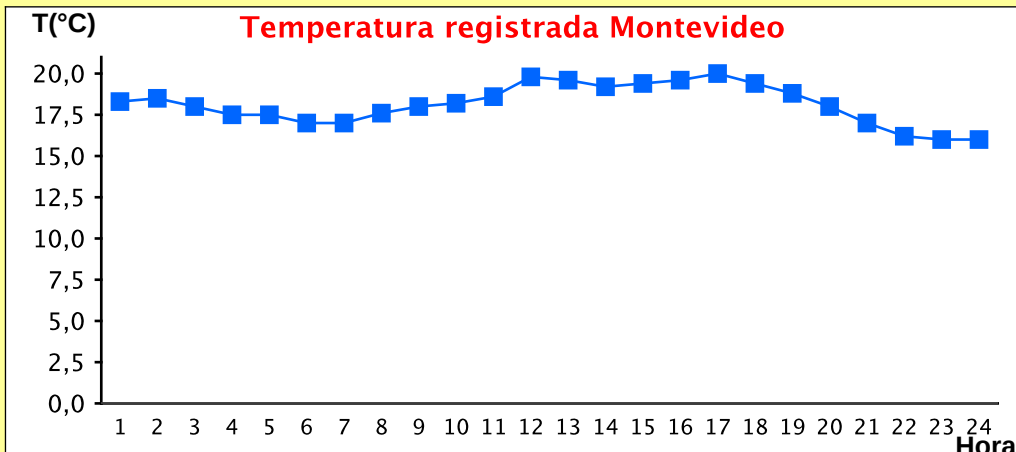



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1279,97 Hora 11:46
Potencia mínima:	873,88 Hora 03:31
Pico noche:	1421,78 Hora 21:30

Generación Media (MW)	
Eólica	9,1
Biomasa	56,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

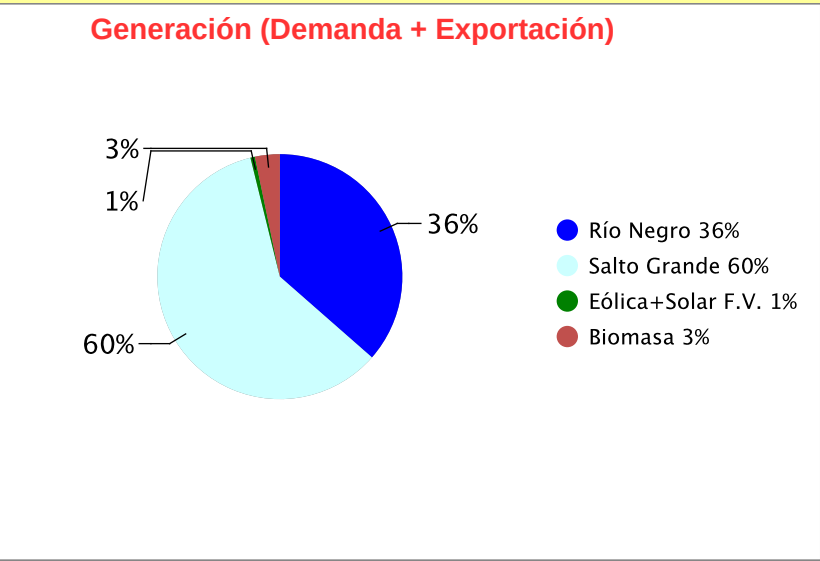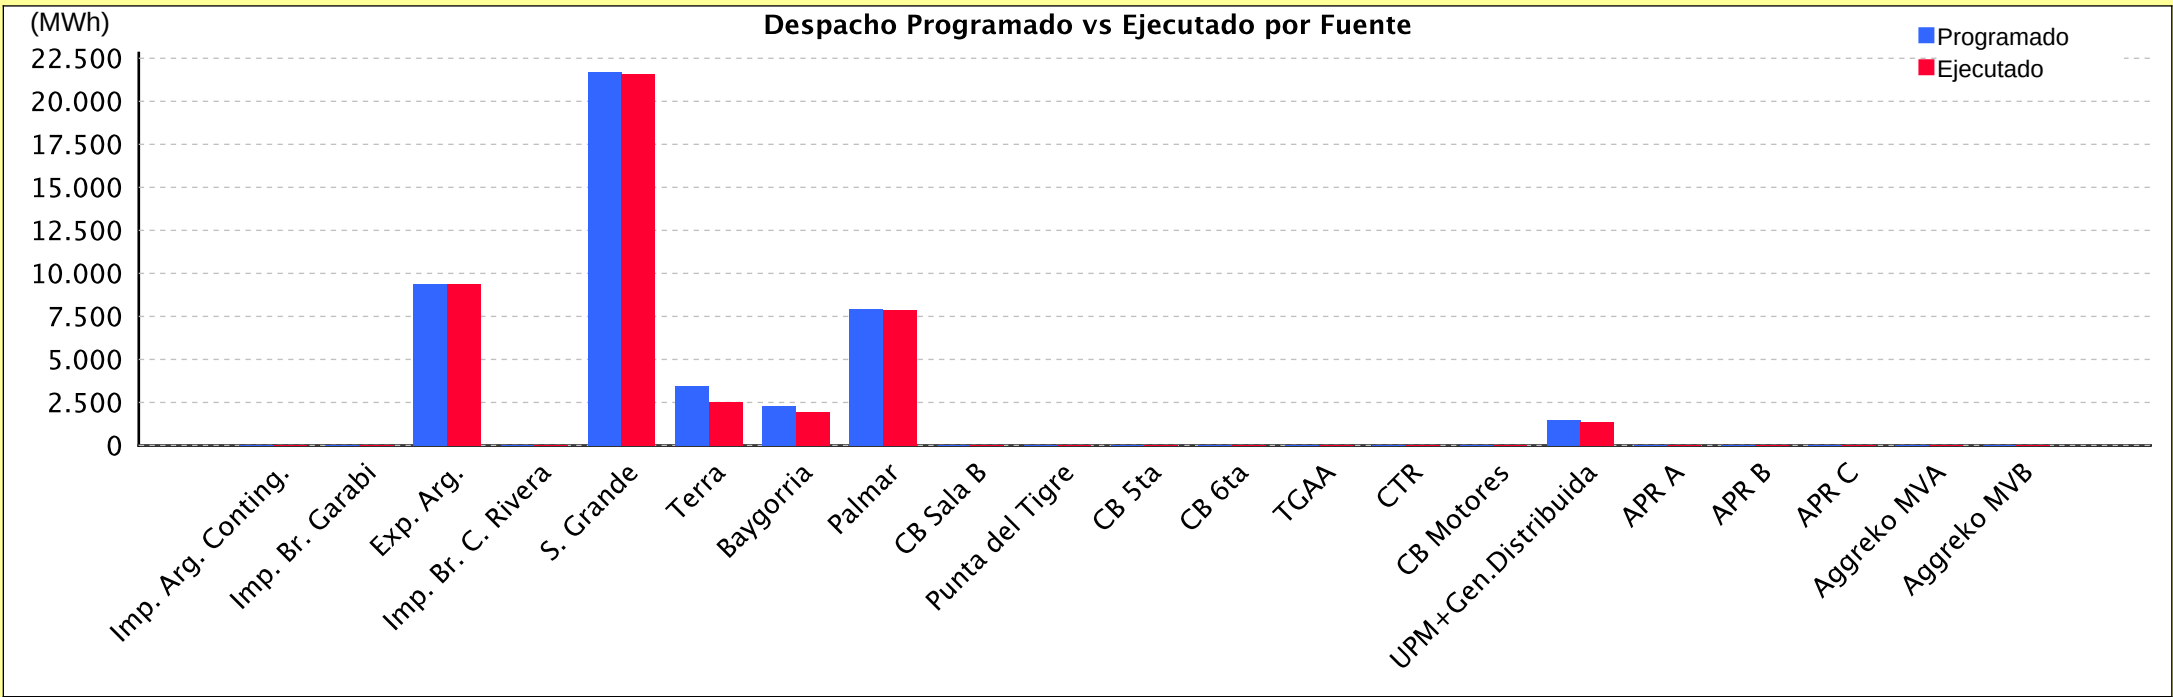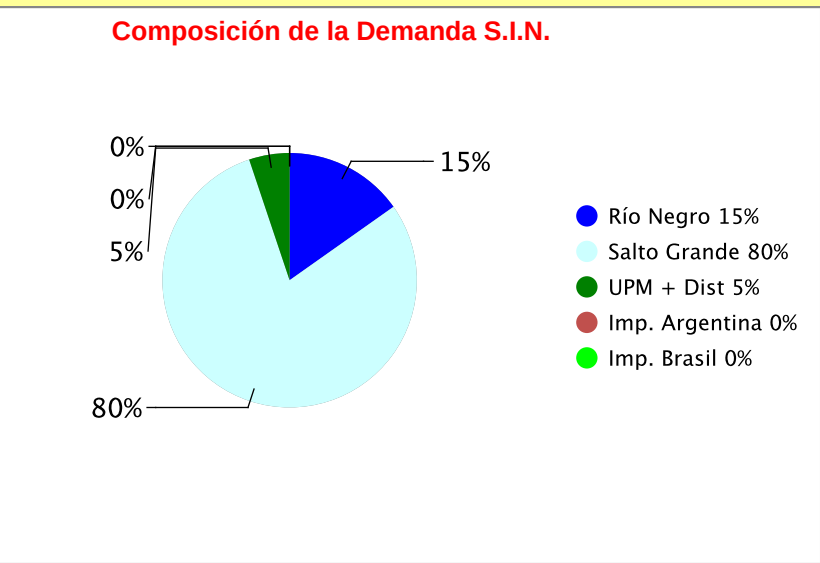



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

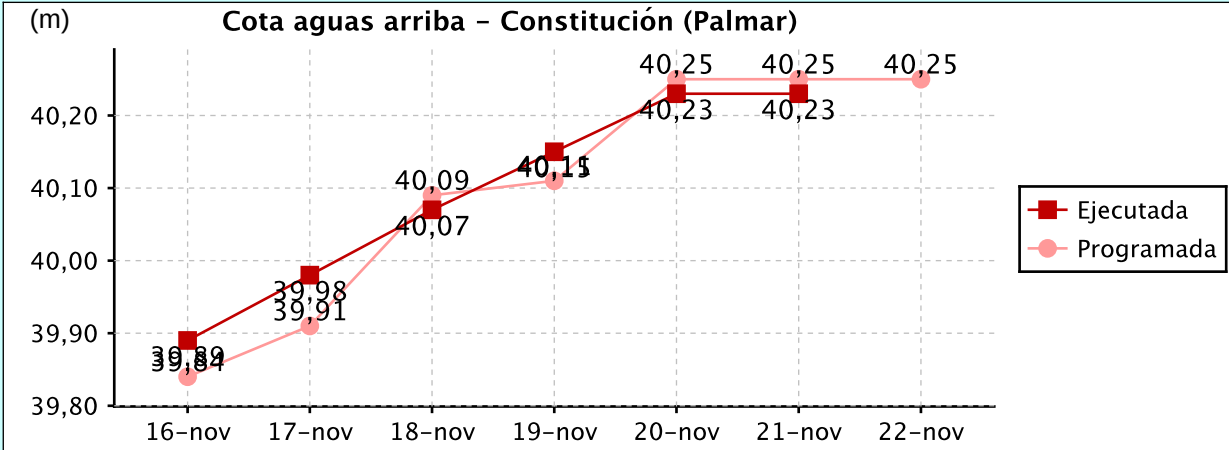
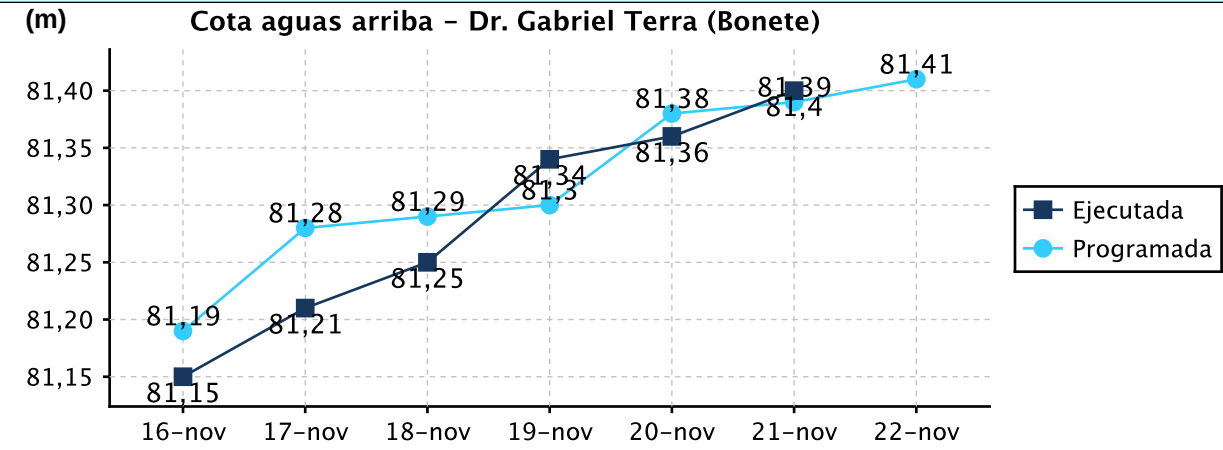


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,39	81,4
Baygorria	54,17	54,19
Palmar	40,25	40,23
SGU	35,16	35,15

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

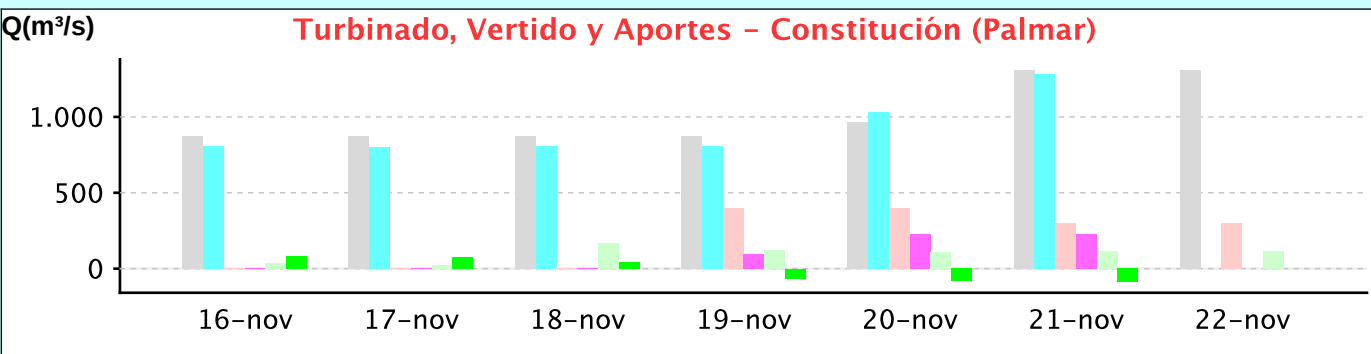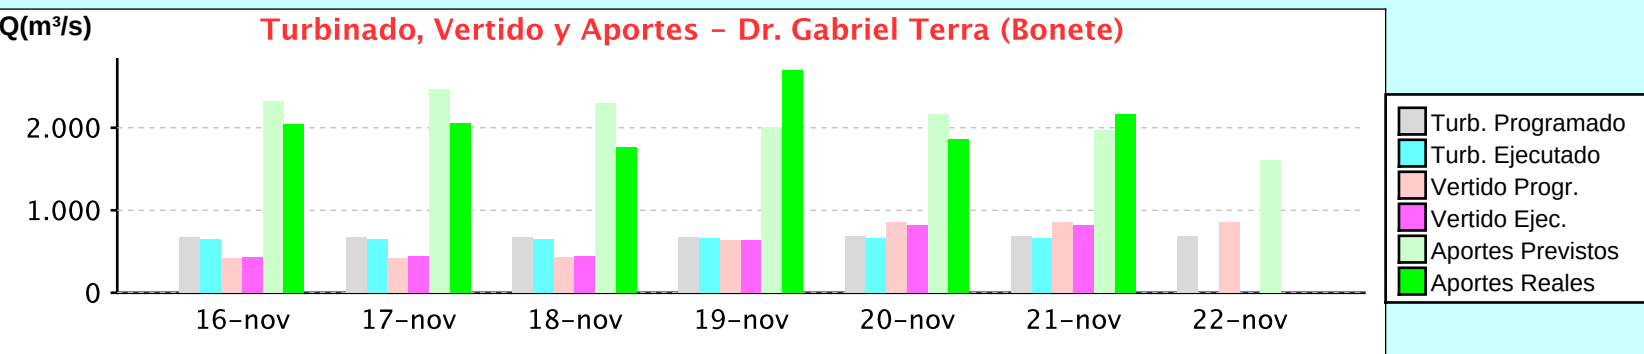

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

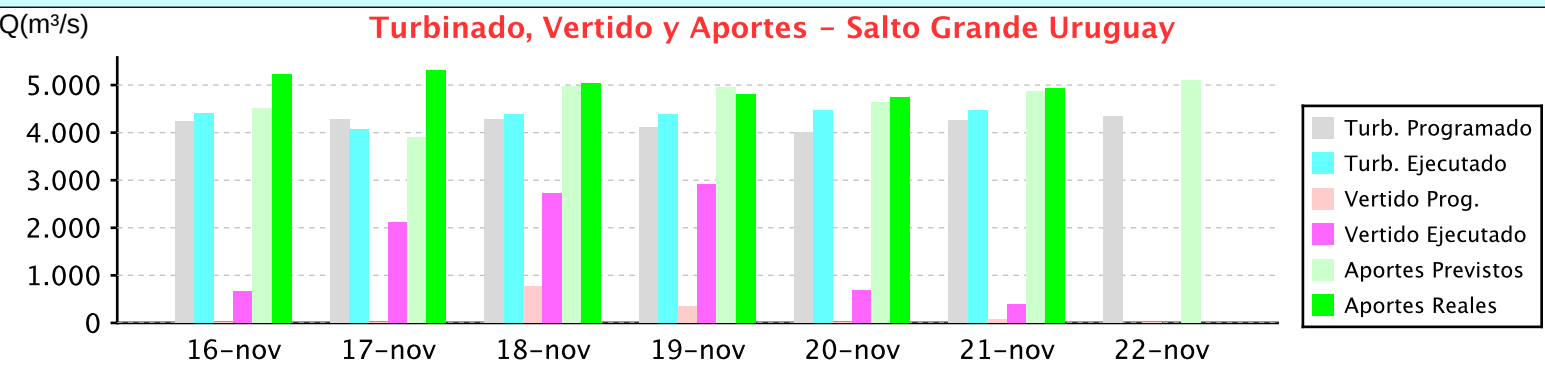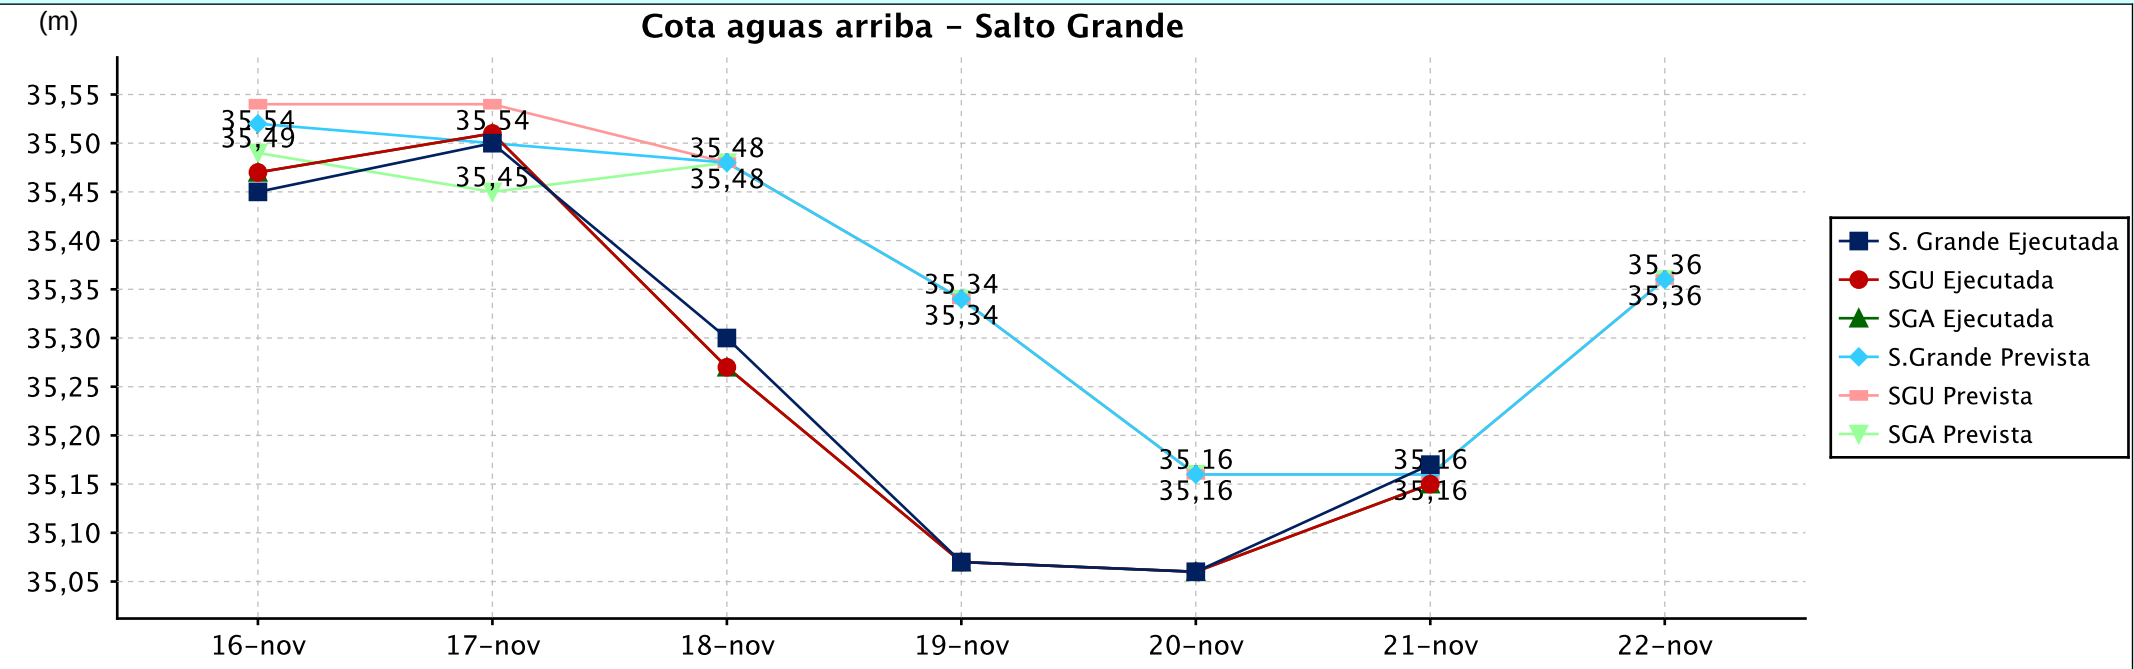

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,15
Cota Vista Arg	35,15
Cota real	35,17
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
0	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	691	664
Baygorria	800	746
Palmar	1.310	1.280
SGU	4.261	4.476

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.968	2.166
Baygorria	41	151
Palmar	113	-89
SGU	4.875	4.934

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	860	823
Baygorria	800	881
Palmar	300	226
SGU	81	394

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron a Argentina 391 MW medios de excedentes de vertimiento de Río Negro y Salto Grande.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

25/11/2013 12:26
