



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 02 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-4
Central La Tablada	-1
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.337
C. Baygorria	2.208
C. Palmar	7.790
C. Salto Grande	15.245
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.380
TOTAL Generación	29.933

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.933
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.740
Diferencia (MWh)	193
Ejecutada - Programada	0,65 %

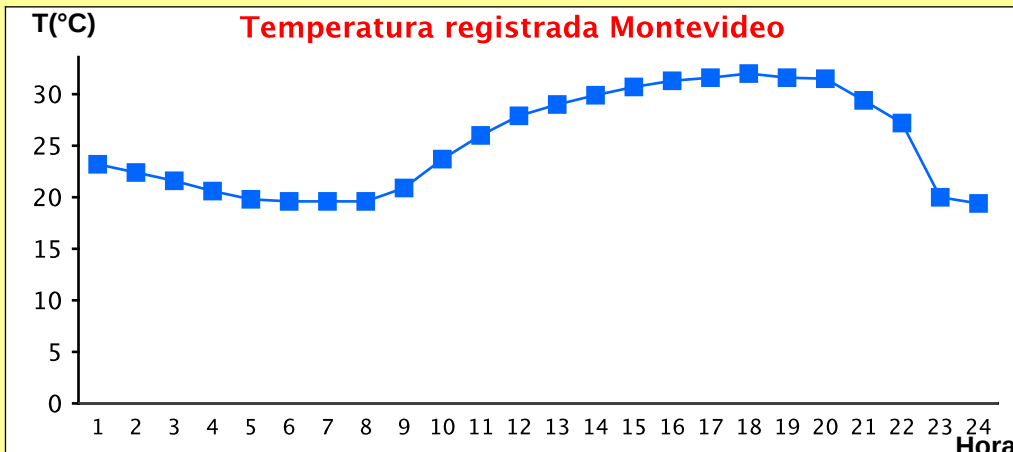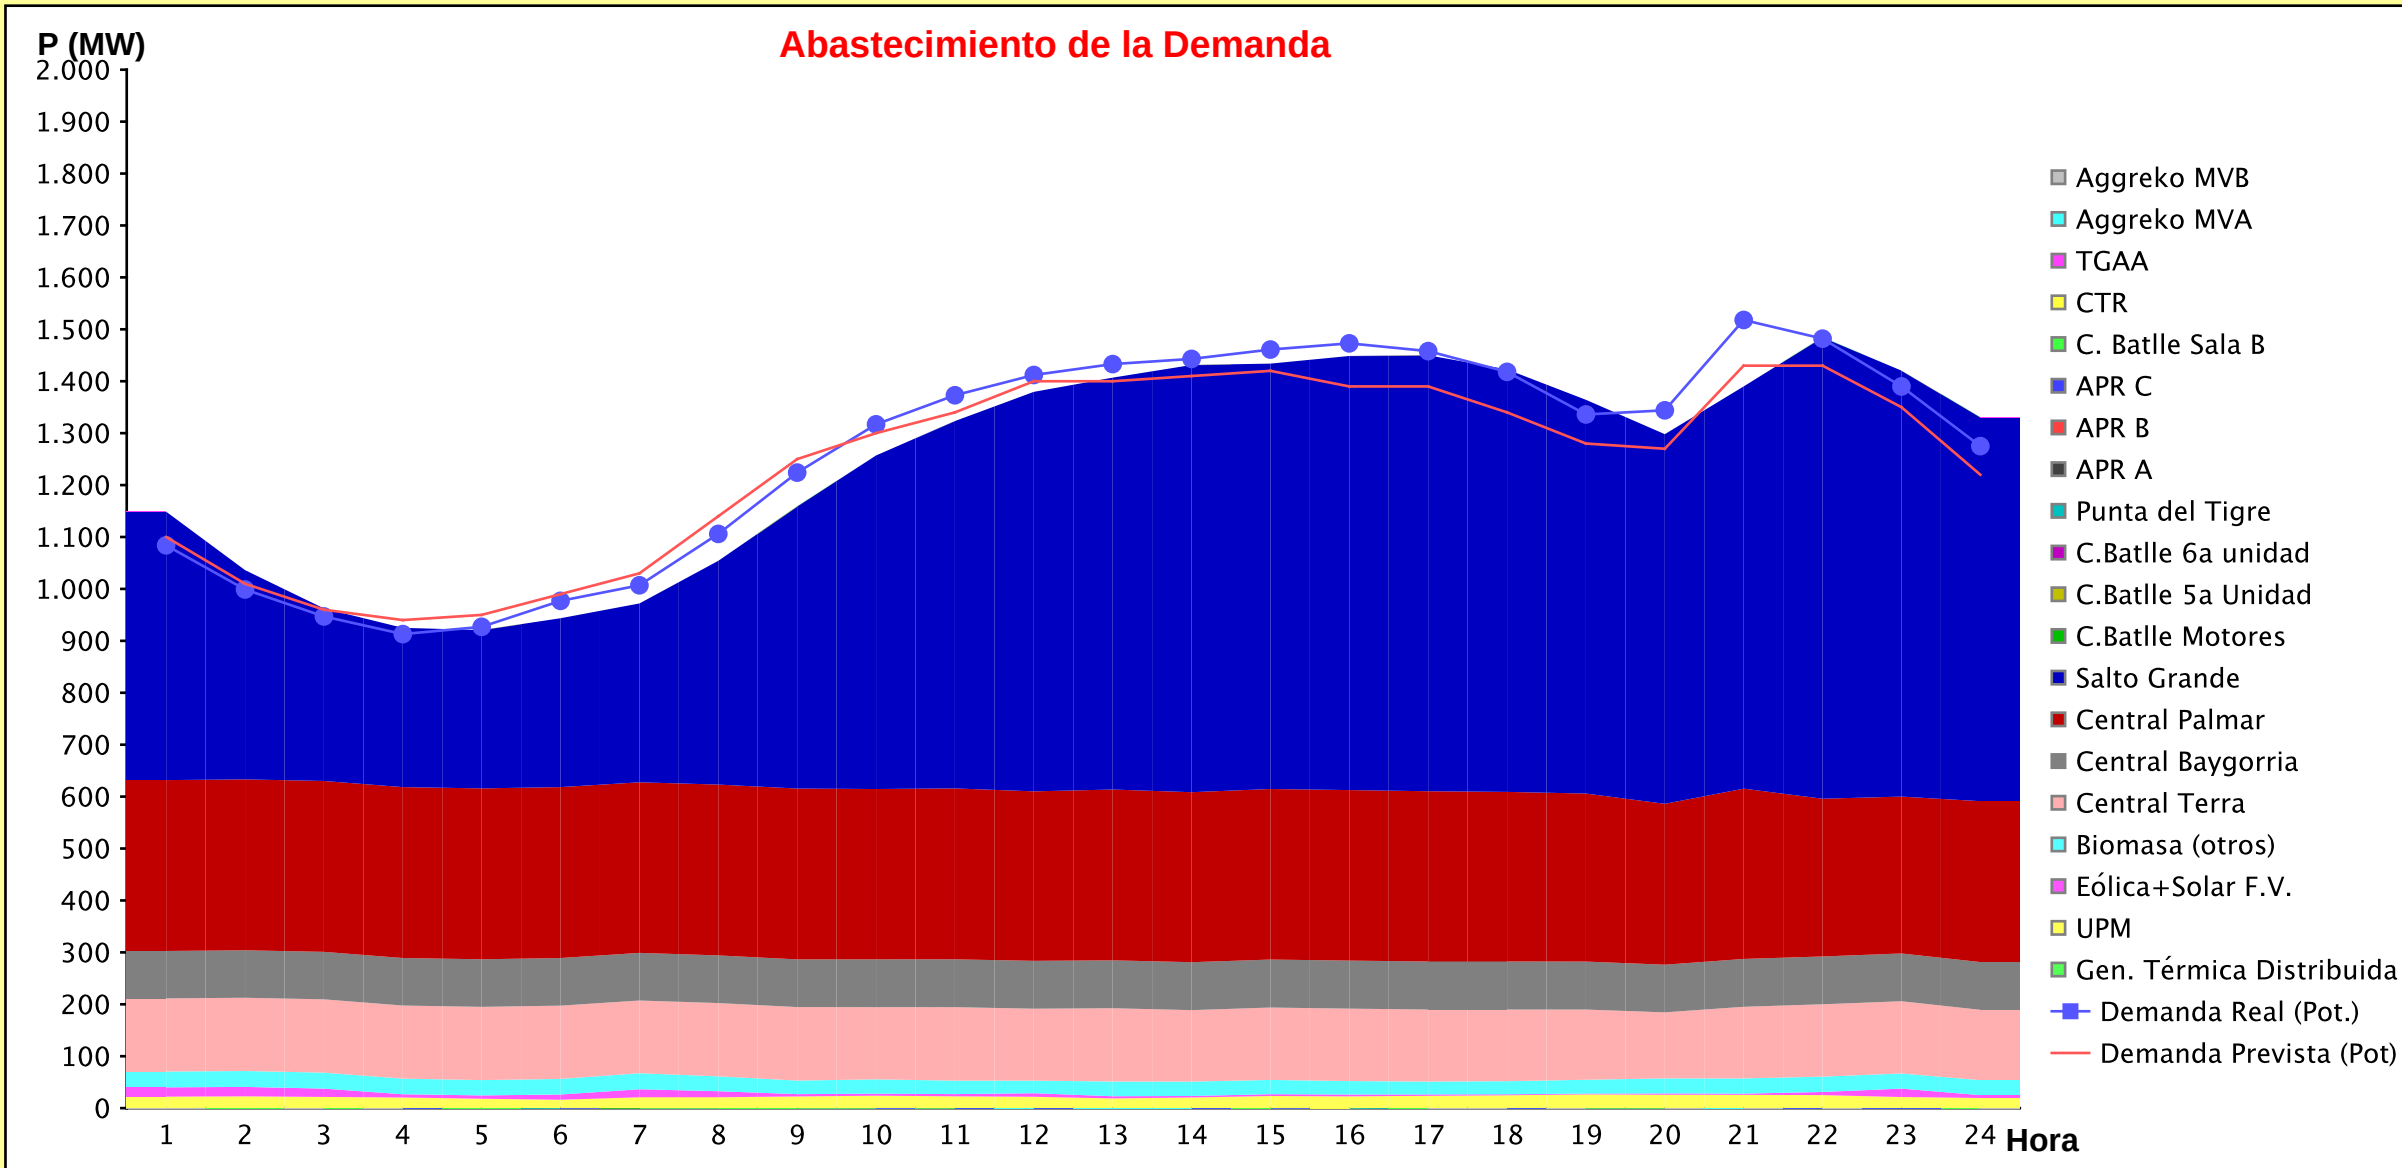



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1489,33 Hora 16:13
Potencia mínima:	912,46 Hora 03:59
Pico noche:	1529,18 Hora 21:07

Generación Media (MW)	
Eólica	7,4
Biomasa	54,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

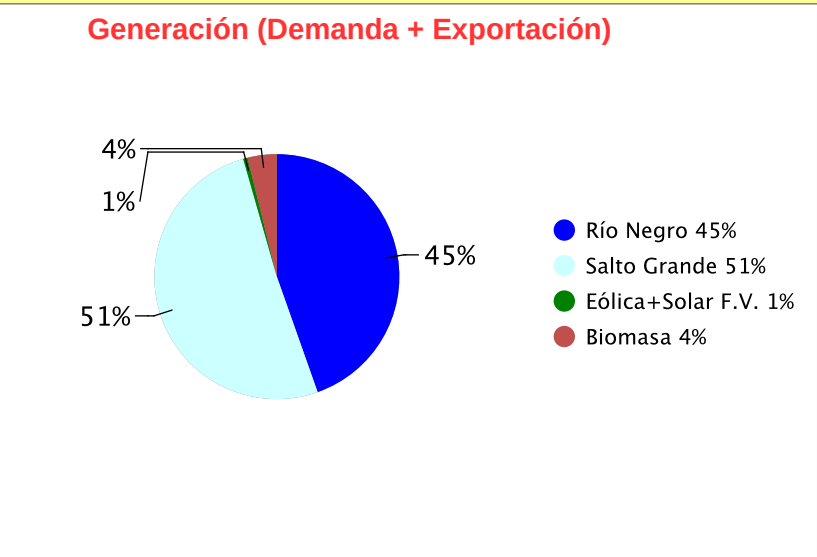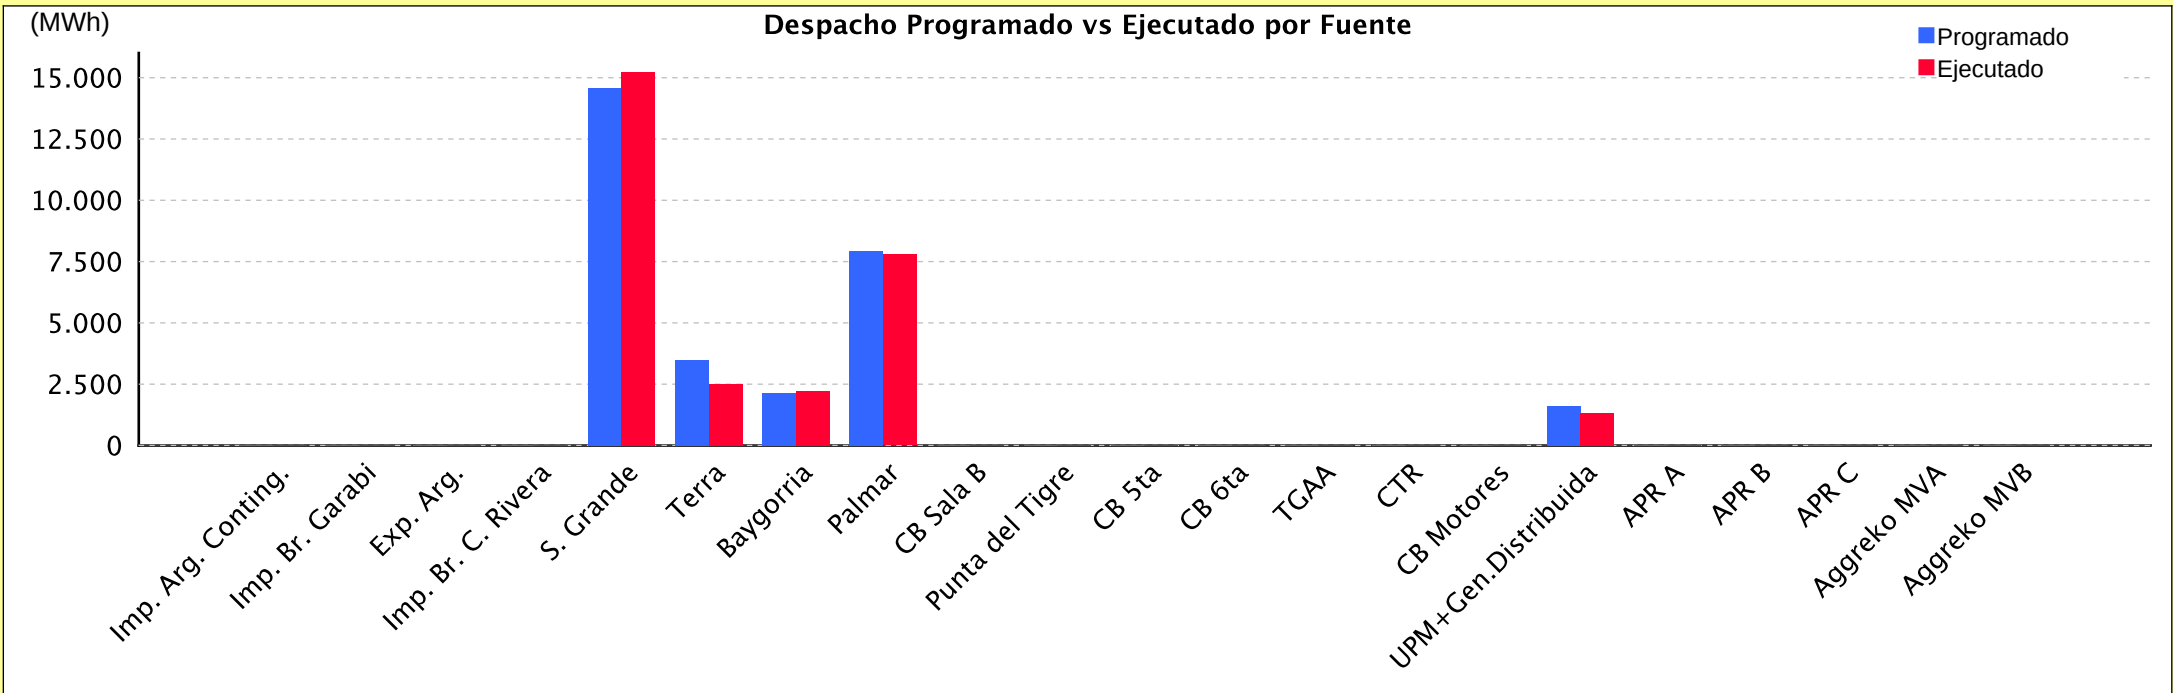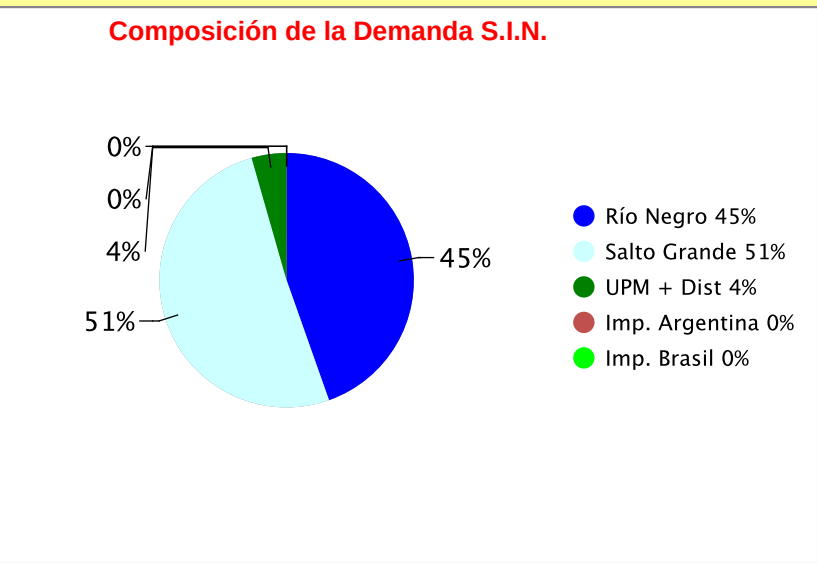



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

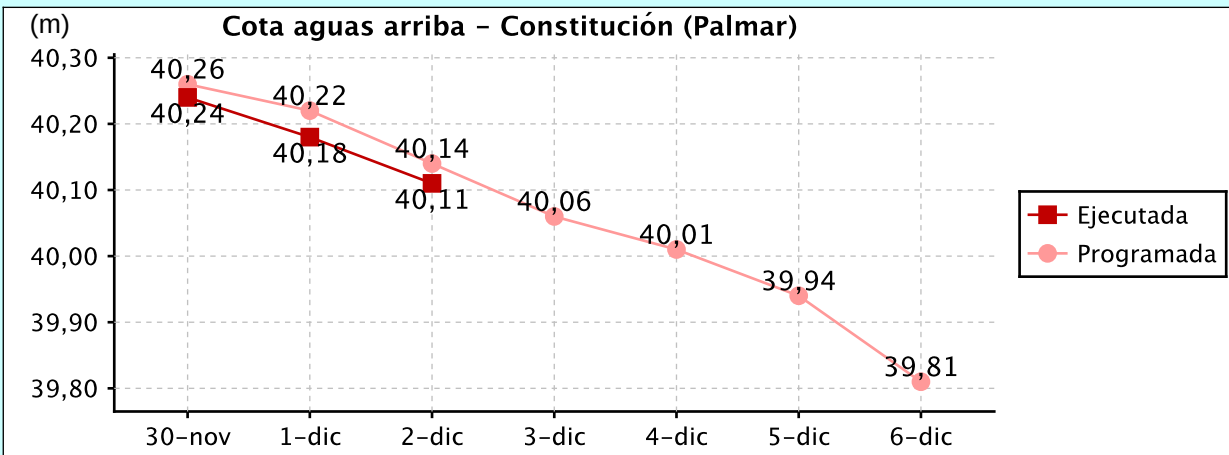
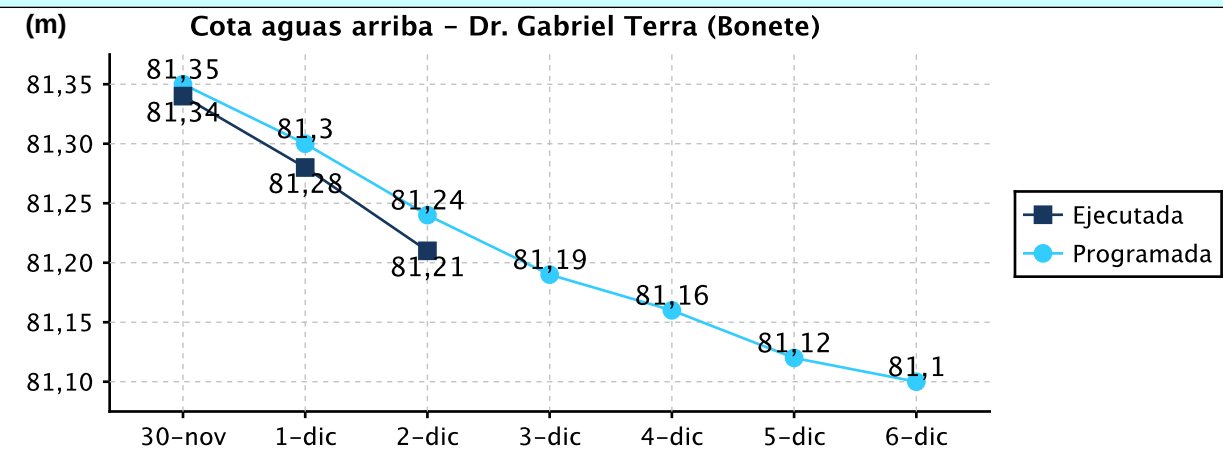


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,24	81,21
Baygorria	54,10	54,18
Palmar	40,14	40,11
SGU	35,50	35,48

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

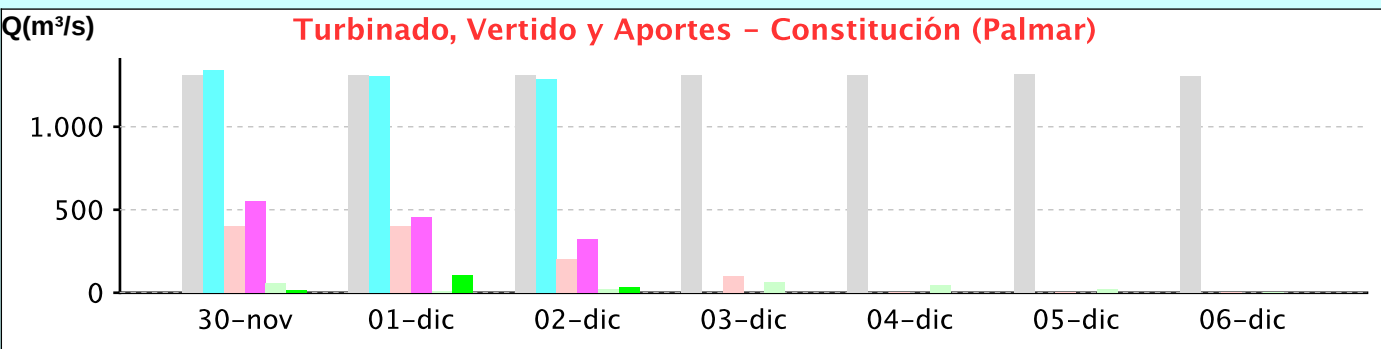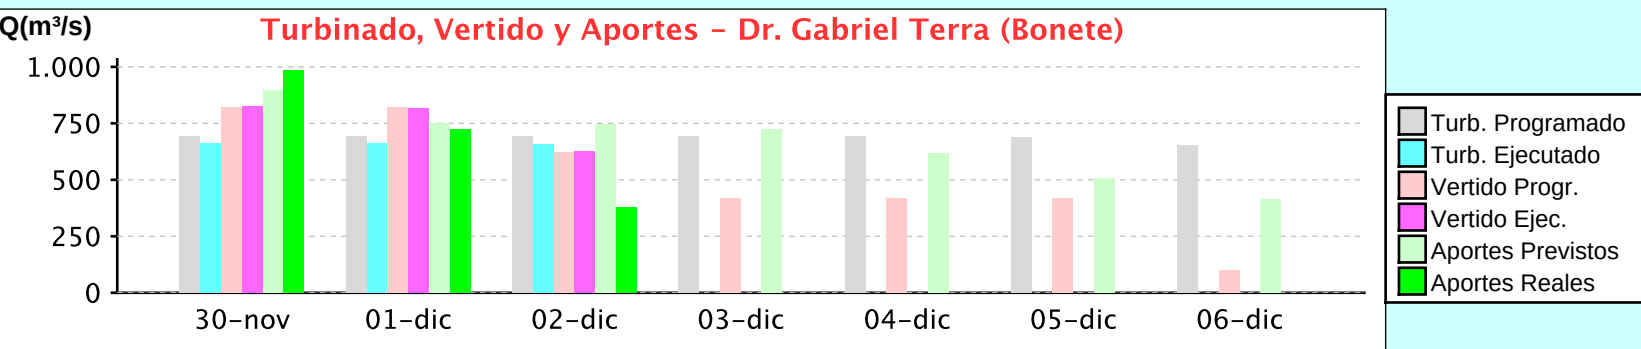

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

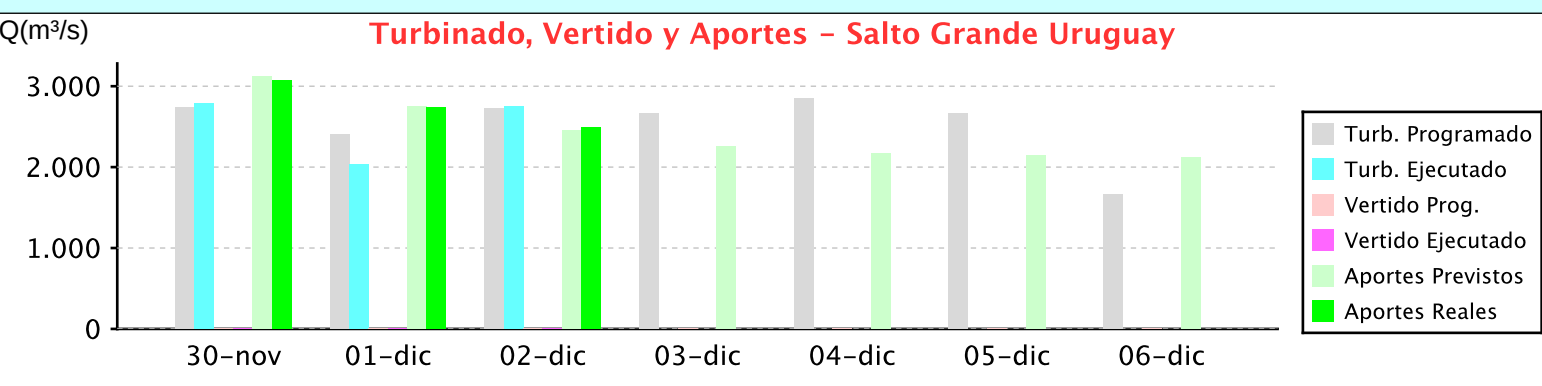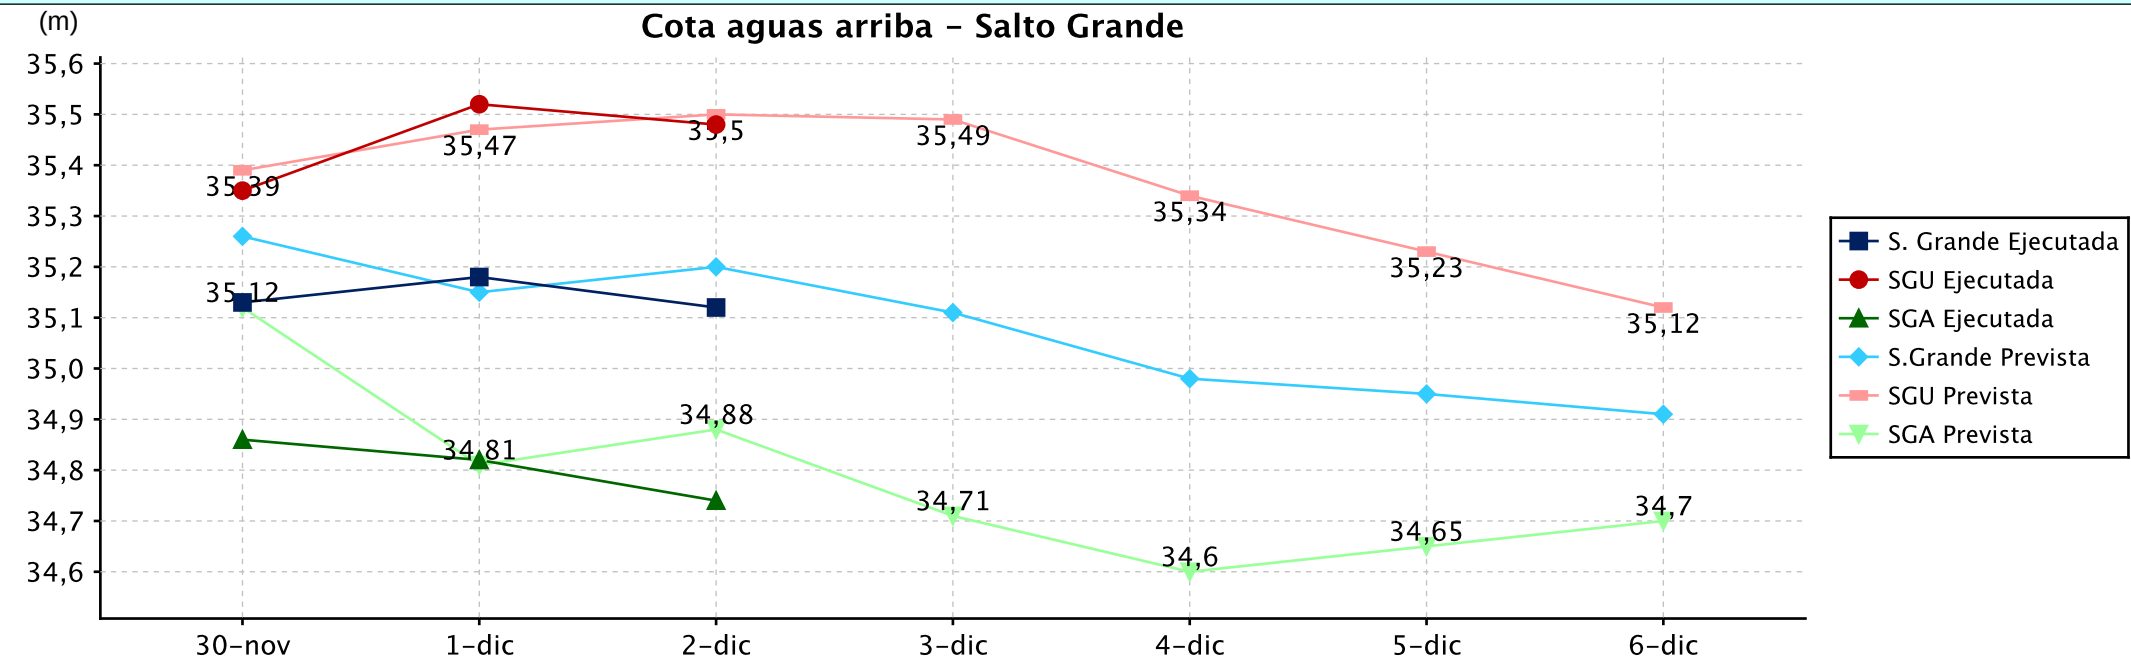

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,48
Cota Vista Arg	34,74
Cota real	35,12
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
17.750	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	691	658
Baygorria	758	840
Palmar	1.310	1.285
SGU	2.720	2.750

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	746	376
Baygorria	0	161
Palmar	20	33
SGU	2.450	2.487

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	620	627
Baygorria	600	556
Palmar	200	325
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
