



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 07 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-11
Sala B	-4
5ta.	-5
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.336
C. Baygorria	2.283
C. Palmar	7.820
C. Salto Grande	11.526
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.592
TOTAL Generación	26.487

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.487
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.300
Diferencia (MWh)	187
Ejecutada - Programada	0,71 %

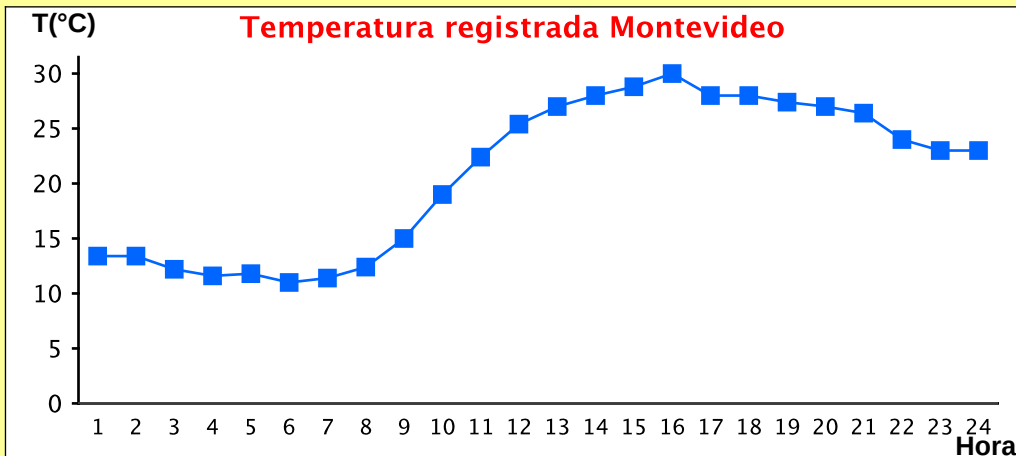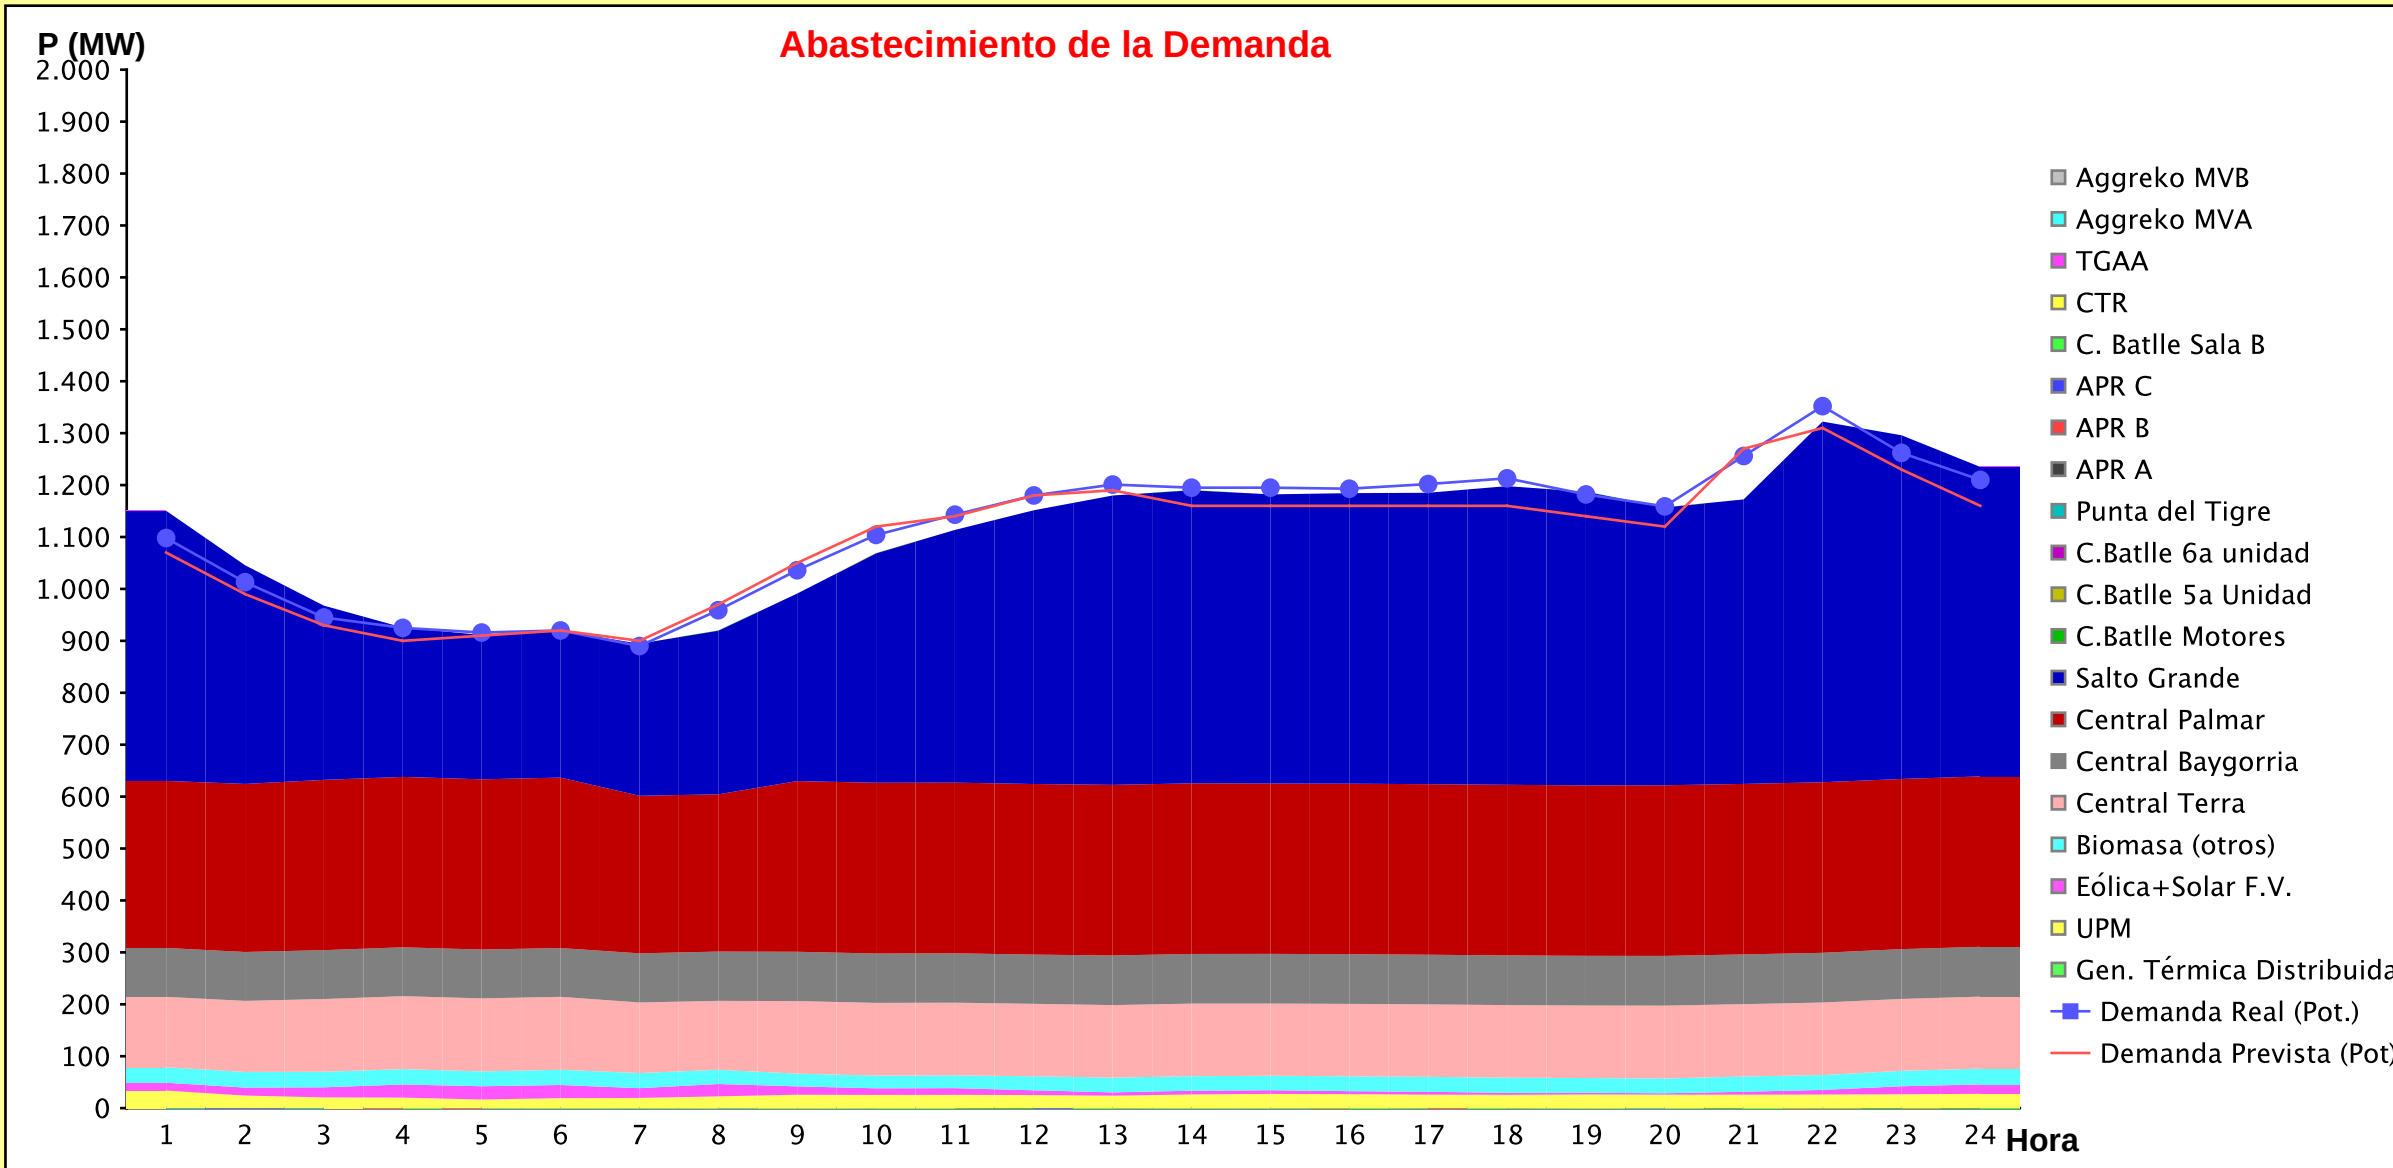



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1223,92 Hora 13:01
Potencia mínima:	880,08 Hora 06:34
Pico noche:	1369,04 Hora 21:52

Generación Media (MW)	
Eólica	13,0
Biomasa	57,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

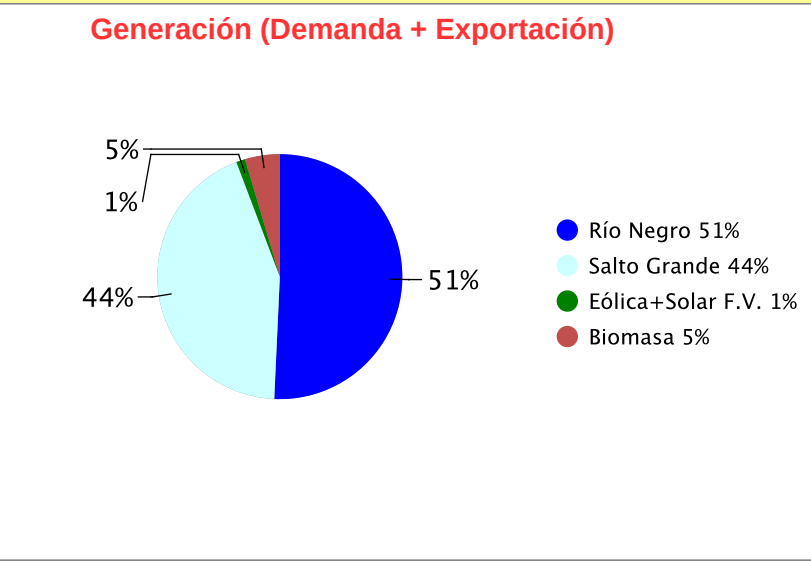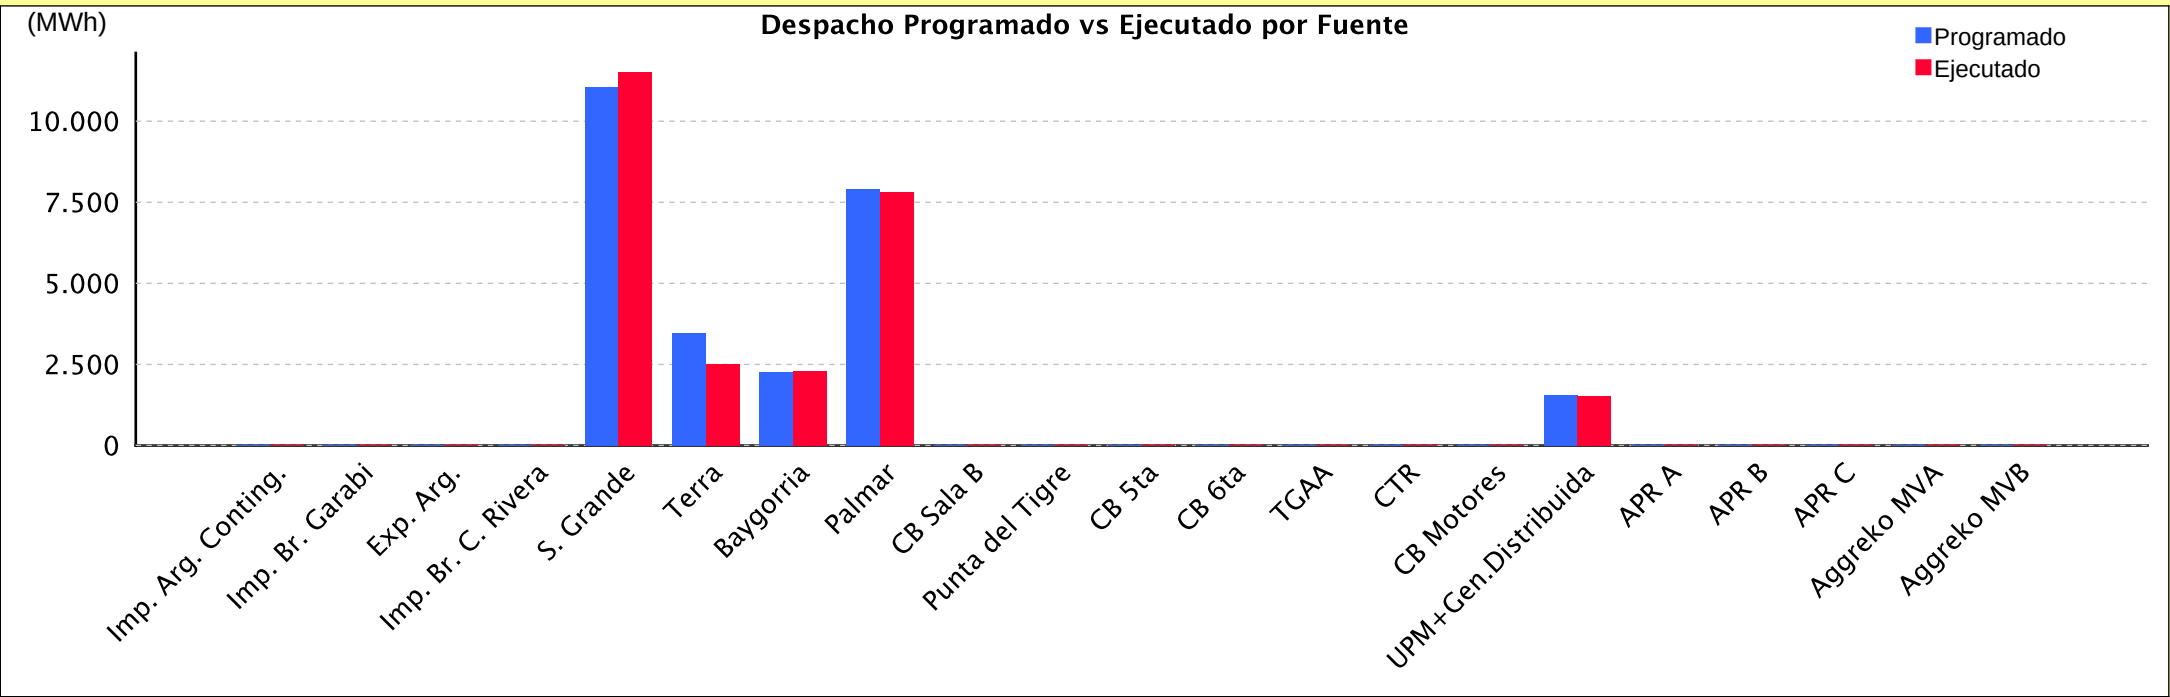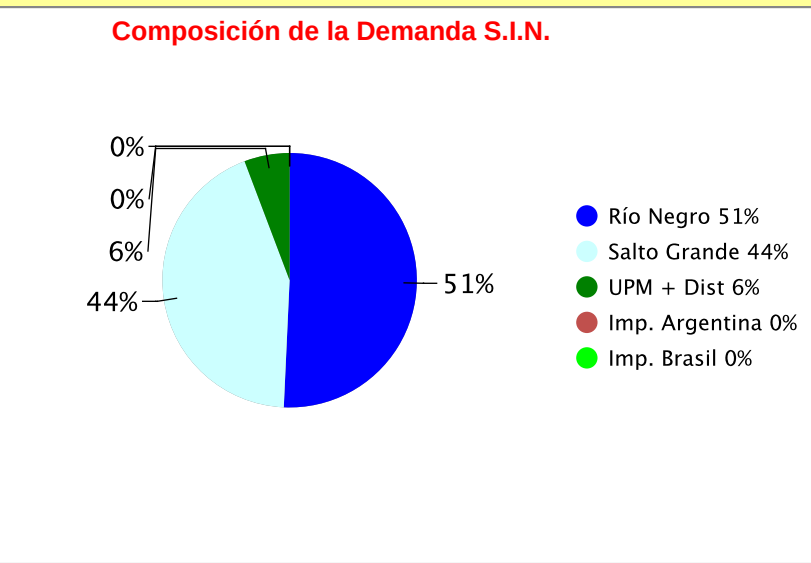



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

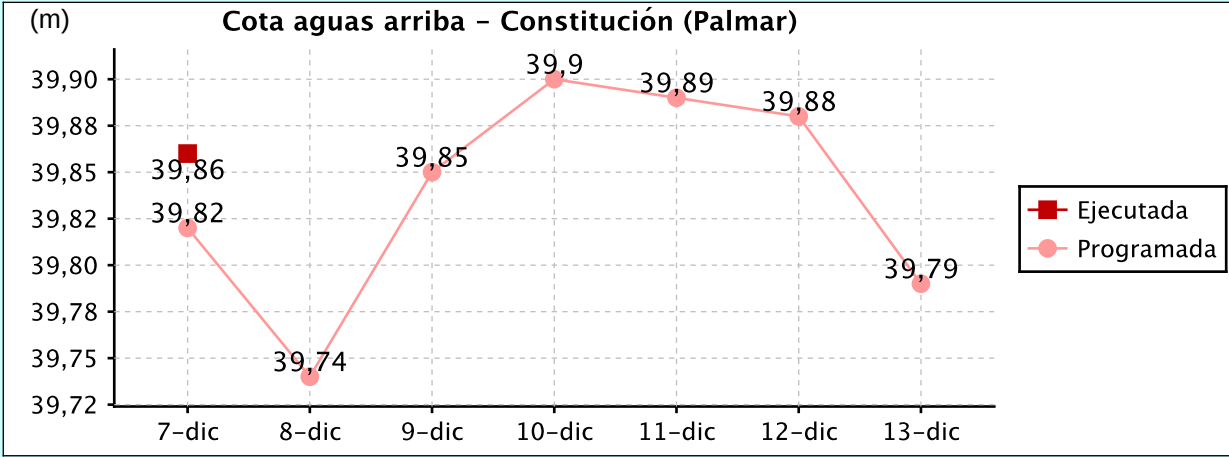
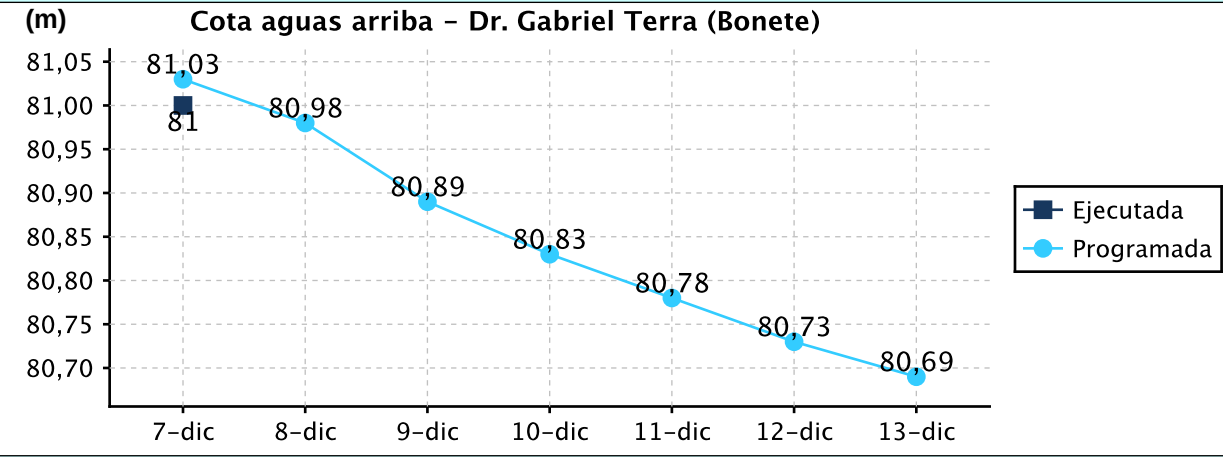


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,03	81
Baygorria	53,91	54,04
Palmar	39,82	39,86
SGU	35,12	35,02

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

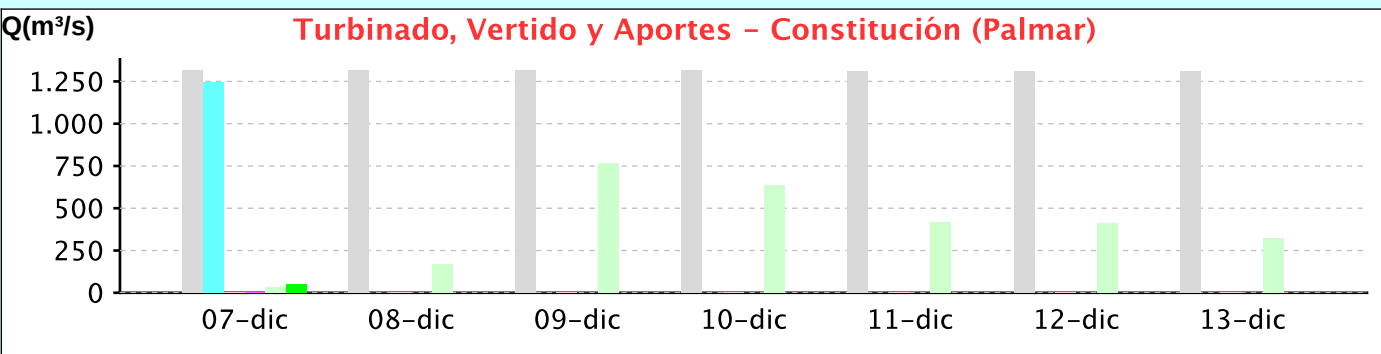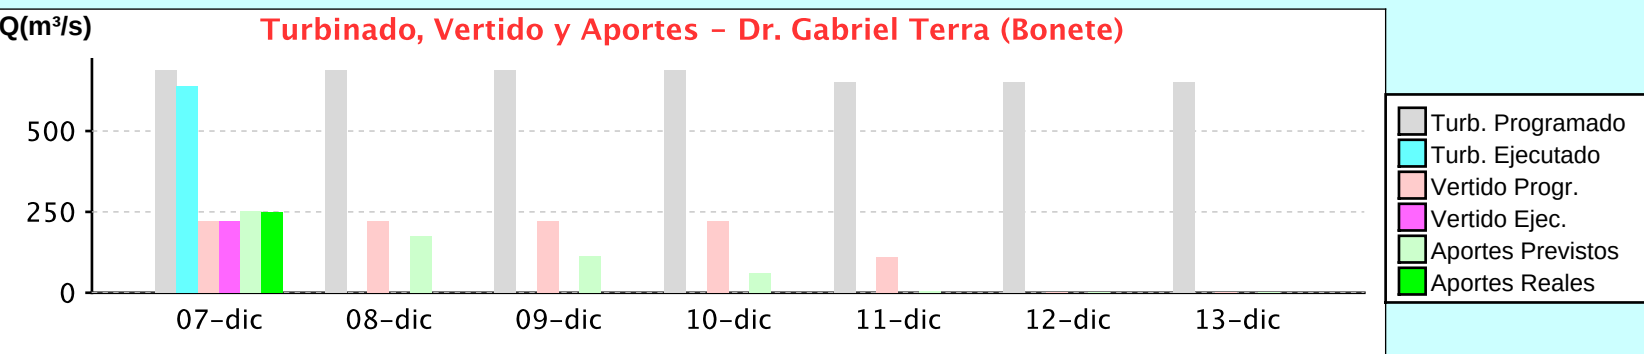

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

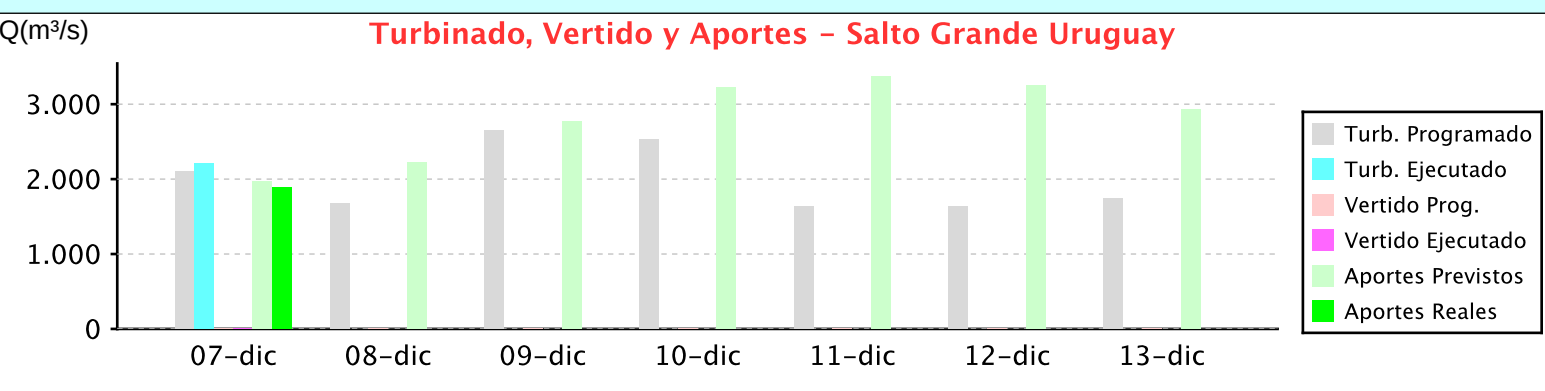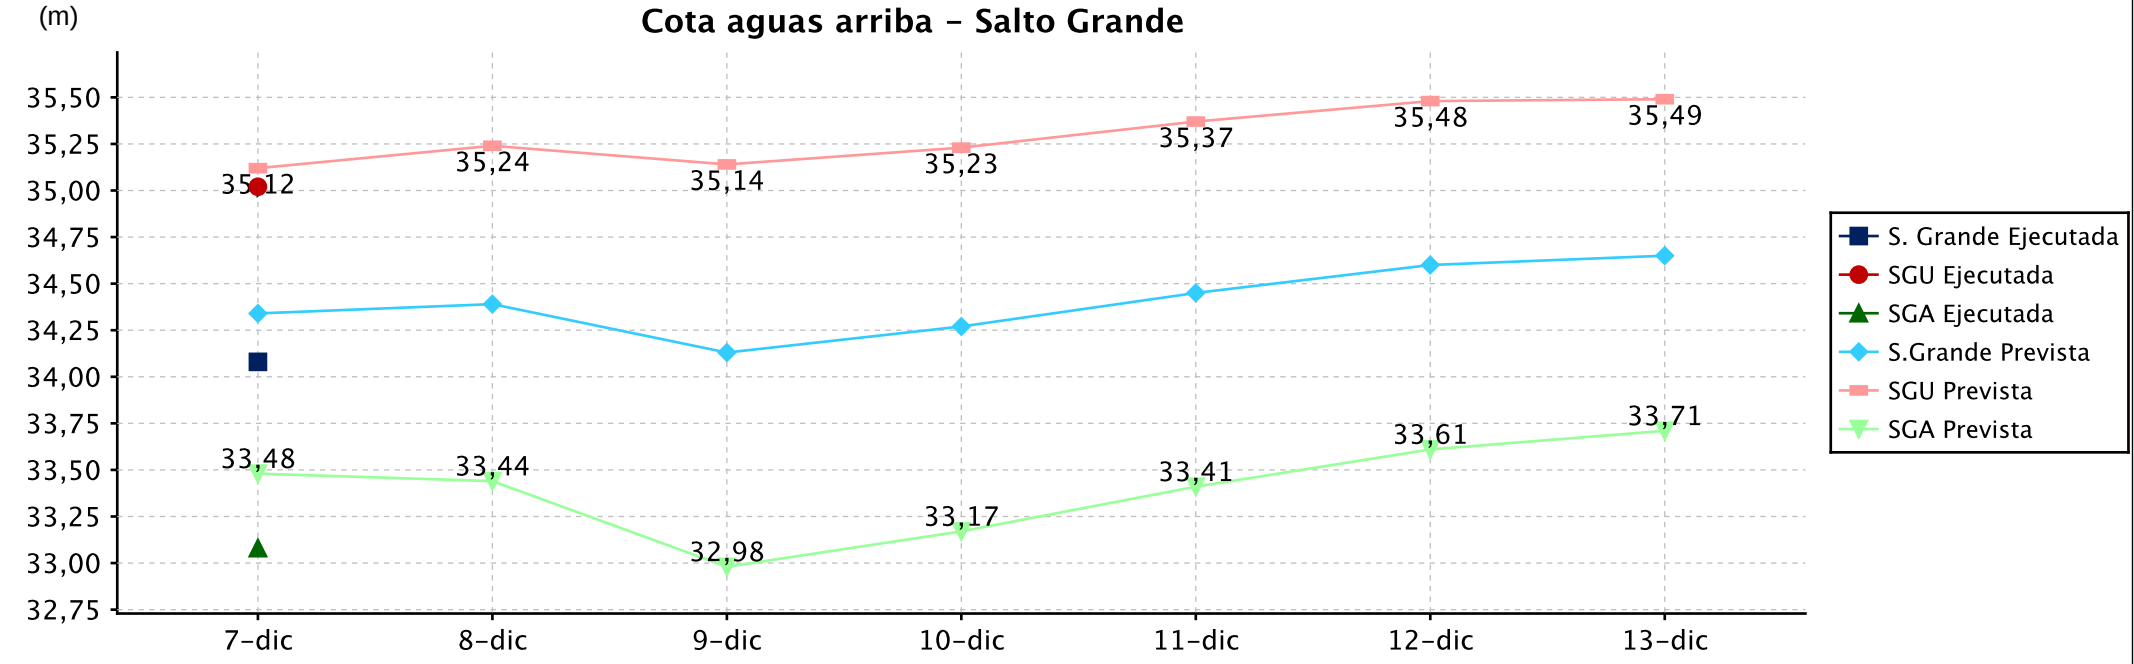

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,02
Cota Vista Arg	33,08
Cota real	34,08
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	40.324

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	687	638
Baygorria	865	835
Palmar	1.315	1.247
SGU	2.104	2.211

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	251	250
Baygorria	0	-1
Palmar	30	48
SGU	1.975	1.895

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	221
Baygorria	100	33
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
