



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 13 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	1.363
Sala B	-4
5ta.	-4
6ta.	212
Motores	1.159
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	97
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.370
C. Baygorria	1.857
C. Palmar	5.290
C. Salto Grande	16.798
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.720
TOTAL Generación	30.438

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.438
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.120
Diferencia (MWh)	318
Ejecutada - Programada	1,06 %

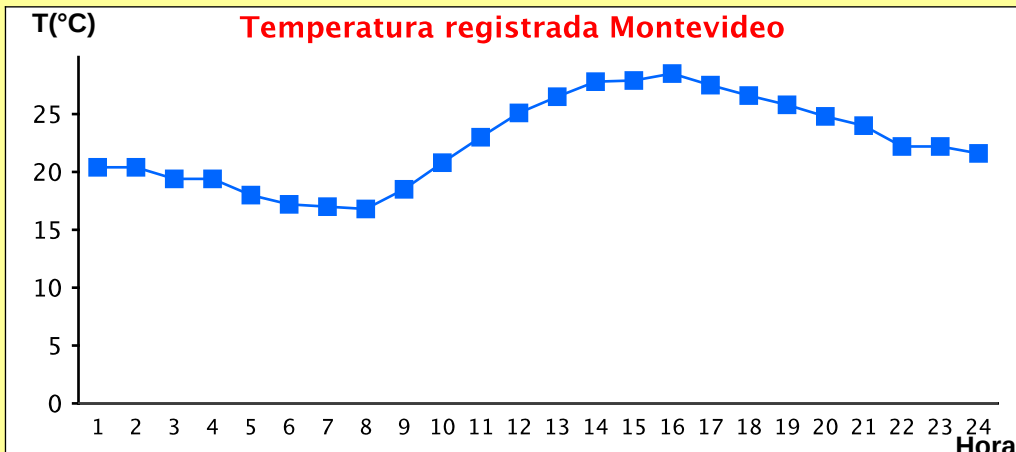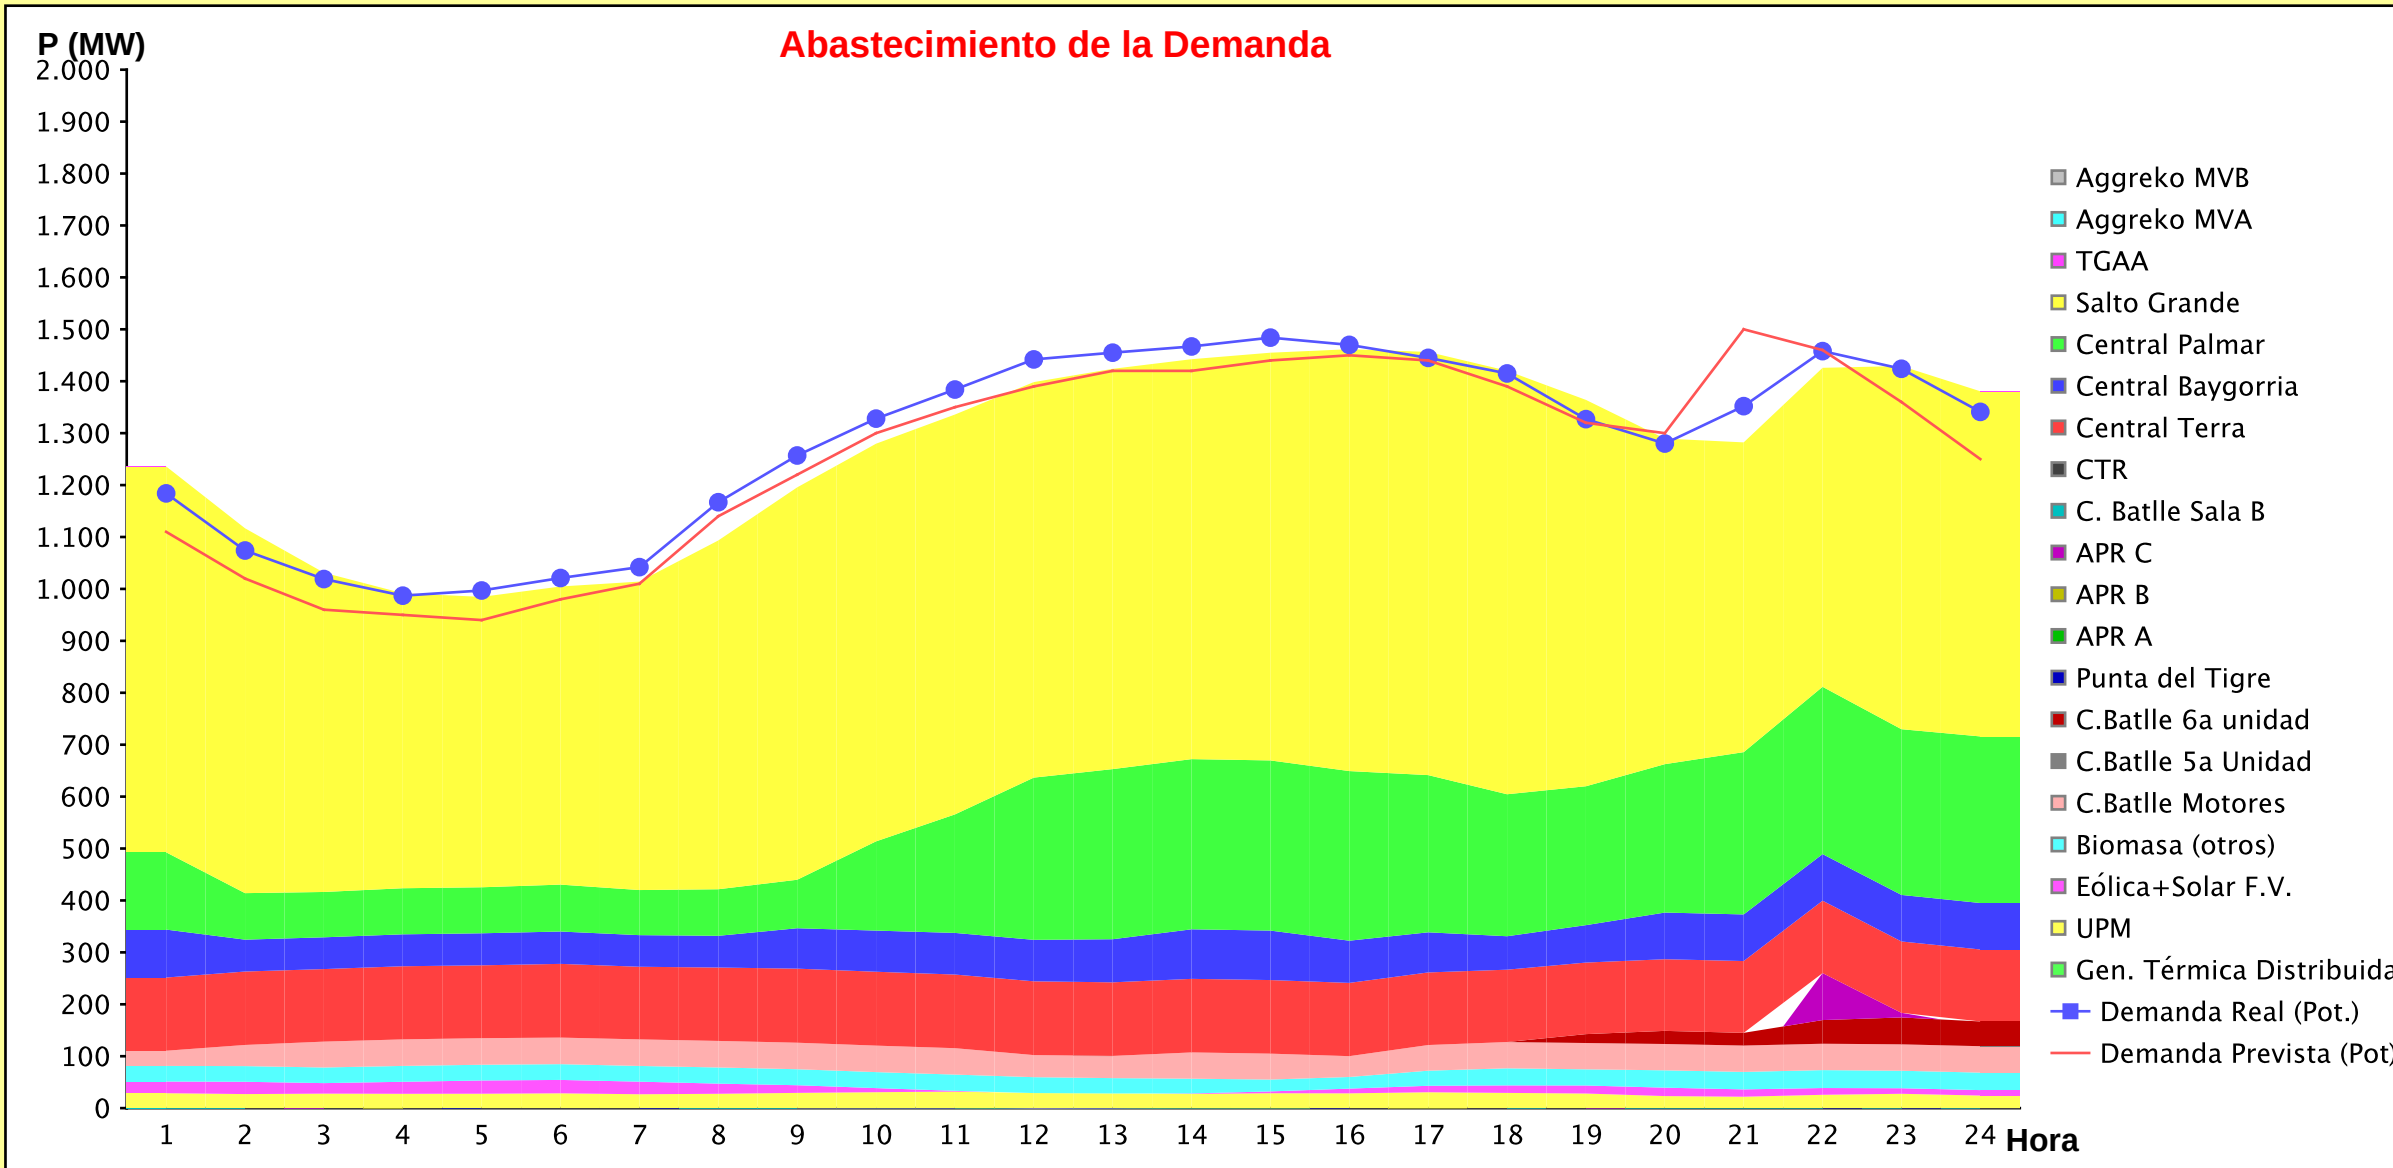



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1496,94 Hora 14:56
Potencia mínima:	969,22 Hora 04:08
Pico noche:	1465,15 Hora 21:42

Generación Media (MW)	
Eólica	14,0
Biomasa	64,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

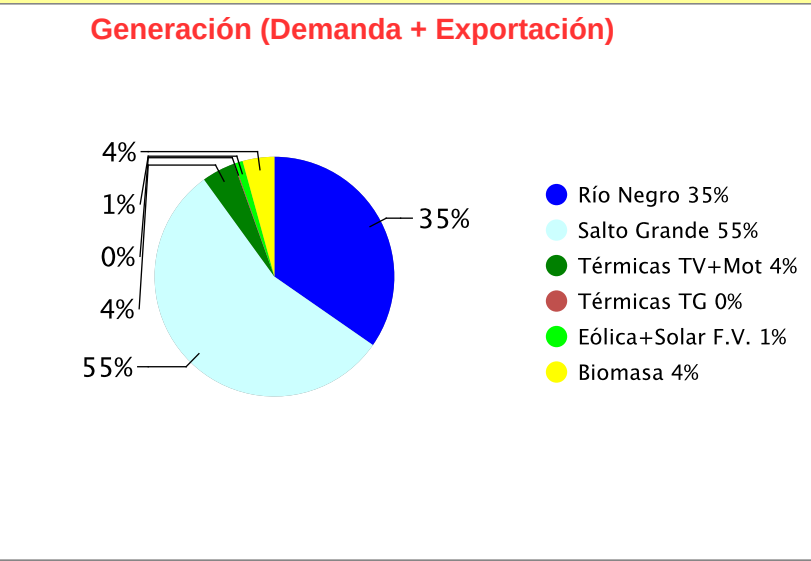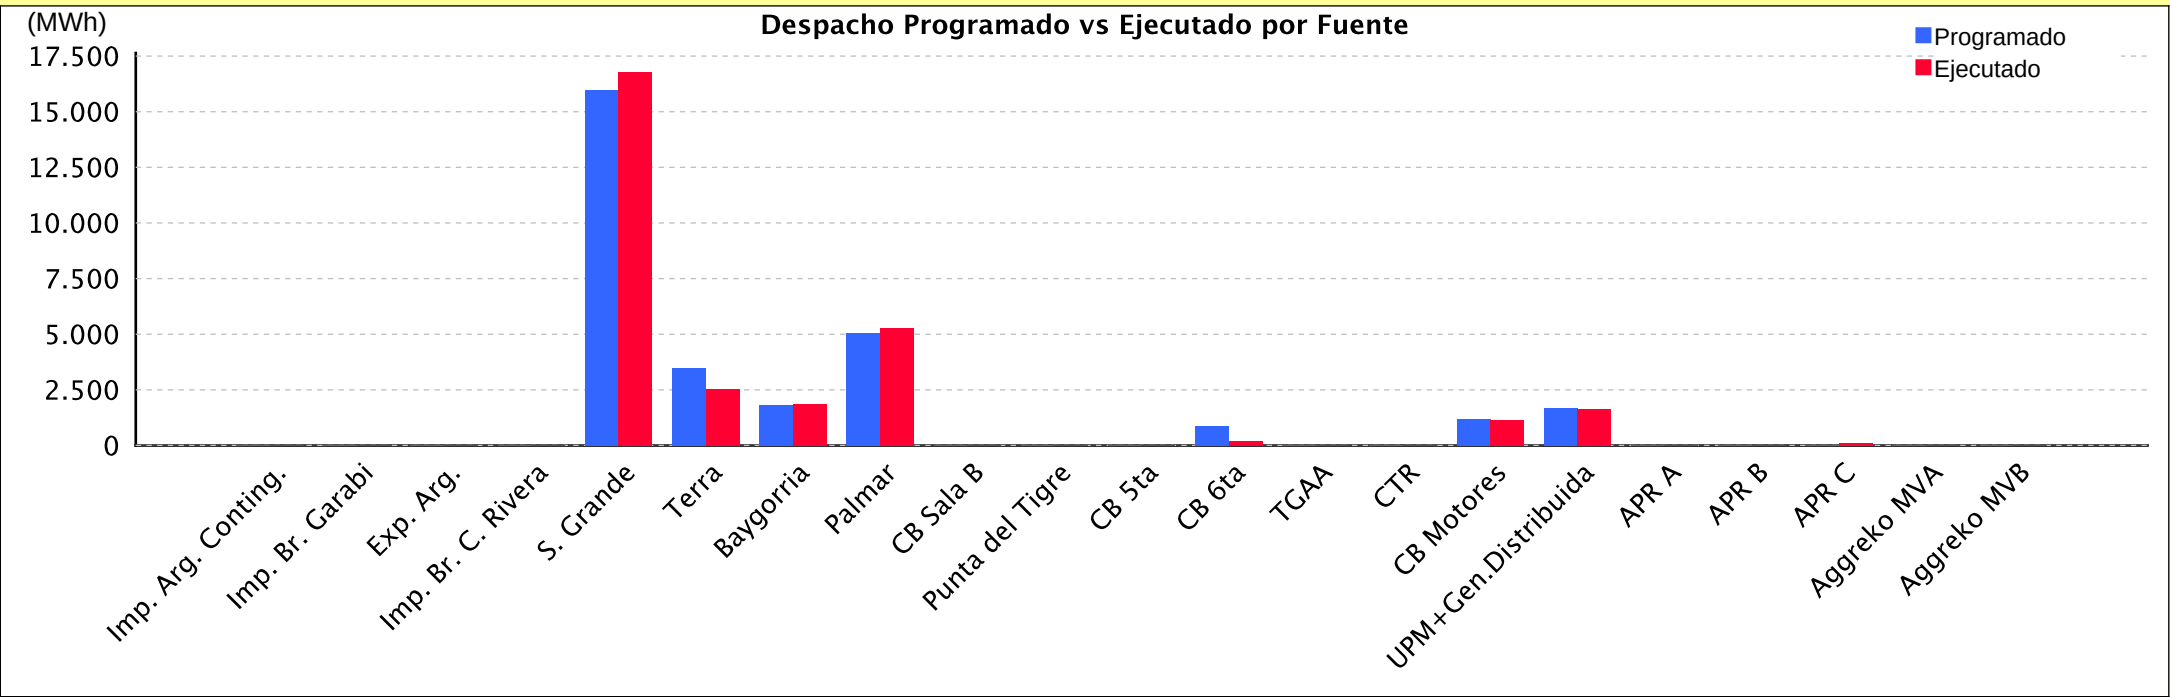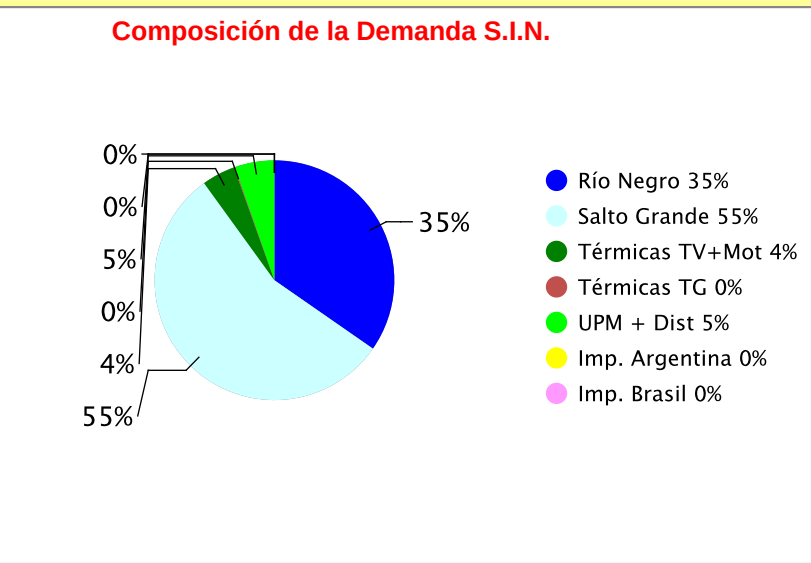



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

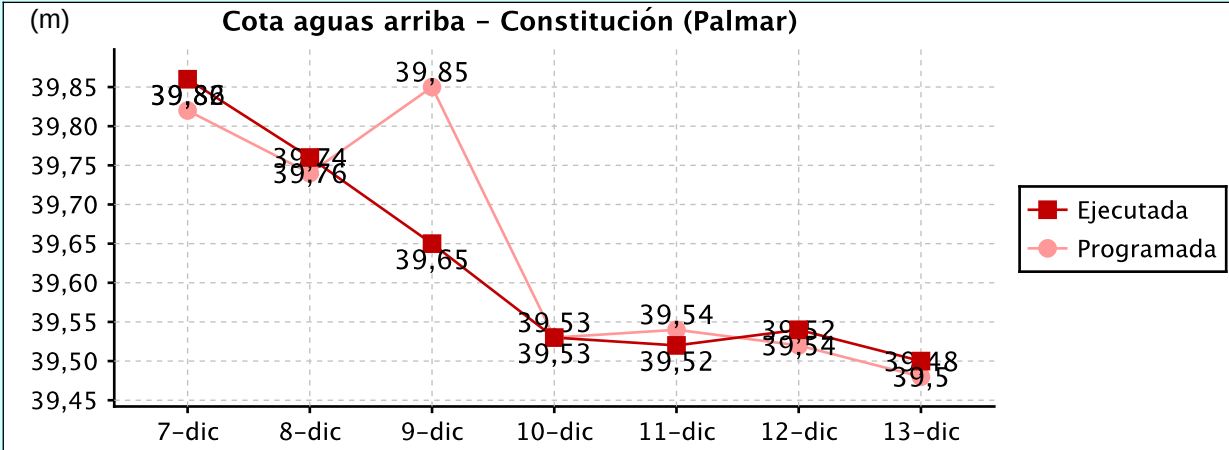
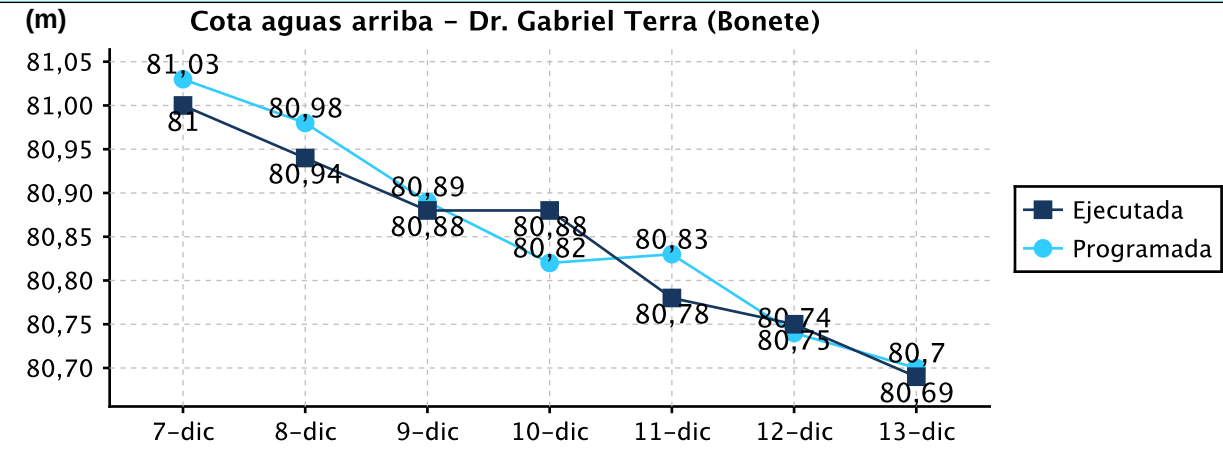


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,70	80,69
Baygorria	53,88	53,87
Palmar	39,48	39,5
SGU	35,41	35,43

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

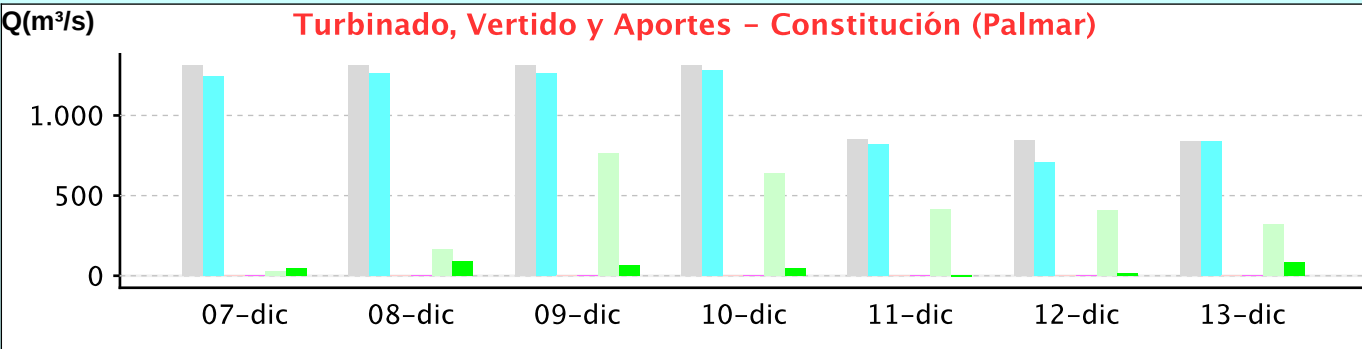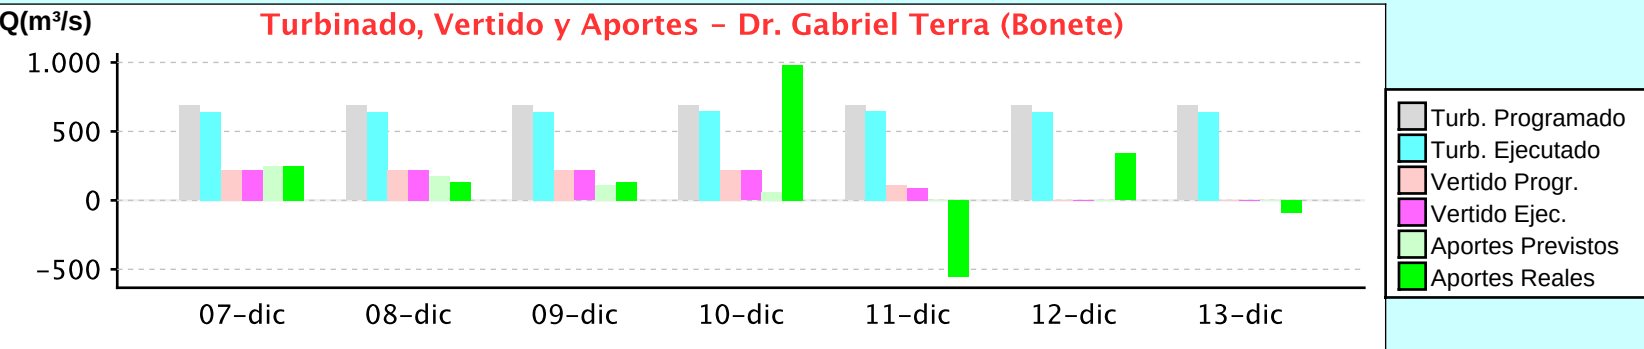

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

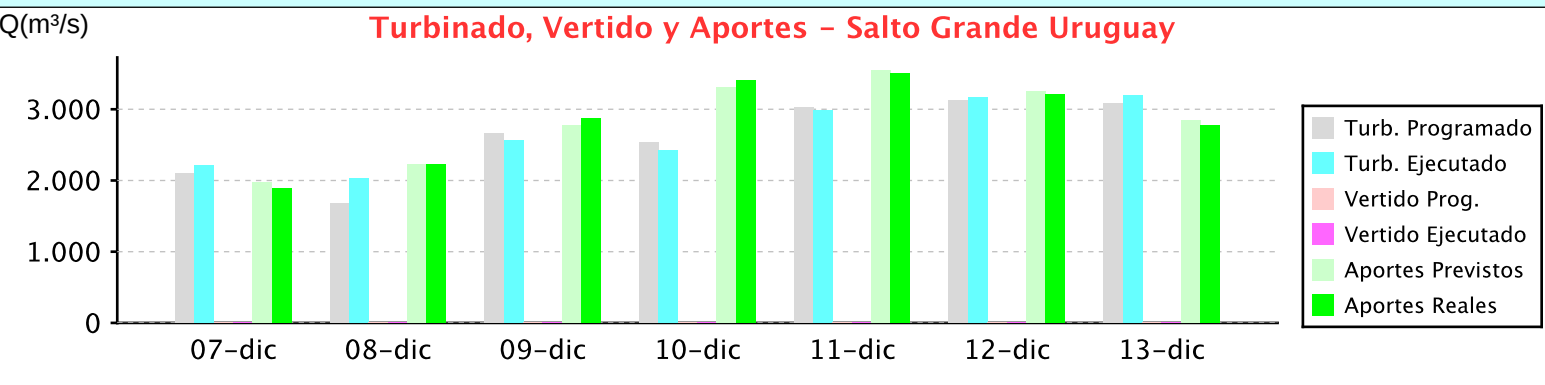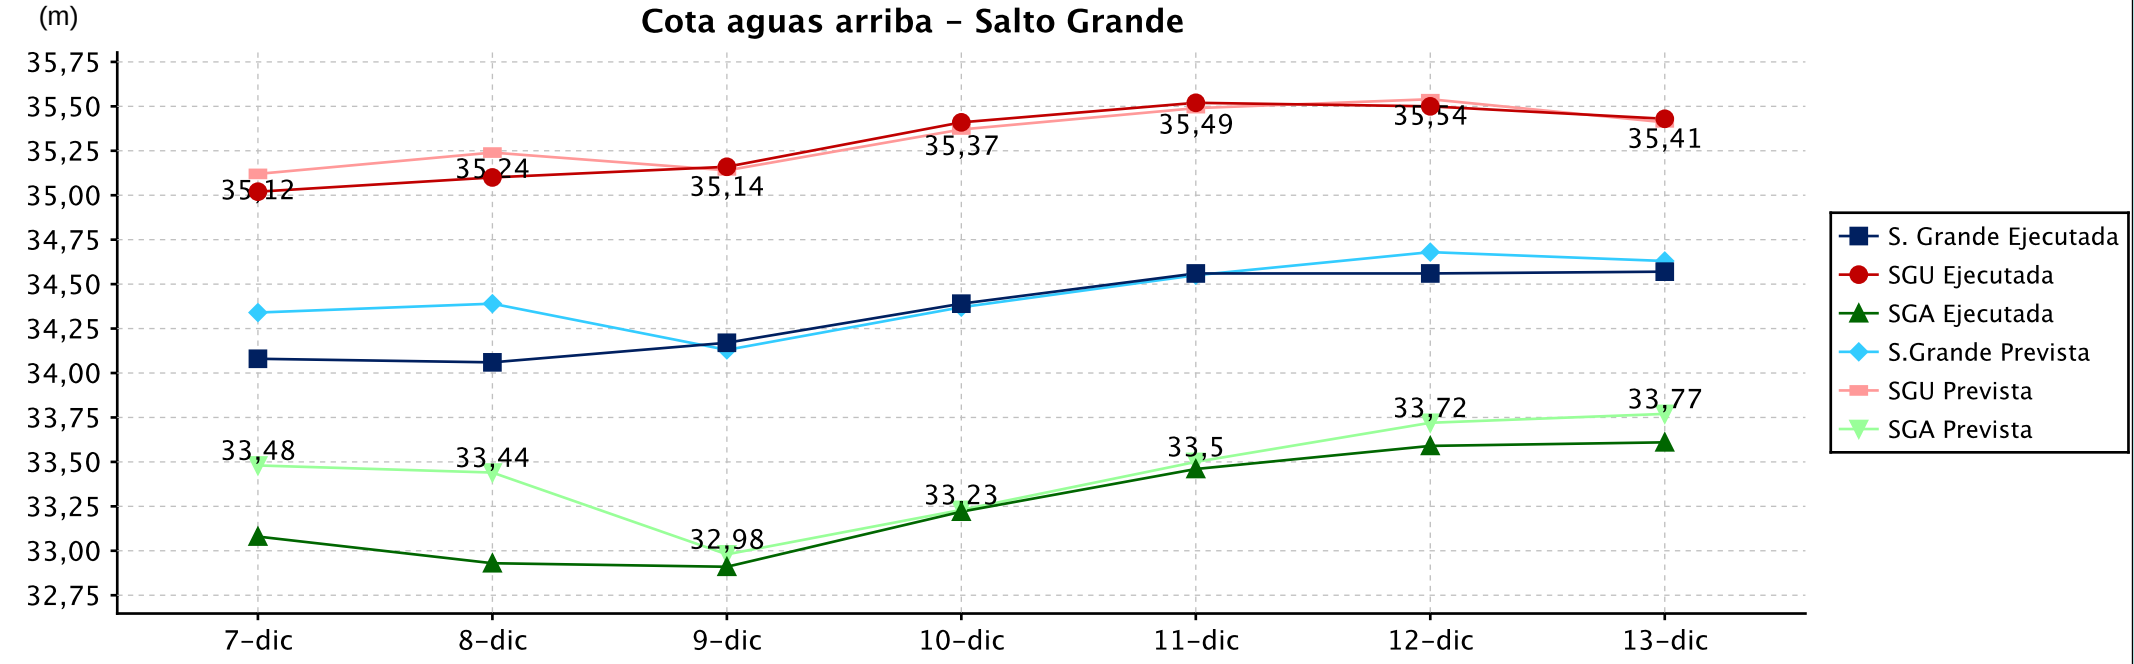

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,43
Cota Vista Arg	33,61
Cota real	34,57
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	40.488

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	687	639
Baygorria	696	642
Palmar	840	840
SGU	3.085	3.188

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-89
Baygorria	0	17
Palmar	322	84
SGU	2.850	2.778

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se generaron 97 MWh por concepto de pruebas en APR C.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

17/12/2013 14:46
