




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 21 de diciembre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	5.076
Sala B	-4
5ta.	1.524
6ta.	2.337
Motores	1.218
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	5.859
APR A	108
APR B	142
APR C	137
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.381
C. Baygorria	1.927
C. Palmar	6.024
C. Salto Grande	5.925
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.892
TOTAL Generación	30.427

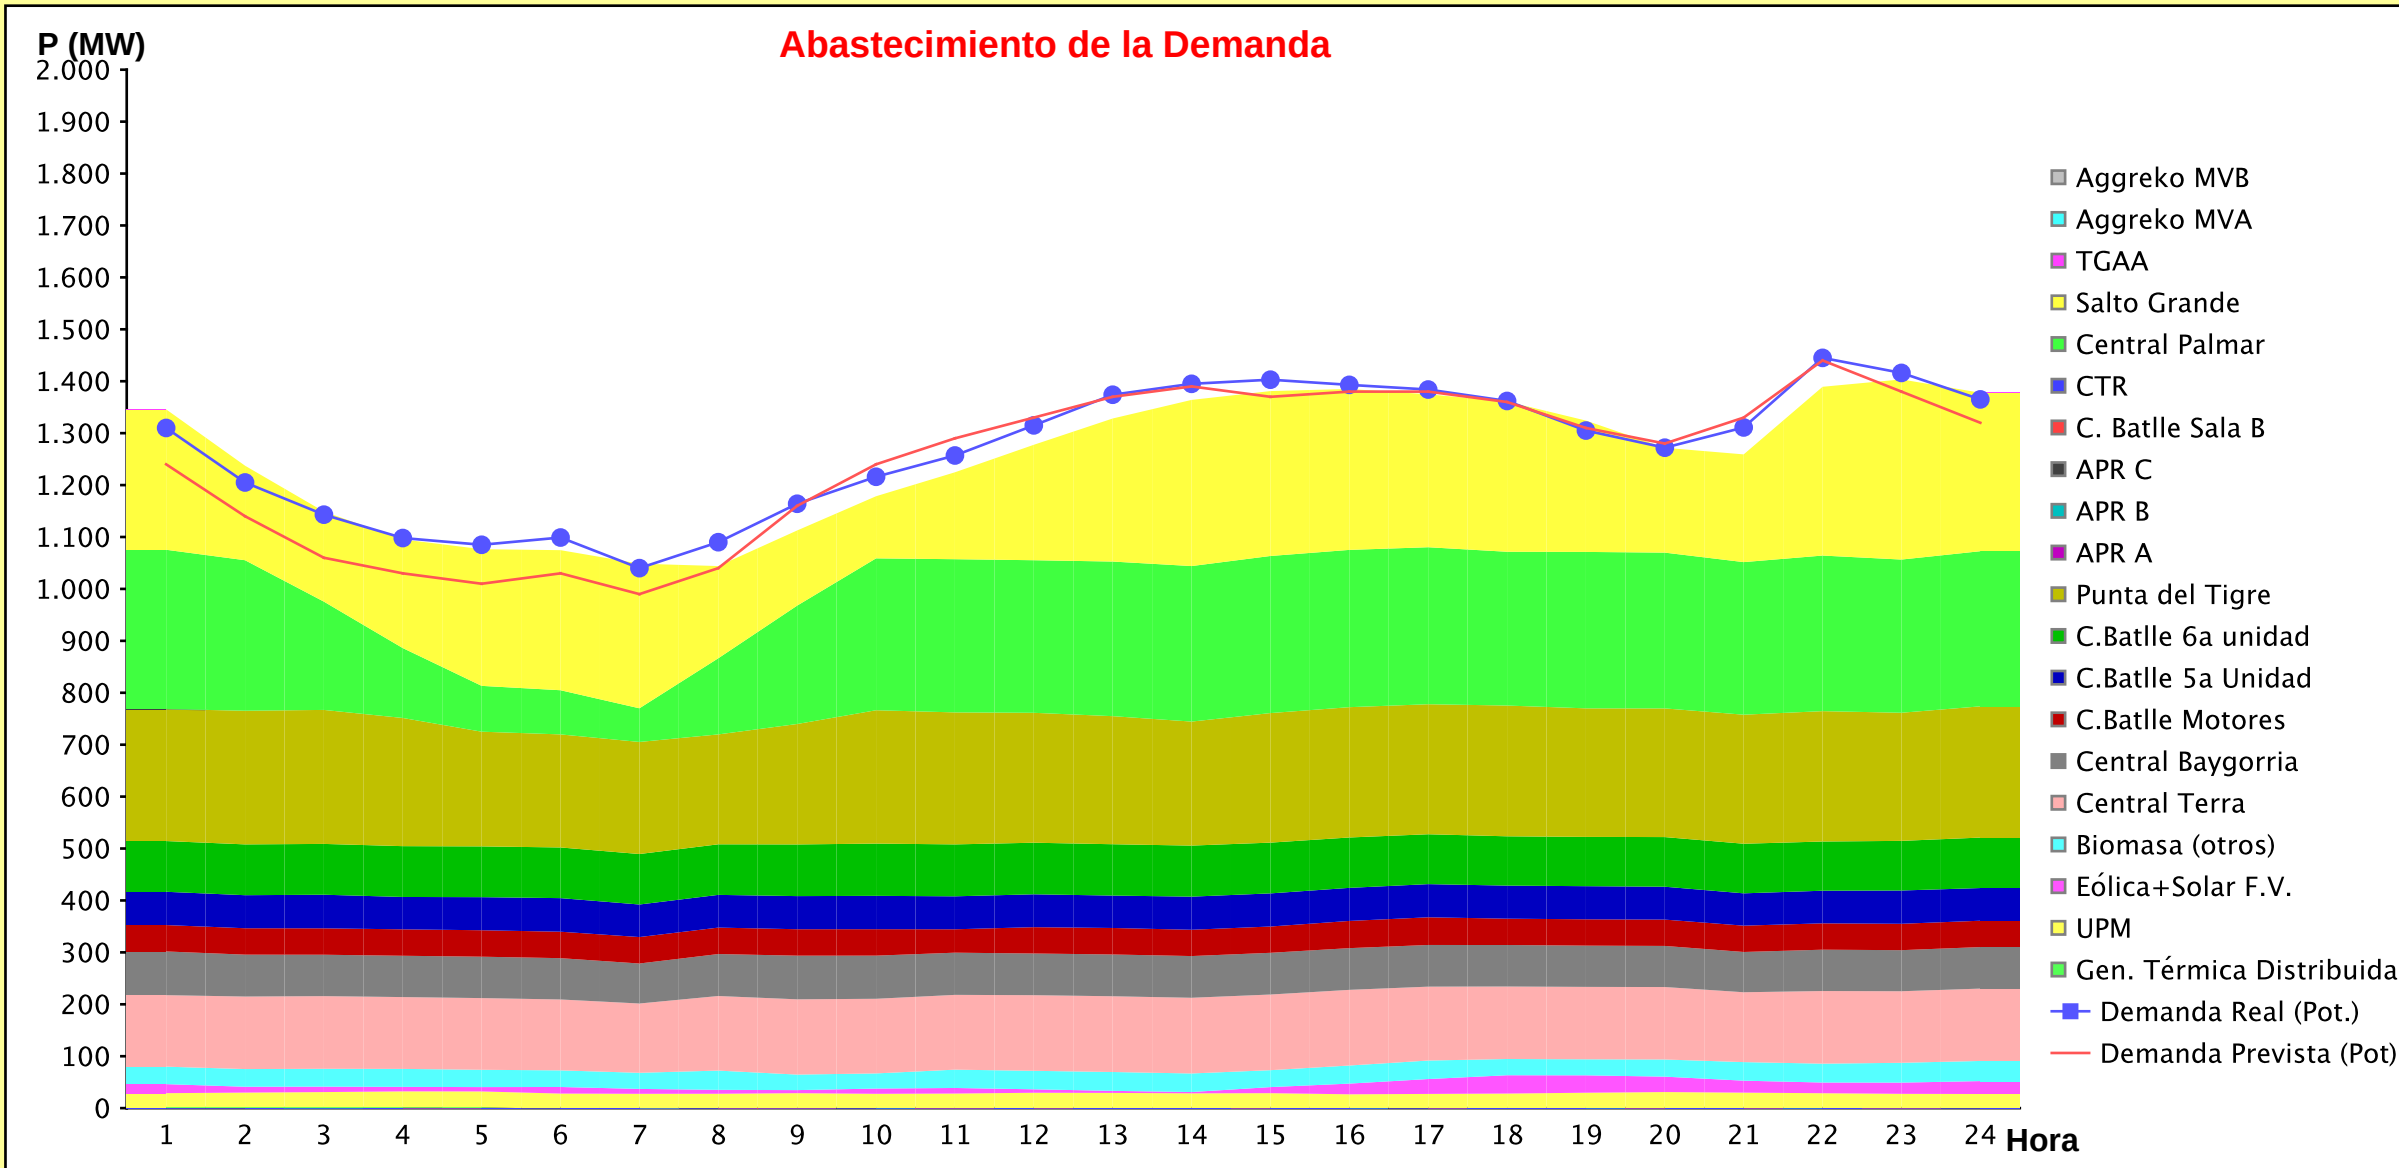

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	394
Hidráulica	0
Térmica	394
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	394




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.033
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.870
Diferencia (MWh)	163
Ejecutada - Programada	0,54 %

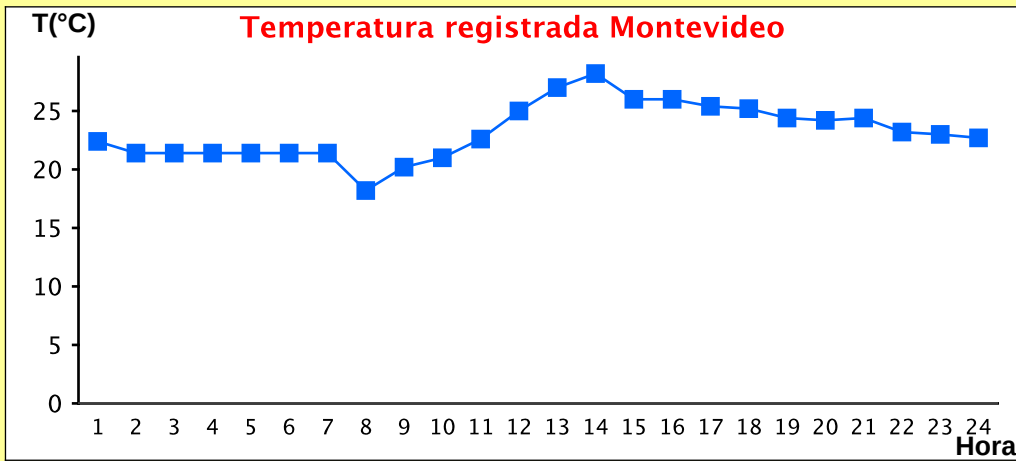



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1409,67 Hora 14:32
Potencia mínima:	1027,03 Hora 06:58
Pico noche:	1456,31 Hora 21:50

Generación Media (MW)	
Eólica	15,8
Biomasa	67,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,4
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

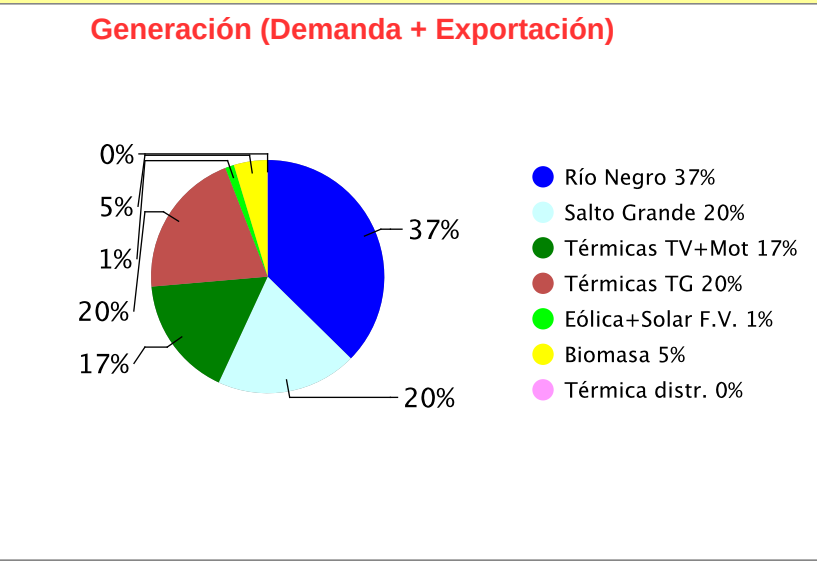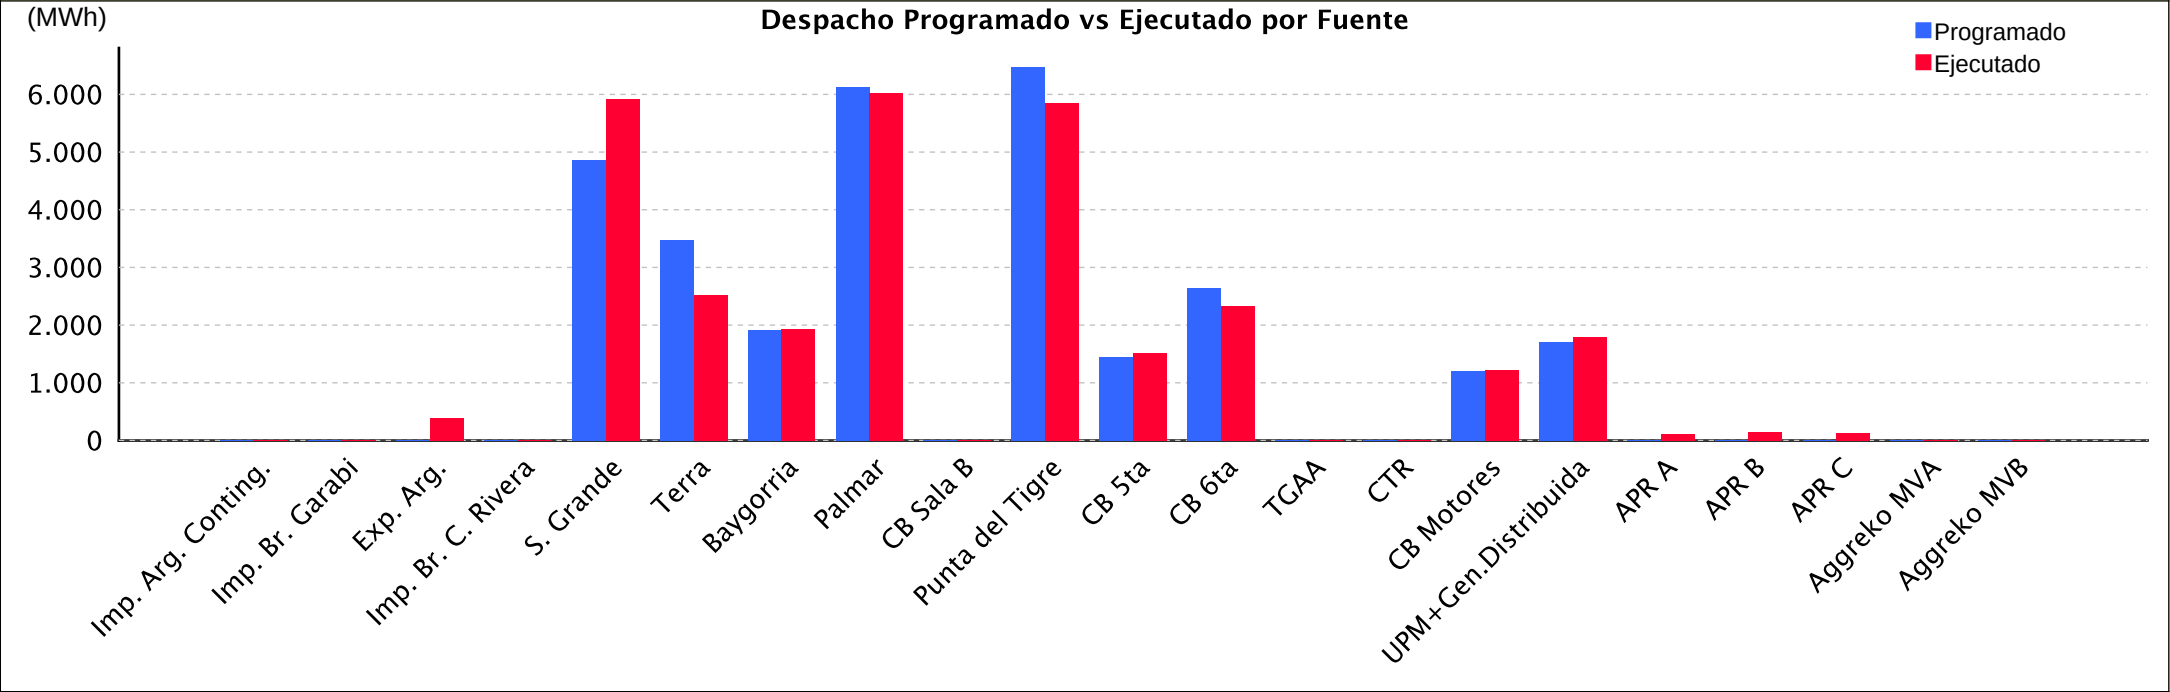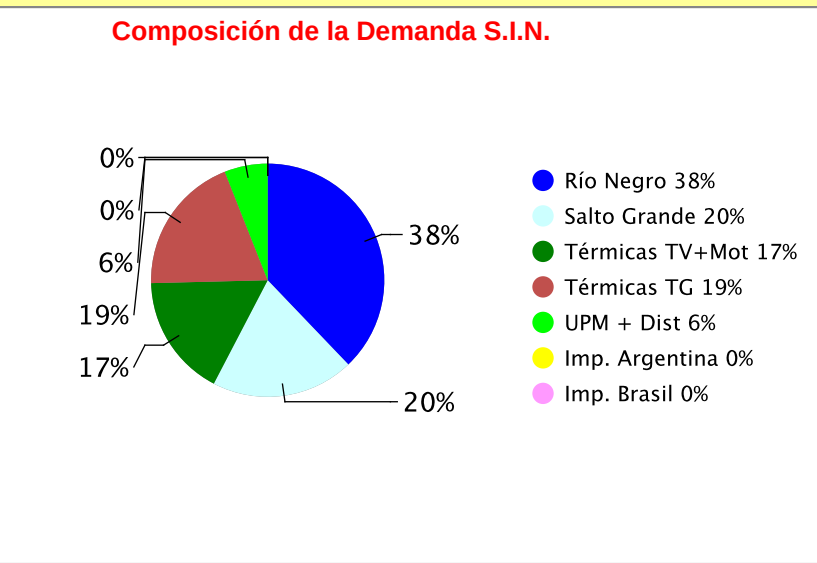



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

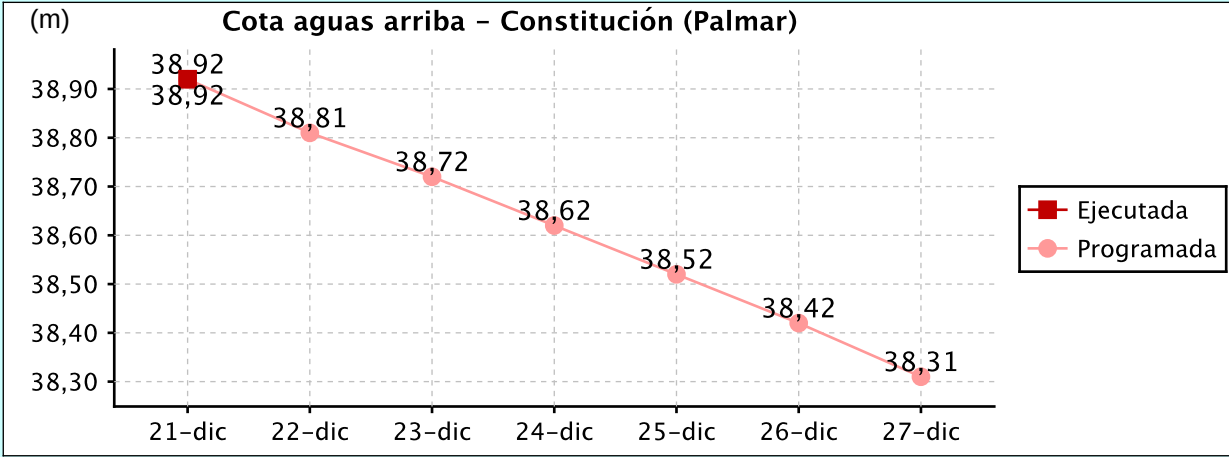
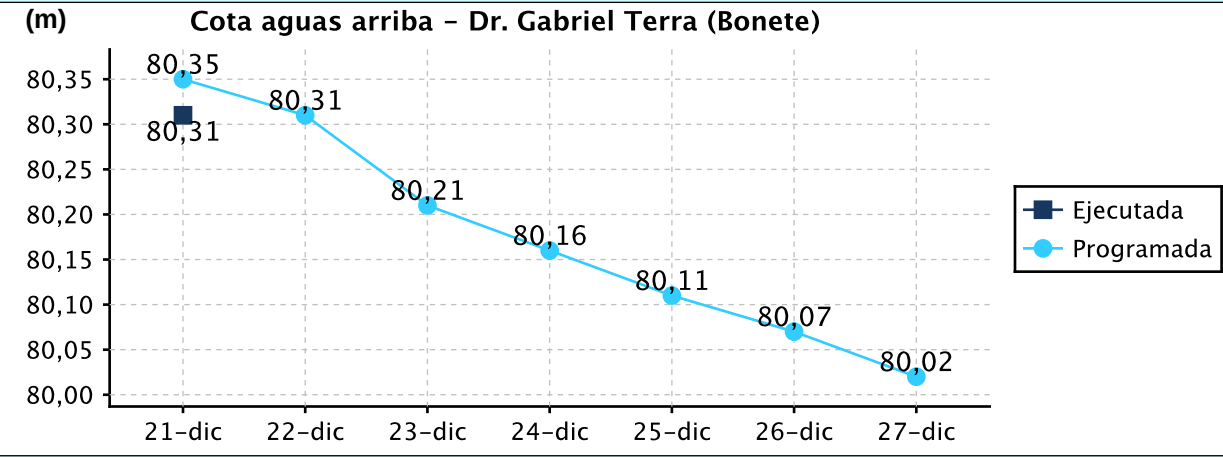


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,35	80,31
Baygorria	53,82	53,8
Palmar	38,92	38,92
SGU	34,71	34,78

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

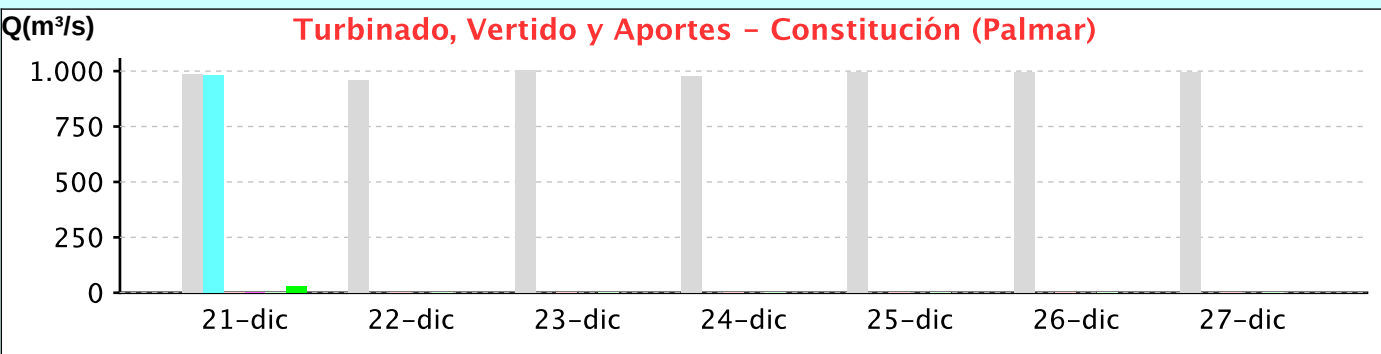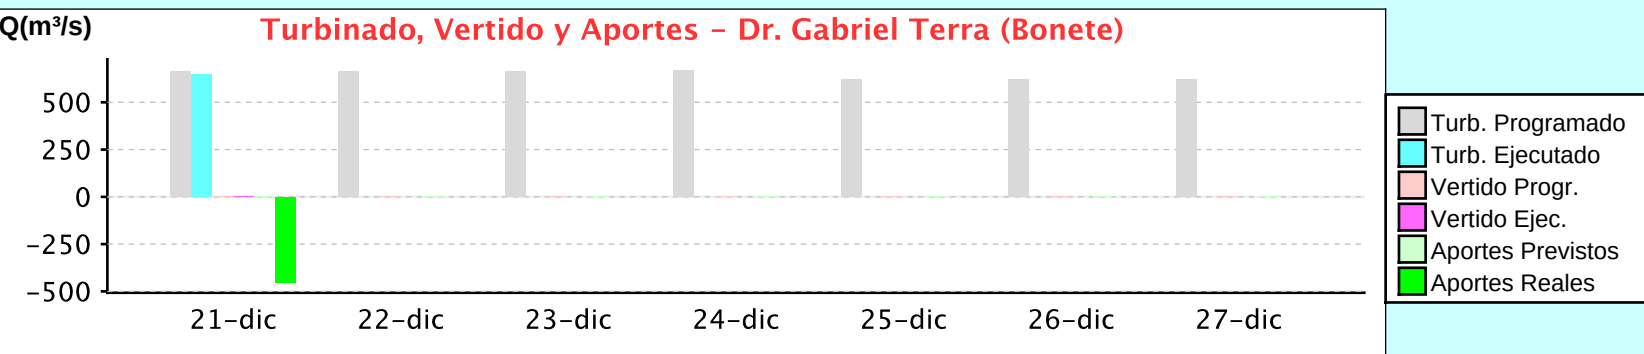

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

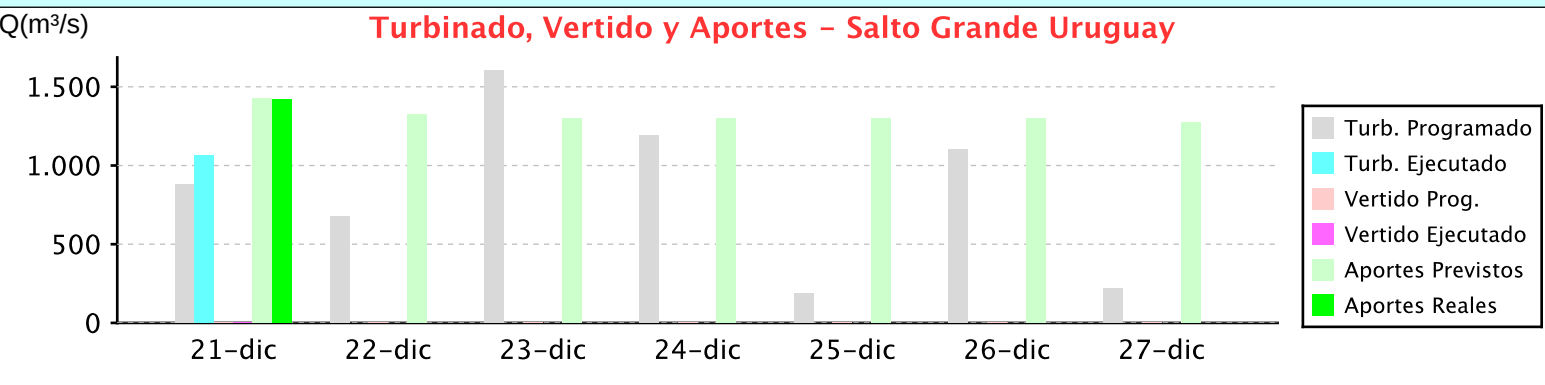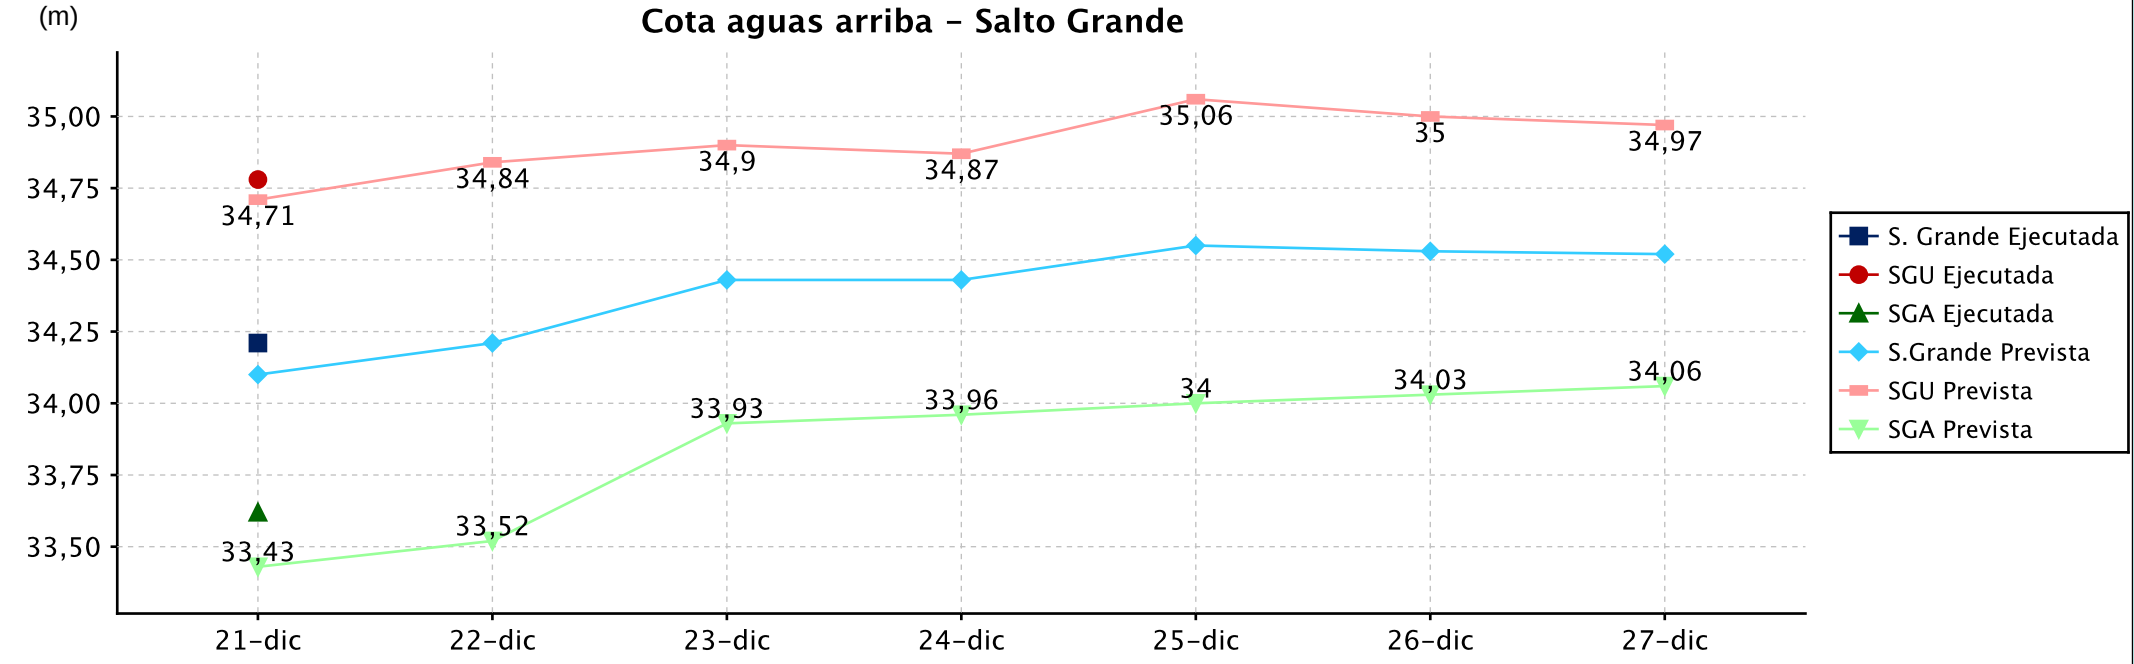

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,78
Cota Vista Arg	33,62
Cota real	34,21
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
24.920	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	665	650
Baygorria	652	652
Palmar	985	980
SGU	877	1.064

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-451
Baygorria	0	15
Palmar	0	28
SGU	1.425	1.422

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
