



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 31 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	4.747
Sala B	-4
5ta.	1.531
6ta.	2.021
Motores	1.199
Central La Tablada	100
Central P. del Tigre	5.963
APR A	1.890
APR B	2.080
APR C	2.084
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.198
C. Baygorria	1.599
C. Palmar	5.125
C. Salto Grande	2.876
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	890
TOTAL Generación	30.551

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	355
Hidráulica	0
Térmica	355
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	355




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.196
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	33.840
Diferencia (MWh)	-3.644
Ejecutada - Programada	-10,77 %

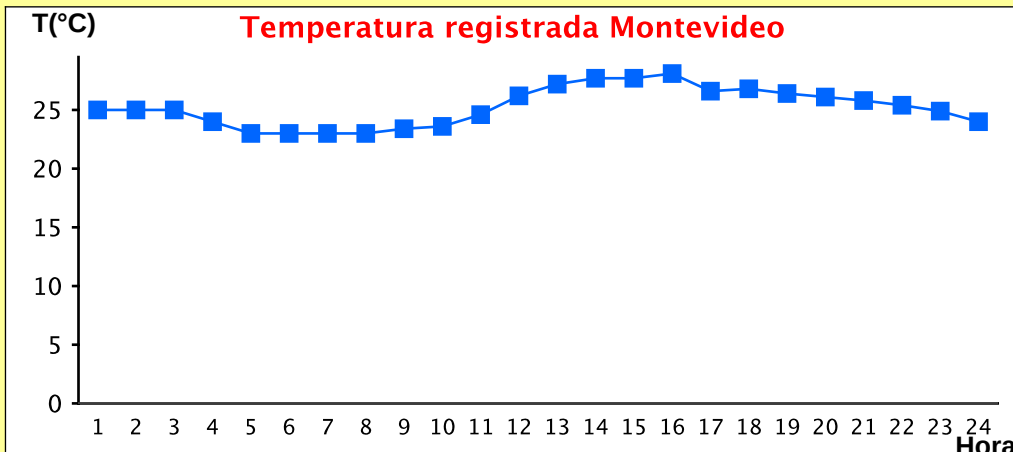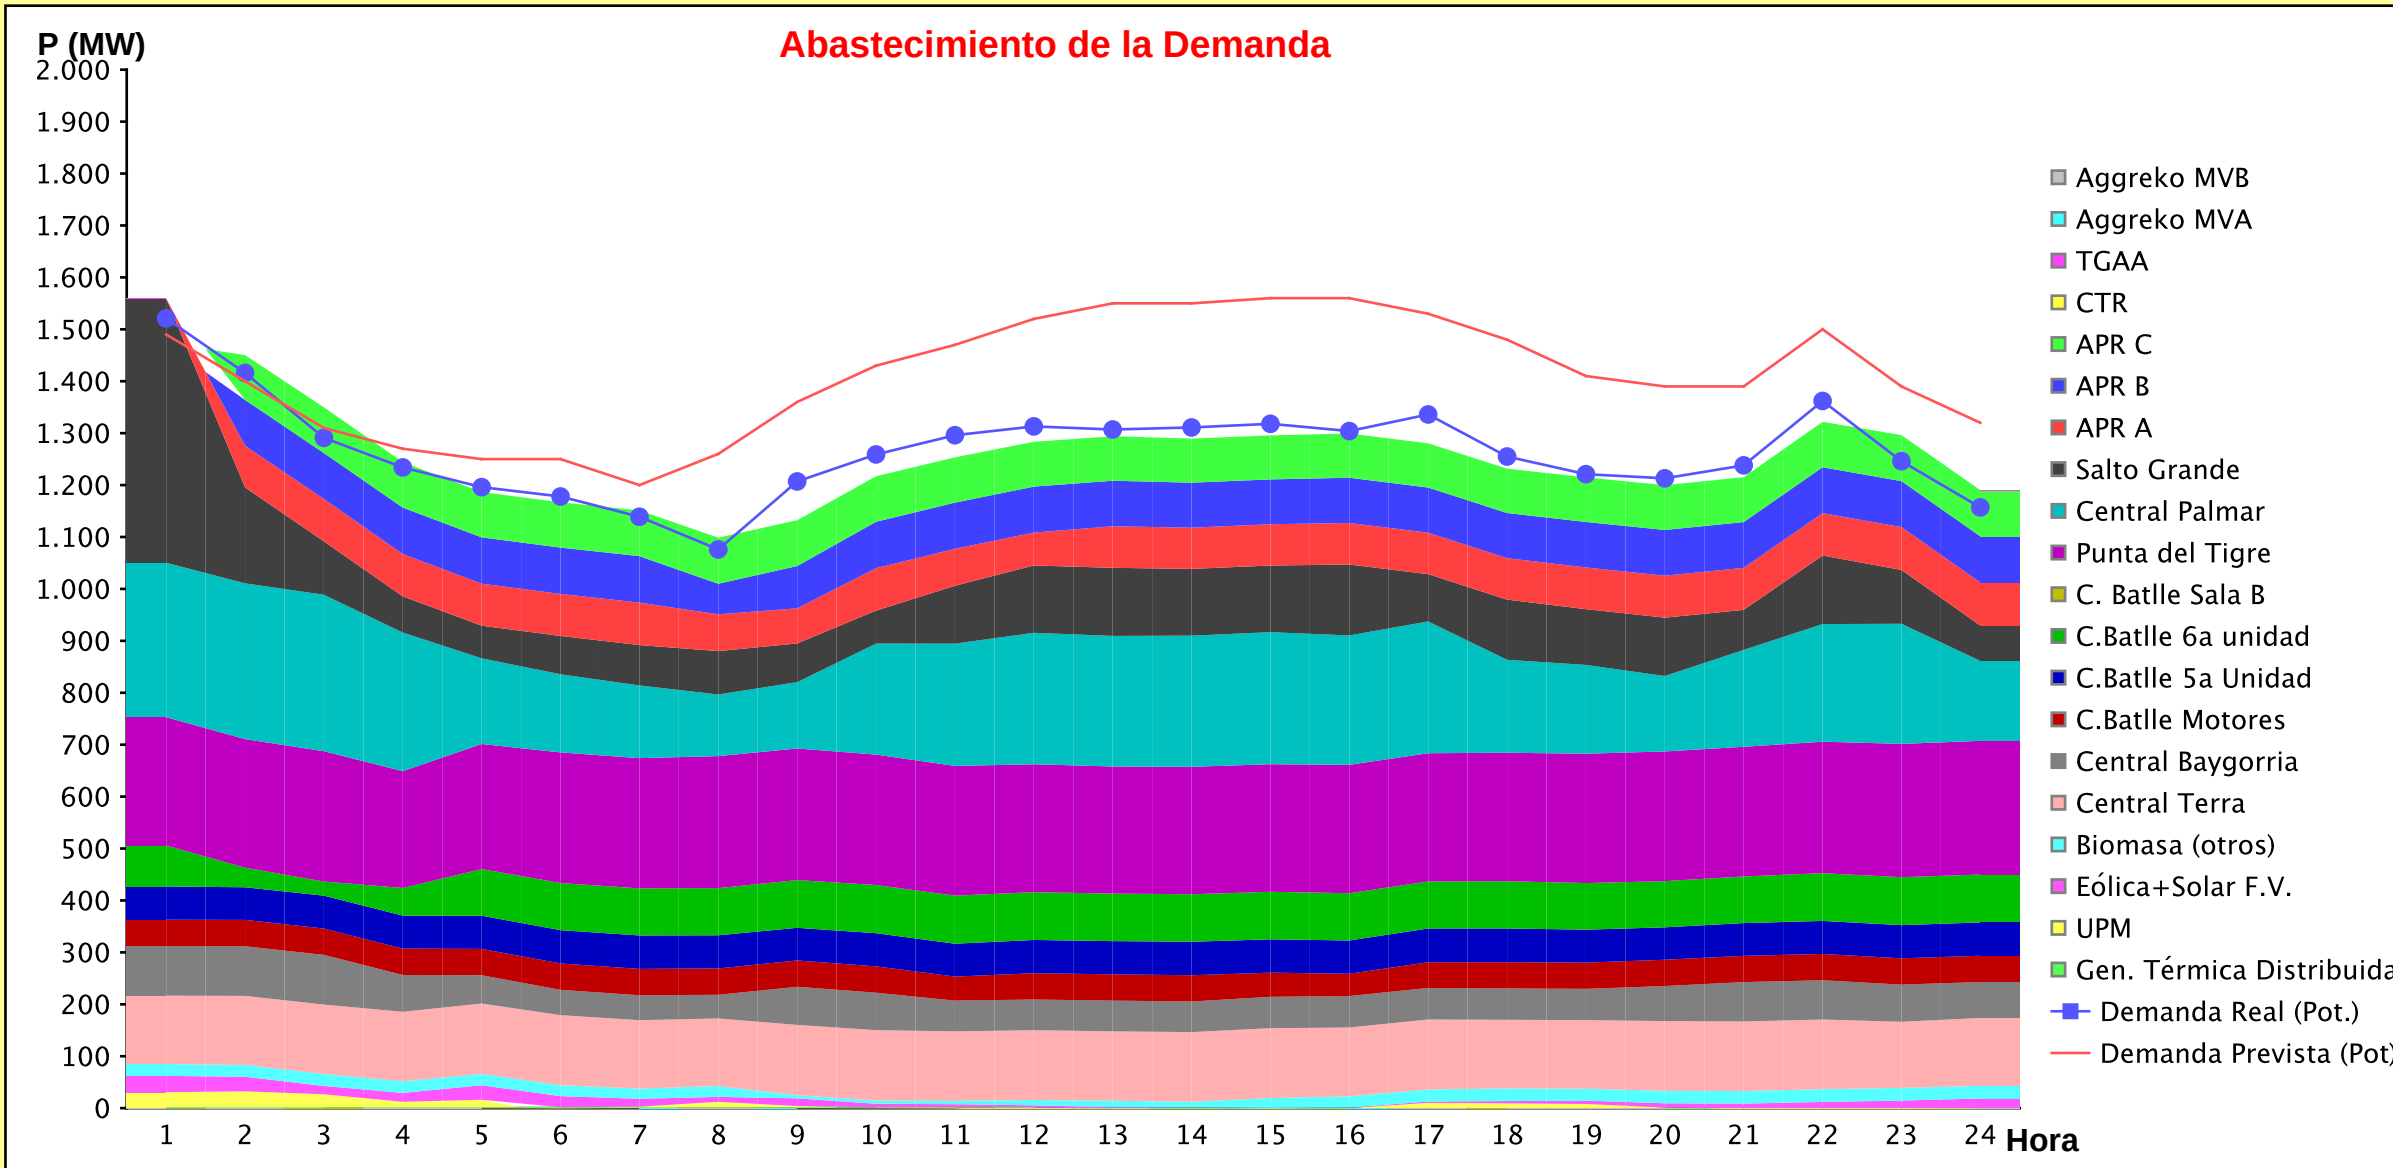



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1328,61 Hora 15:04
Potencia mínima:	1080,91 Hora 08:02
Pico noche:	1384,63 Hora 21:35

Generación Media (MW)	
Eólica	11,8
Biomasa	31,1
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,9
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

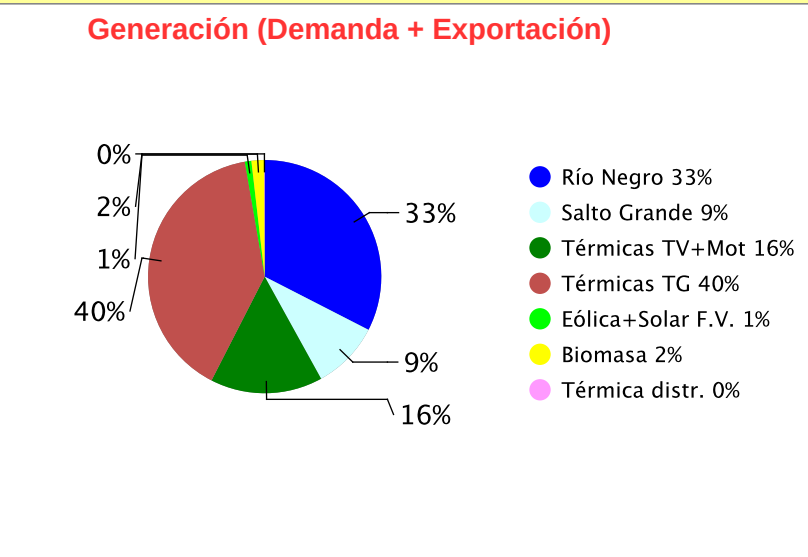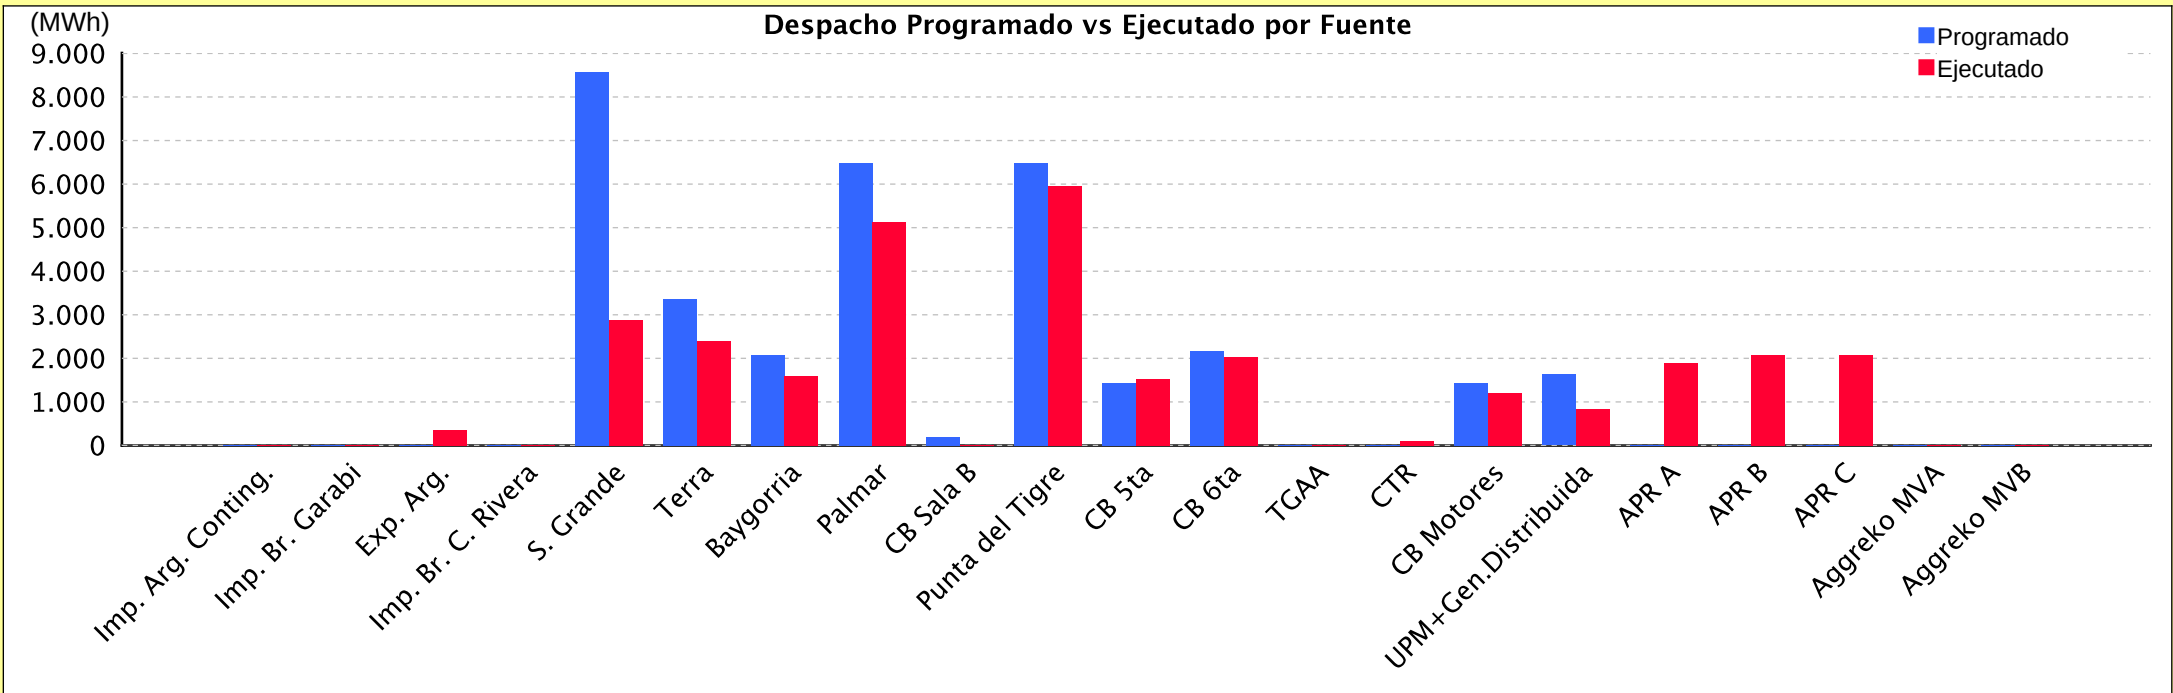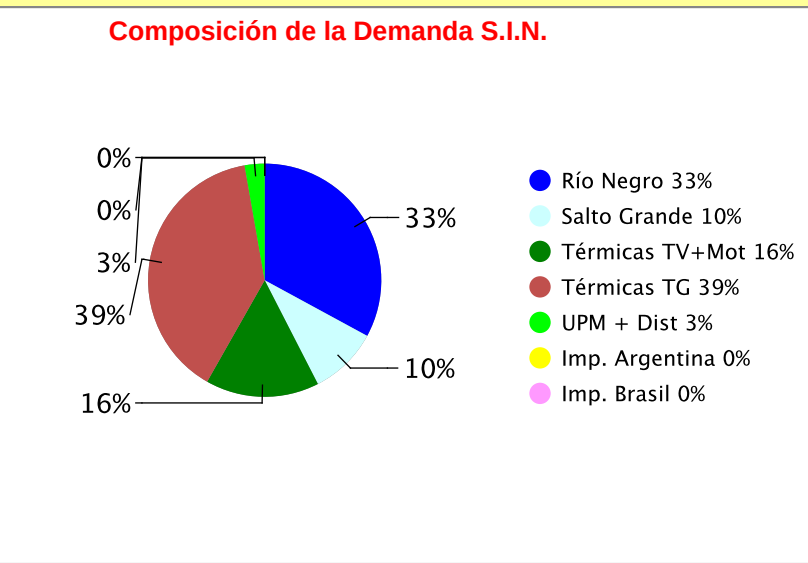



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

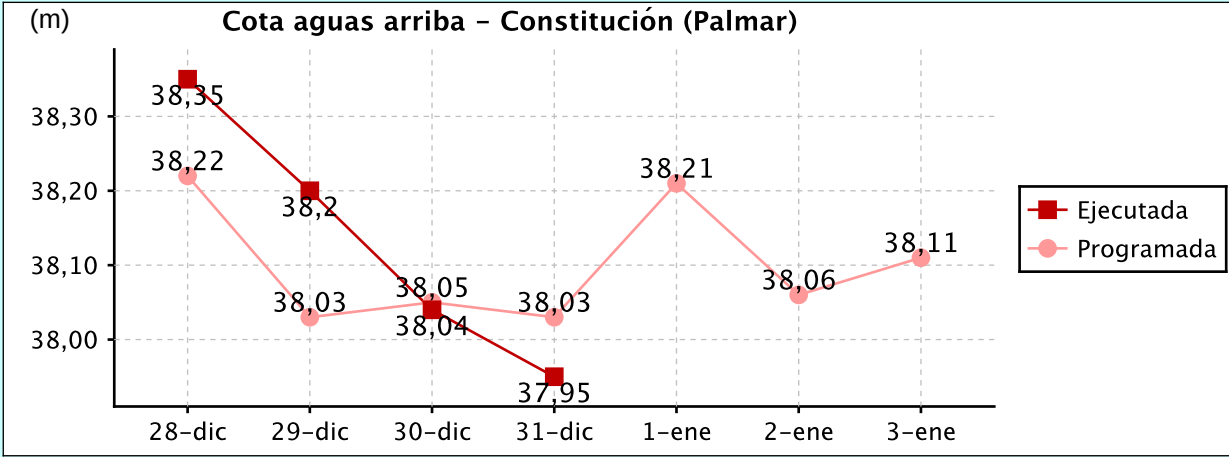
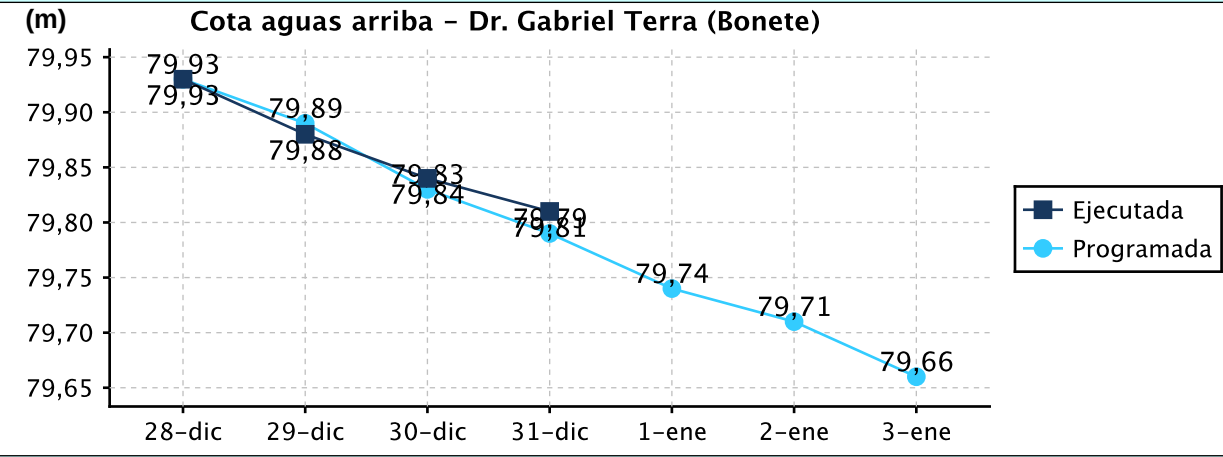


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,79	79,81
Baygorria	53,60	53,73
Palmar	38,03	37,95
SGU	33,41	33,52

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

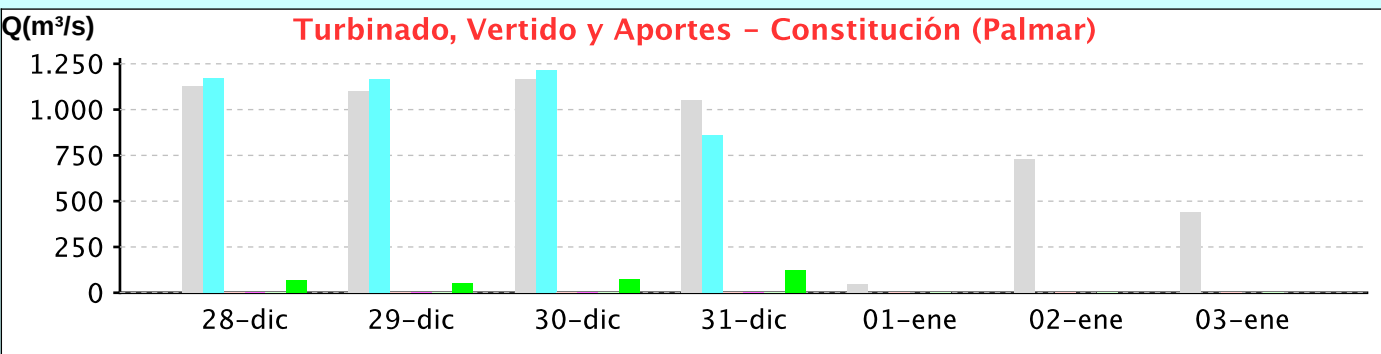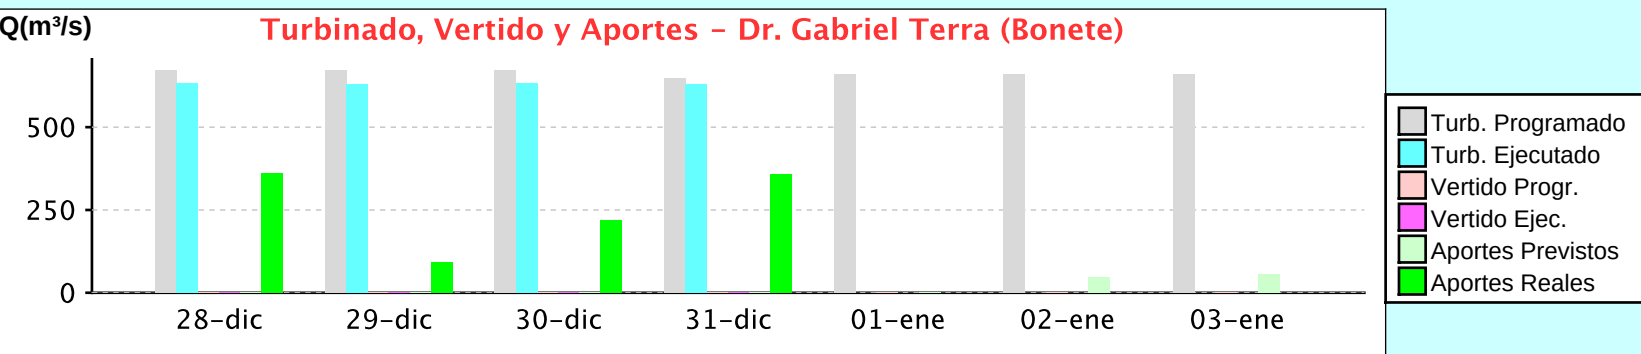

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

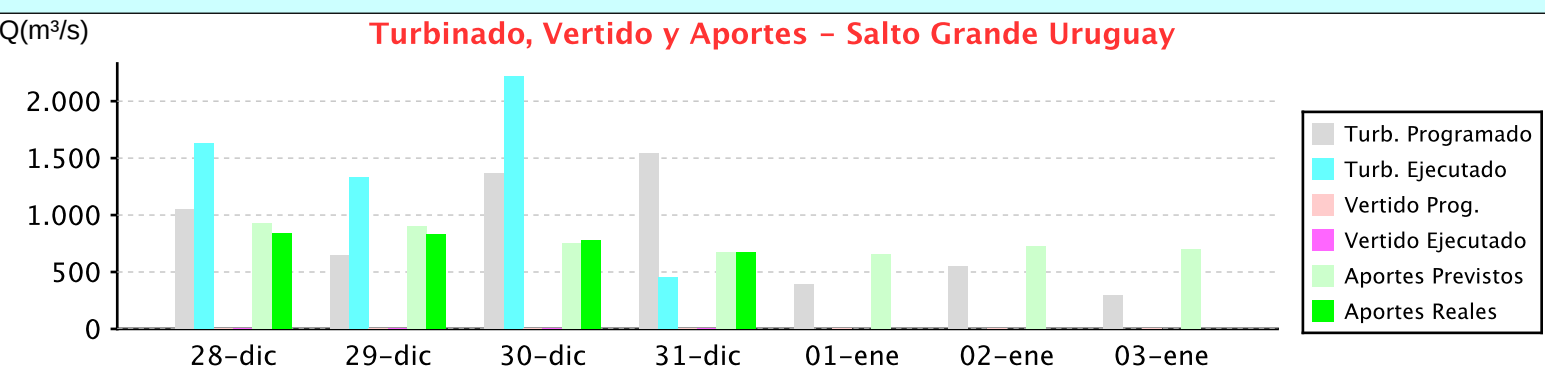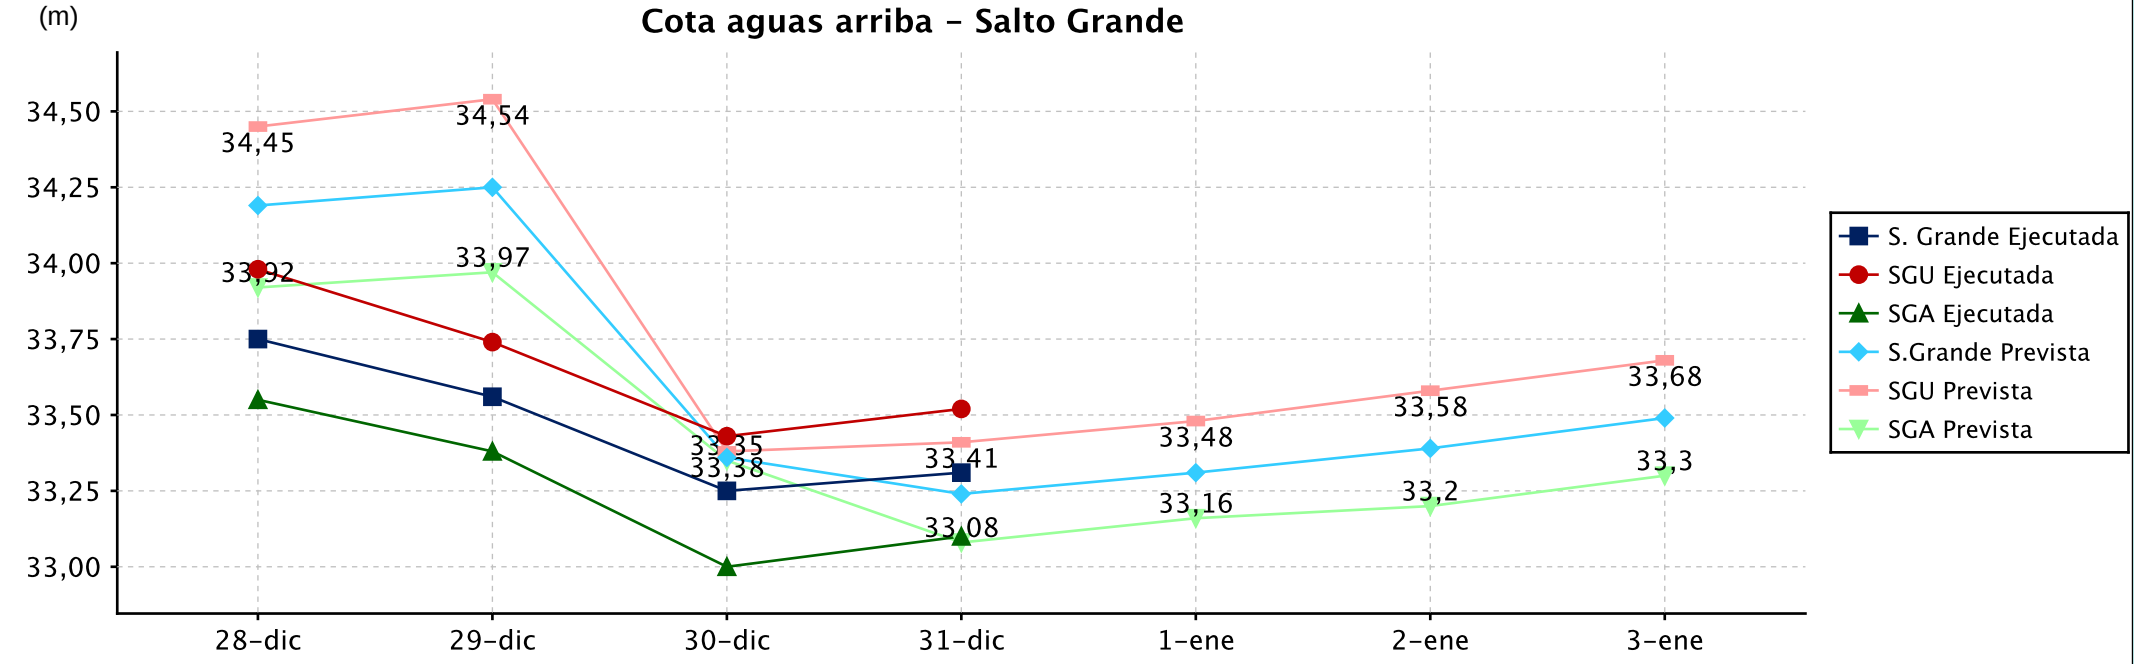

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,52
Cota Vista Arg	33,10
Cota real	33,31

Dif. Energ. (U-A)	7.935
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	648	630
Baygorria	698	508
Palmar	1.053	858
SGU	1.545	449

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	358
Baygorria	0	65
Palmar	0	125
SGU	675	670

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
