



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 01 de enero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	4.940
Sala B	-4
5ta.	1.533
6ta.	2.209
Motores	1.201
Central La Tablada	0
Central P. del Tigre	6.009
APR A	1.919
APR B	1.808
APR C	1.567
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.245
C. Baygorria	1.498
C. Palmar	709
C. Salto Grande	2.958
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.158
TOTAL Generación	25.808

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.808
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.870
Diferencia (MWh)	-1.062
Ejecutada - Programada	-3,95 %

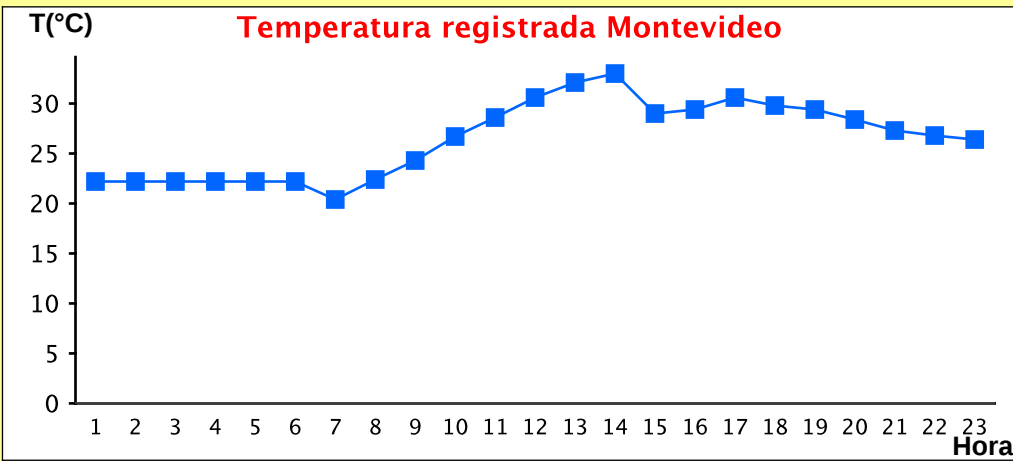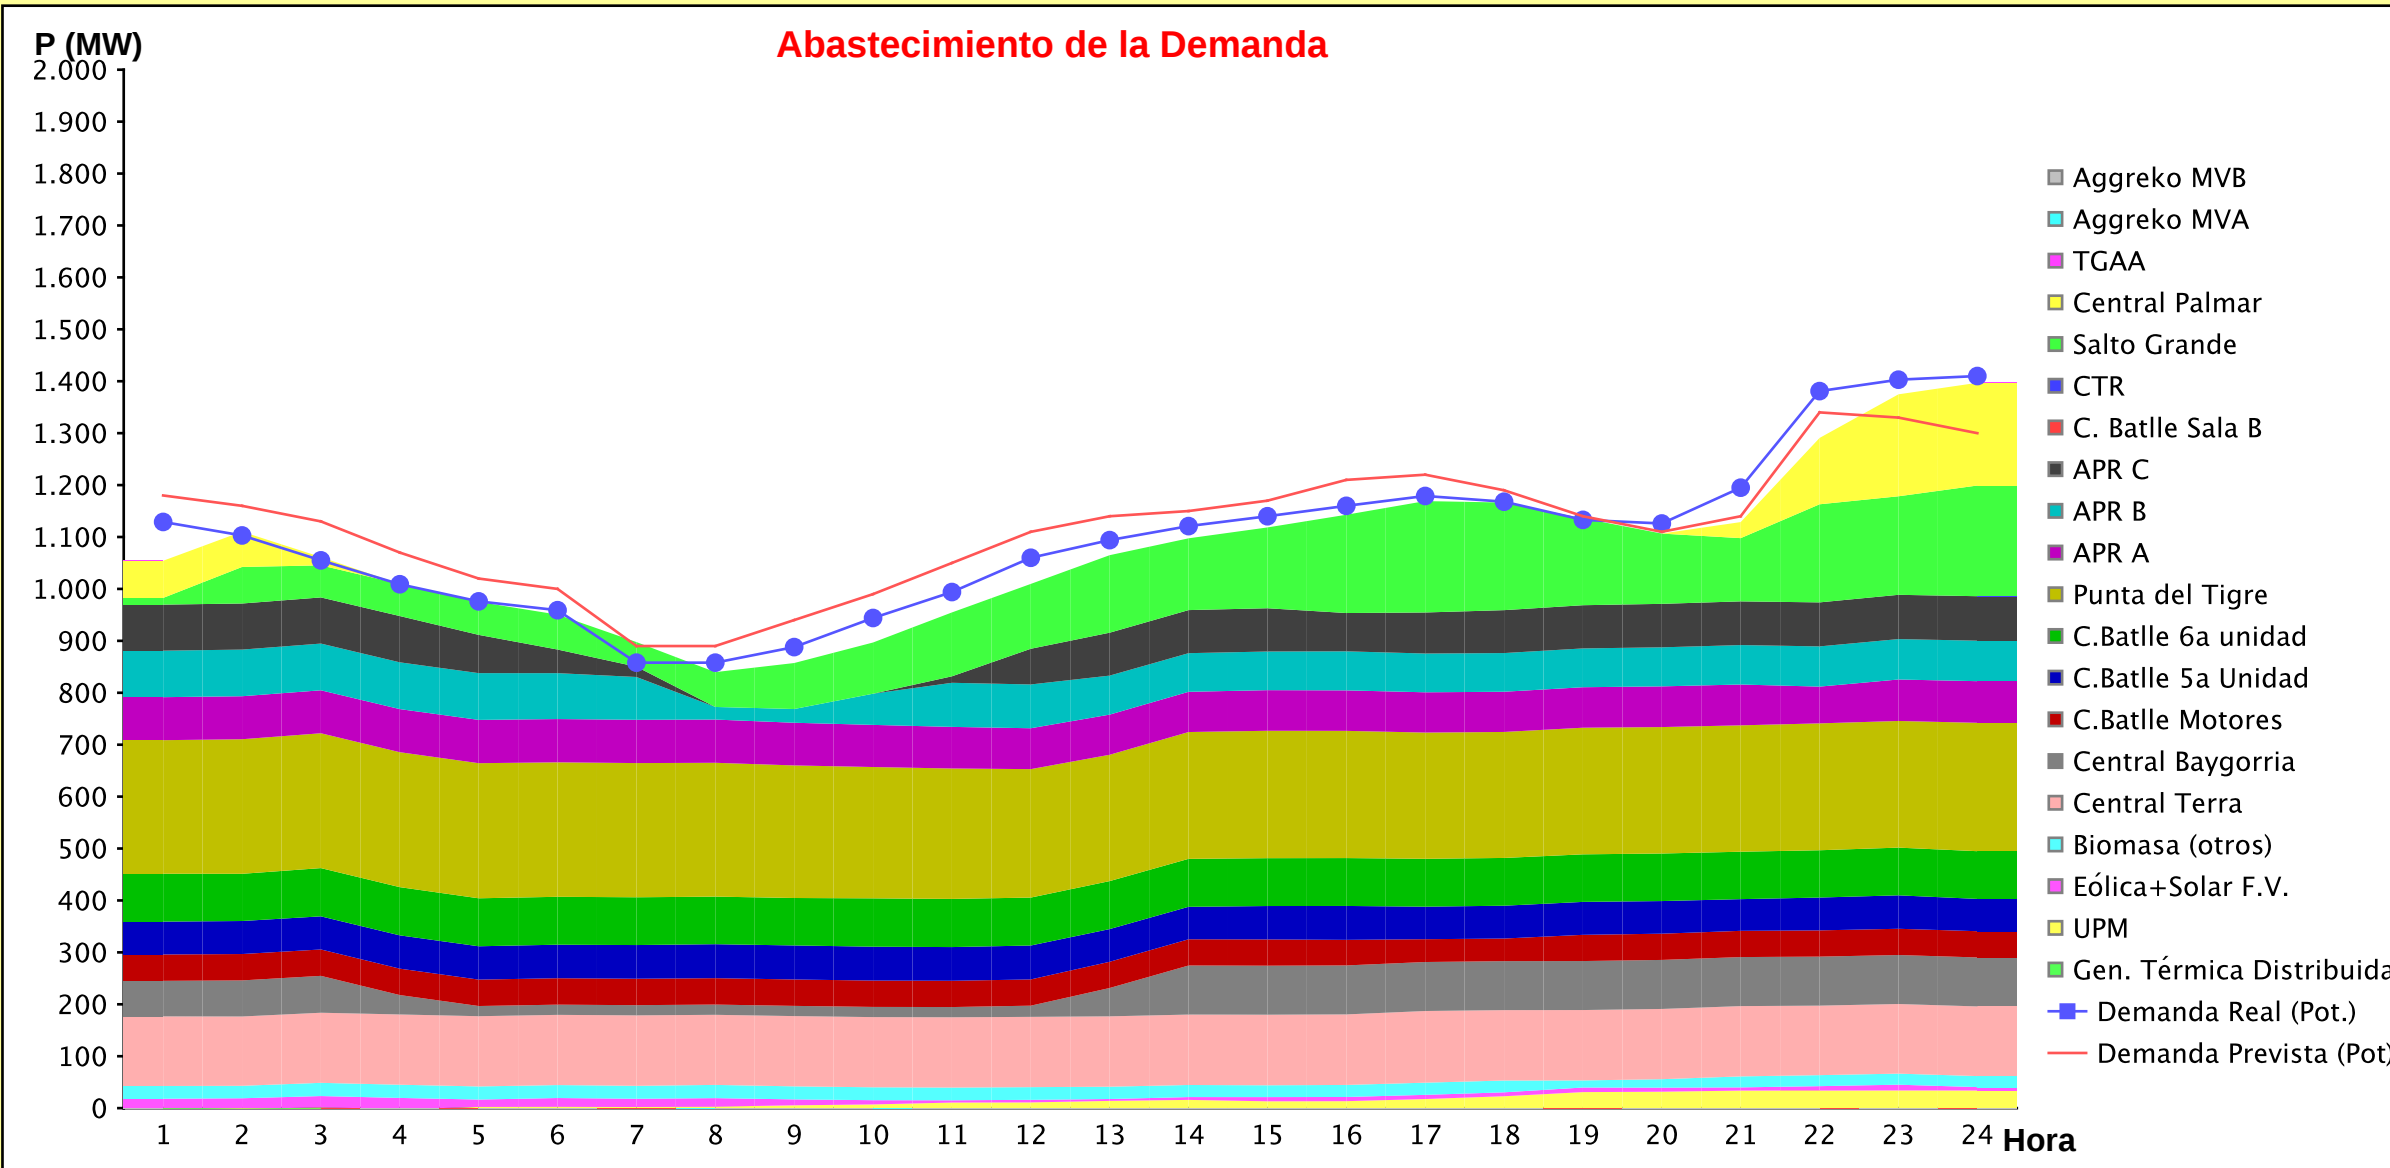



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1188,4 Hora 16:51
Potencia mínima:	847,28 Hora 07:39
Pico noche:	1404,32 Hora 23:00

Generación Media (MW)	
Eólica	11,0
Biomasa	42,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

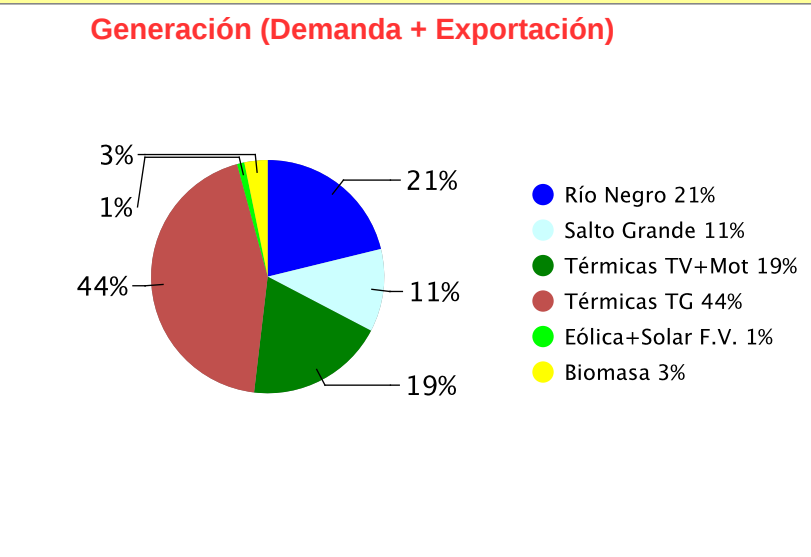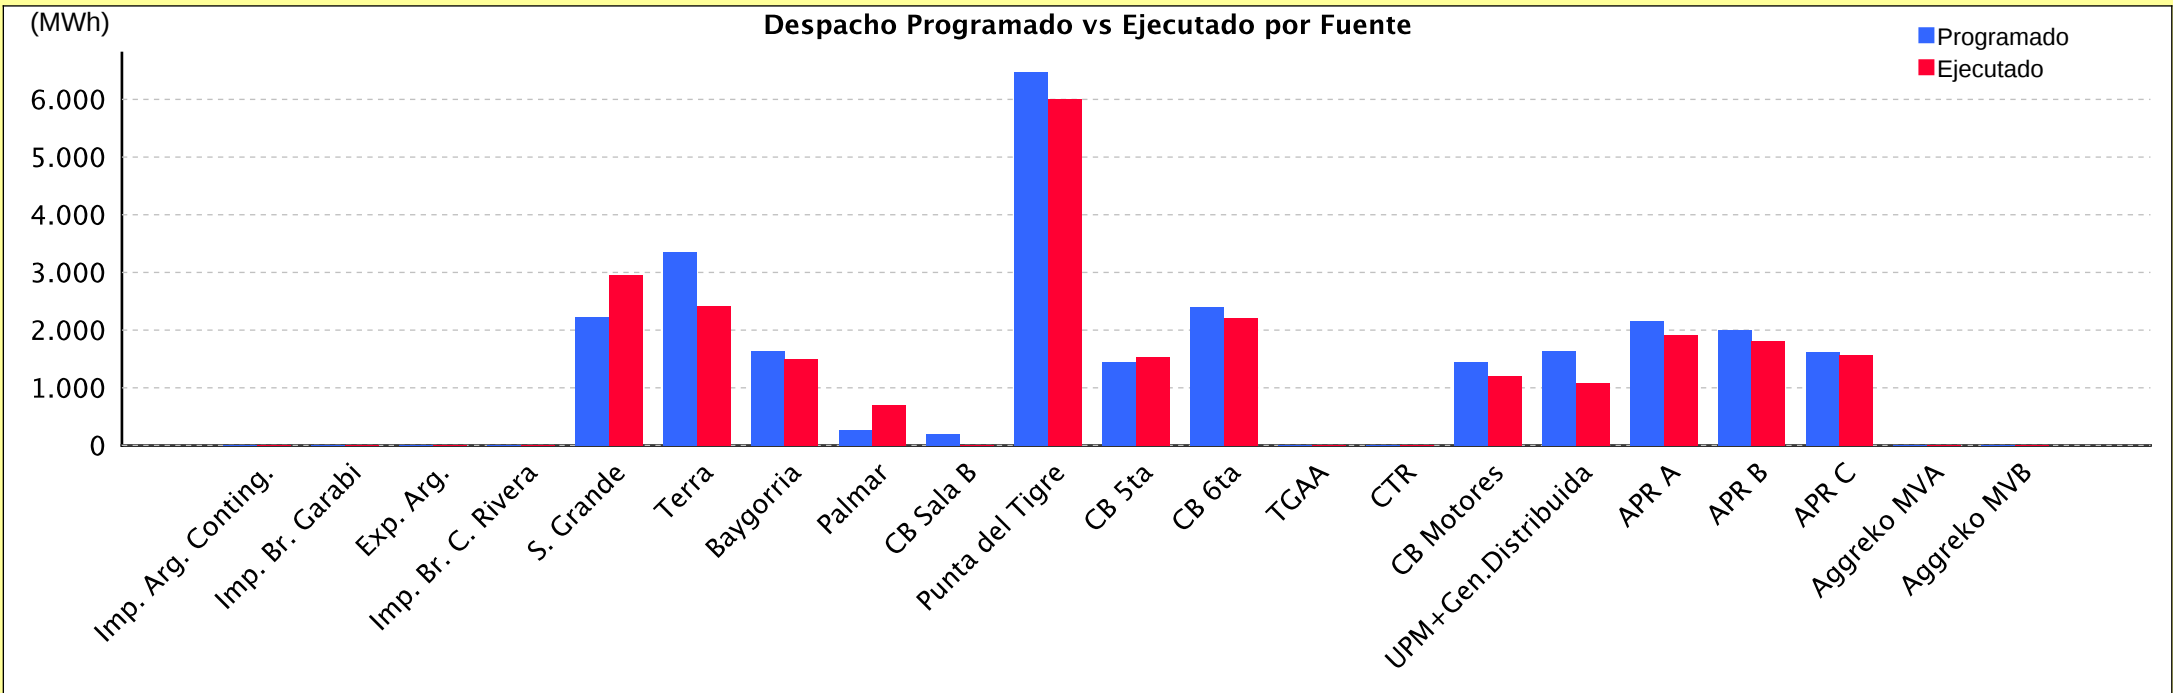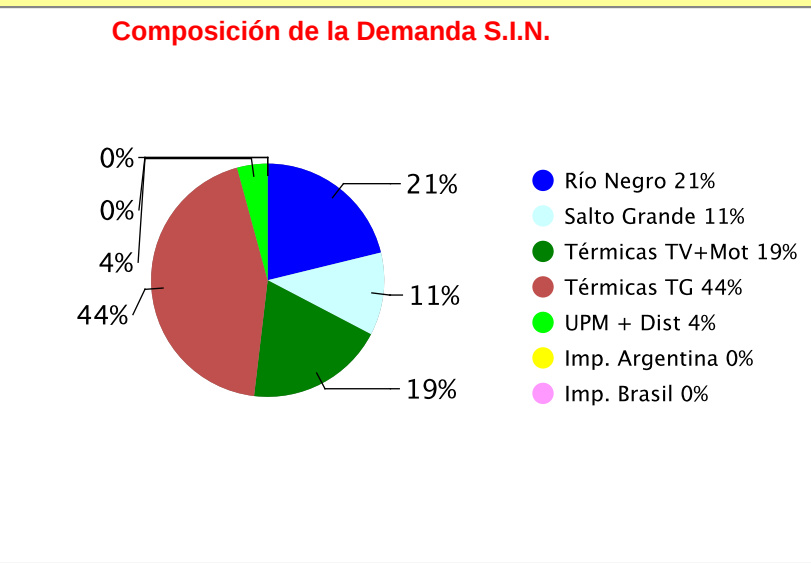



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

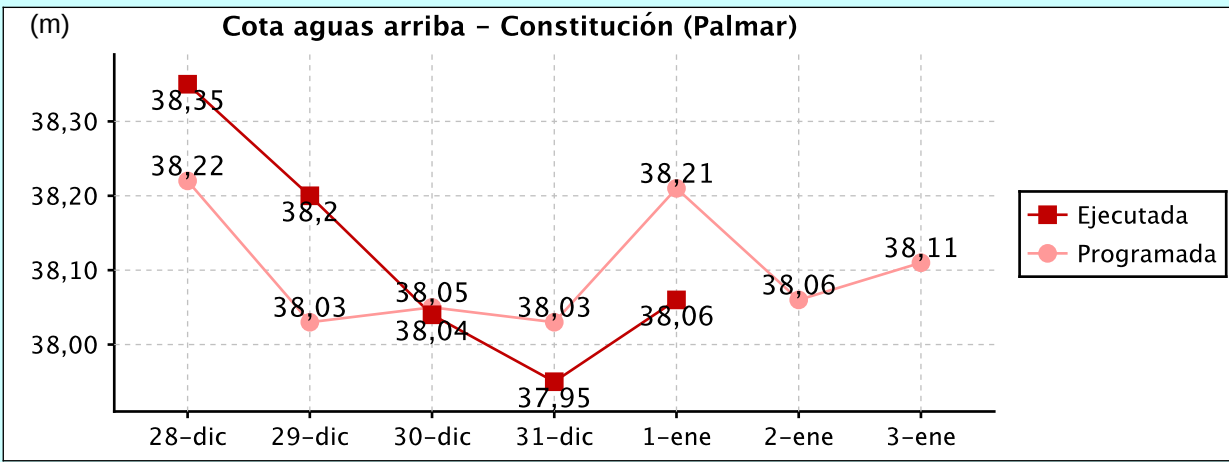
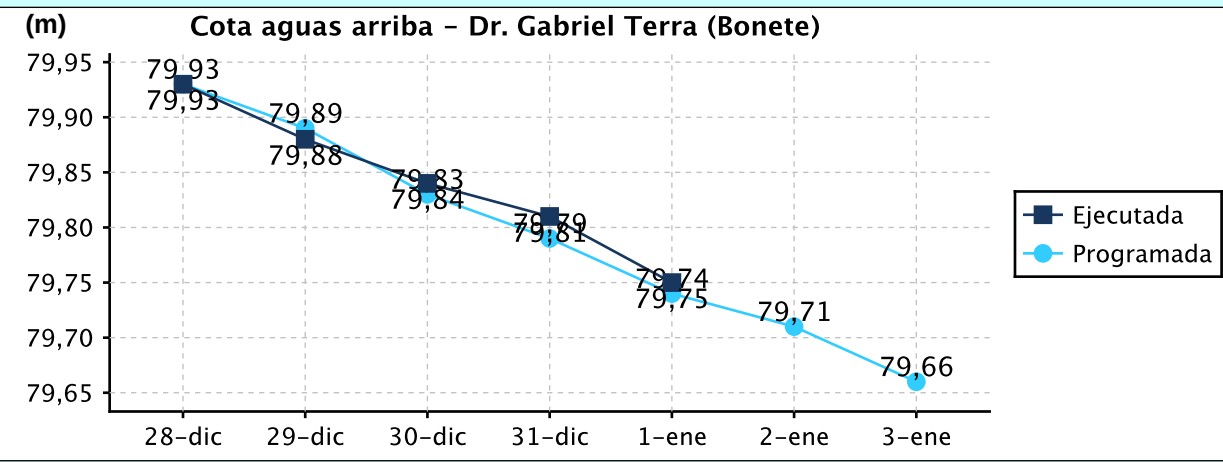


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,74	79,75
Baygorria	53,62	53,87
Palmar	38,21	38,06
SGU	33,48	33,46

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

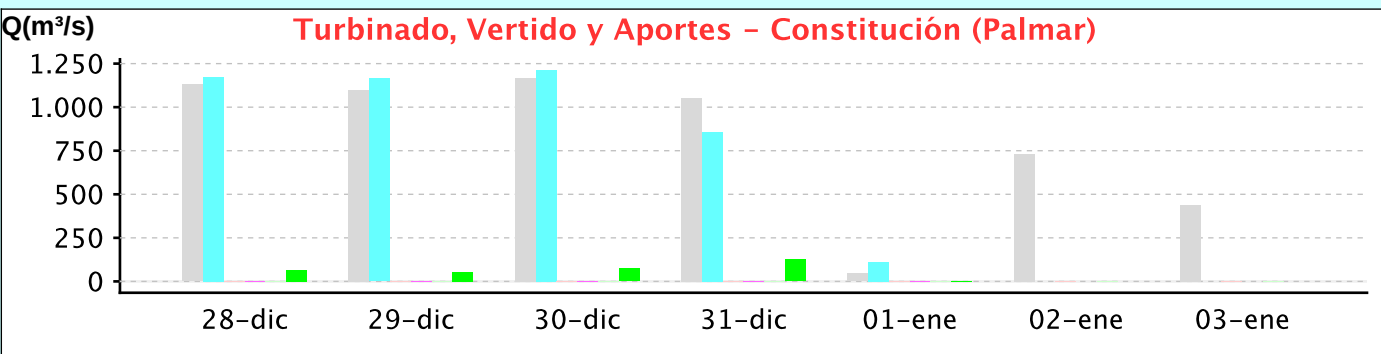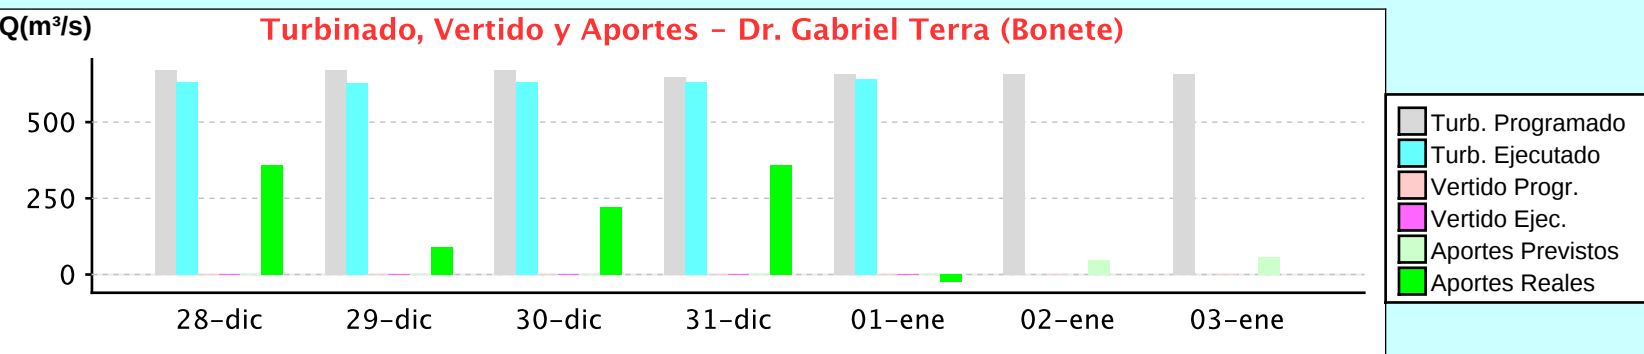

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

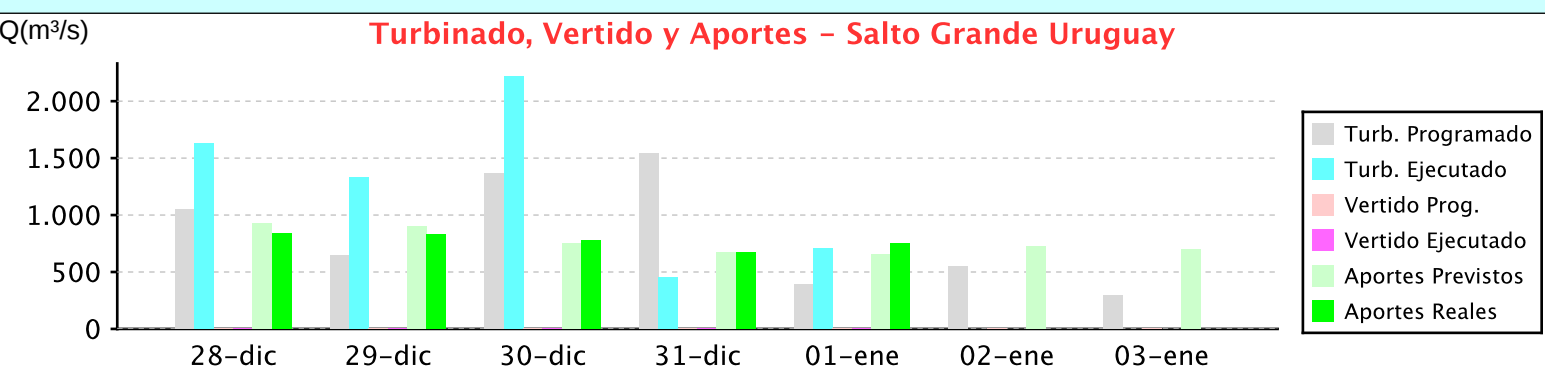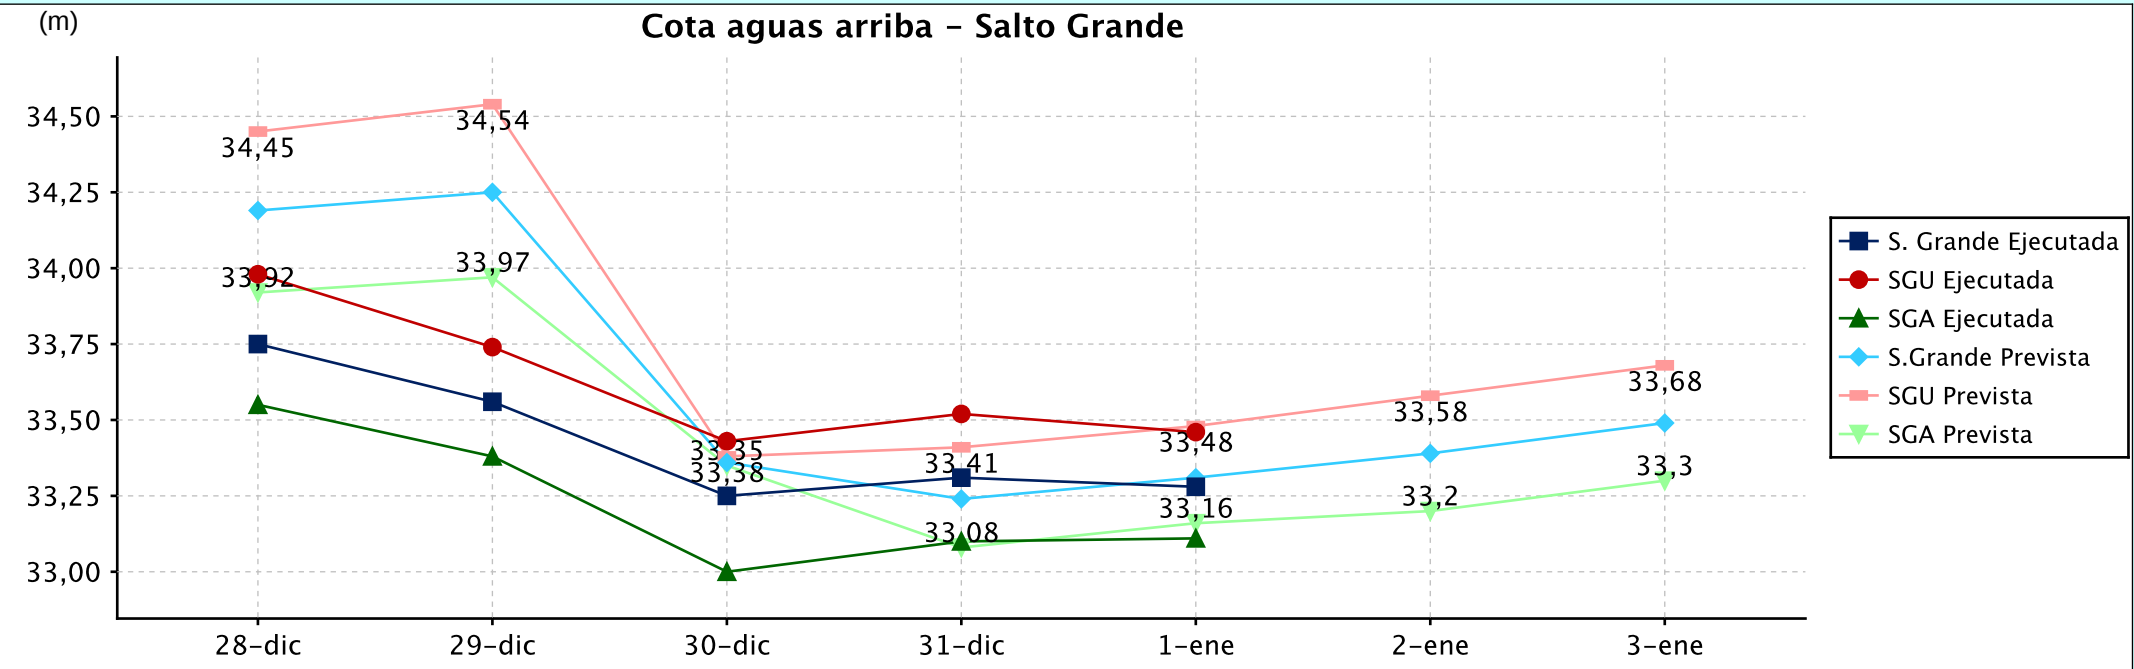

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,46
Cota Vista Arg	33,11
Cota real	33,28

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	6.537
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	659	642
Baygorria	535	472
Palmar	45	113
SGU	395	705

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-25
Baygorria	0	5
Palmar	0	-4
SGU	650	754

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
