



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 04 de enero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	6.252
Sala B	1.067
5ta.	1.522
6ta.	2.217
Motores	1.446
Central La Tablada	0
Central P. del Tigre	5.861
APR A	1.734
APR B	1.394
APR C	751
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.249
C. Baygorria	1.826
C. Palmar	457
C. Salto Grande	2.730
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.687
TOTAL Generación	25.941

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.941
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	



Demanda Programada (MWh)	28.370
Diferencia (MWh)	-2.429
Ejecutada - Programada	-8,56 %

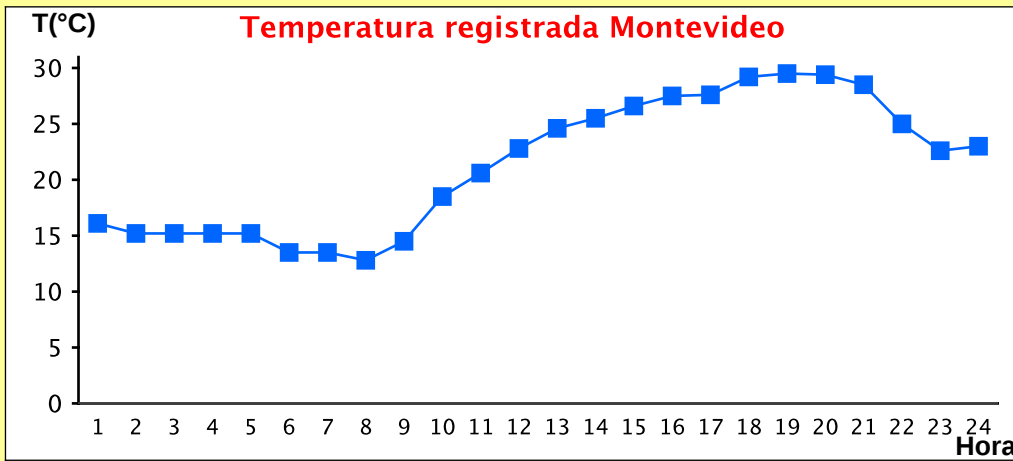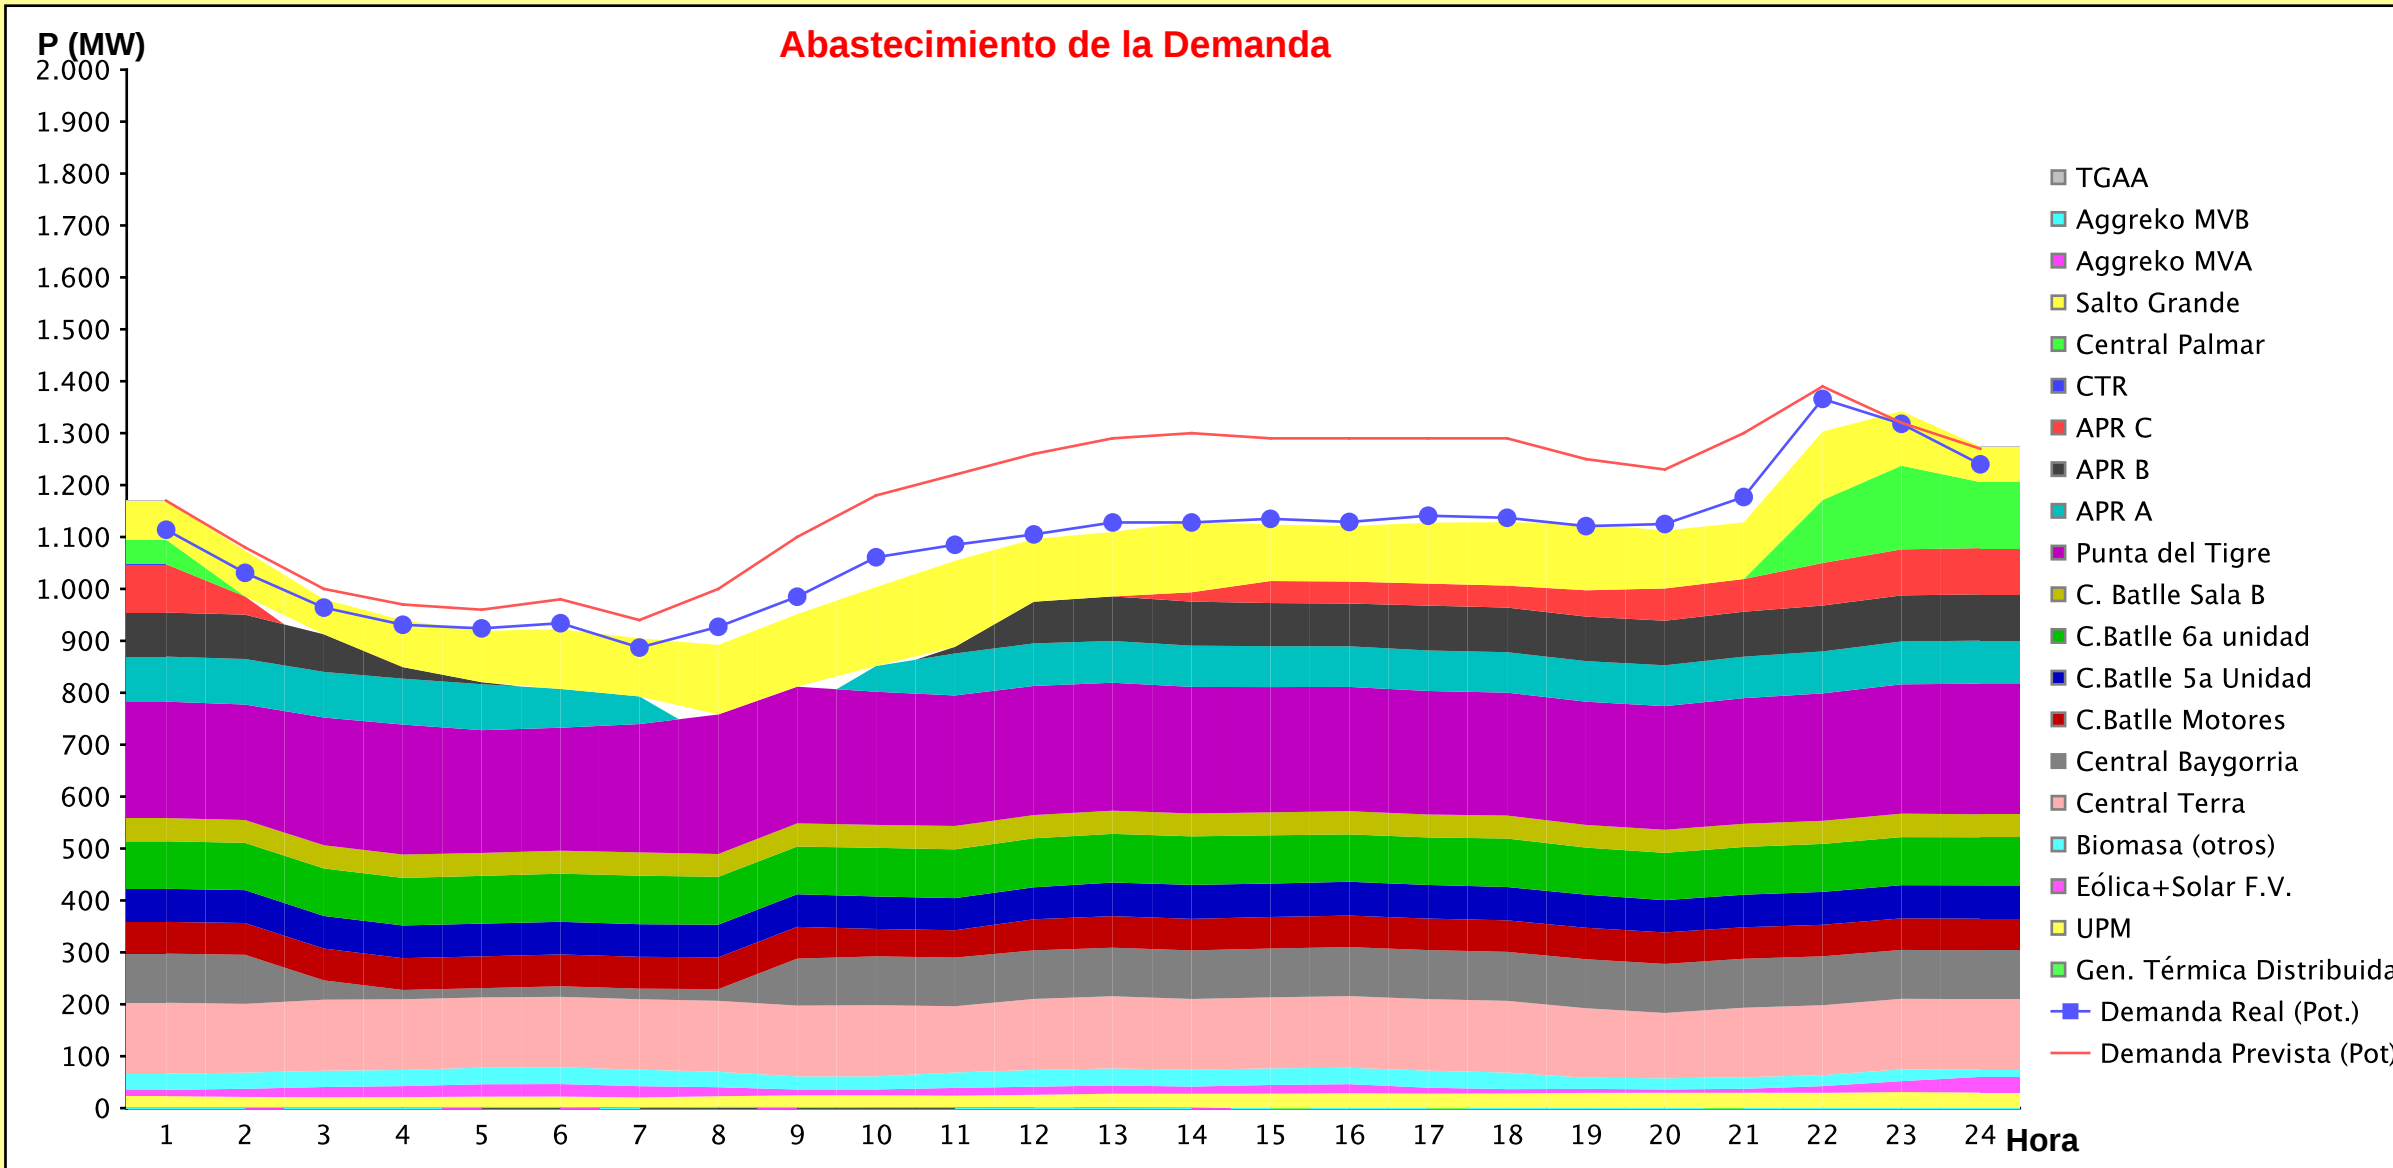


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1144,9 Hora 16:58
Potencia mínima:	883,25 Hora 06:51
Pico noche:	1366,24 Hora 21:55

Generación Media (MW)	
Eólica	15,8
Biomasa	57,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	1,2
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

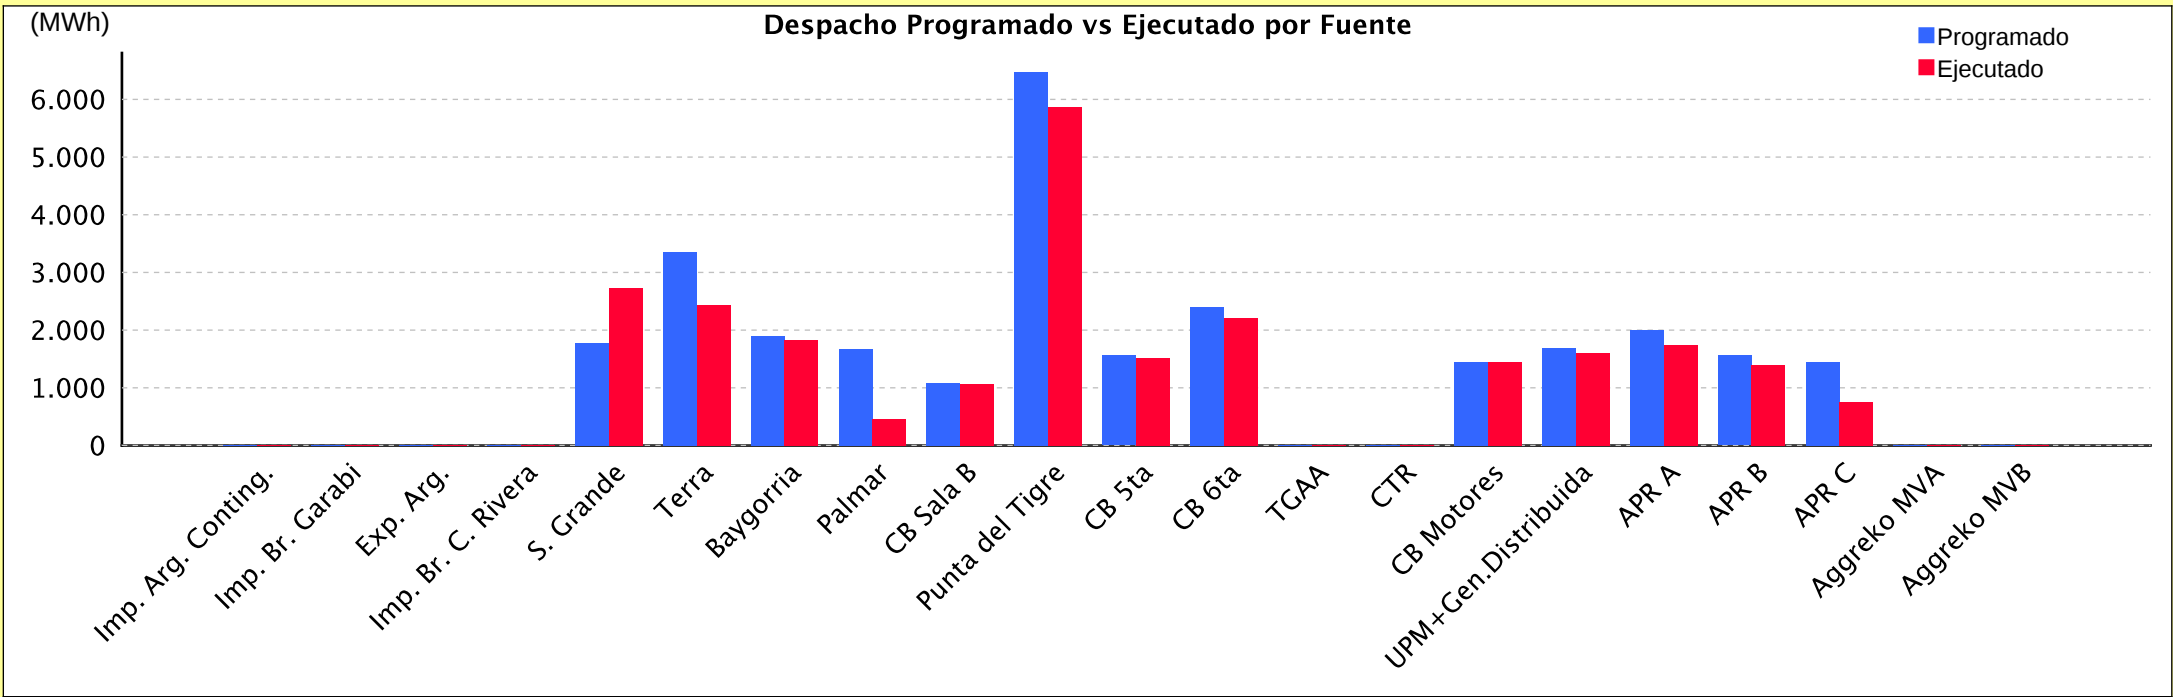
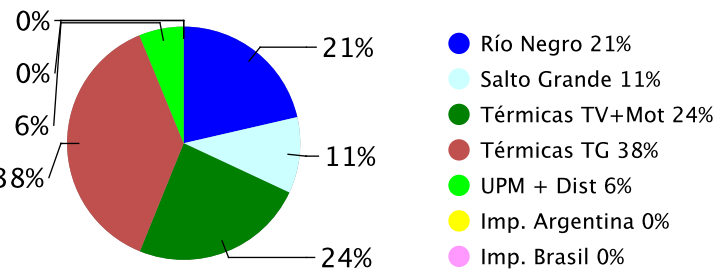


Generación (Demanda + Exportación)

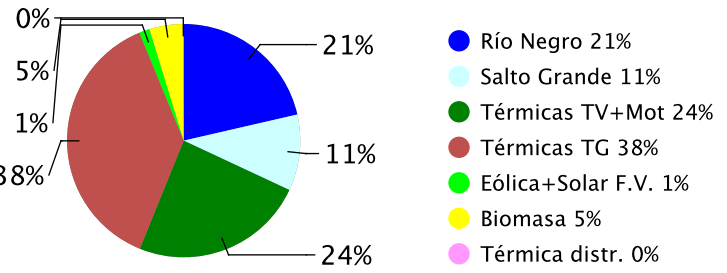



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

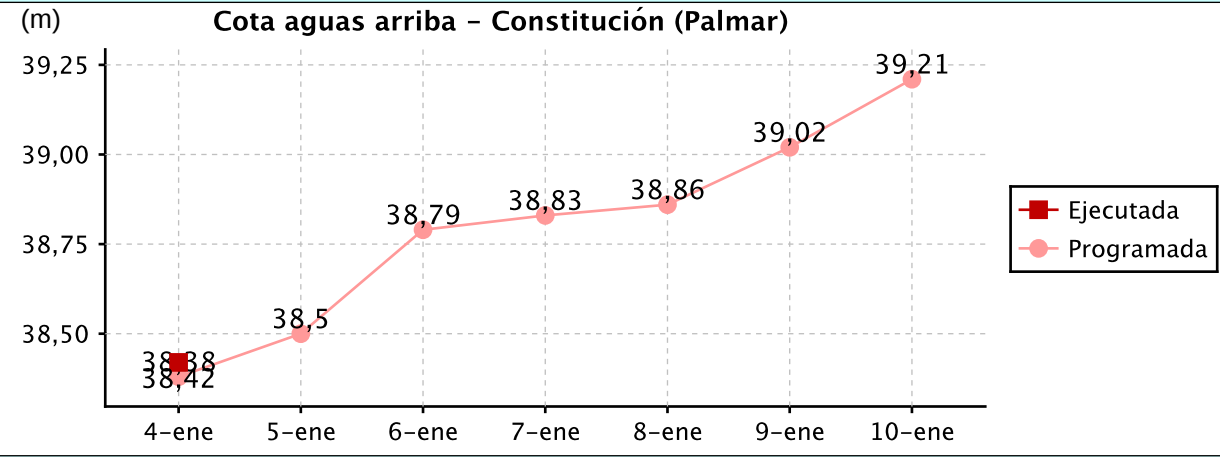
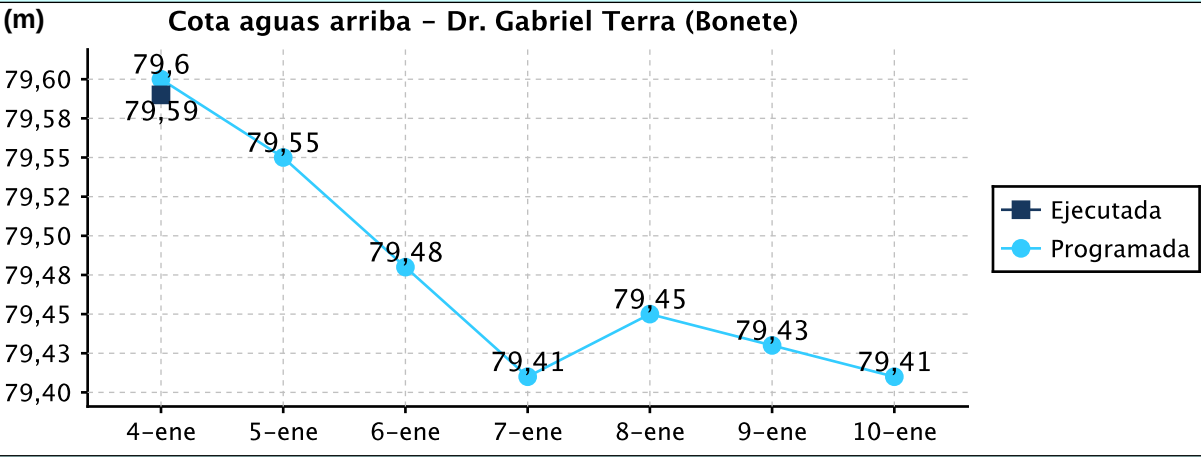


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,60	79,59
Baygorria	53,82	53,96
Palmar	38,38	38,42
SGU	33,84	33,91

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

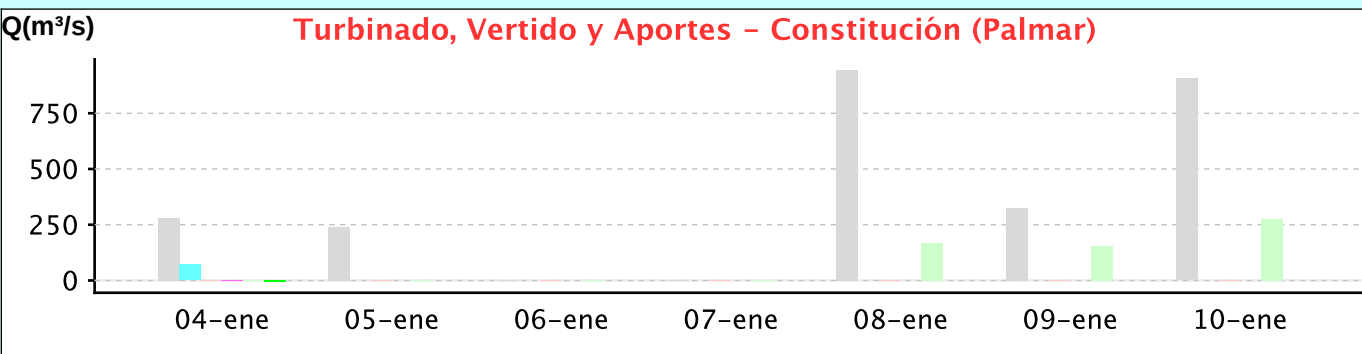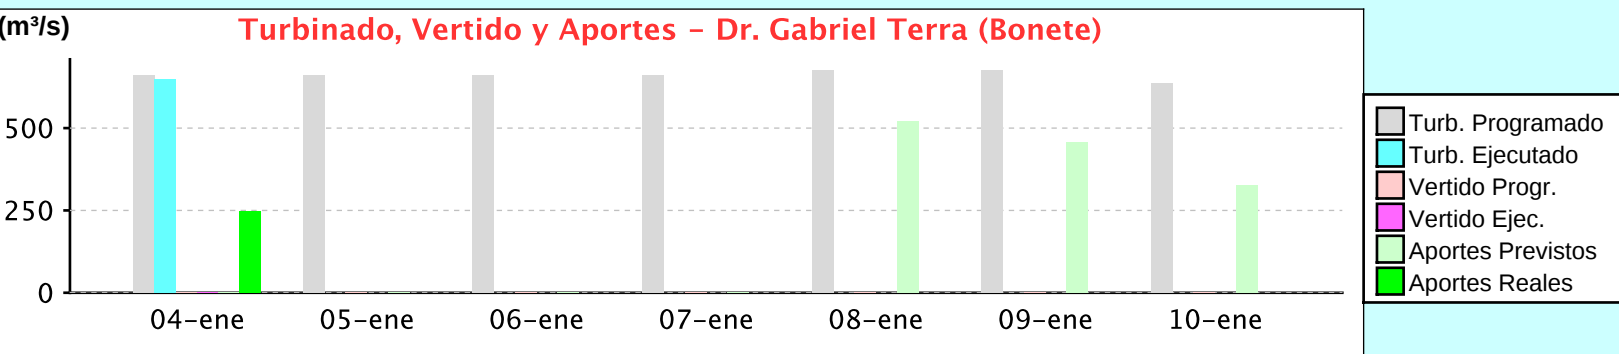

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

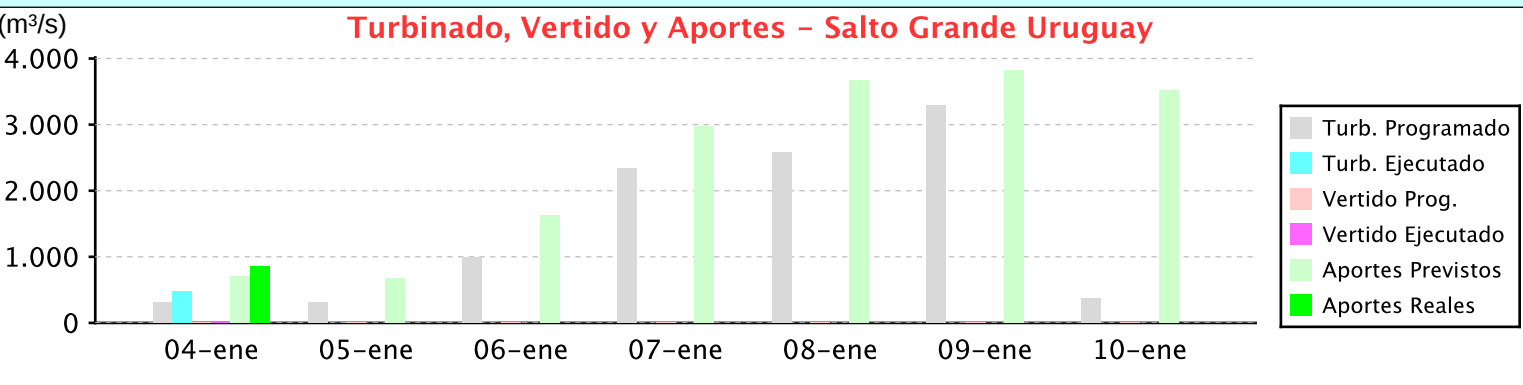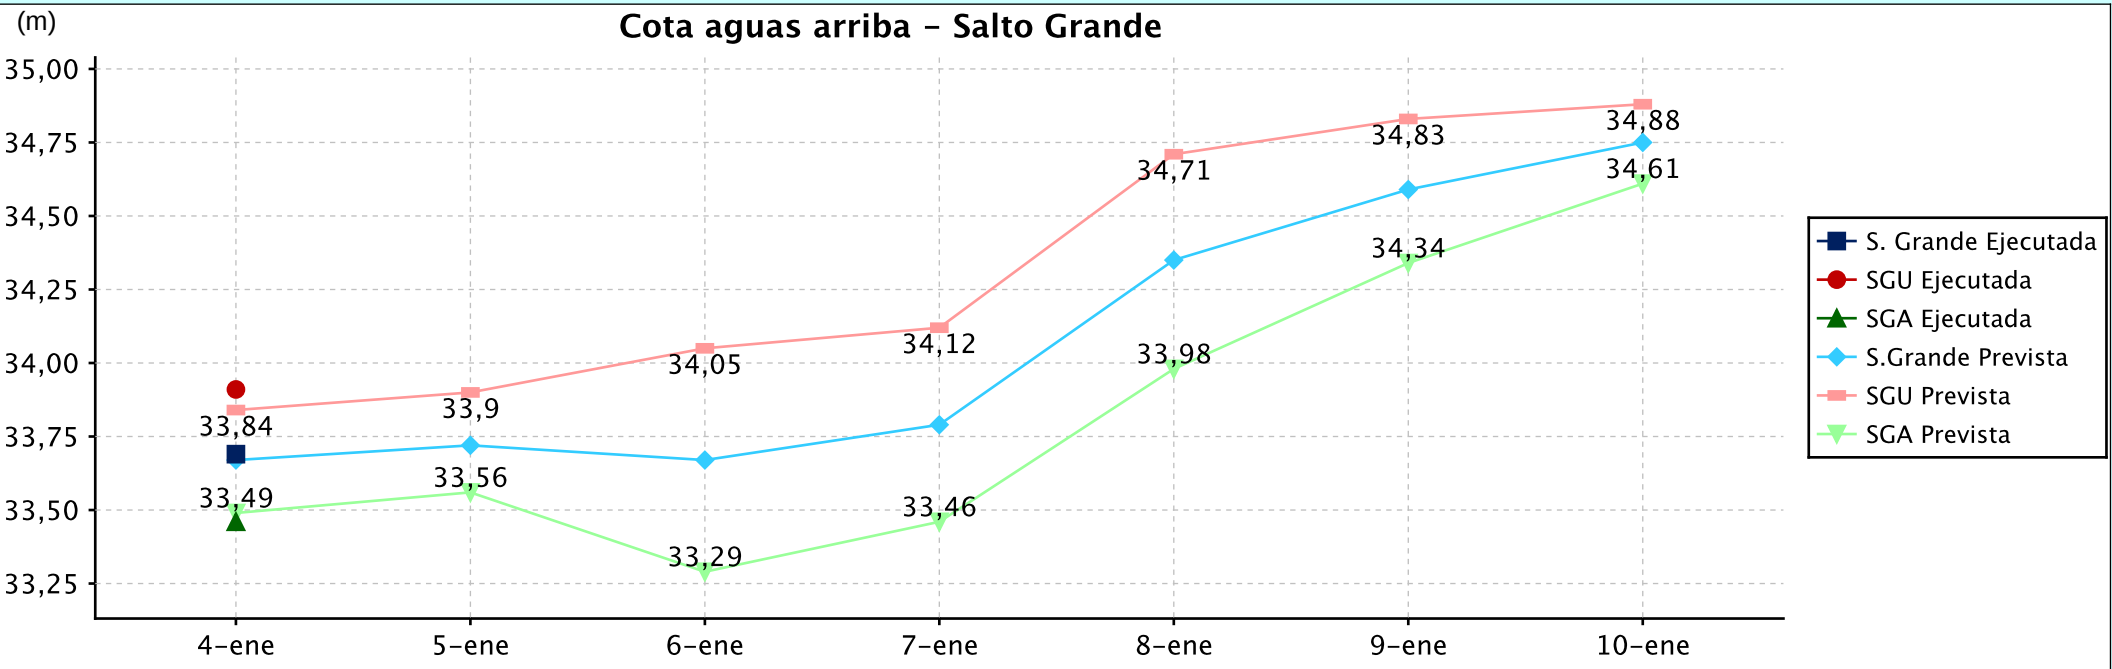

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,91
Cota Vista Arg	33,46
Cota real	33,69
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	8.868

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	659	648
Baygorria	621	586
Palmar	282	72
SGU	314	479

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	247
Baygorria	0	-3
Palmar	0	-8
SGU	700	849

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
