



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 05 de enero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	6.305
Sala B	1.073
5ta.	1.534
6ta.	2.244
Motores	1.455
Central La Tablada	0
Central P. del Tigre	6.044
APR A	1.623
APR B	1.254
APR C	974
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.254
C. Baygorria	1.980
C. Palmar	456
C. Salto Grande	2.370
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.702
TOTAL Generación	25.961

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.961
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.470
Diferencia (MWh)	-1.509
Ejecutada - Programada	-5,49 %

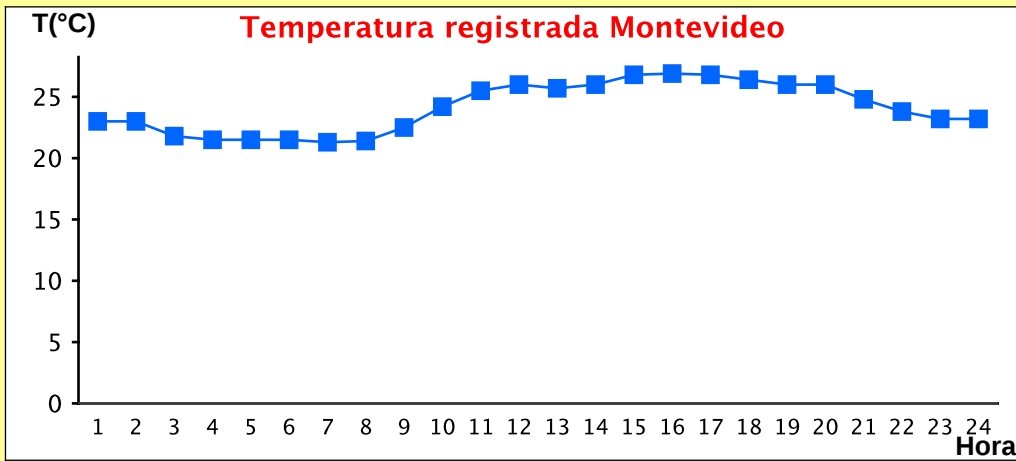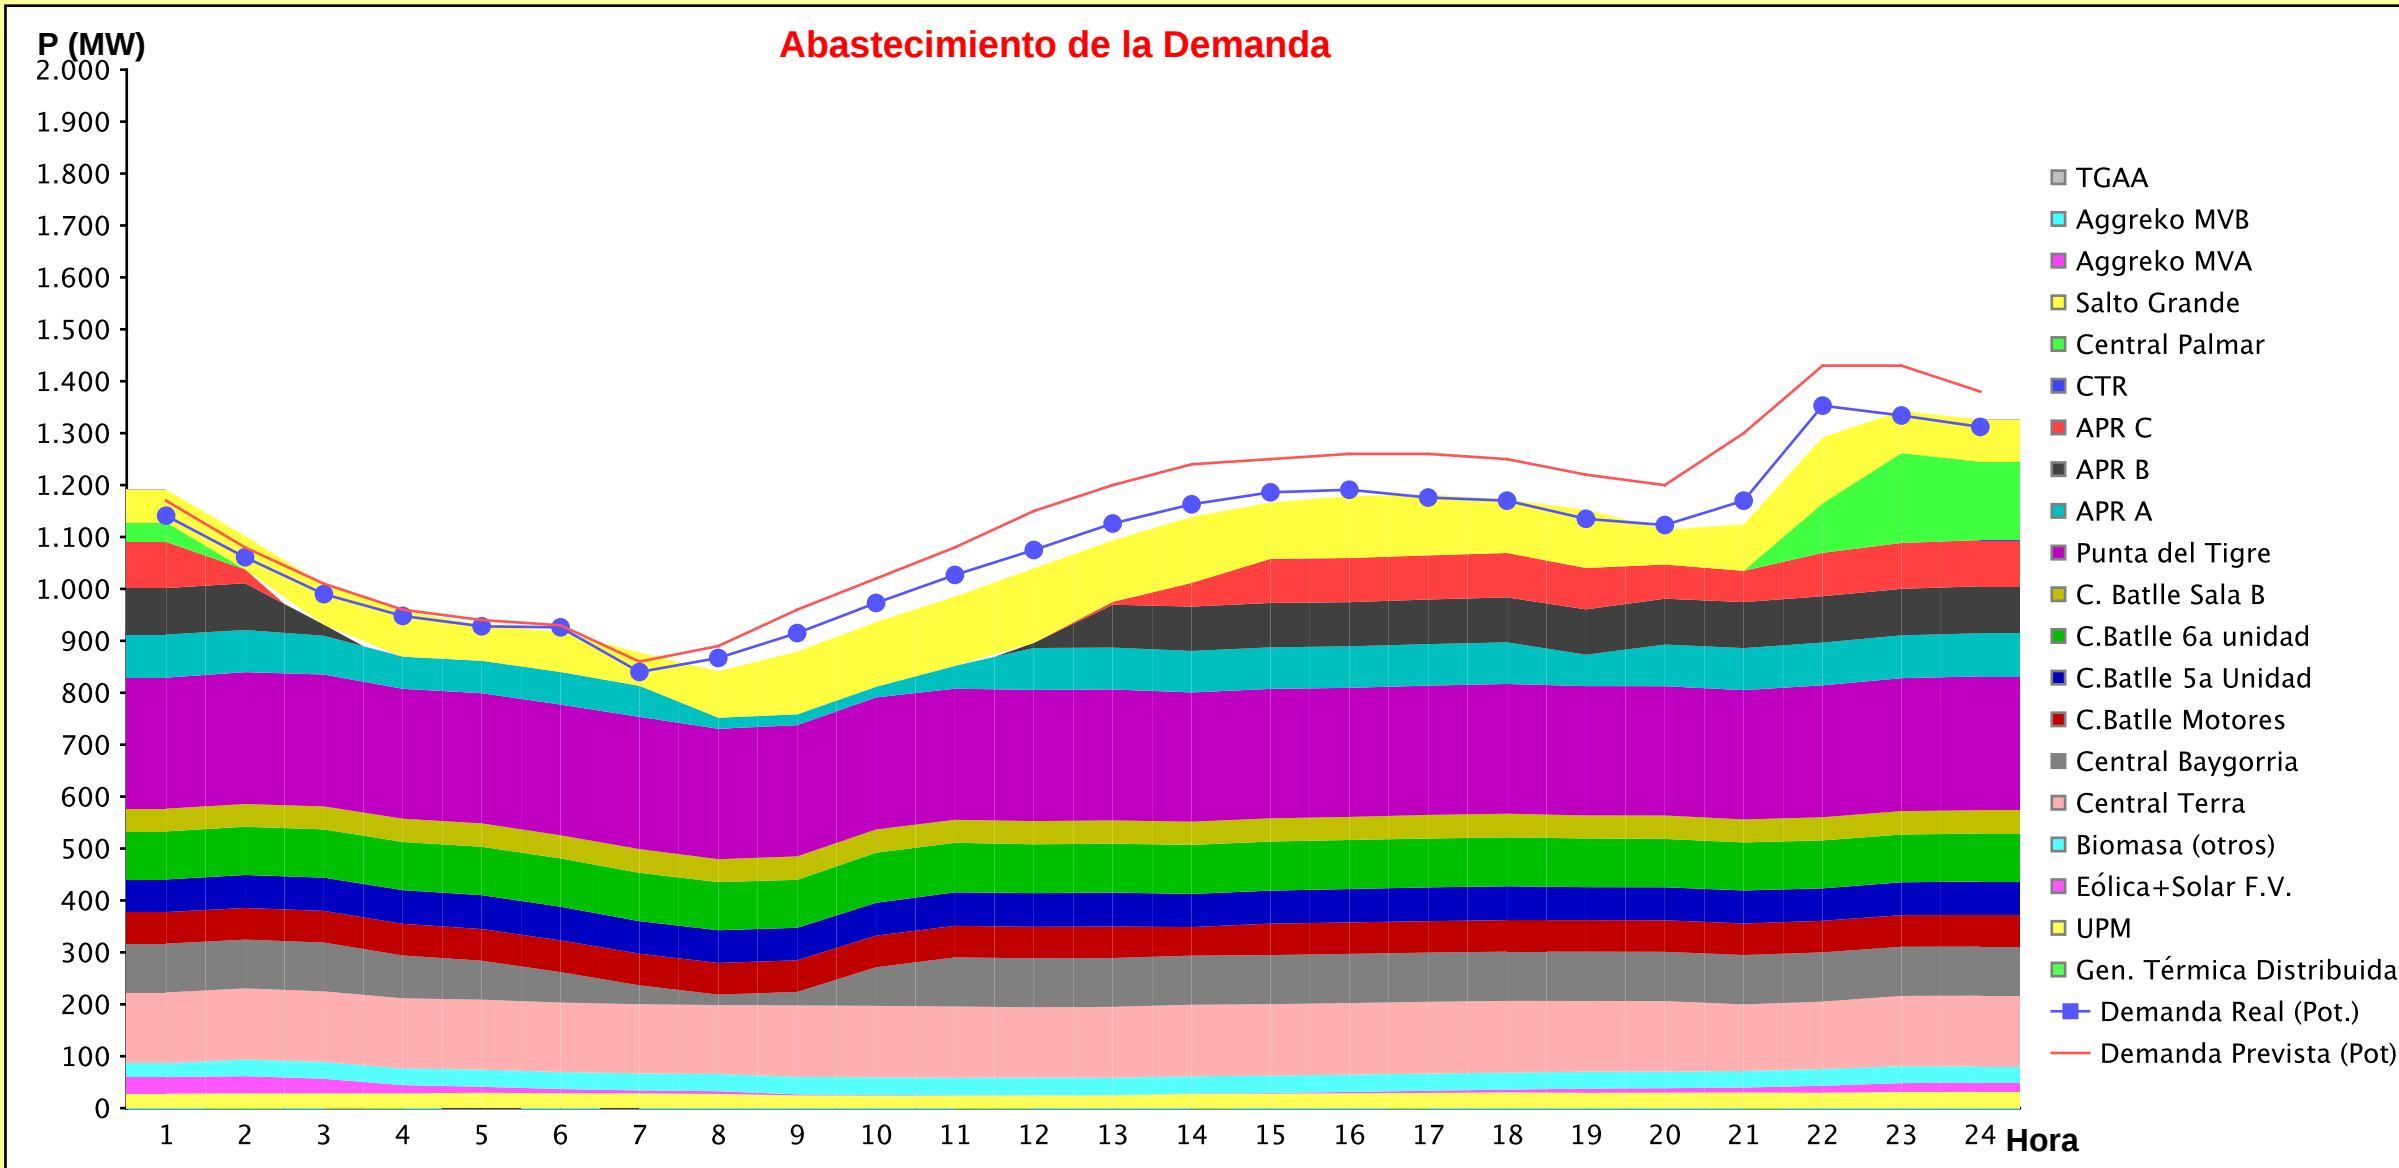



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1194,15 Hora 16:25
Potencia mínima:	834,5 Hora 07:04
Pico noche:	1361,9 Hora 22:04

Generación Media (MW)	
Eólica	9,8
Biomasa	65,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

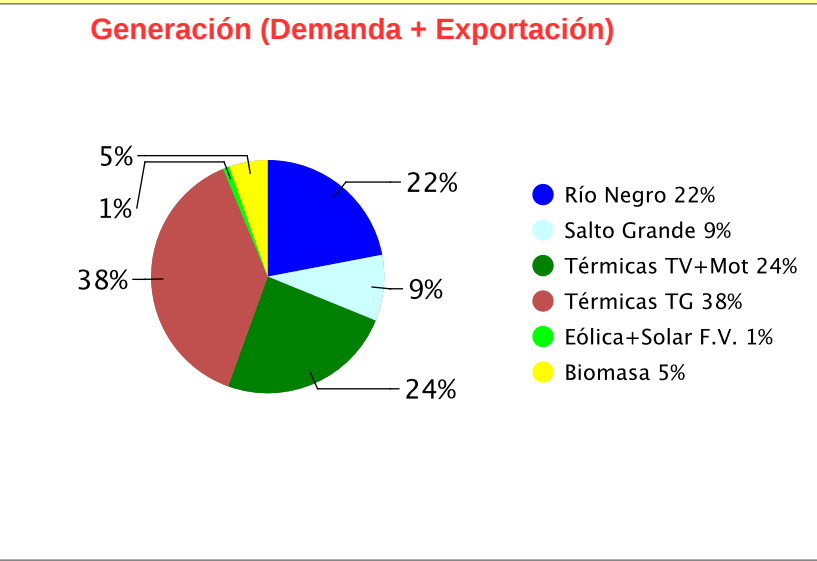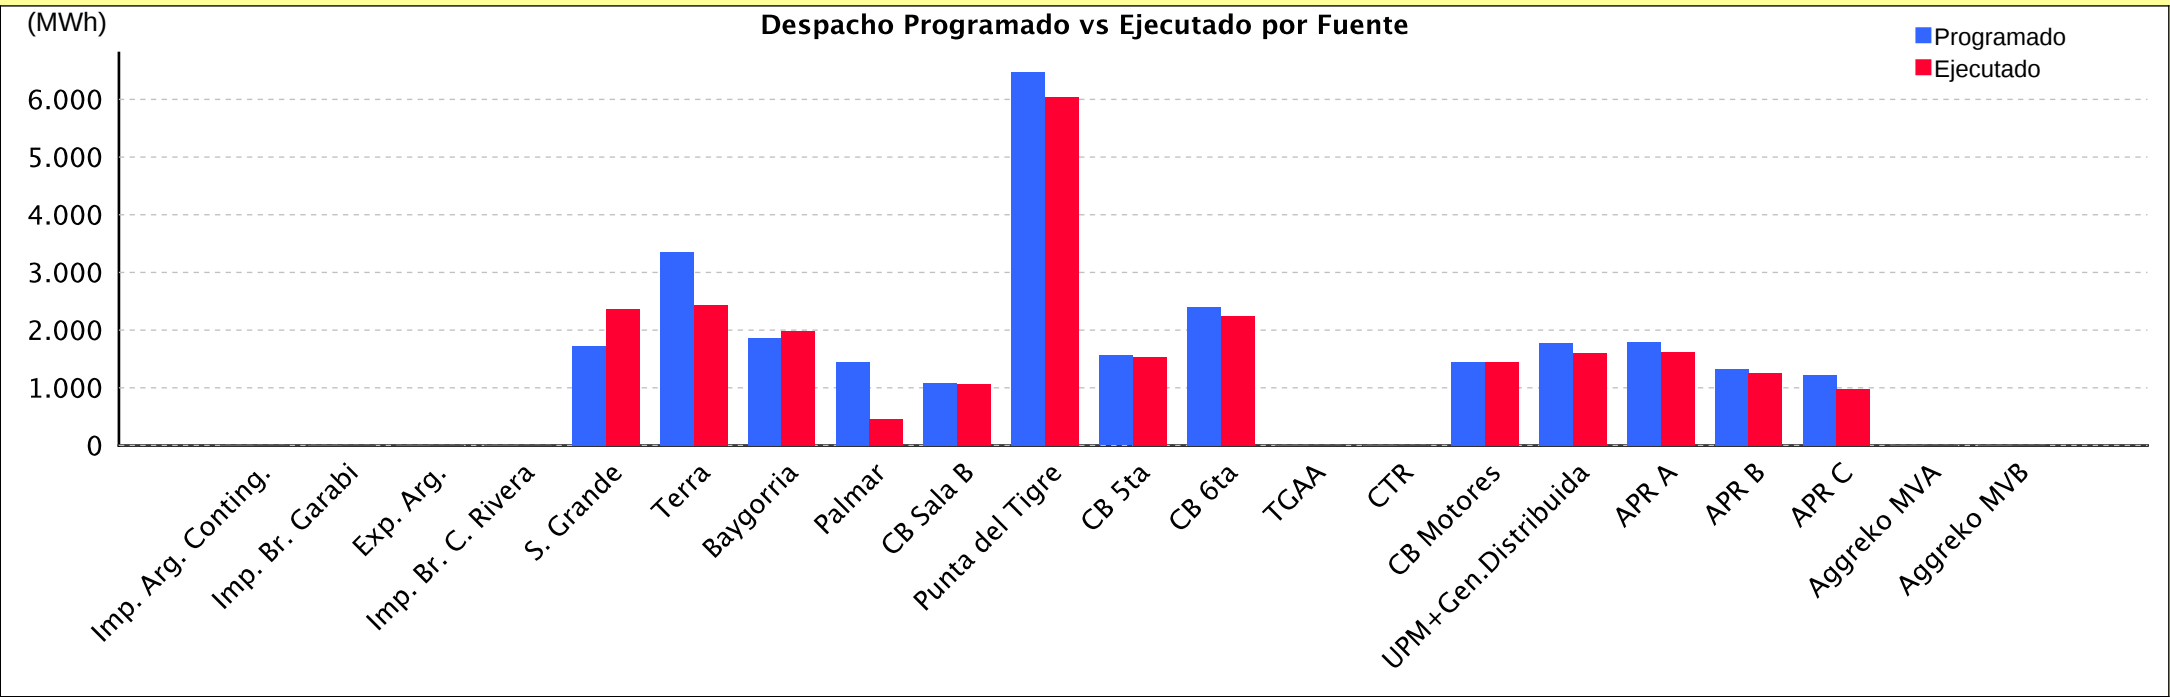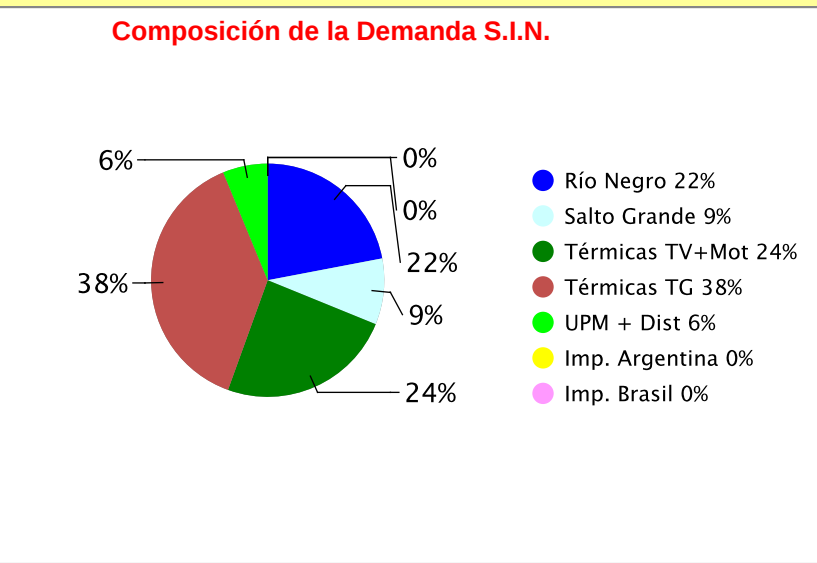



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

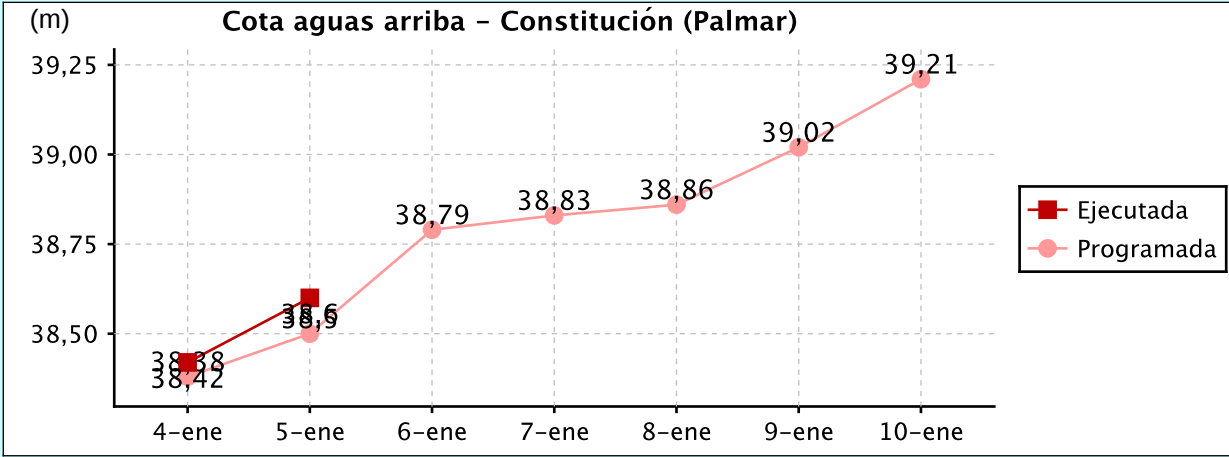
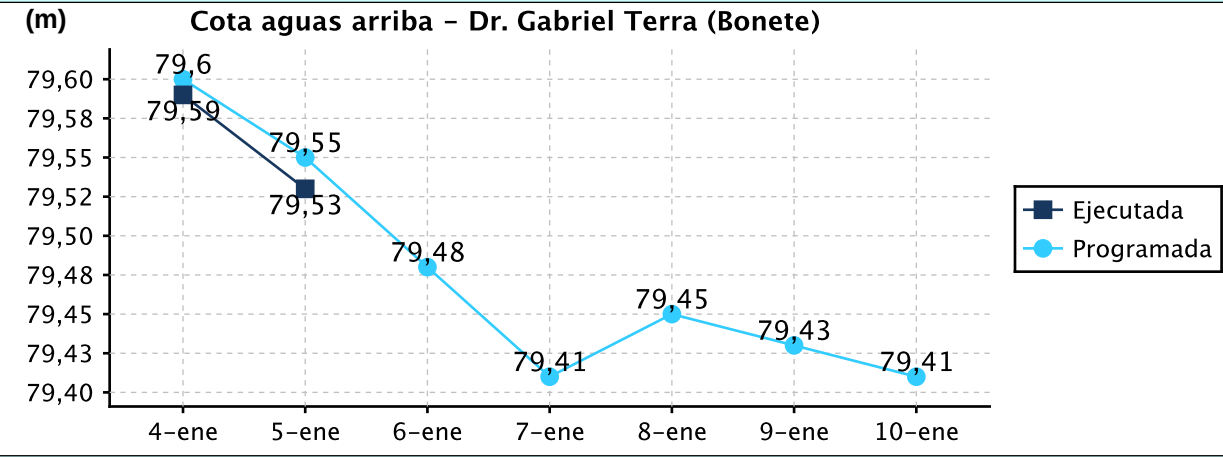


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,55	79,53
Baygorria	53,81	53,97
Palmar	38,50	38,6
SGU	33,90	34,03

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

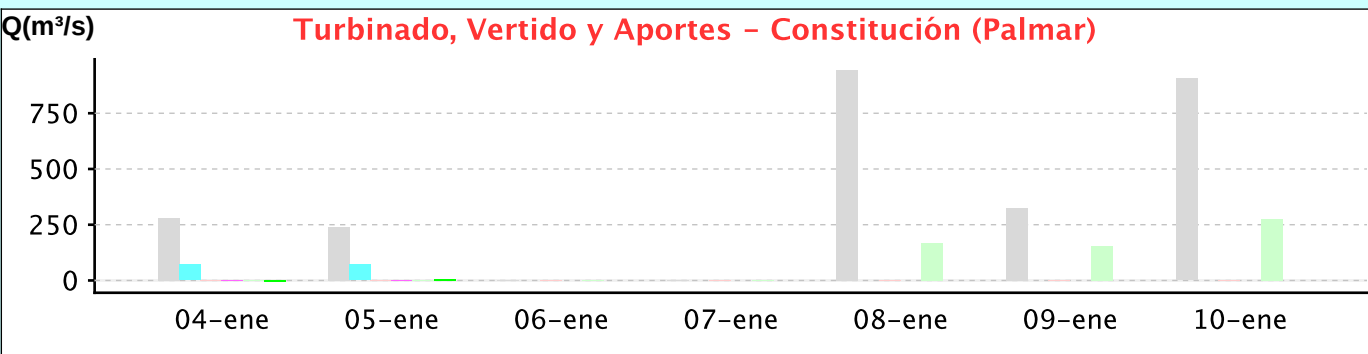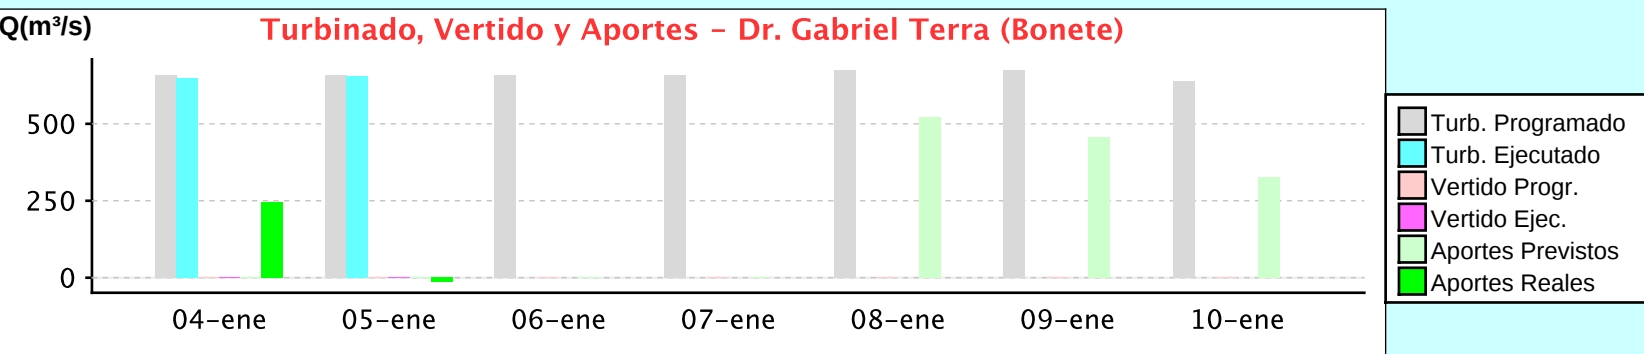

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

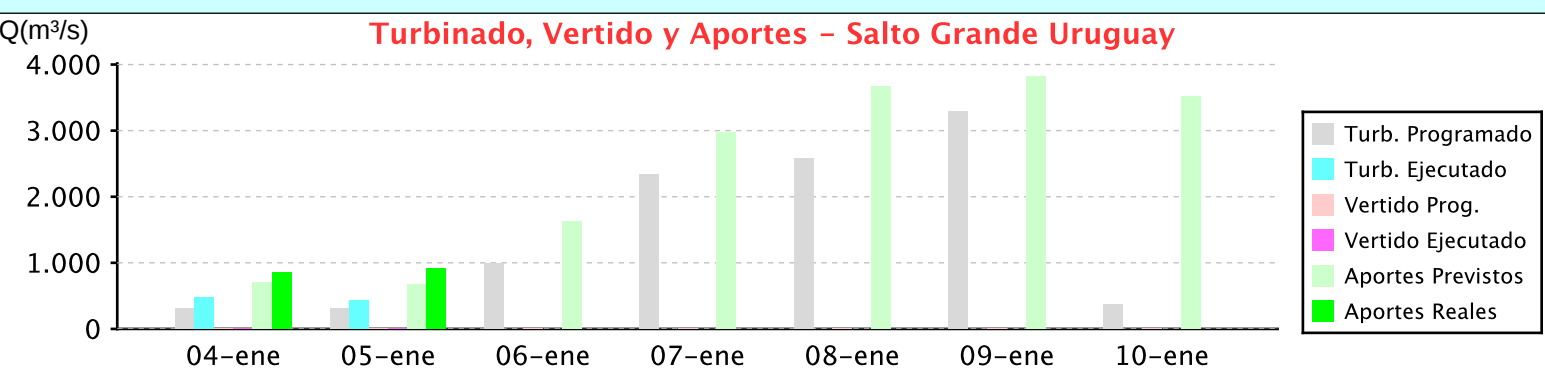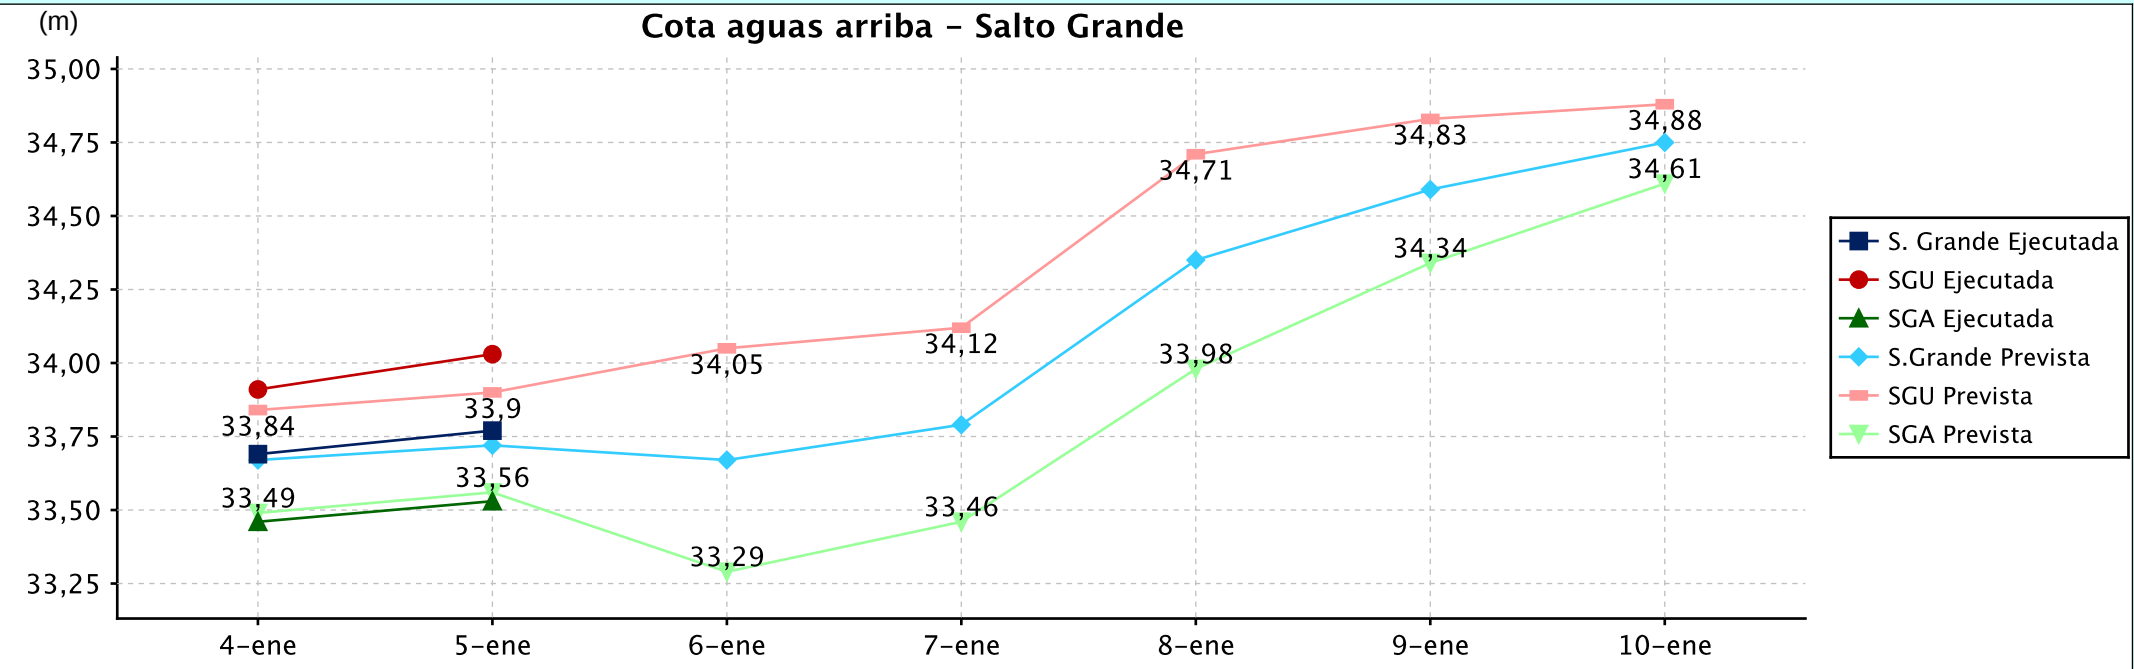

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,03
Cota Vista Arg	33,53
Cota real	33,77

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	9.975
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	659	654
Baygorria	610	641
Palmar	242	72
SGU	305	429

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-14
Baygorria	0	13
Palmar	0	7
SGU	675	918

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
