




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 06 de enero de 2014


Generación Térmica	
Central Batlle	6.150
Sala B	1.073
5ta.	1.497
6ta.	2.144
Motores	1.436
Central La Tablada	1.018
Central P. del Tigre	5.881
APR A	1.832
APR B	2.082
APR C	1.460
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.226
C. Baygorria	1.706
C. Palmar	465
C. Salto Grande	7.607
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.904
TOTAL Generación	33.330

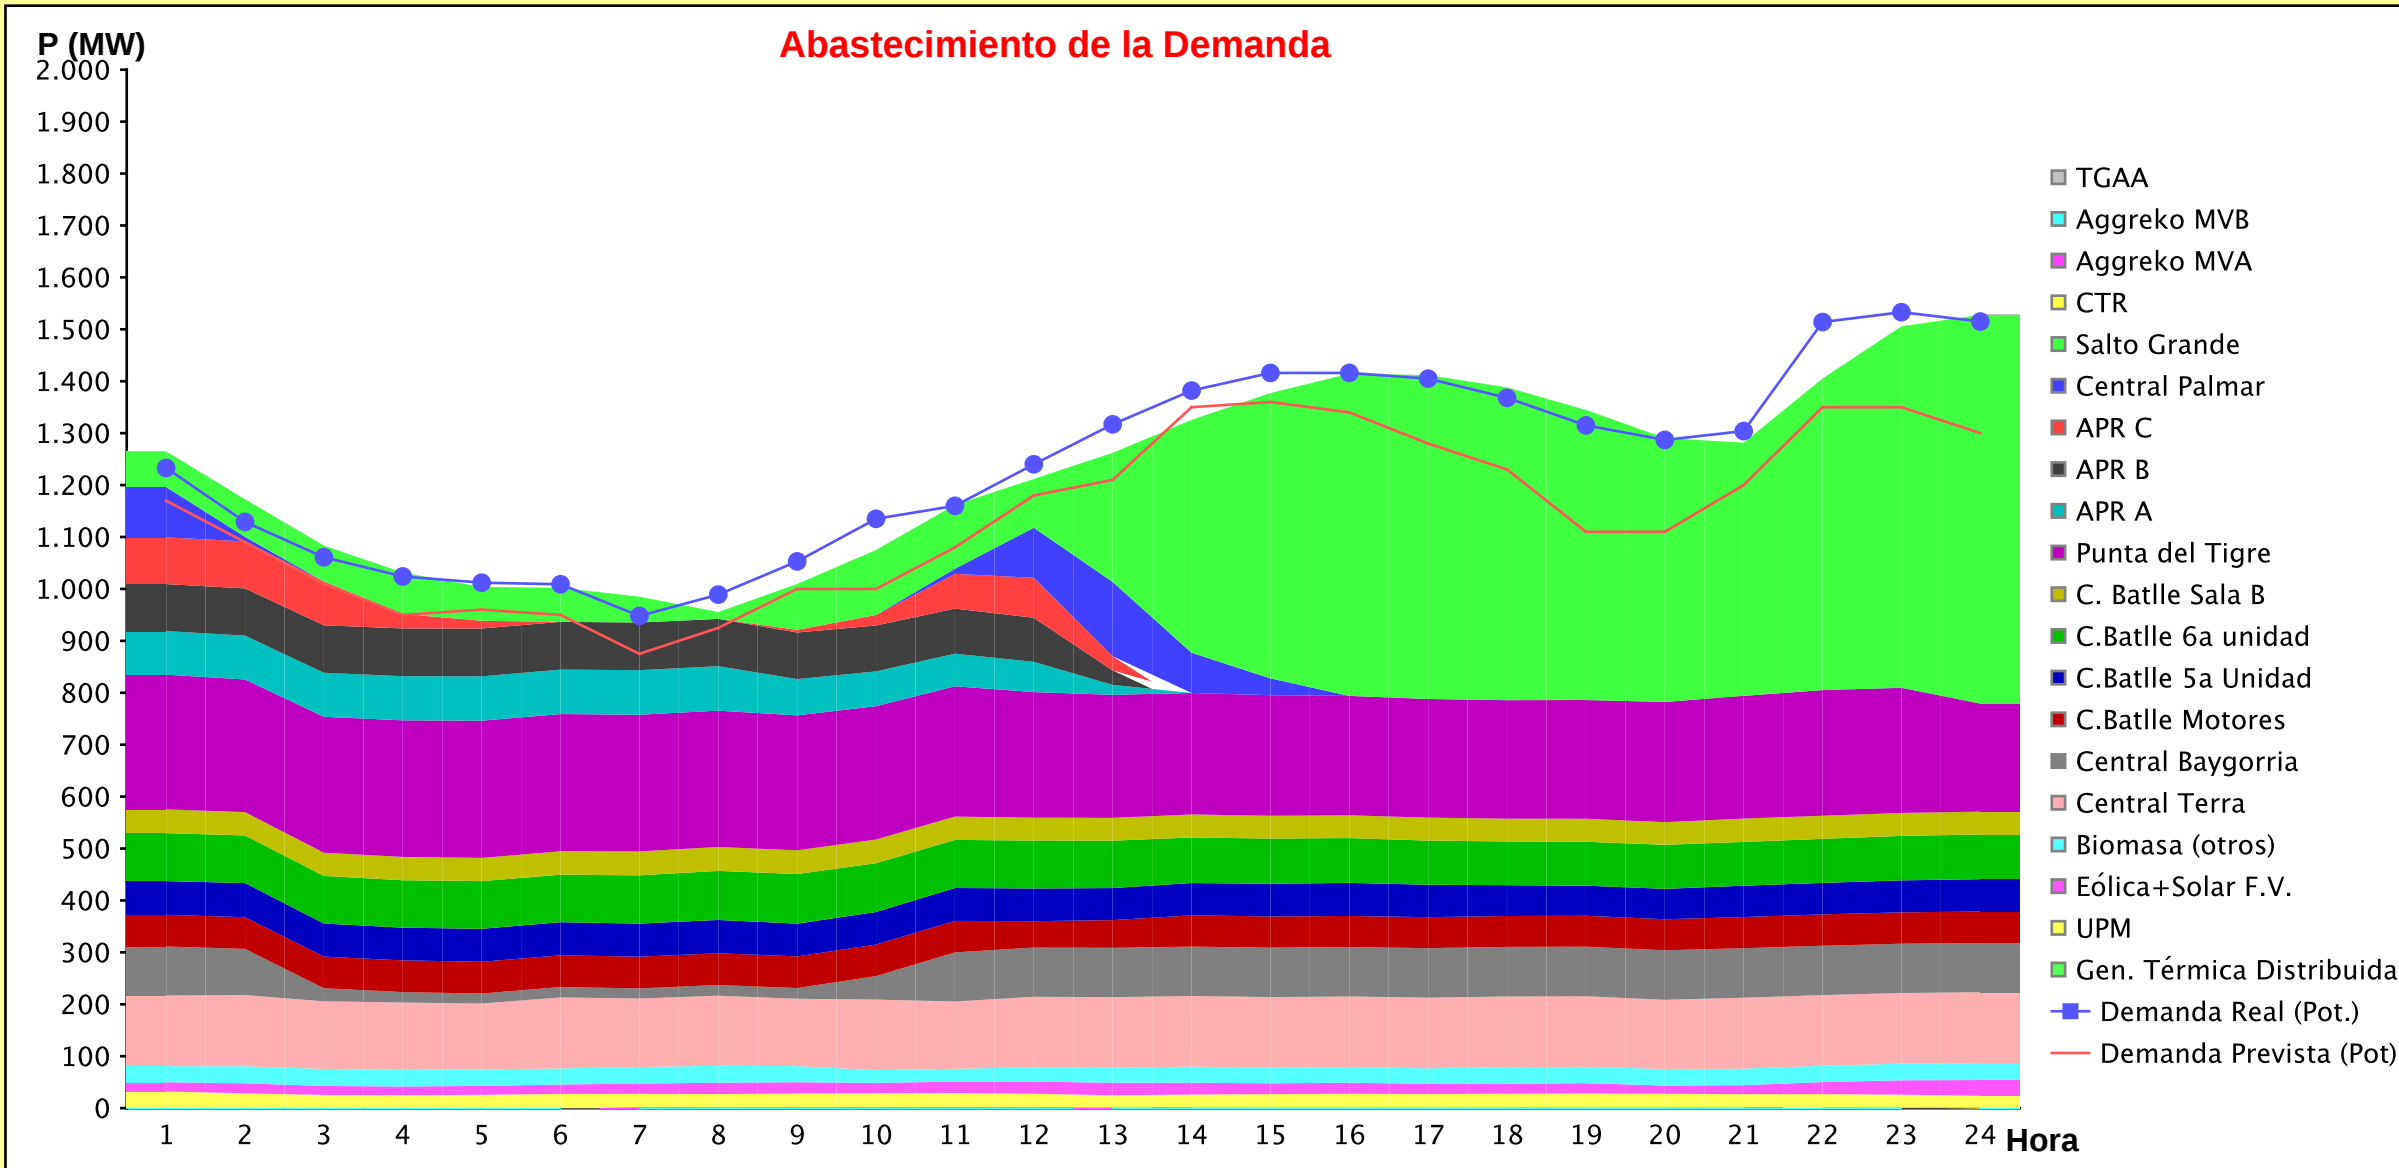

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.822
Hidráulica	0
Térmica	3.822
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.822




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.509
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.380
Diferencia (MWh)	2.129
Ejecutada - Programada	7,77 %

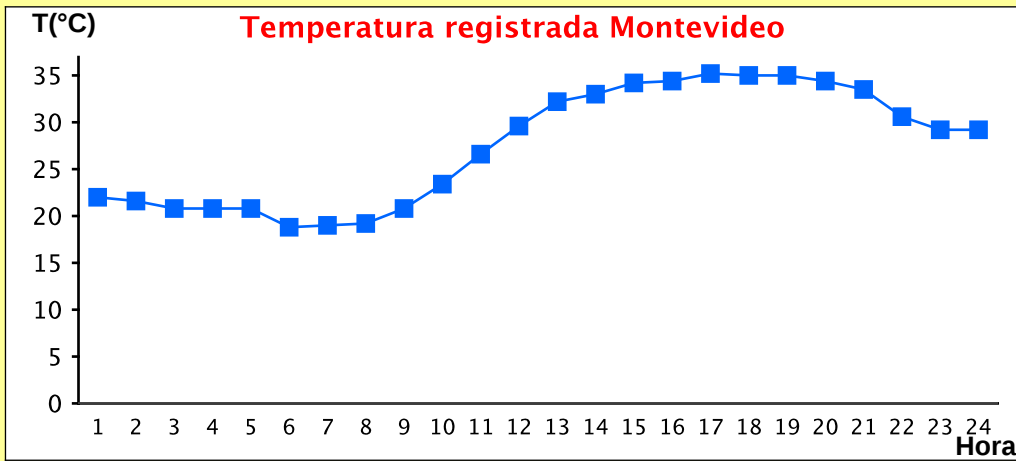



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1431,72 Hora 16:14
Potencia mínima:	940,27 Hora 06:50
Pico noche:	1551,6 Hora 22:49

Generación Media (MW)	
Eólica	20,9
Biomasa	61,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	1,2
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

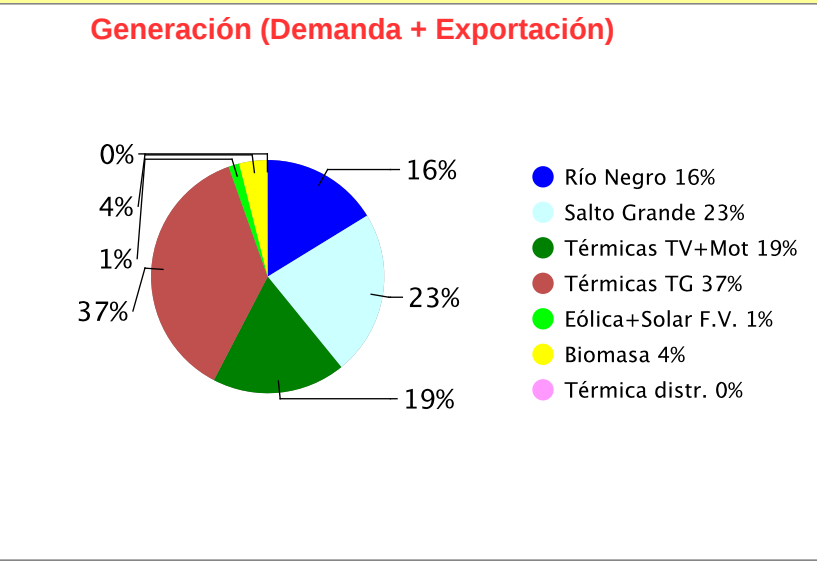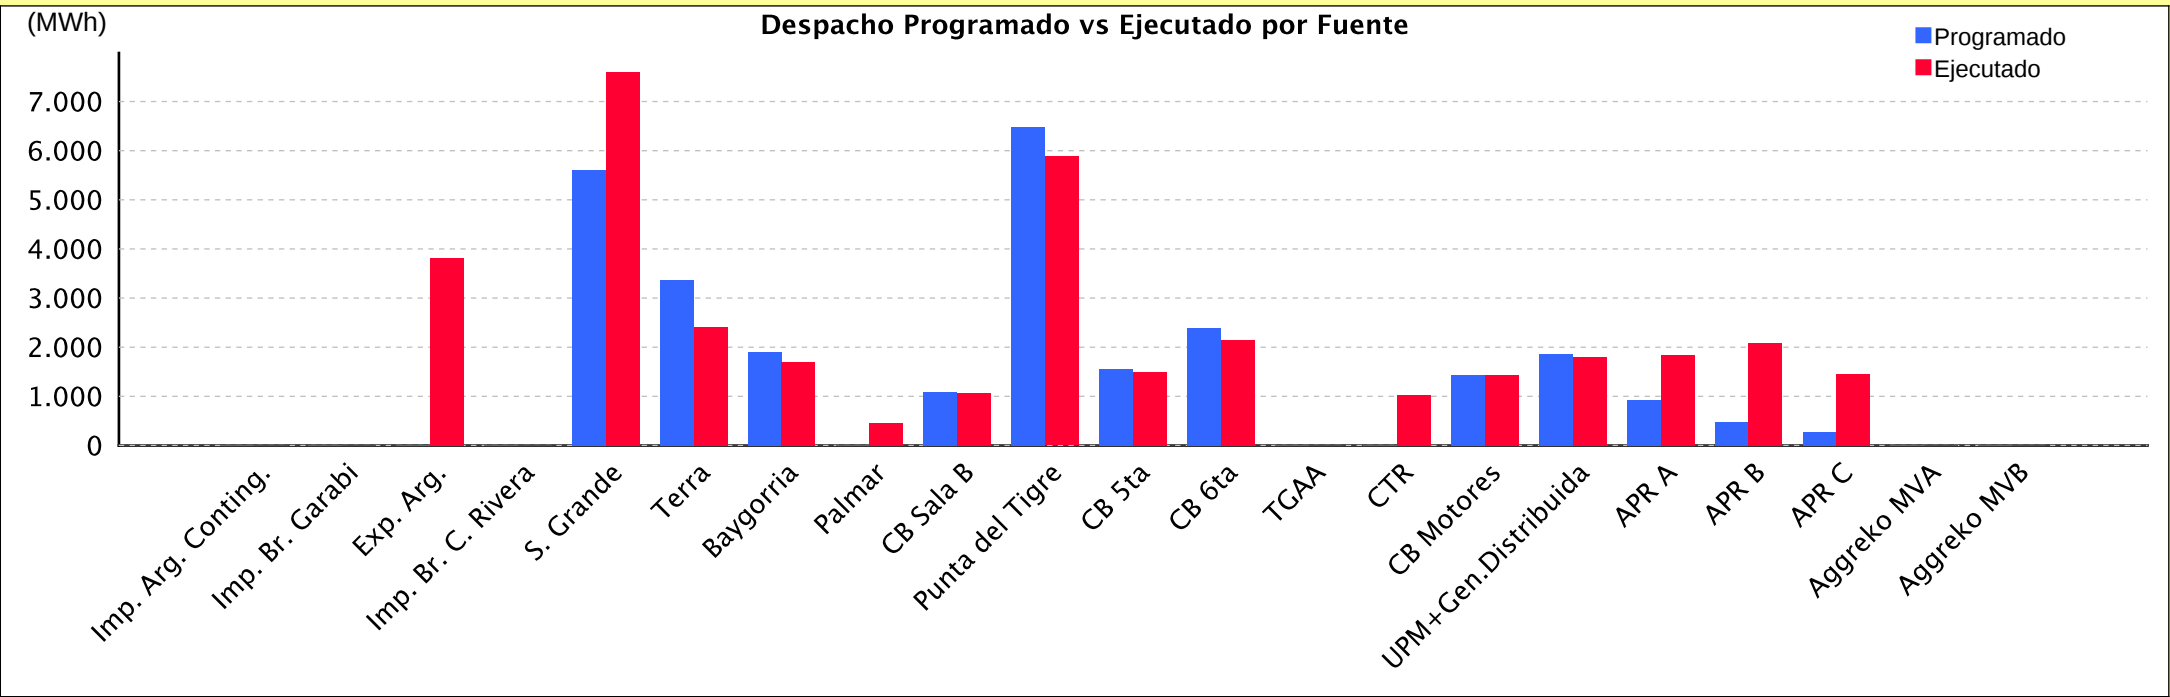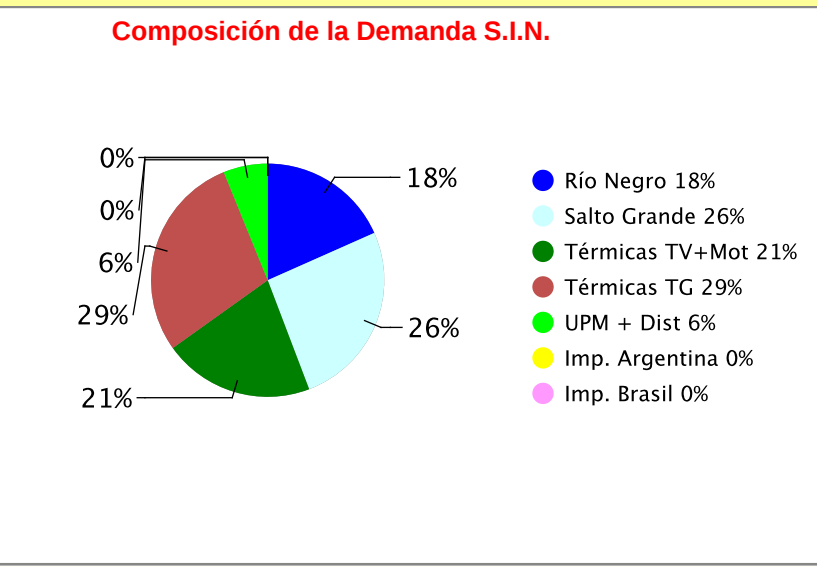



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

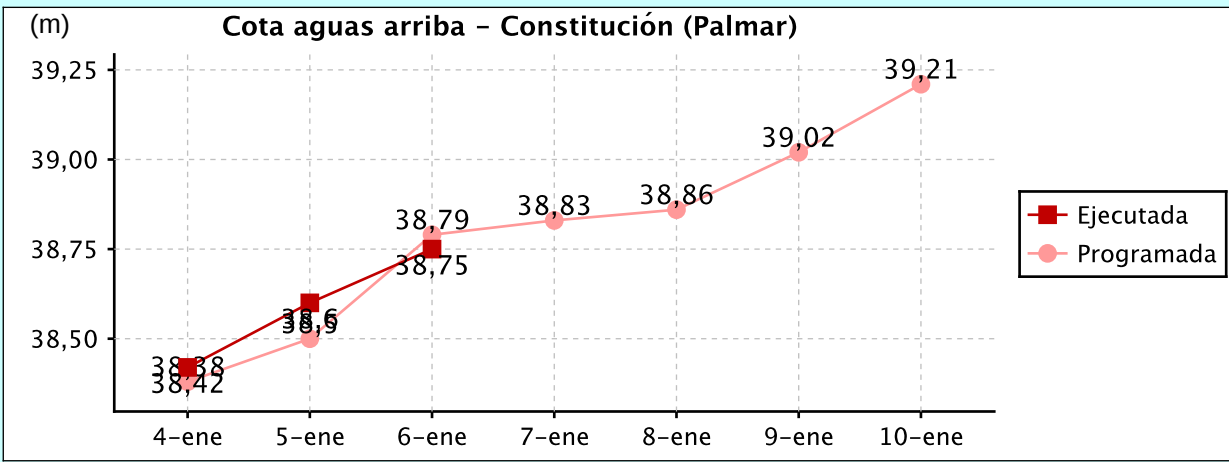
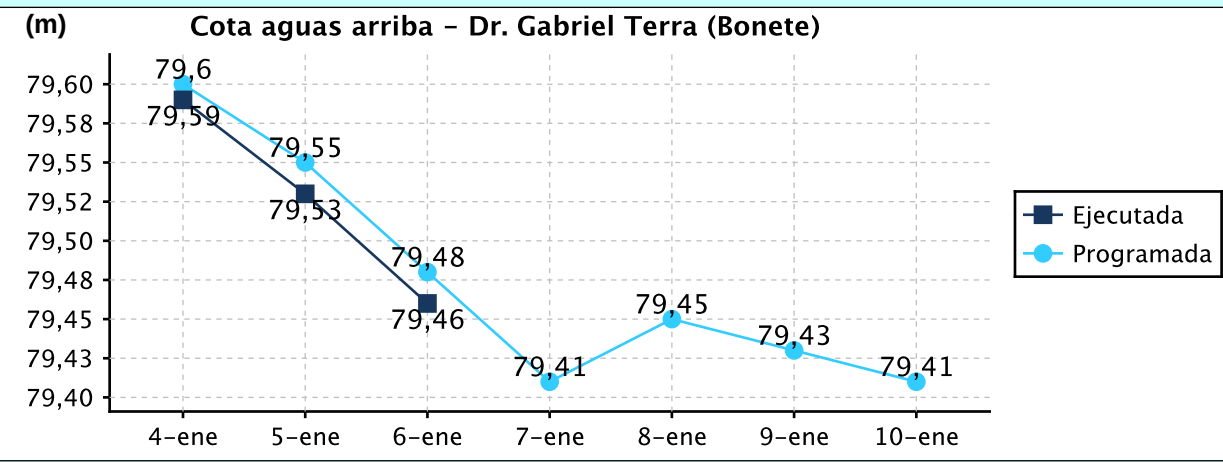


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,48	79,46
Baygorria	53,97	54,03
Palmar	38,79	38,75
SGU	34,05	34,02

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

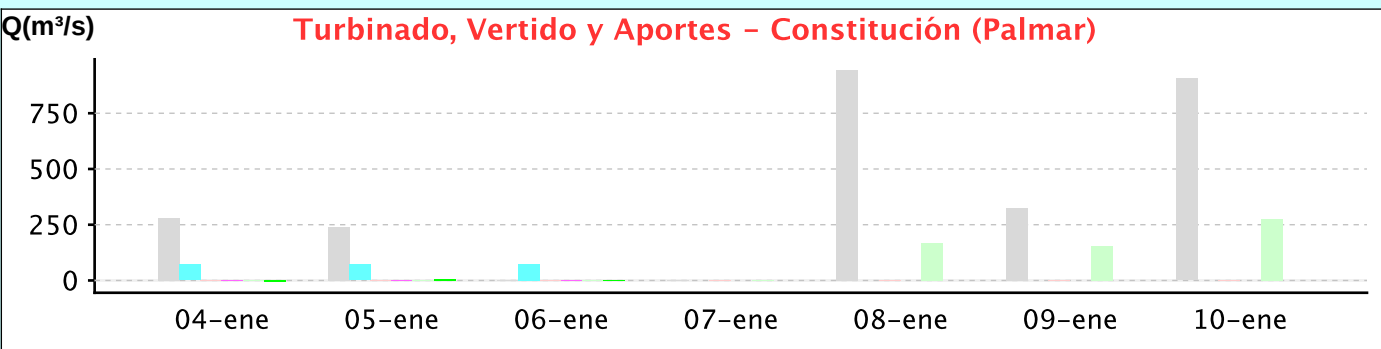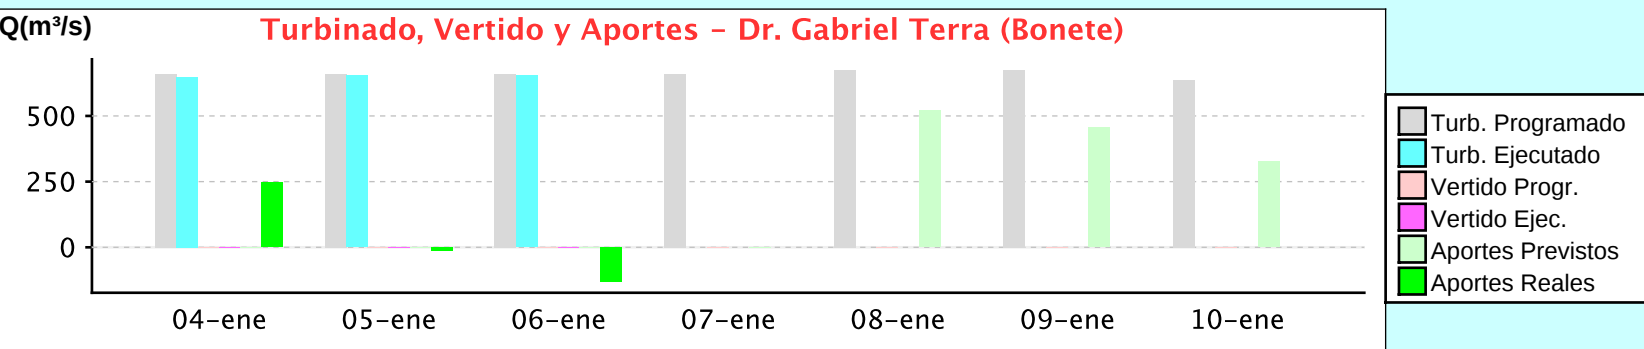

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

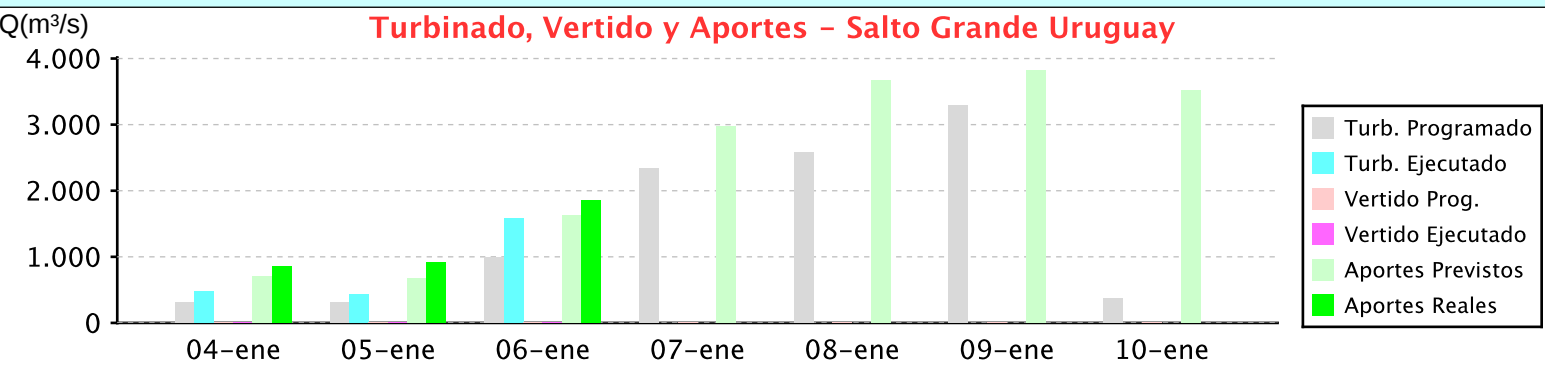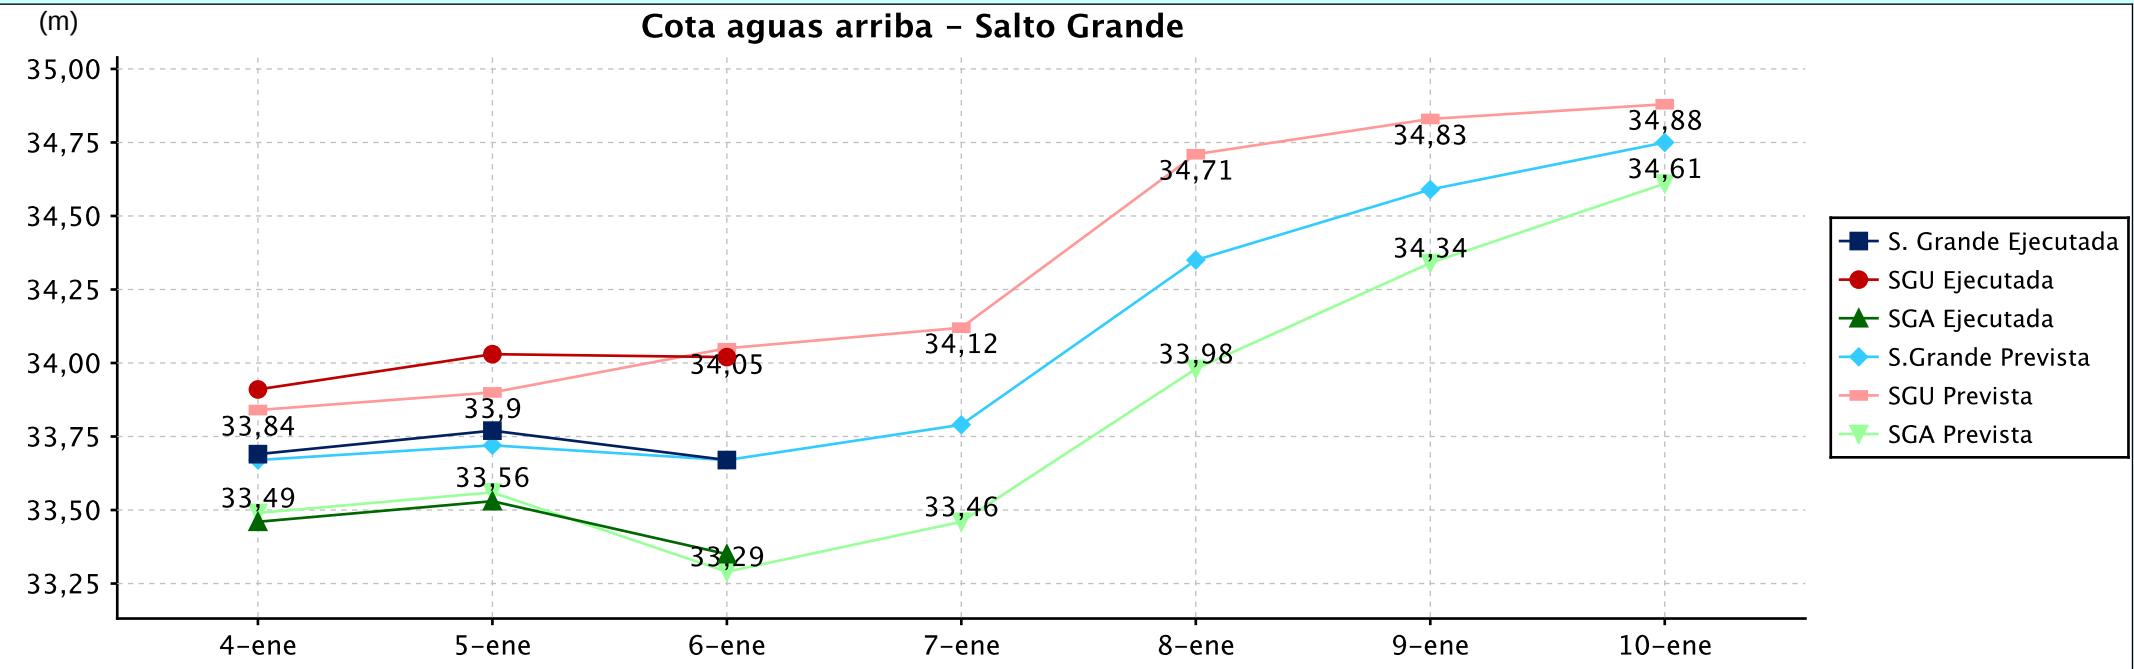

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,02
Cota Vista Arg	33,35
Cota real	33,67

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	13.408
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	659	653
Baygorria	621	554
Palmar	0	72
SGU	993	1.576

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-133
Baygorria	0	-16
Palmar	0	3
SGU	1.625	1.856

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
