



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 10 de enero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	5.489
Sala B	783
5ta.	1.300
6ta.	2.150
Motores	1.255
Central La Tablada	0
Central P. del Tigre	-10
APR A	-1
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	18
Aggreko MVA	18
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.769
C. Baygorria	1.662
C. Palmar	252
C. Salto Grande	17.197
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.979
TOTAL Generación	29.352

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.352
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.330
Diferencia (MWh)	-978
Ejecutada - Programada	-3,23 %

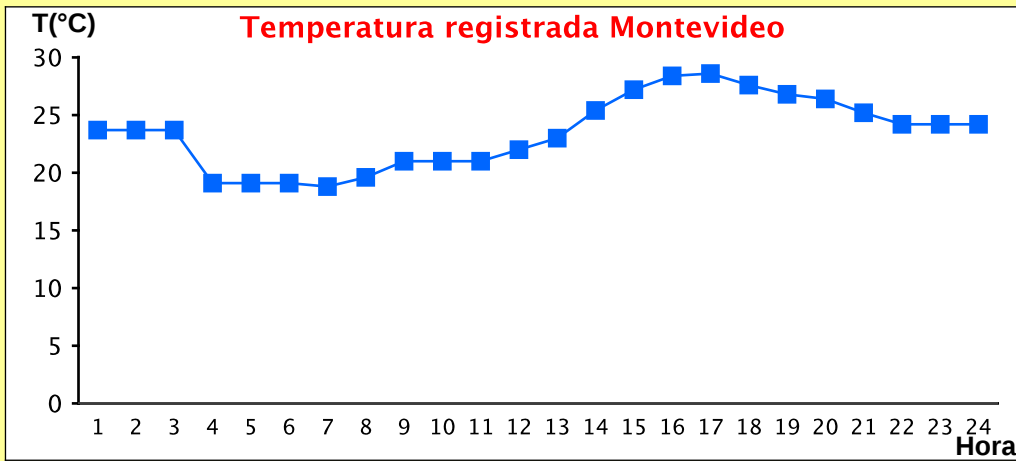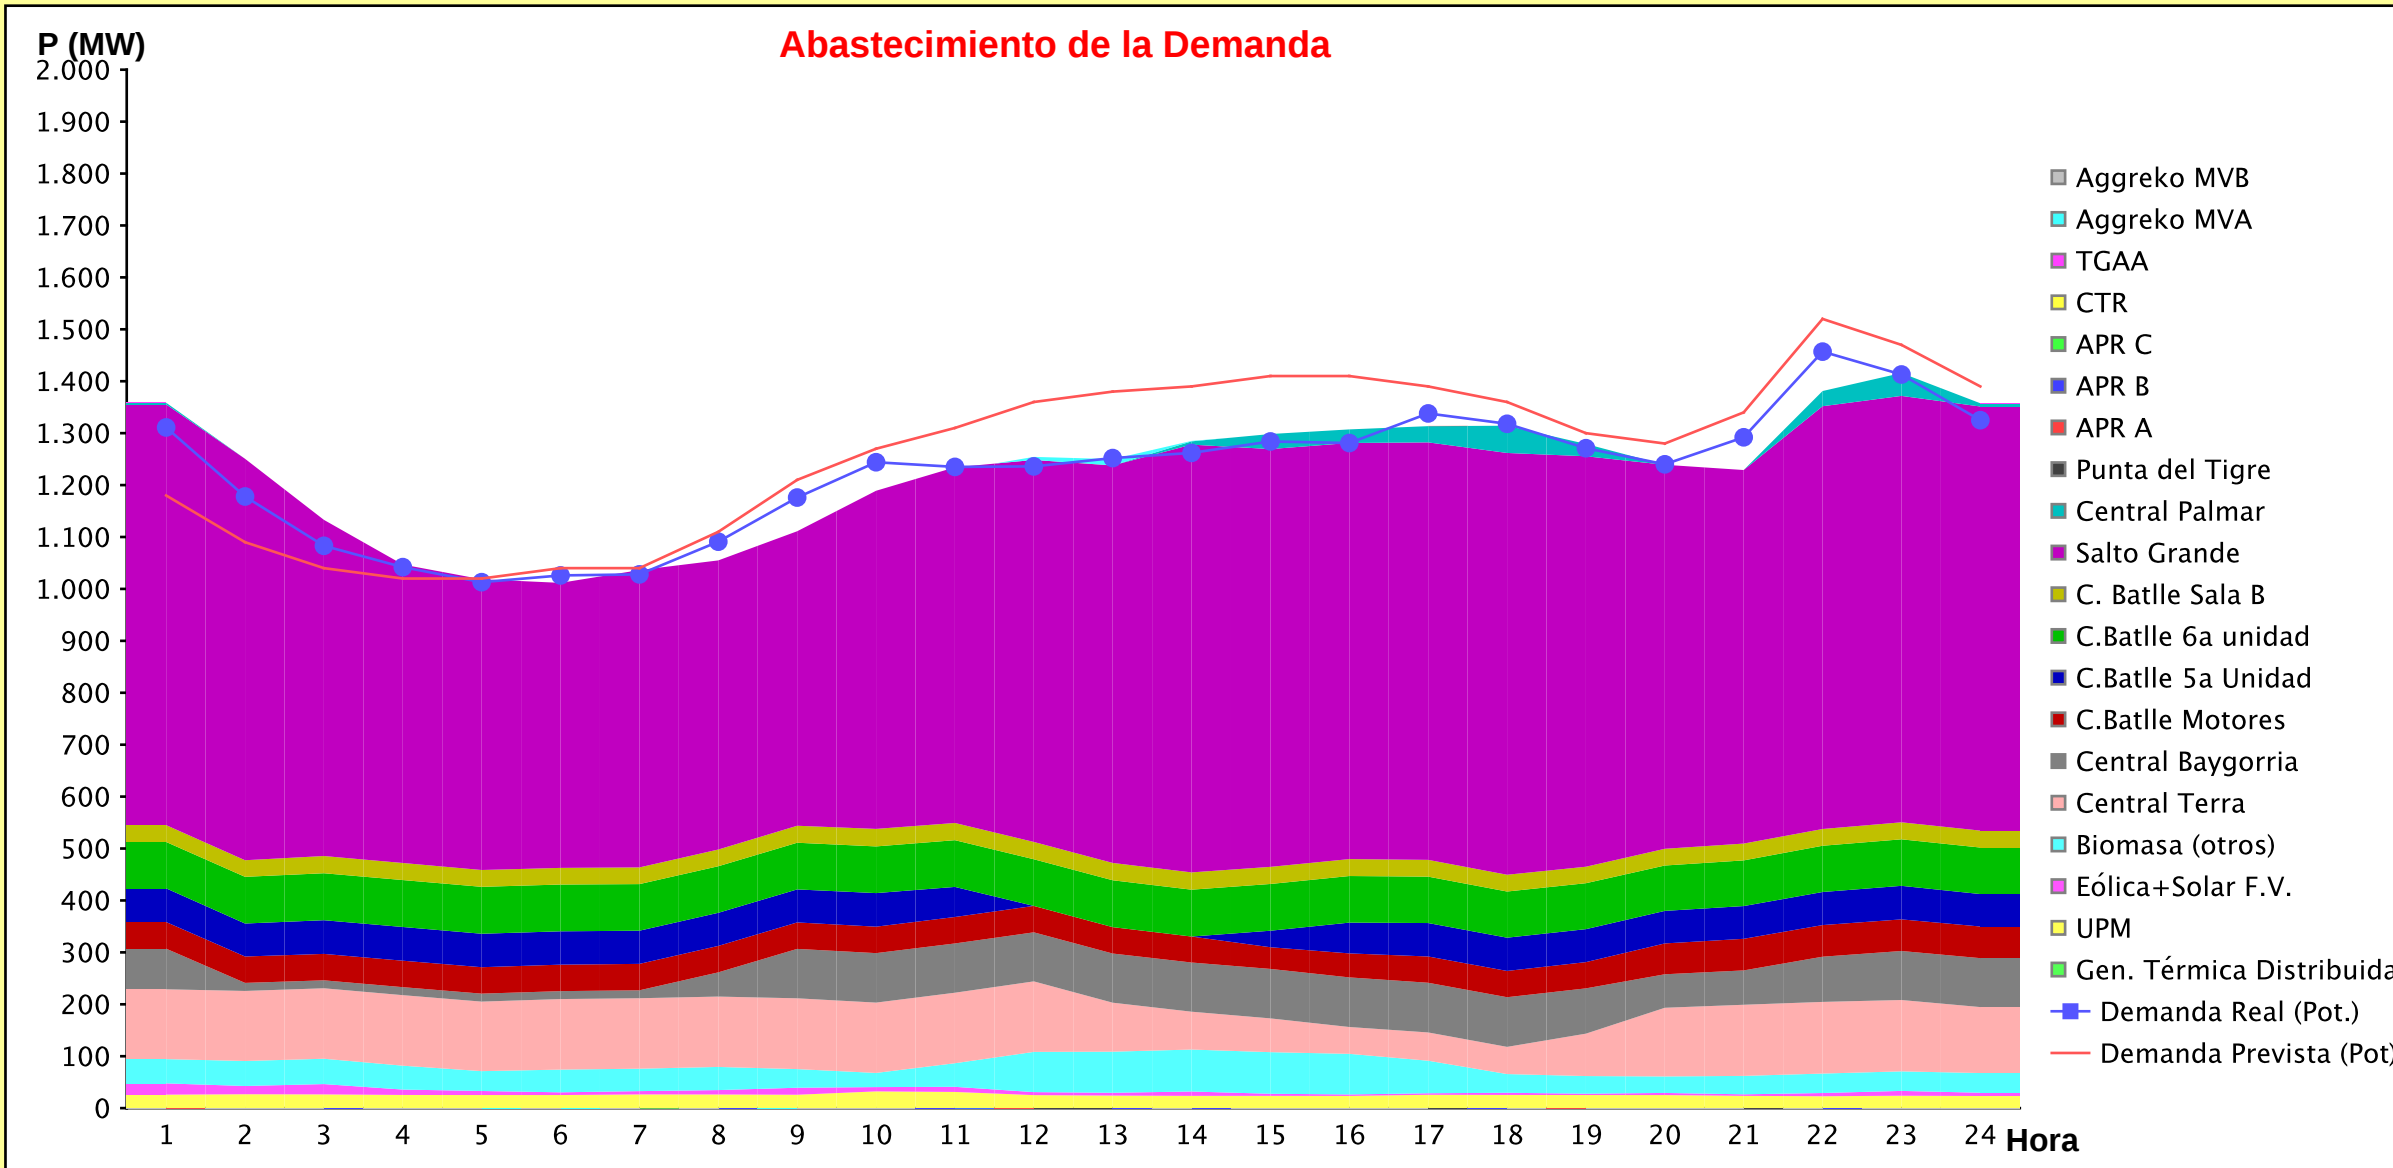



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1352,18 Hora 16:37
Potencia mínima:	1011,04 Hora 04:41
Pico noche:	1469,54 Hora 21:52

Generación Media (MW)	
Eólica	8,9
Biomasa	76,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

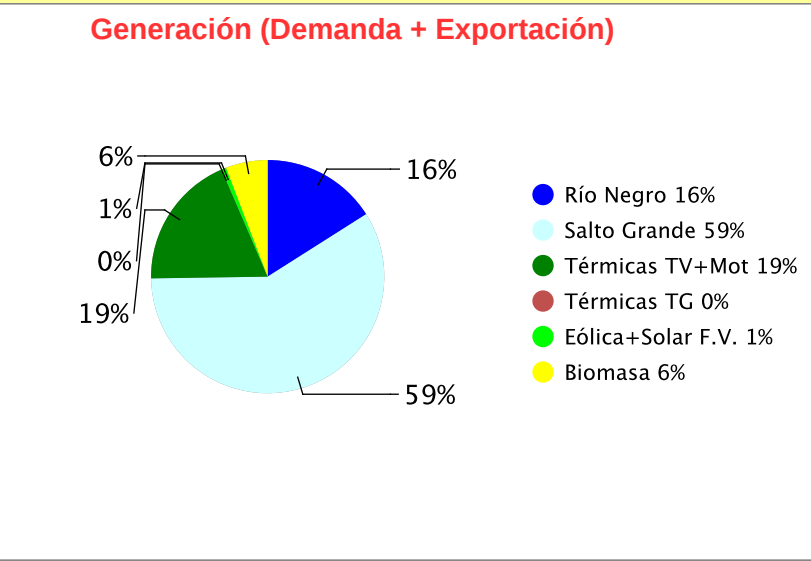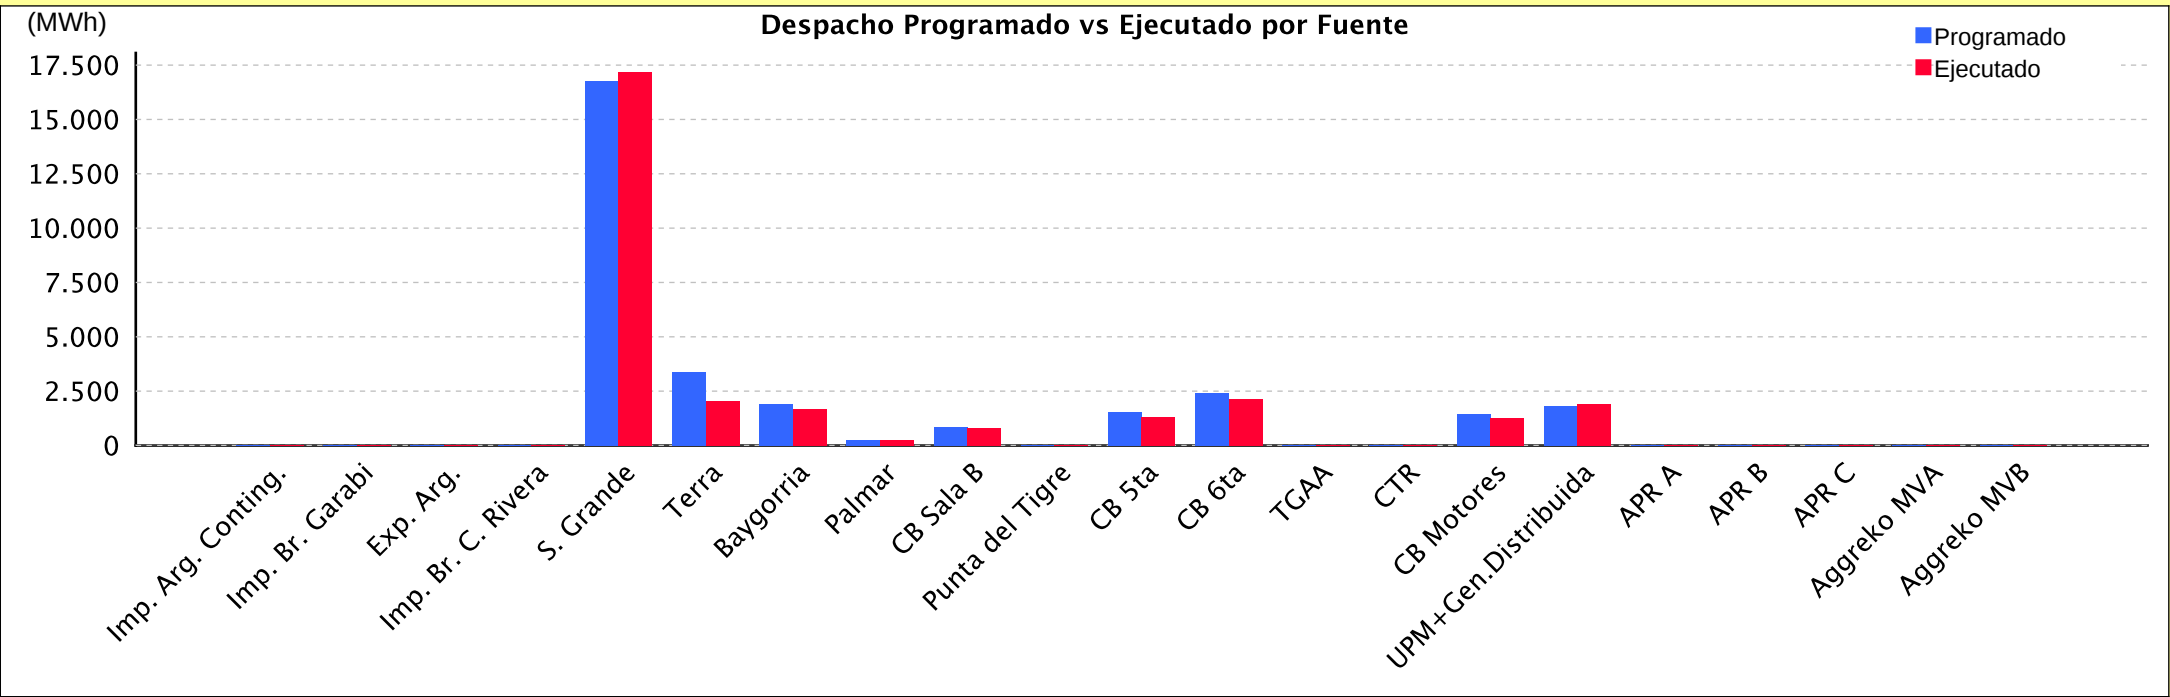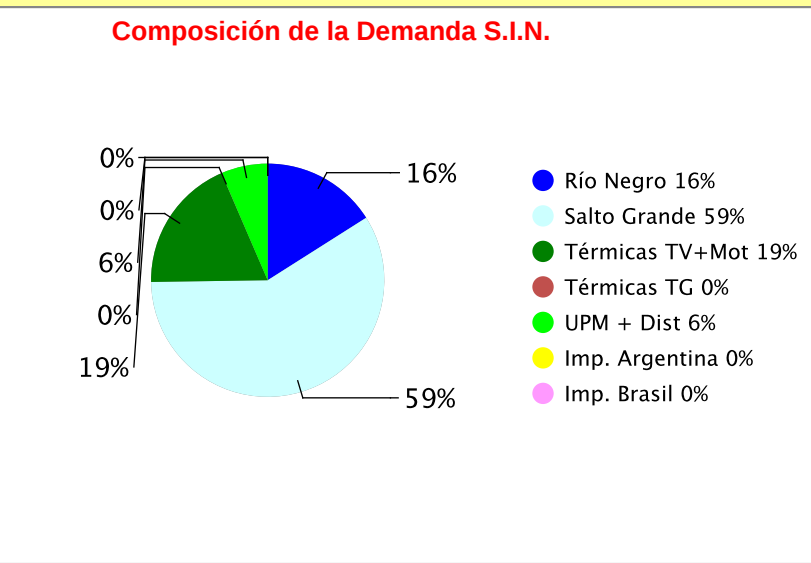



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

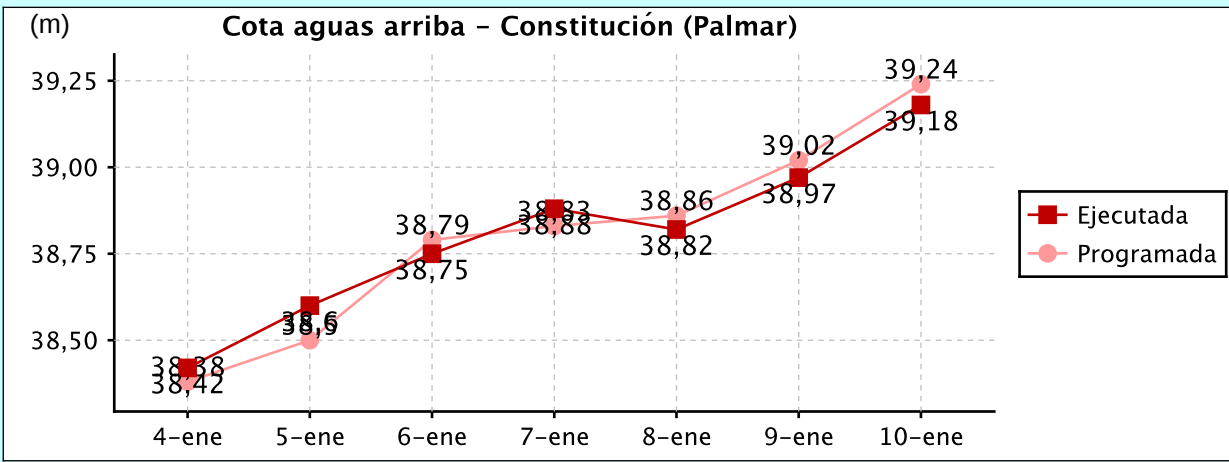
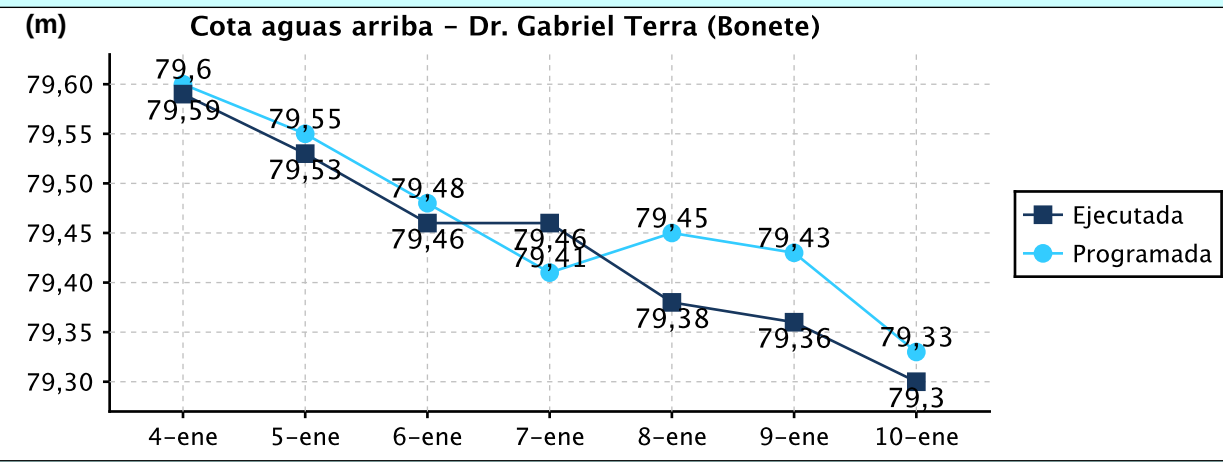


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,33	79,3
Baygorria	53,98	54
Palmar	39,24	39,18
SGU	35,08	35,03

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

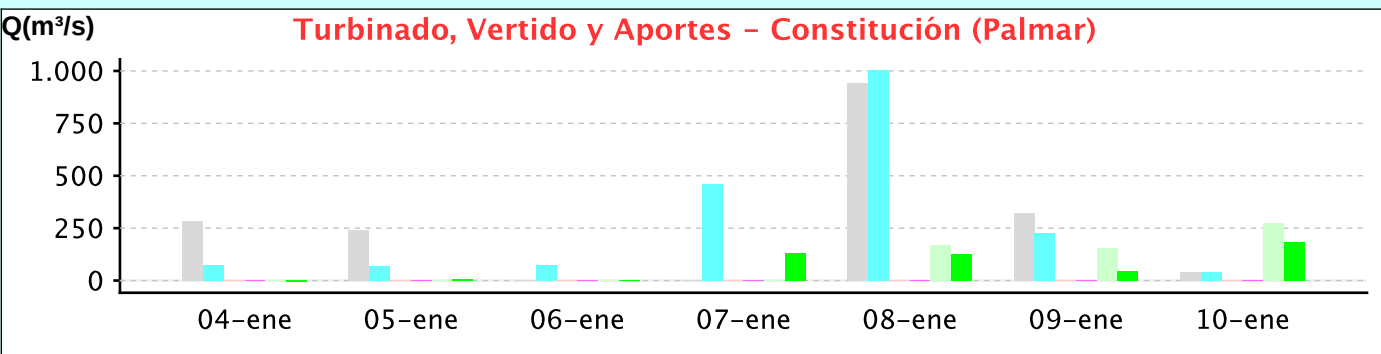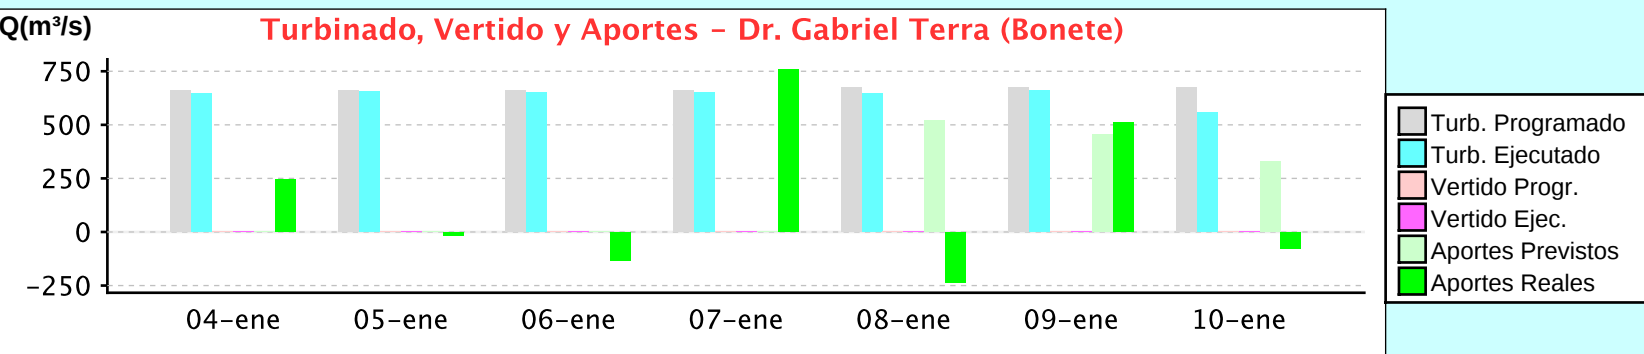

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

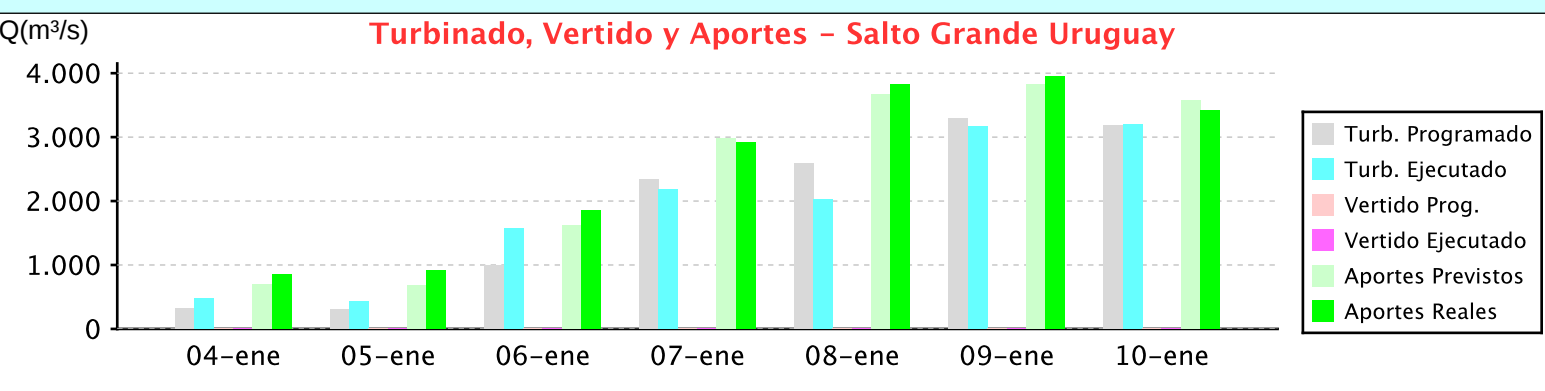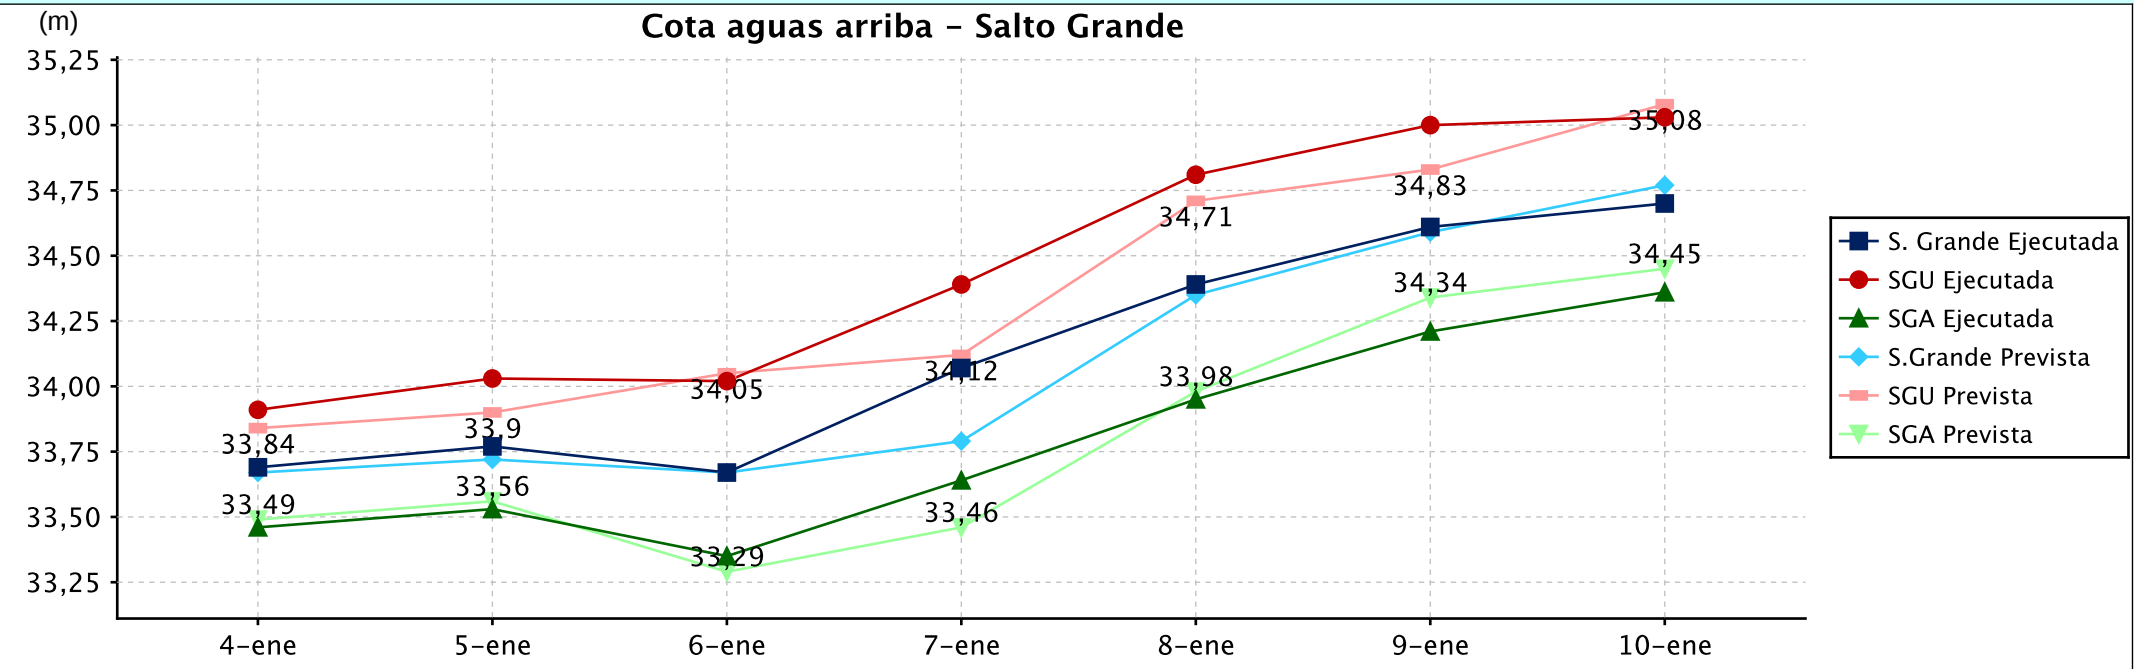

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,03
Cota Vista Arg	34,36
Cota real	34,70

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	15.331
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	675	559
Baygorria	616	561
Palmar	39	40
SGU	3.183	3.205

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	327	-77
Baygorria	14	27
Palmar	274	185
SGU	3.575	3.423

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
