



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 12 de enero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	2.517
Sala B	799
5ta.	949
6ta.	774
Motores	-6
Central La Tablada	0
Central P. del Tigre	-11
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.240
C. Baygorria	1.768
C. Palmar	30
C. Salto Grande	13.723
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.585
TOTAL Generación	22.845

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	22.845
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.050
Diferencia (MWh)	-2.205
Ejecutada - Programada	-8,80 %

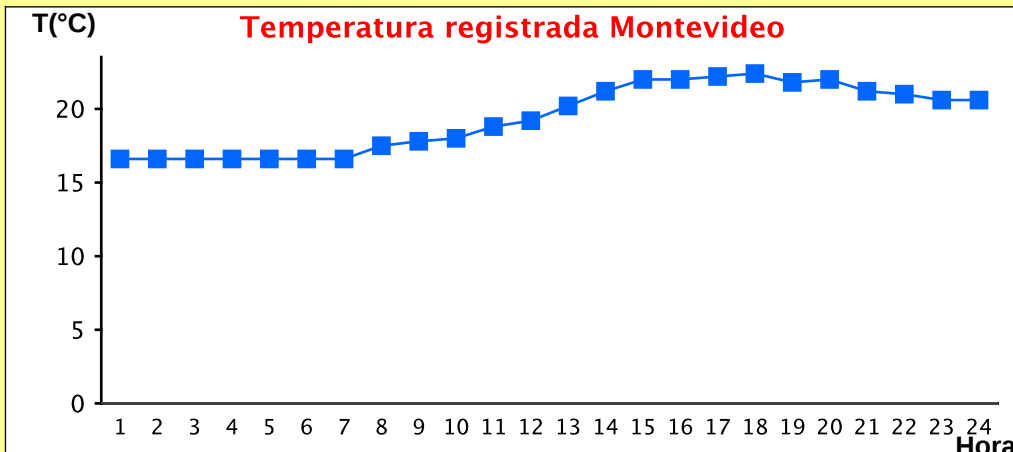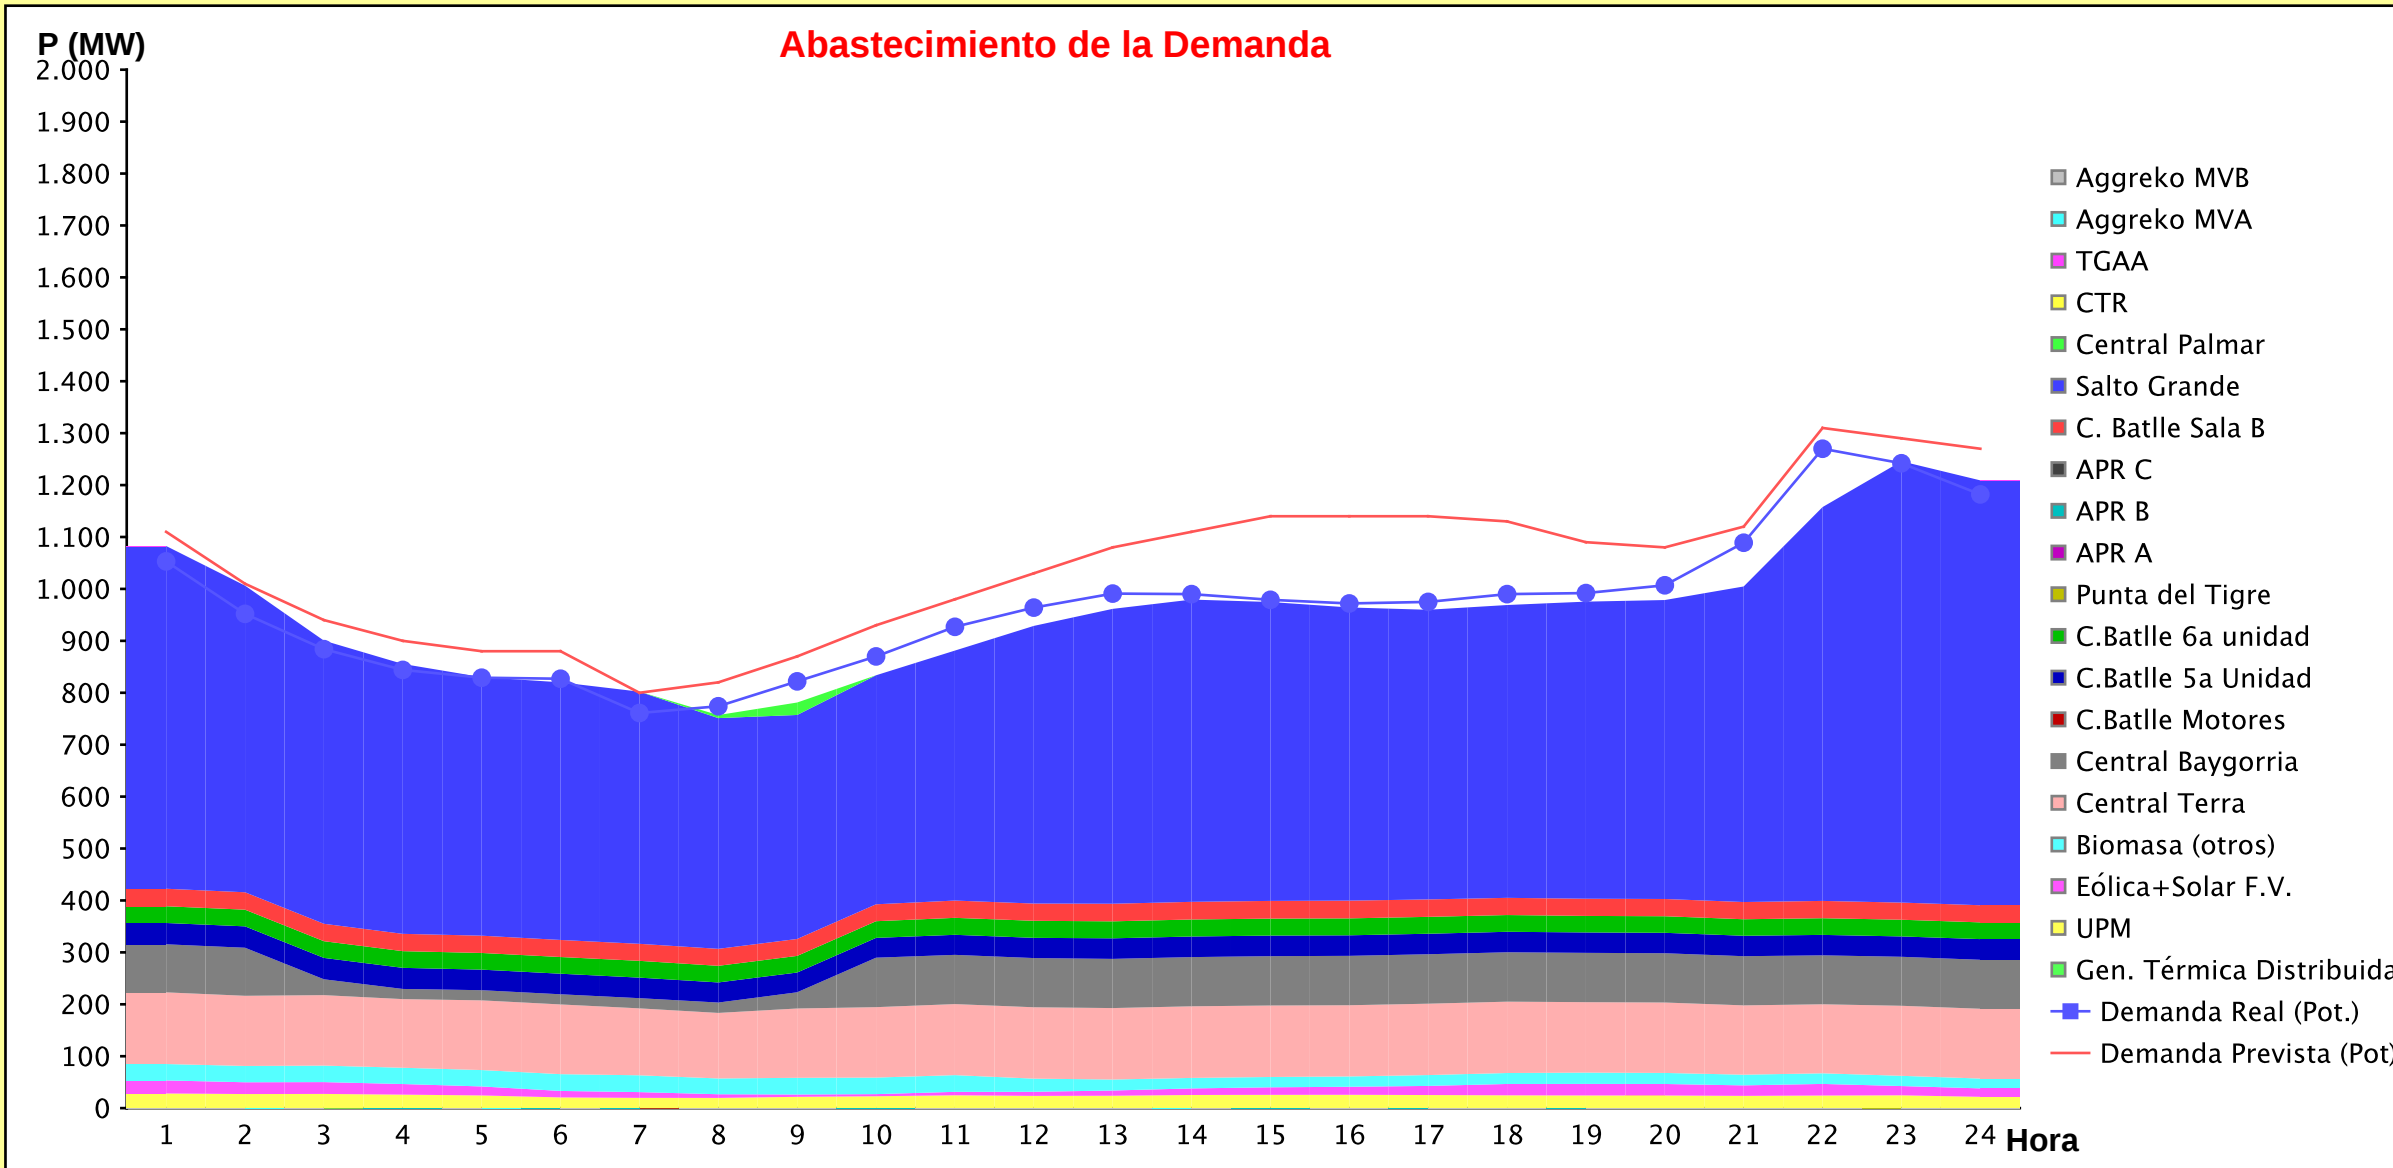



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1000,97 Hora 13:12
Potencia mínima:	757,06 Hora 07:10
Pico noche:	1278,87 Hora 22:15

Generación Media (MW)	
Eólica	15,8
Biomasa	54,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

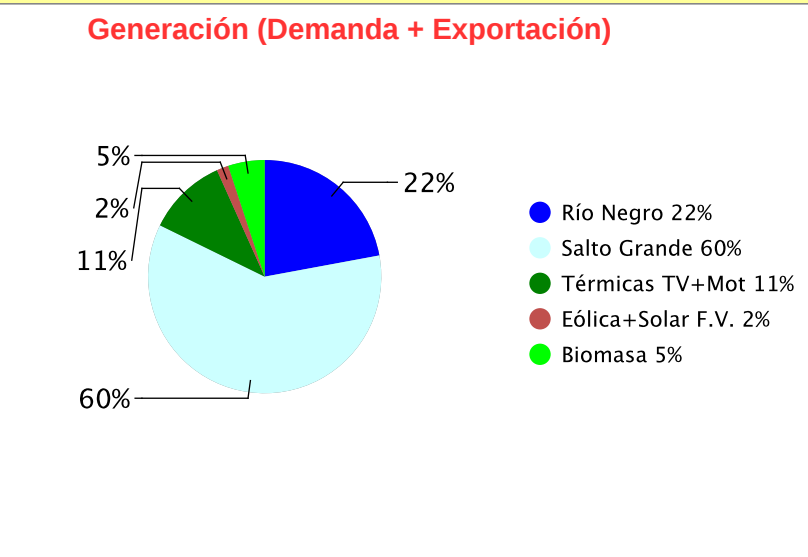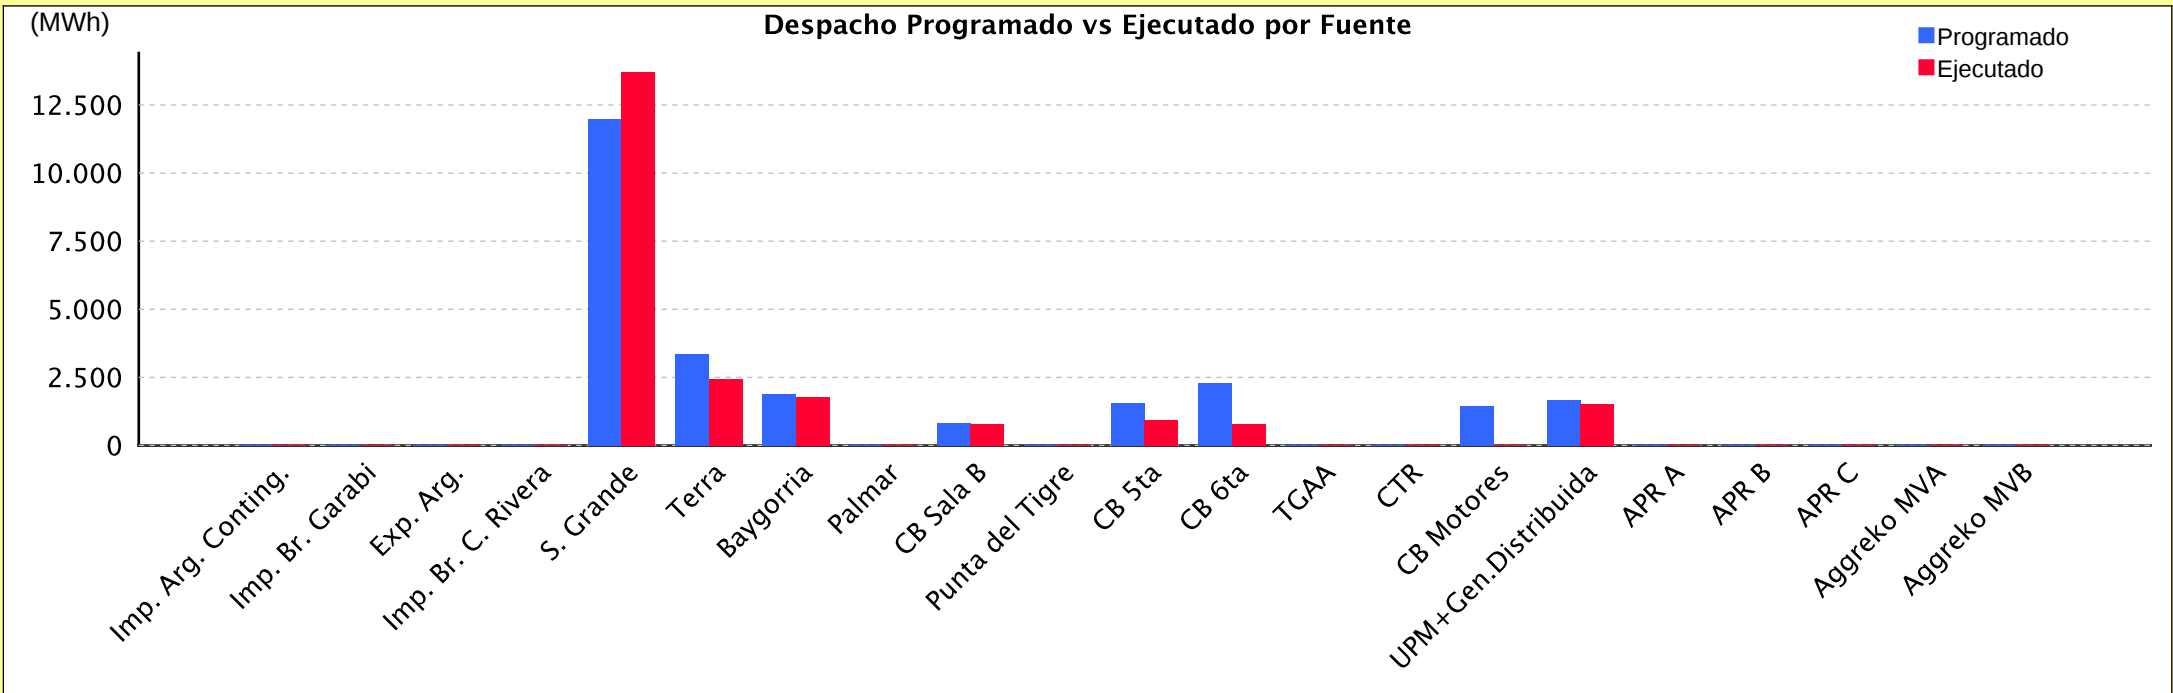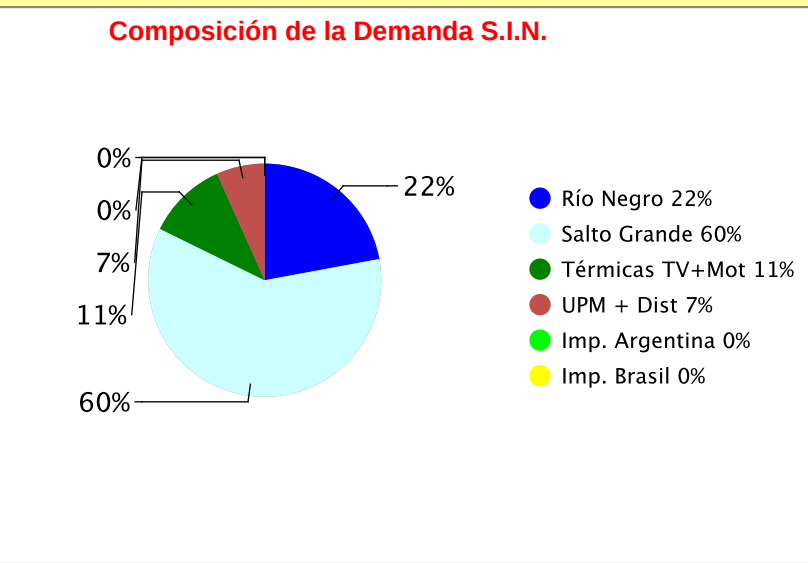



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

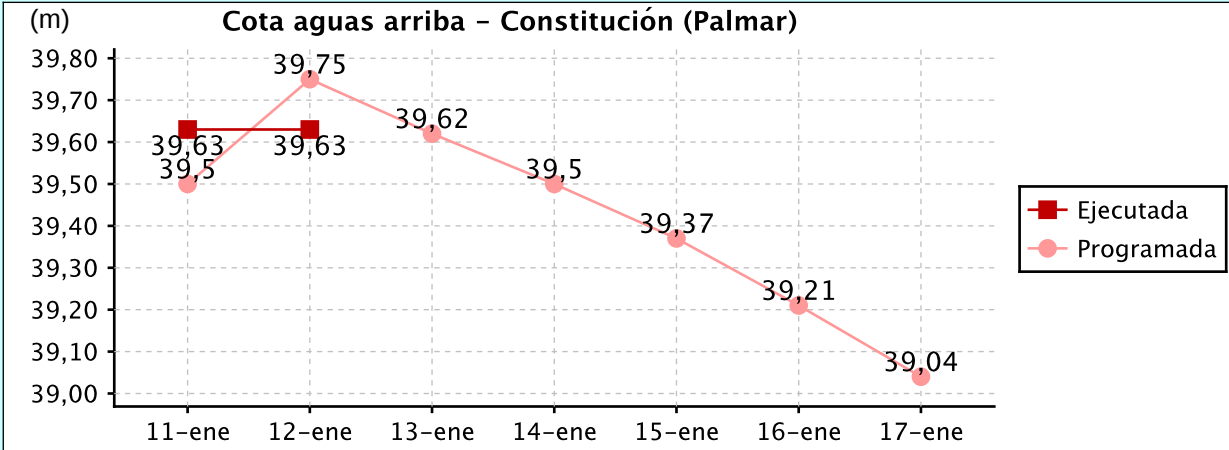
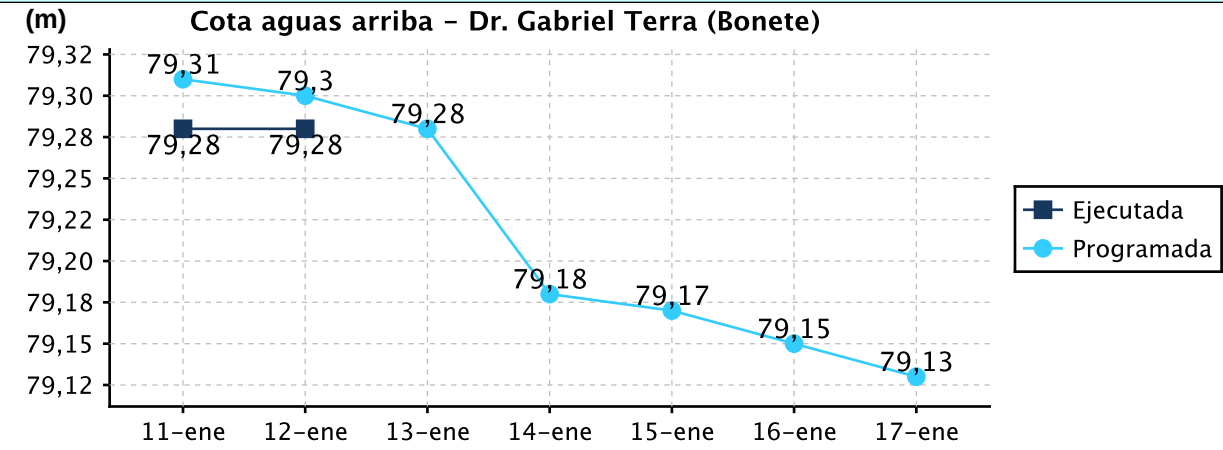


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,30	79,28
Baygorria	54,01	53,86
Palmar	39,75	39,63
SGU	35,39	35,13

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

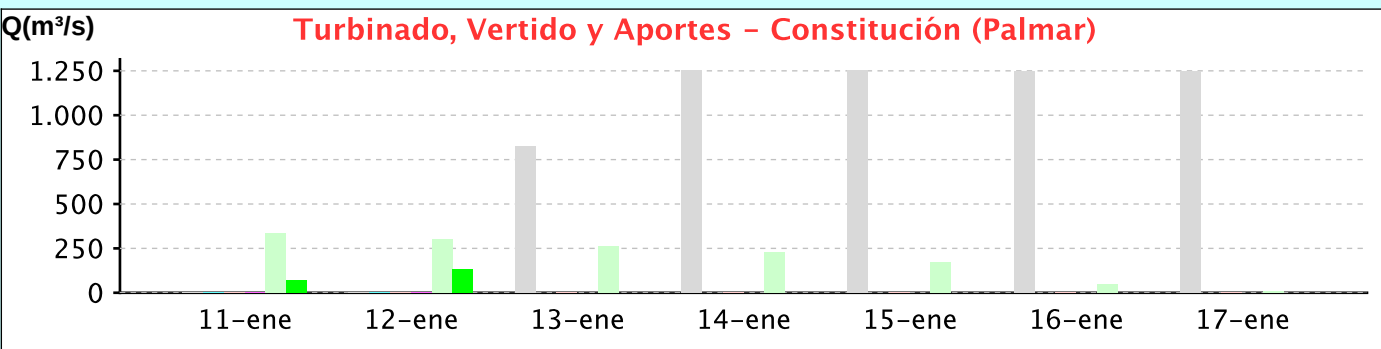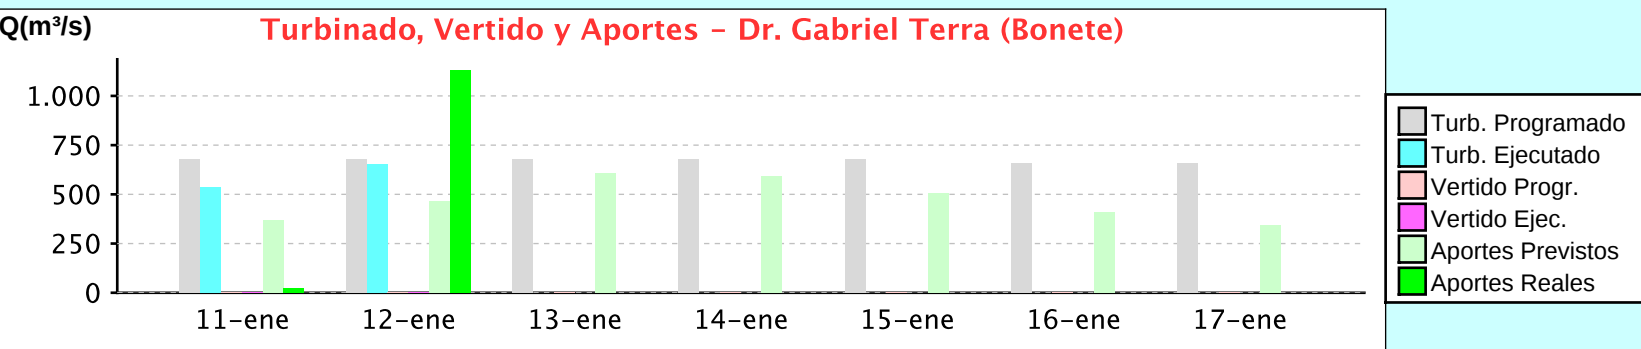

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

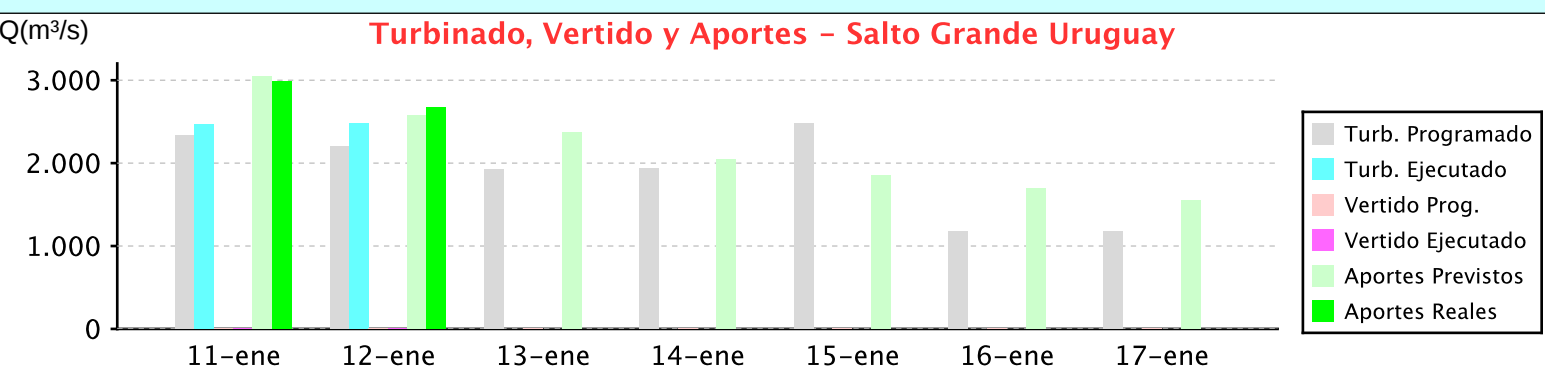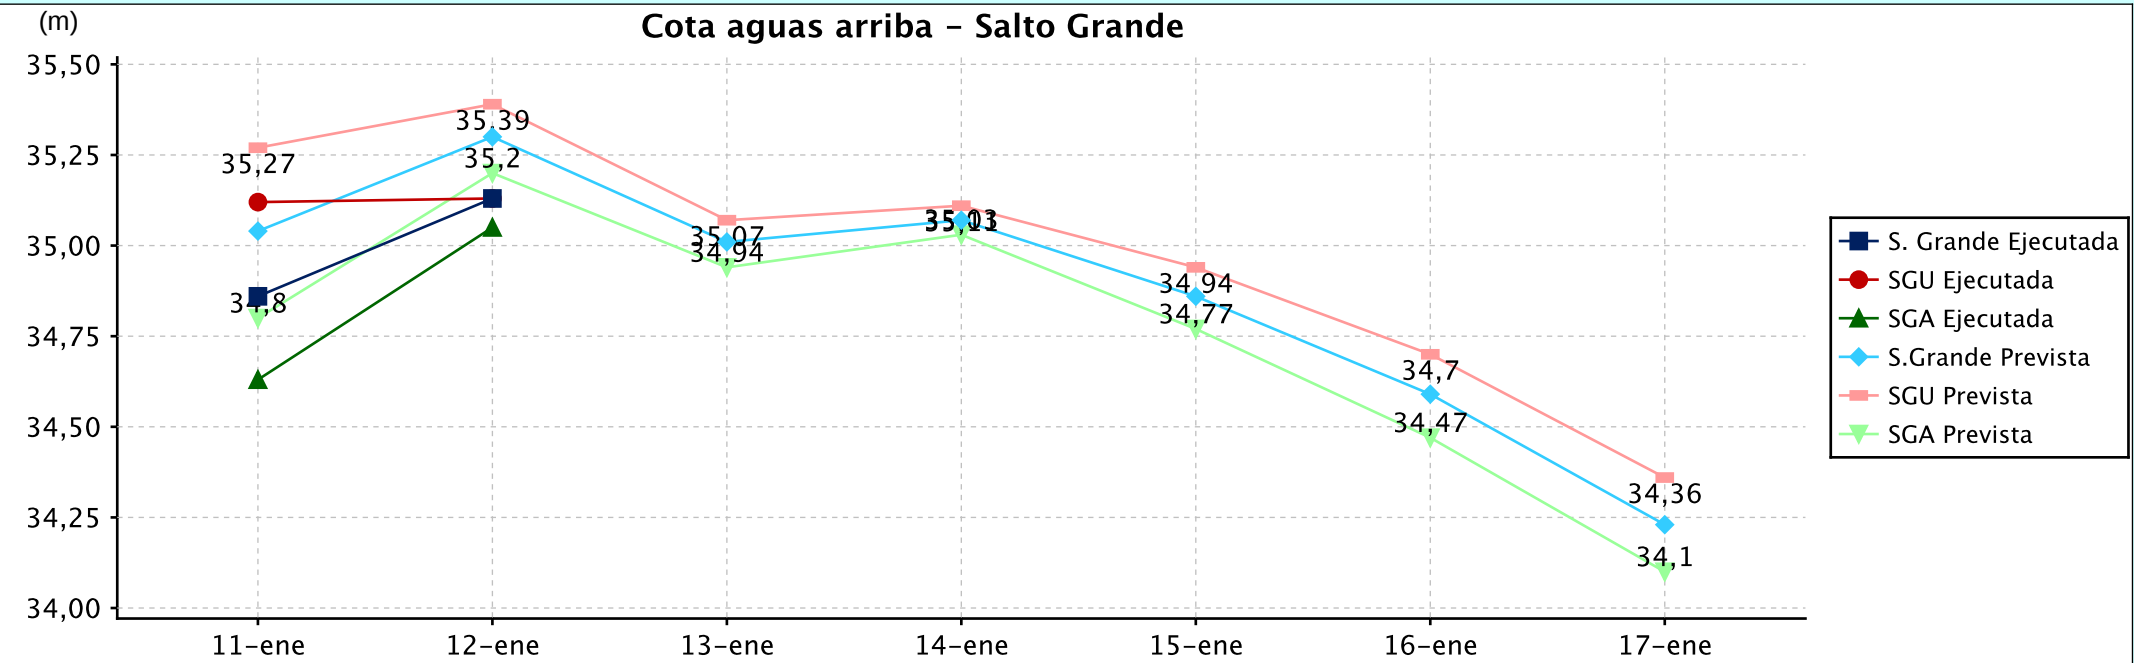

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,13
Cota Vista Arg	35,05
Cota real	35,13

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	1.958
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	678	655
Baygorria	626	628
Palmar	0	5
SGU	2.197	2.481

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	463	1.130
Baygorria	0	33
Palmar	303	131
SGU	2.575	2.678

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
