




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 13 de enero de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	3.485
Sala B	195
5ta.	1.040
6ta.	1.599
Motores	652
Central La Tablada	0
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.247
C. Baygorria	1.888
C. Palmar	5.443
C. Salto Grande	12.466
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.324
TOTAL Generación	27.838

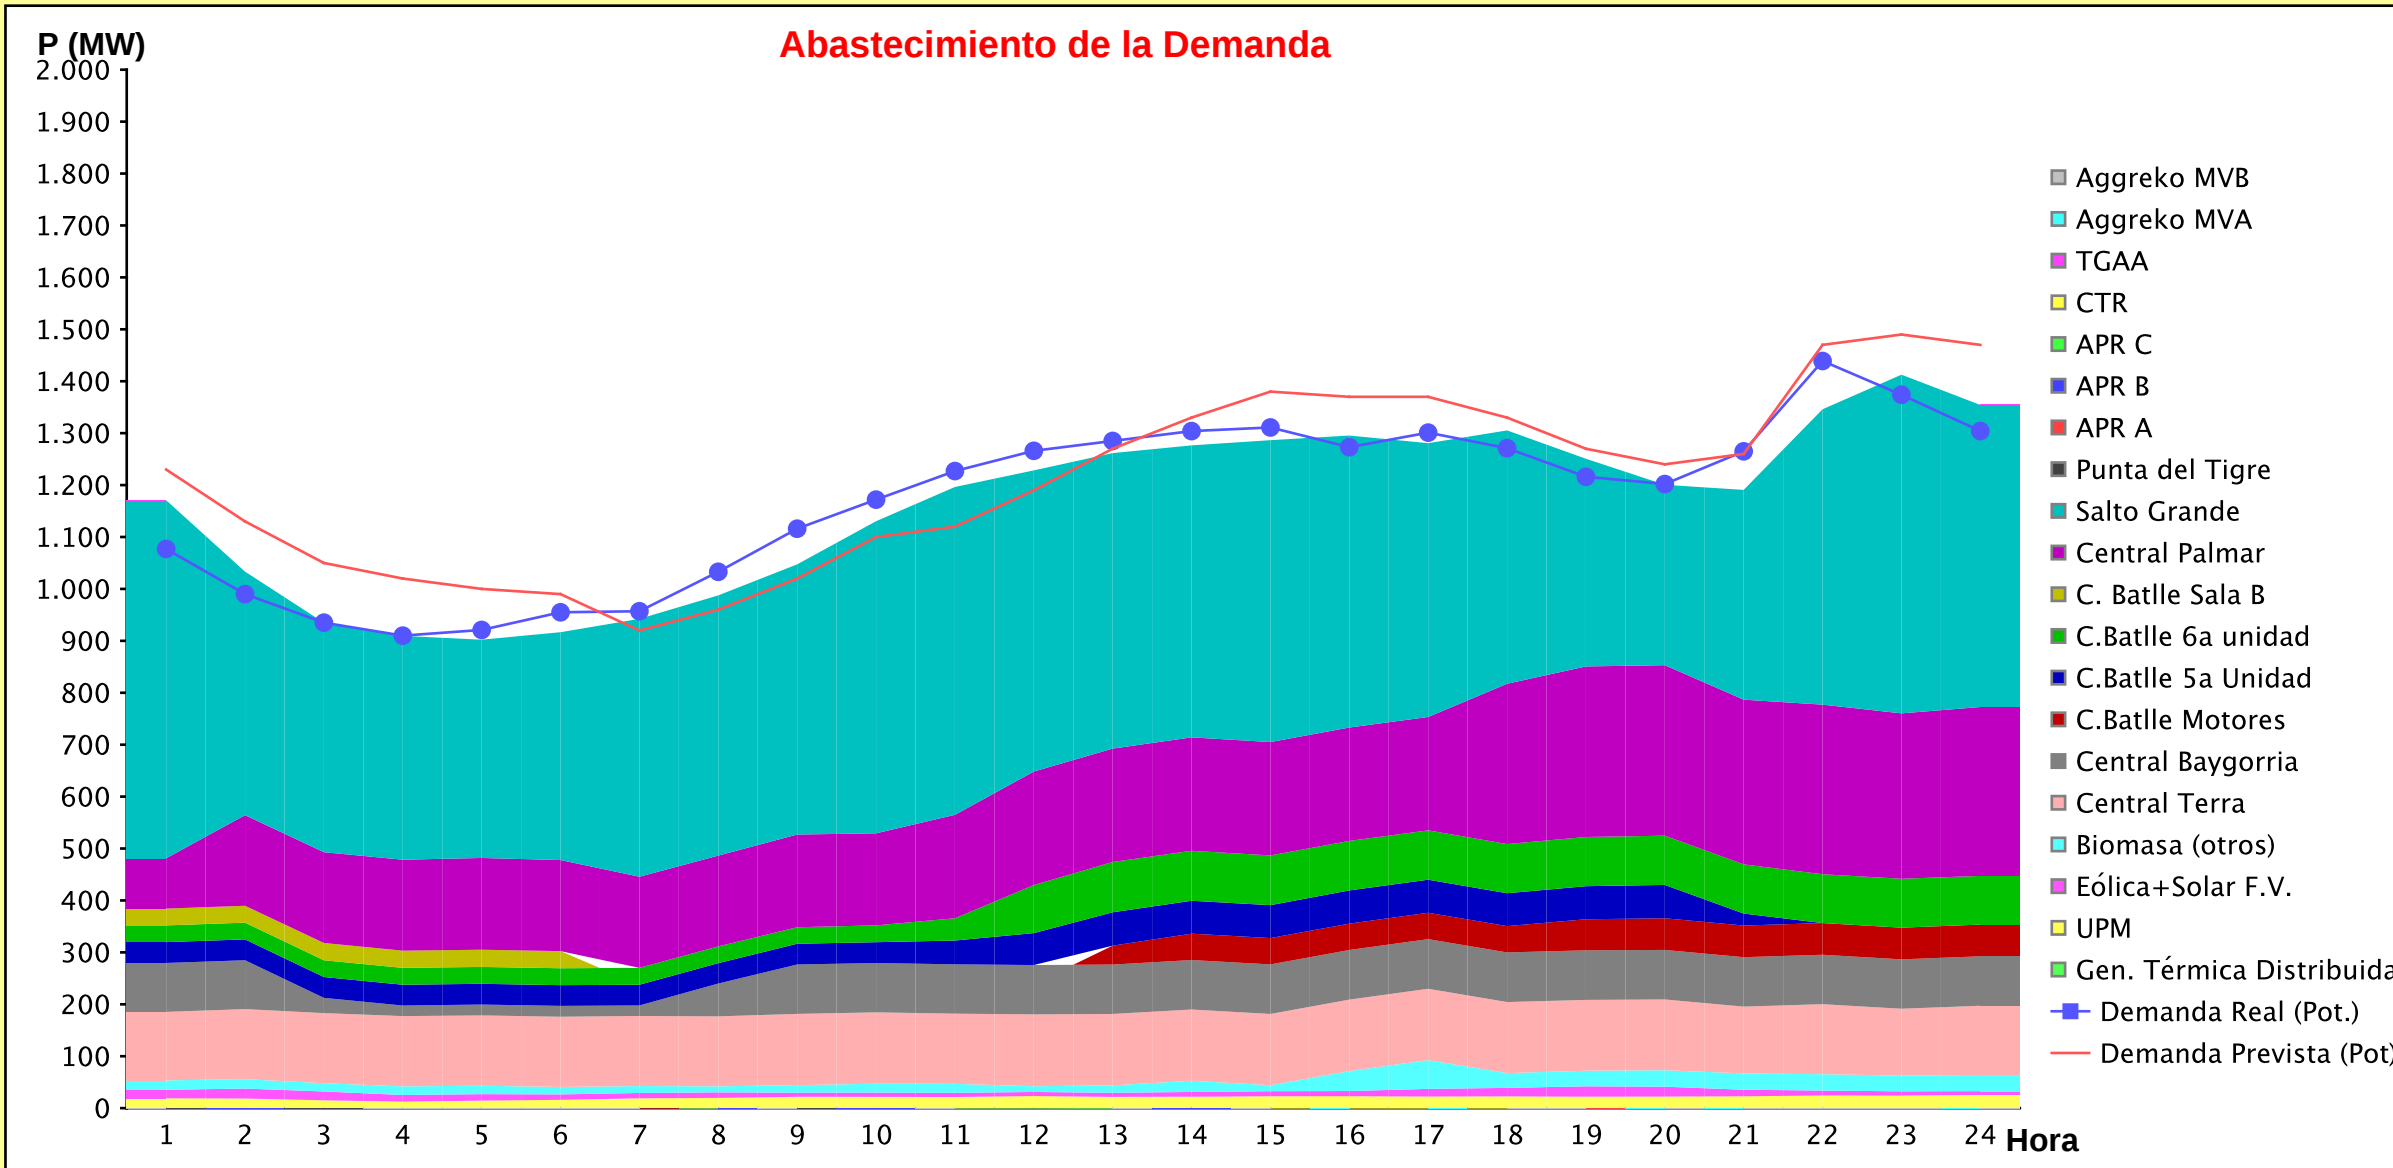

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.838
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.980
Diferencia (MWh)	-1.142
Ejecutada - Programada	-3,94 %

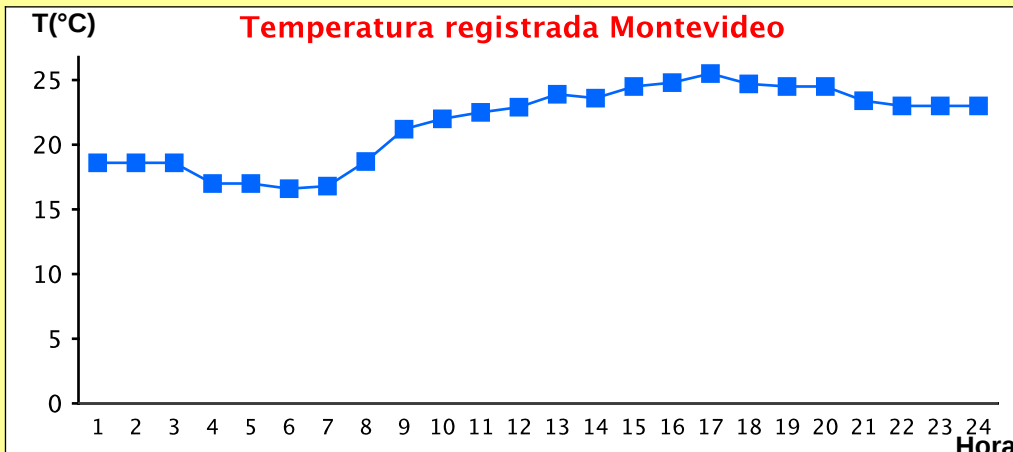



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1324,4 Hora 14:46
Potencia mínima:	907,62 Hora 03:41
Pico noche:	1457,51 Hora 21:52

Generación Media (MW)	
Eólica	12,7
Biomasa	47,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

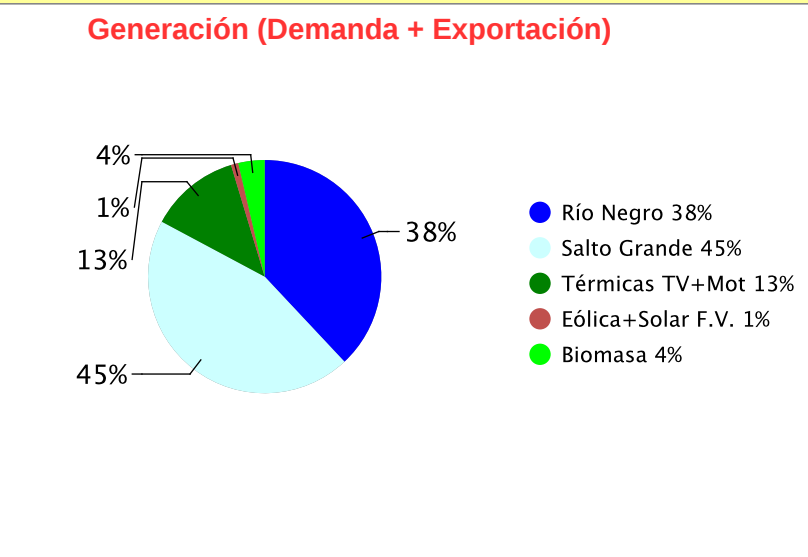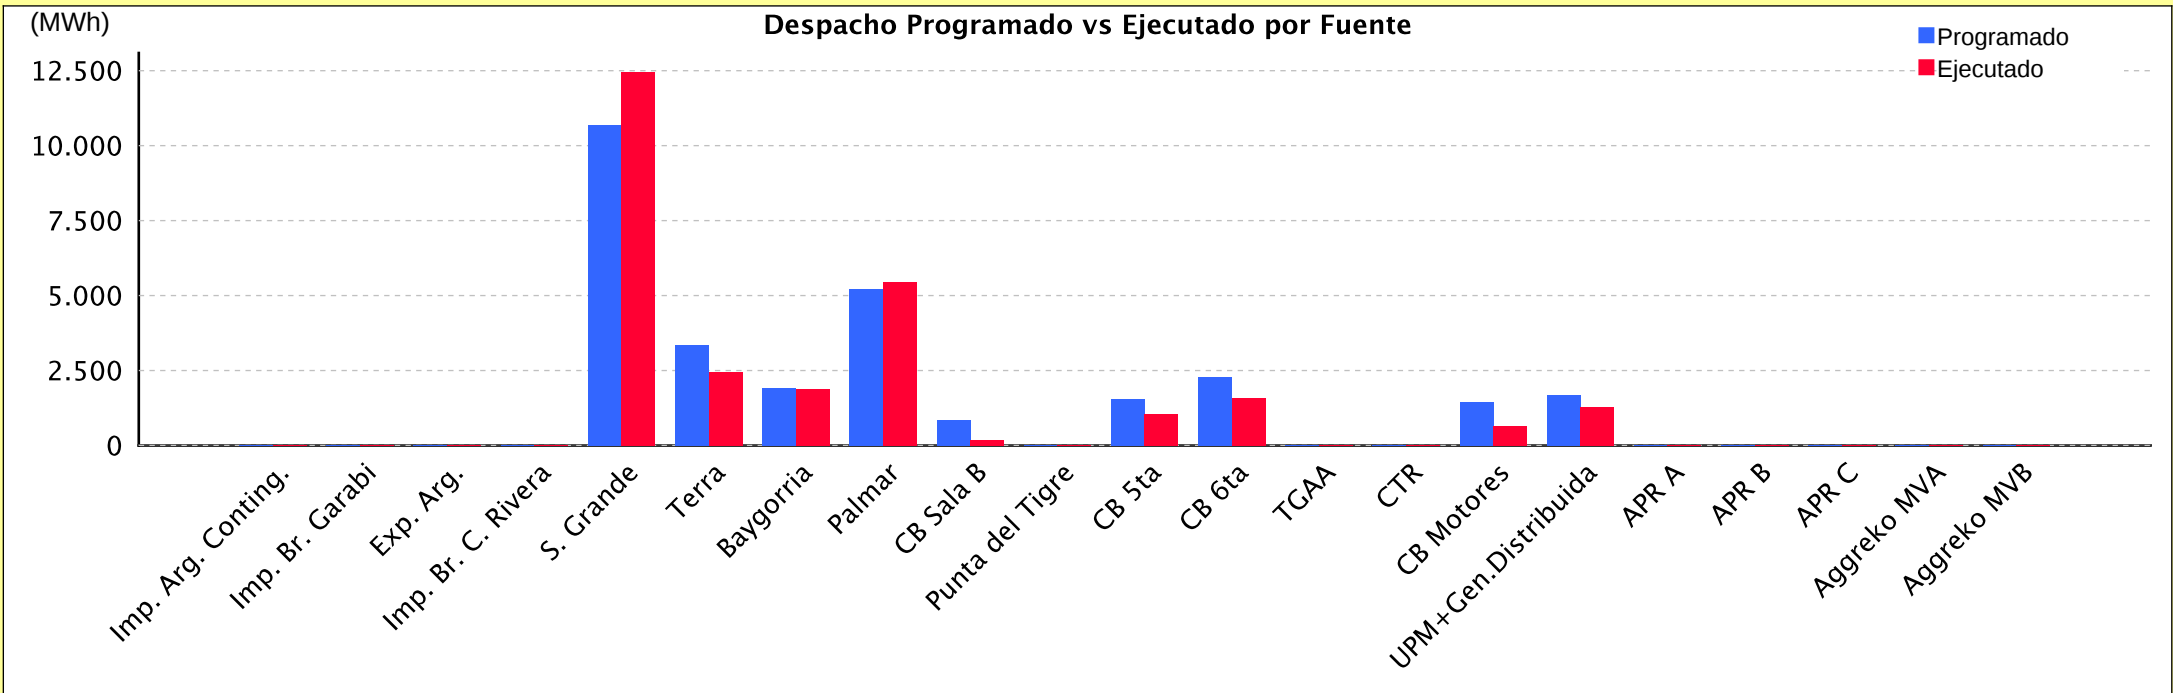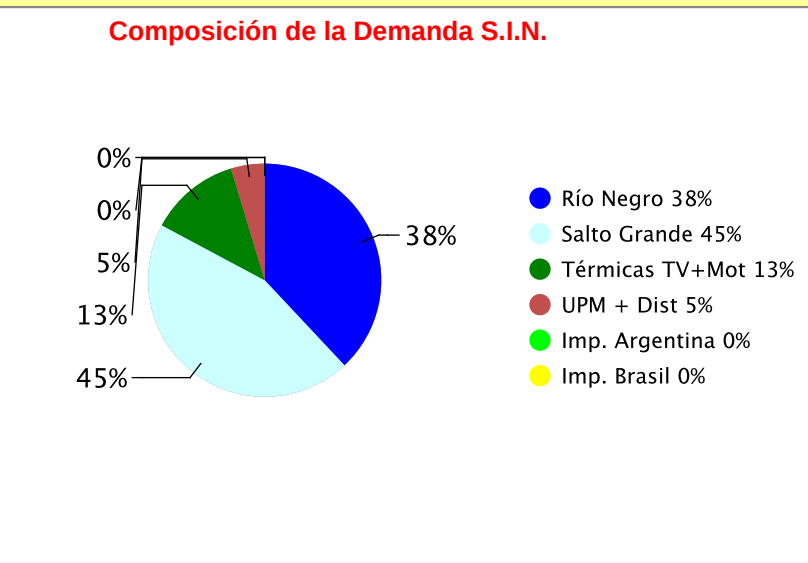



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

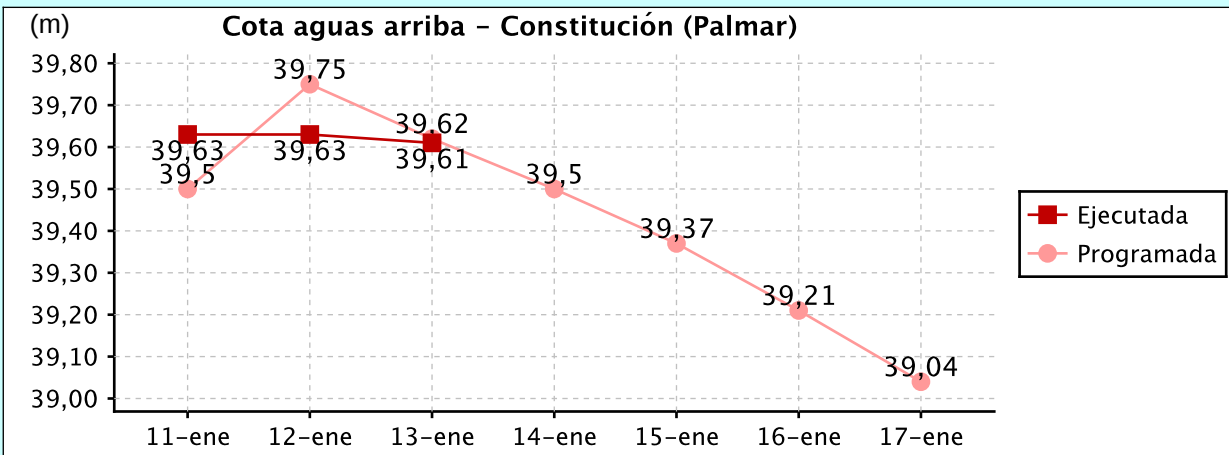
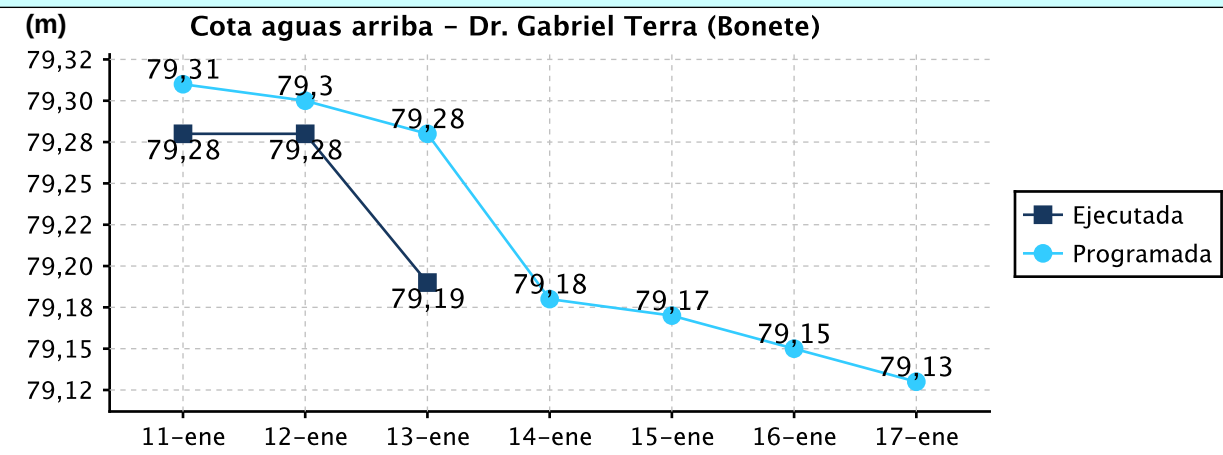


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,28	79,19
Baygorria	53,88	53,84
Palmar	39,62	39,61
SGU	35,07	35,23

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

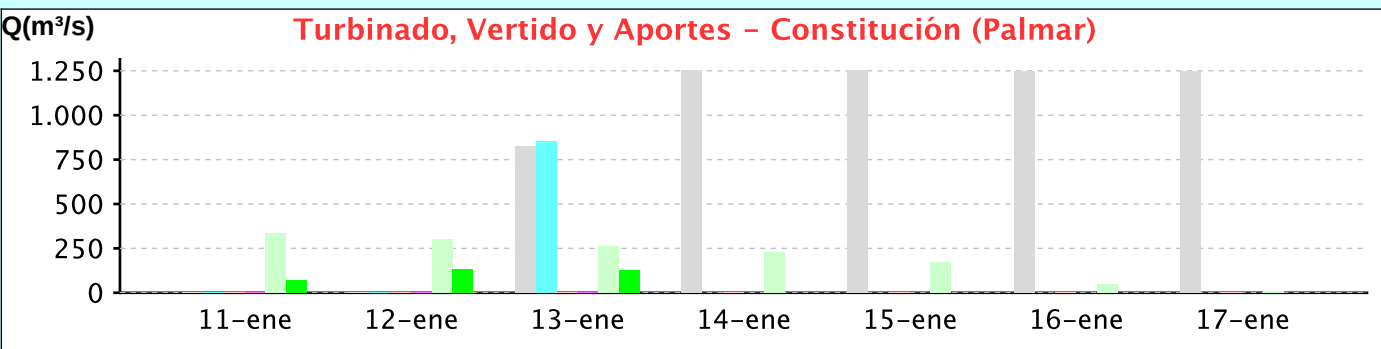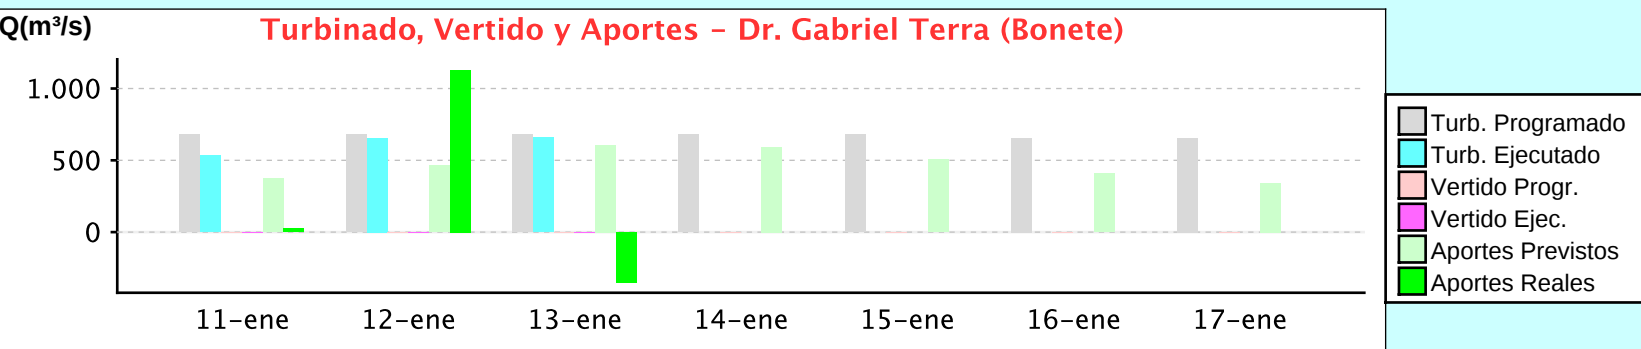

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

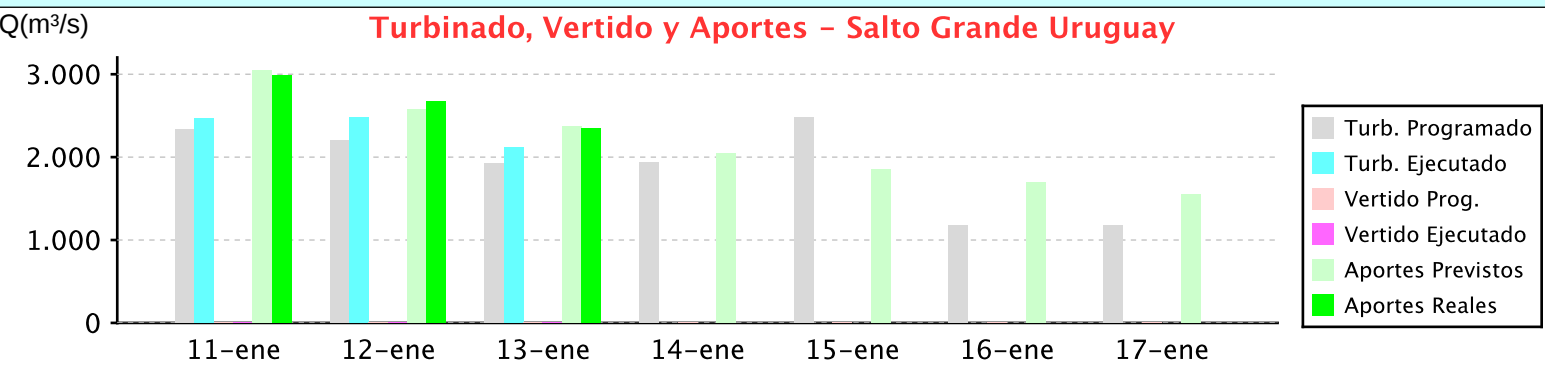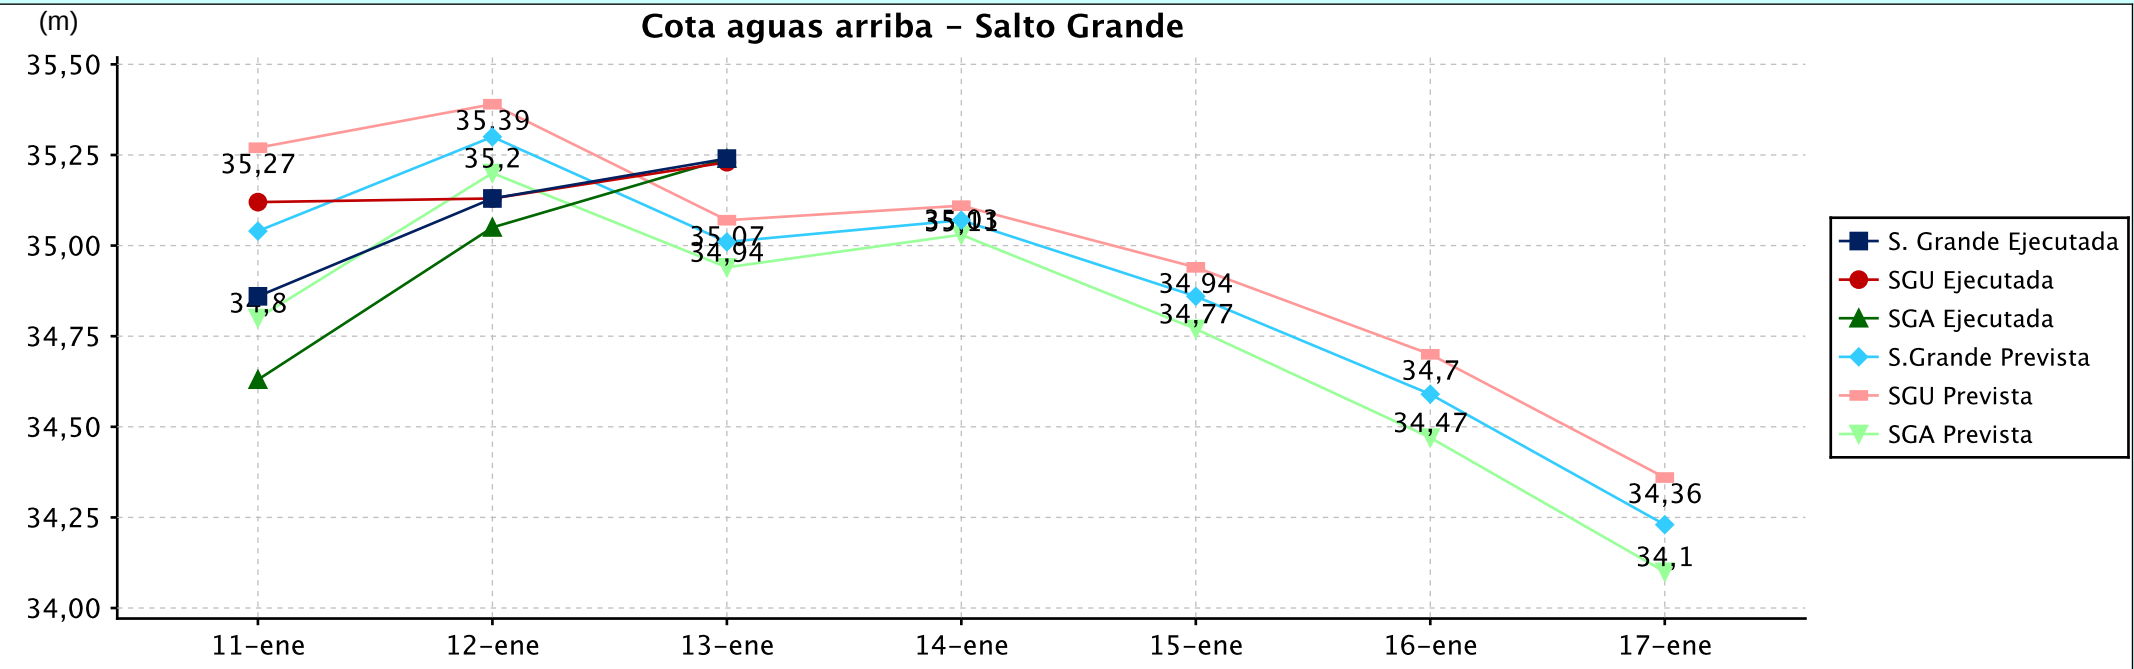

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,23
Cota Vista Arg	35,24
Cota real	35,24
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-131

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	678	659
Baygorria	626	681
Palmar	825	853
SGU	1.926	2.120

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	607	-348
Baygorria	0	13
Palmar	260	128
SGU	2.375	2.350

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
