



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 14 de enero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.603
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.251
Motores	1.356
Central La Tablada	0
Central P. del Tigre	-11
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.230
C. Baygorria	1.917
C. Palmar	7.841
C. Salto Grande	11.420
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.507
TOTAL Generación	29.502

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.502
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.560
Diferencia (MWh)	-1.058
Ejecutada - Programada	-3,46 %

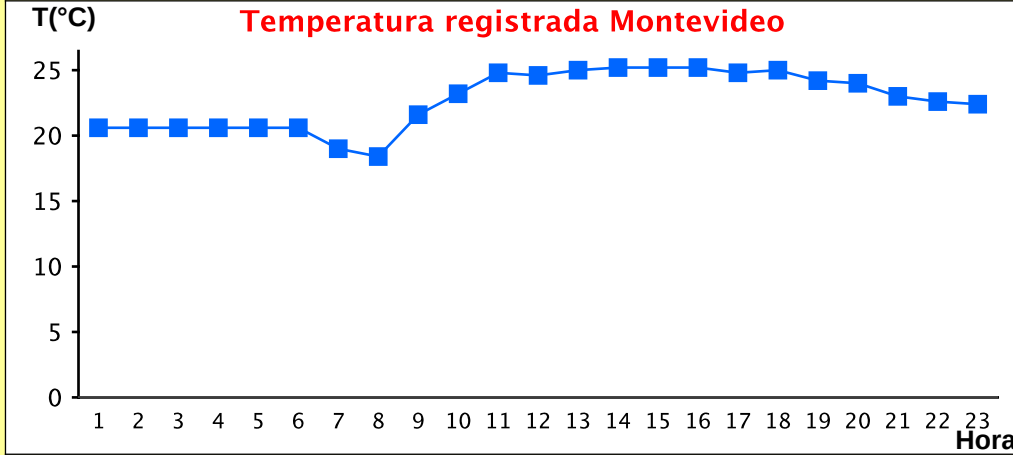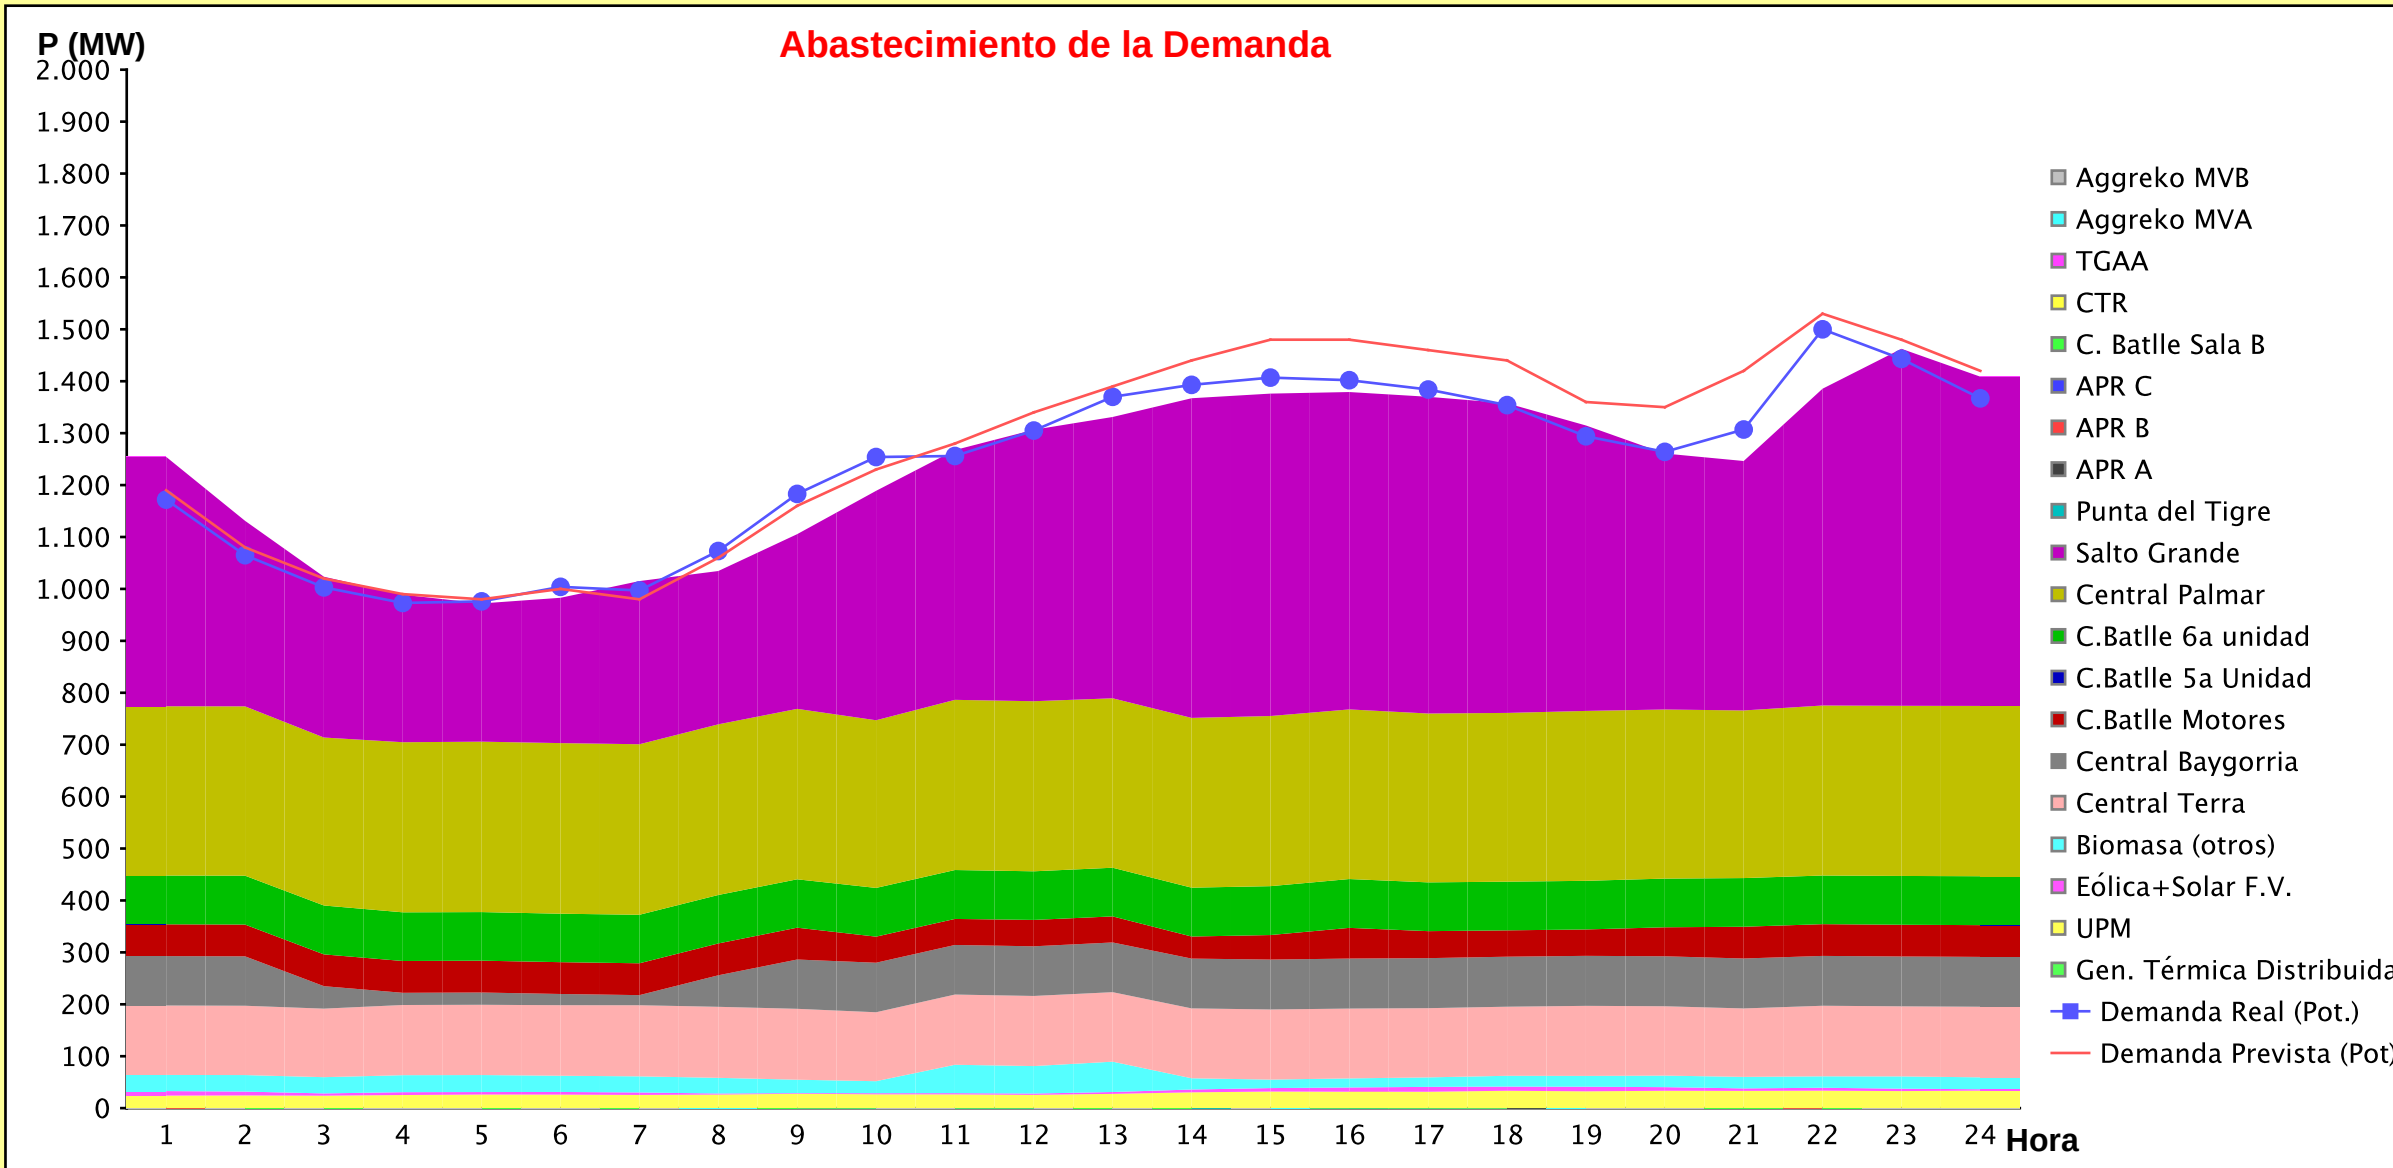



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1413,74 Hora 15:52
Potencia mínima:	978,21 Hora 04:28
Pico noche:	1504,1 Hora 21:56

Generación Media (MW)	
Eólica	6,1
Biomasa	62,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

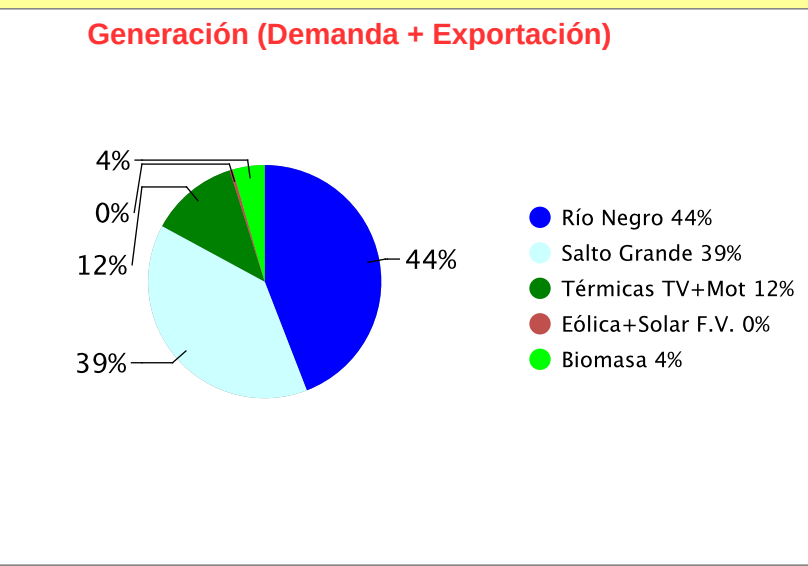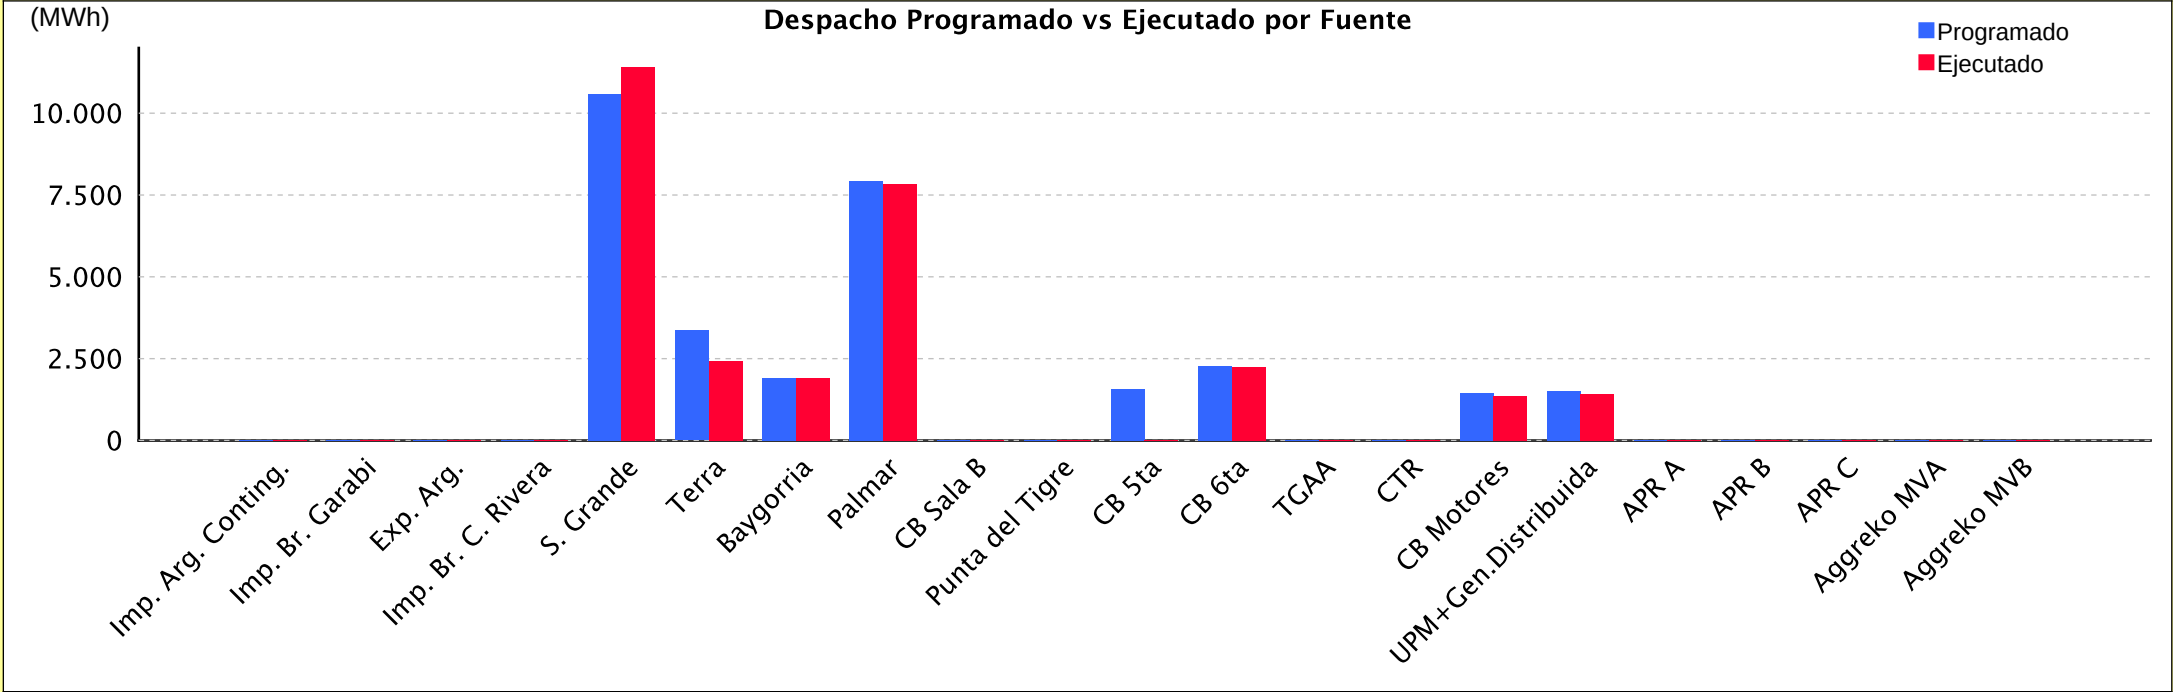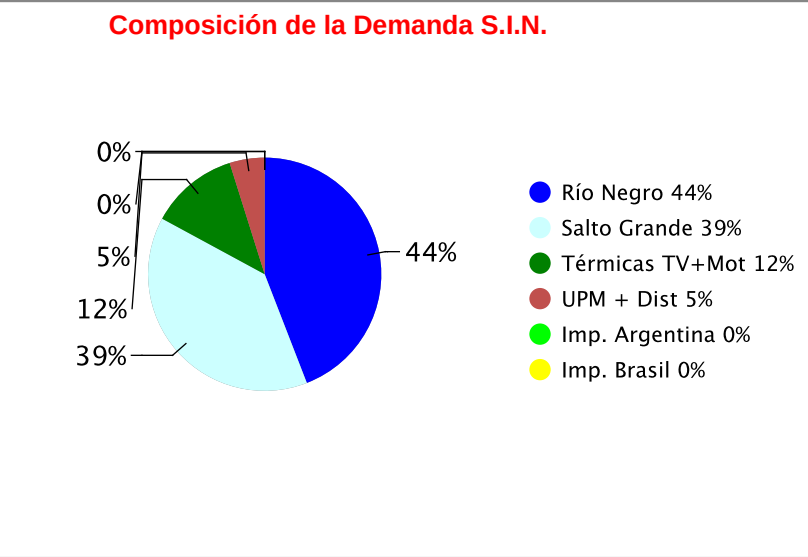



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

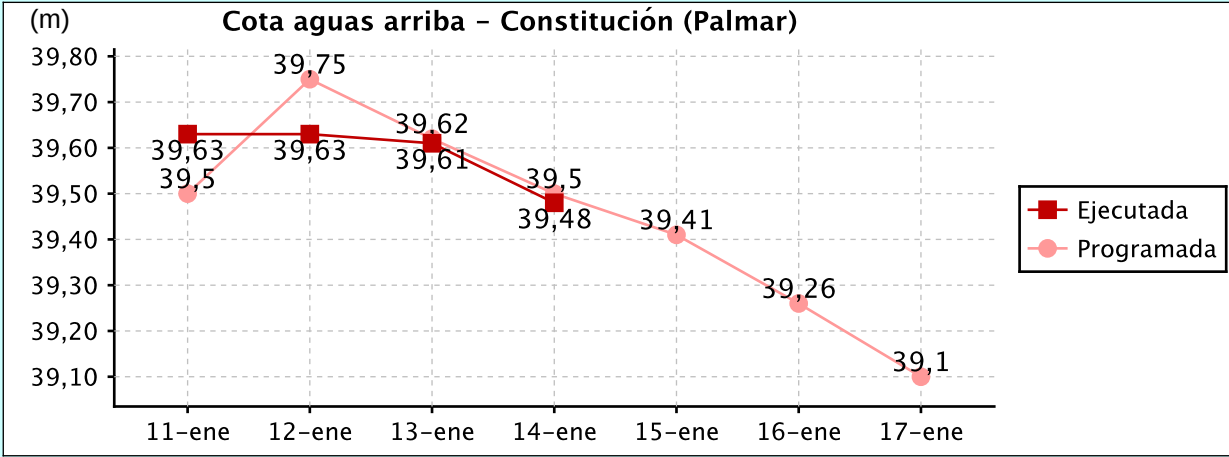
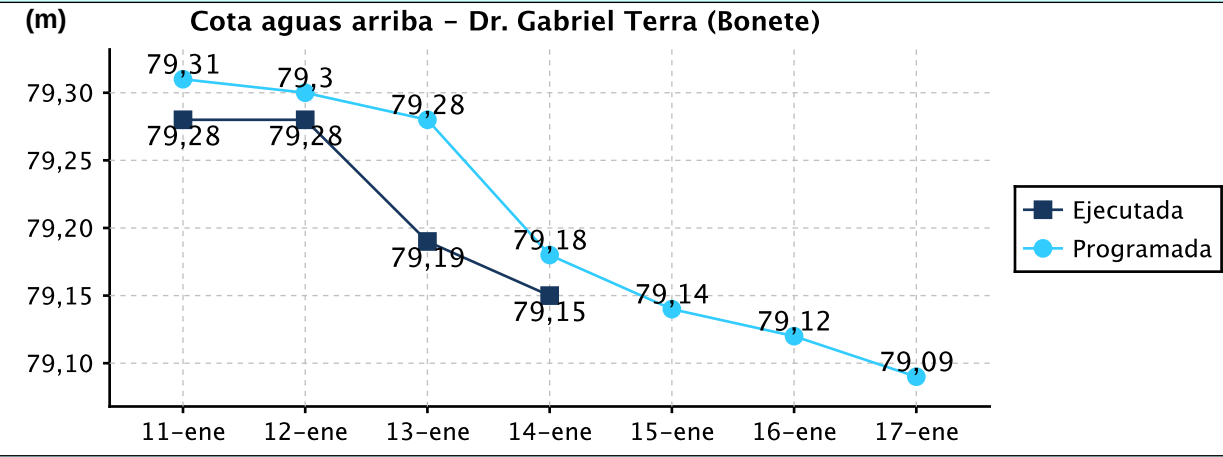


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,18	79,15
Baygorria	53,86	53,81
Palmar	39,50	39,48
SGU	35,11	35,19

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

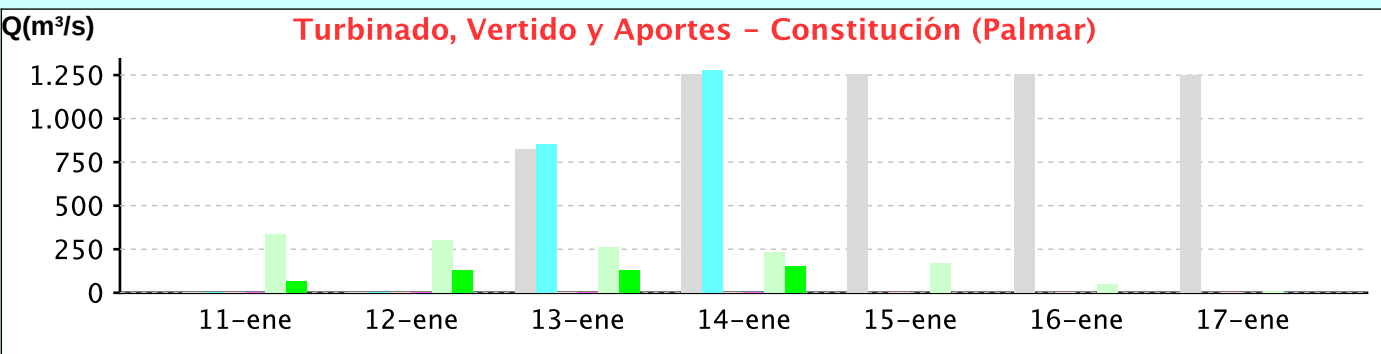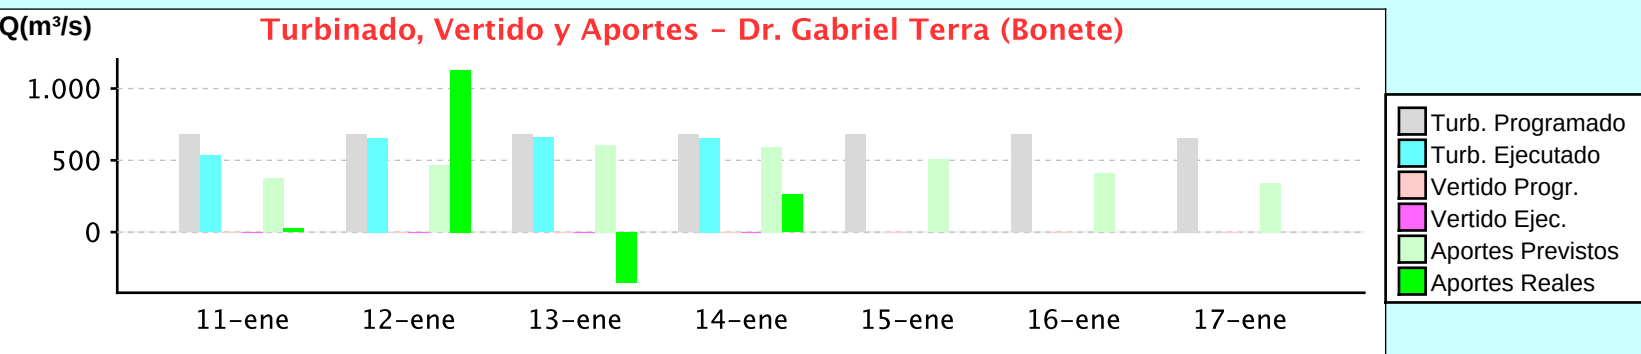

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

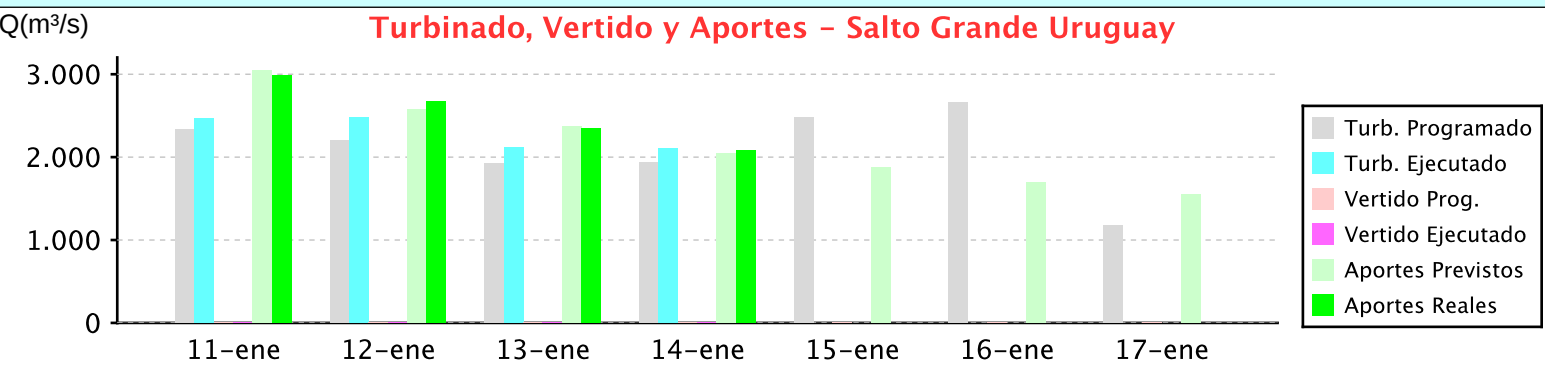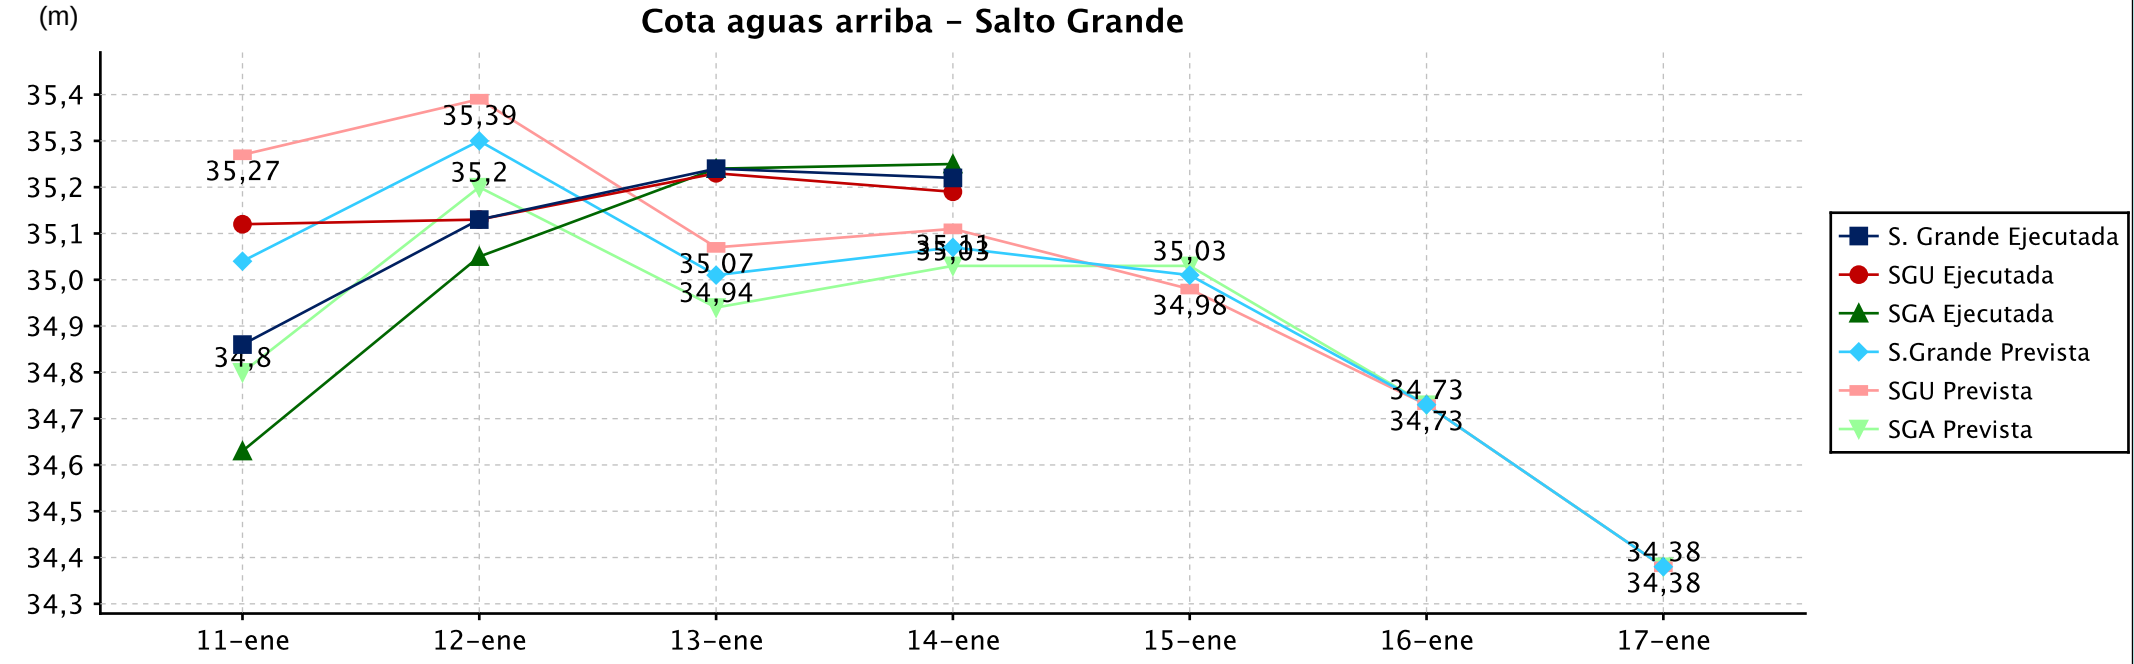

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,19
Cota Vista Arg	35,25
Cota real	35,22
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-1.475

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	678	656
Baygorria	626	689
Palmar	1.252	1.277
SGU	1.941	2.108

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	592	261
Baygorria	0	13
Palmar	230	150
SGU	2.050	2.084

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
