



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 16 de enero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.582
Sala B	140
5ta.	0
6ta.	2.236
Motores	1.207
Central La Tablada	854
Central P. del Tigre	3.465
APR A	879
APR B	1.237
APR C	1.221
Aggreko	467
Aggreko MVA	194
Aggreko MVB	273
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.255
C. Baygorria	1.929
C. Palmar	7.878
C. Salto Grande	14.959
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.745
TOTAL Generación	41.470

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	7.991
Hidráulica	0
Térmica	7.991
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	7.991




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.479
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	33.020
Diferencia (MWh)	459
Ejecutada - Programada	1,39 %

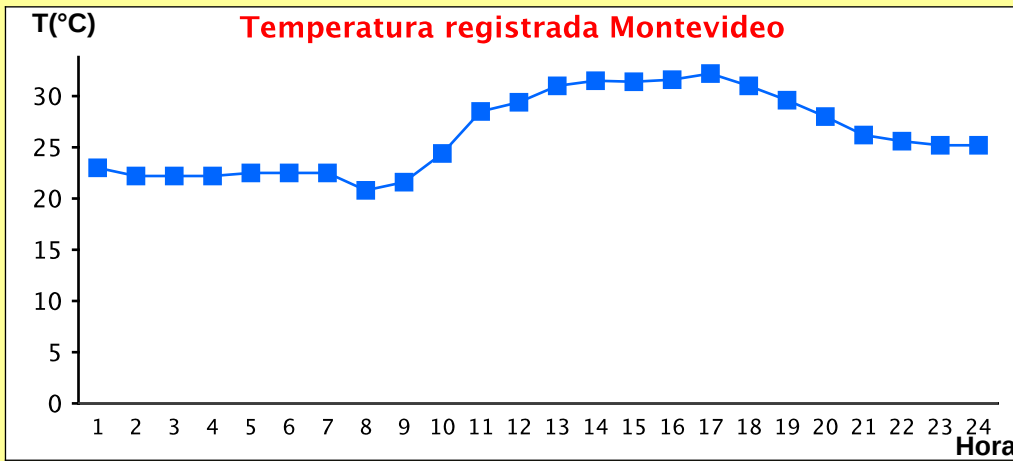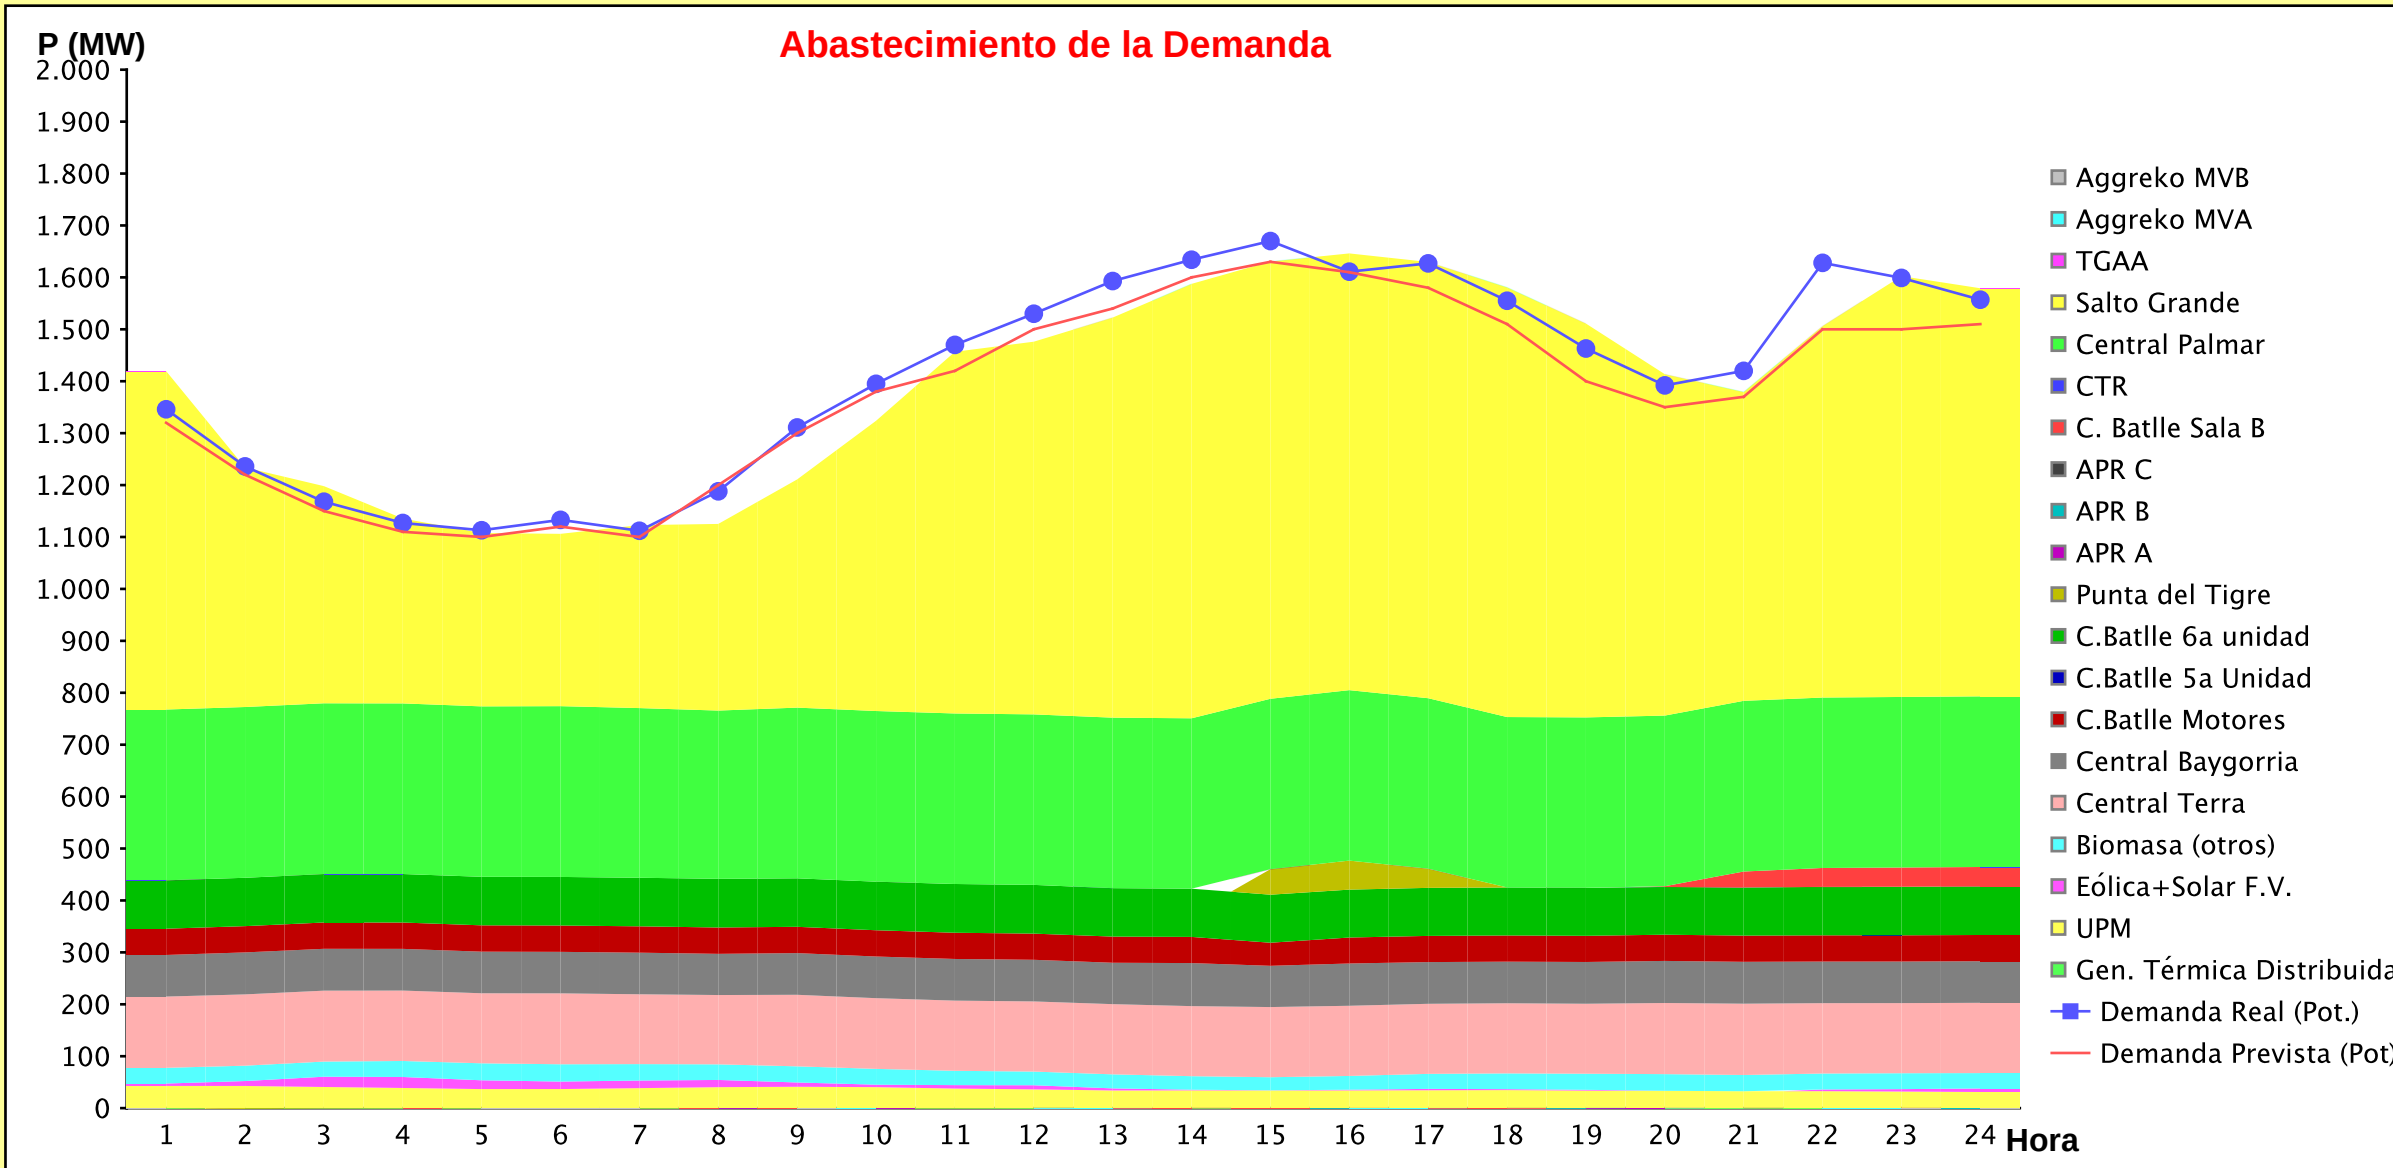



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1670,43 Hora 14:52
Potencia mínima:	1105,38 Hora 06:57
Pico noche:	1631 Hora 22:10

Generación Media (MW)	
Eólica	7,9
Biomasa	72,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

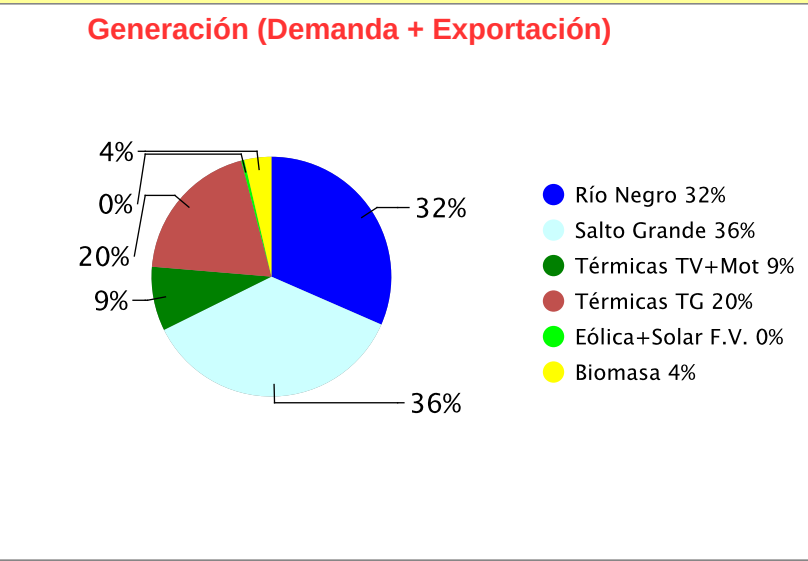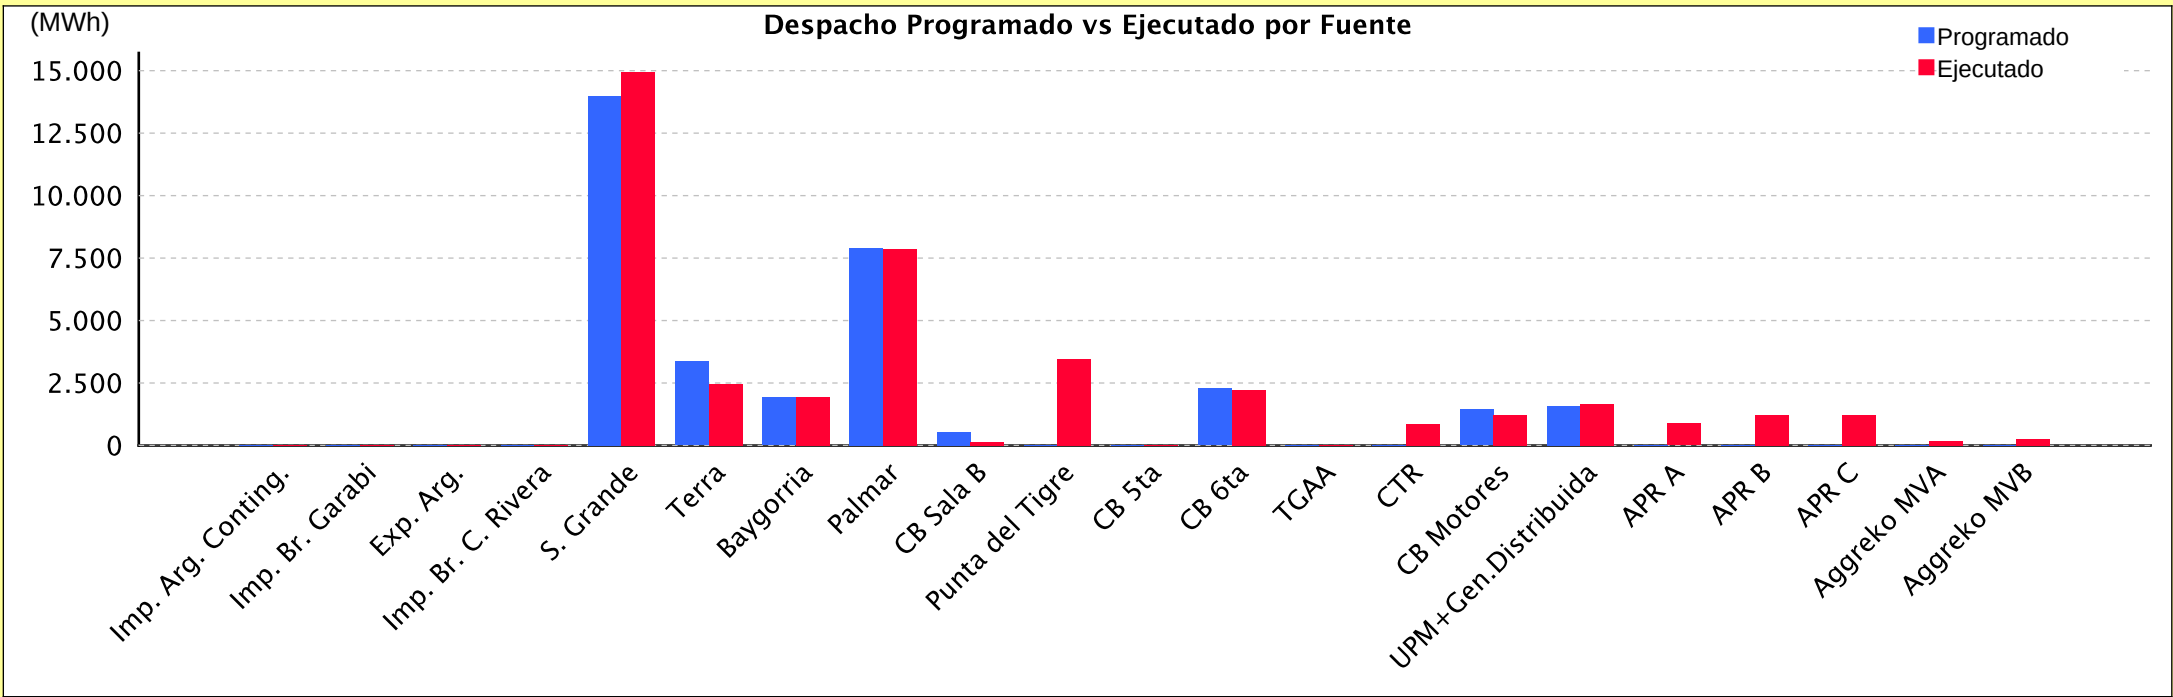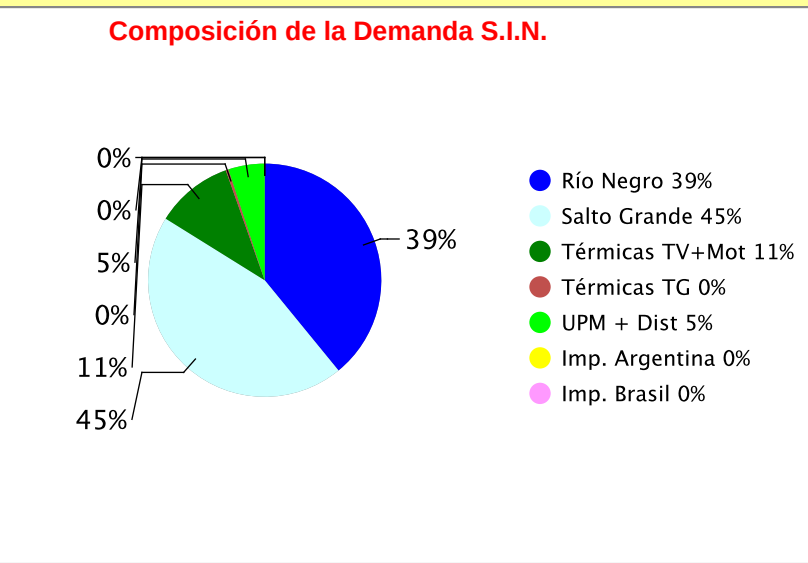



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

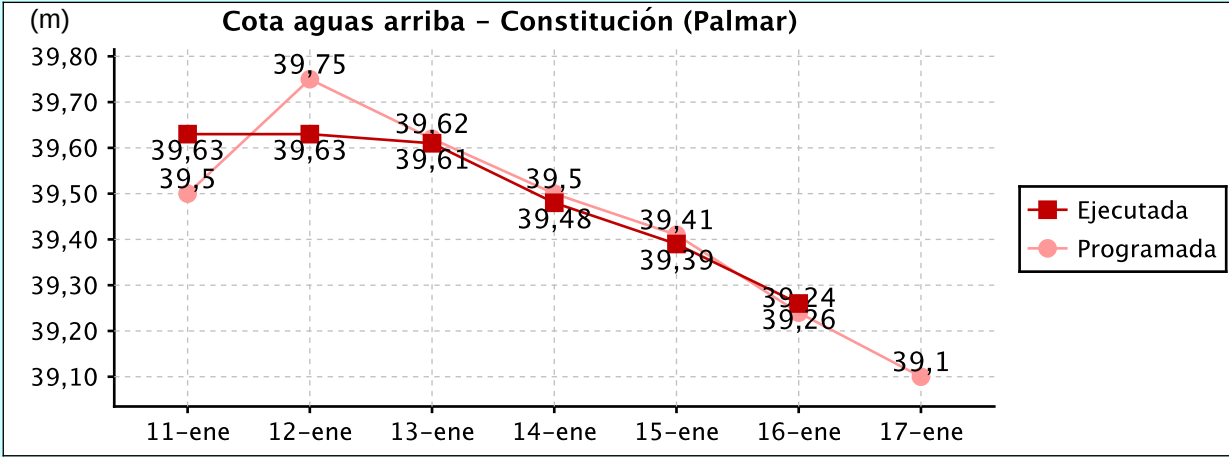
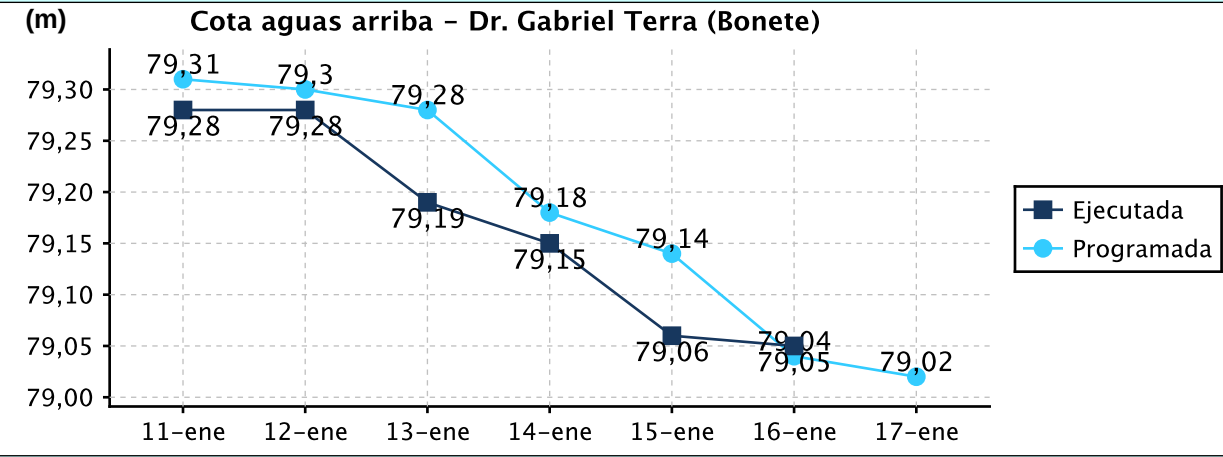


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,04	79,05
Baygorria	53,80	53,81
Palmar	39,24	39,26
SGU	34,71	34,75

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

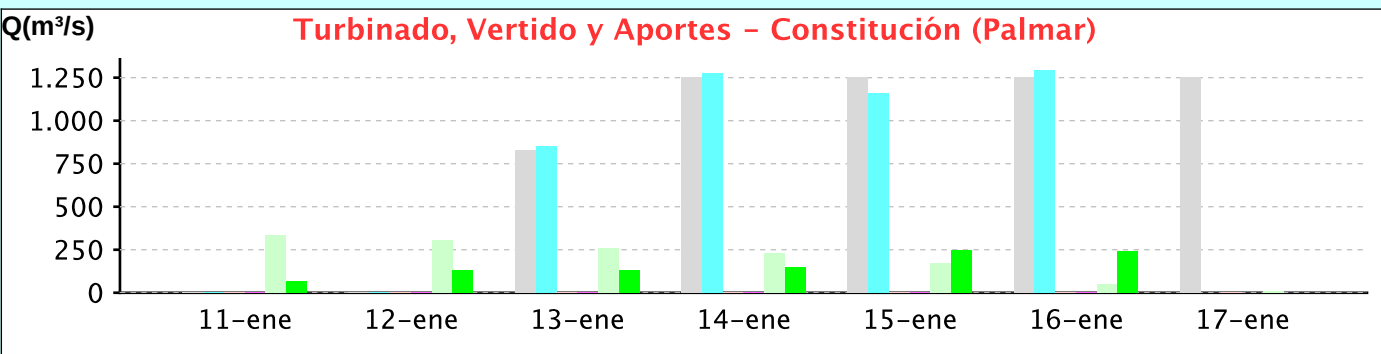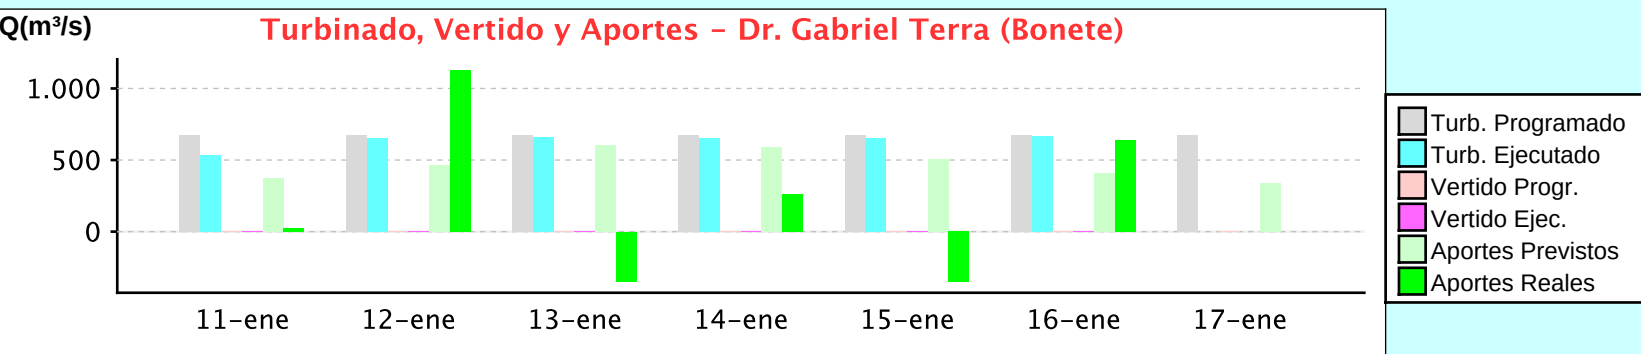

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

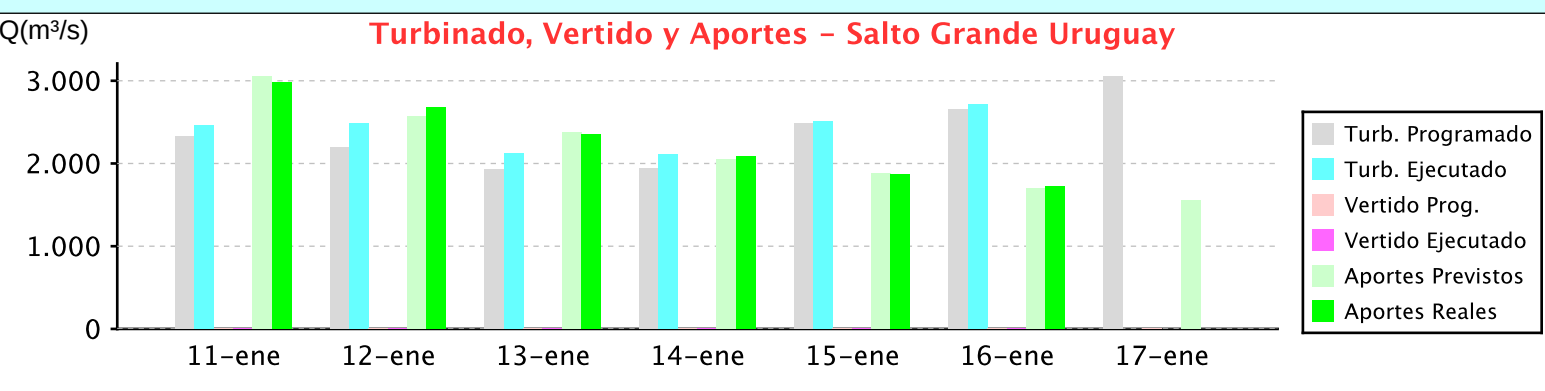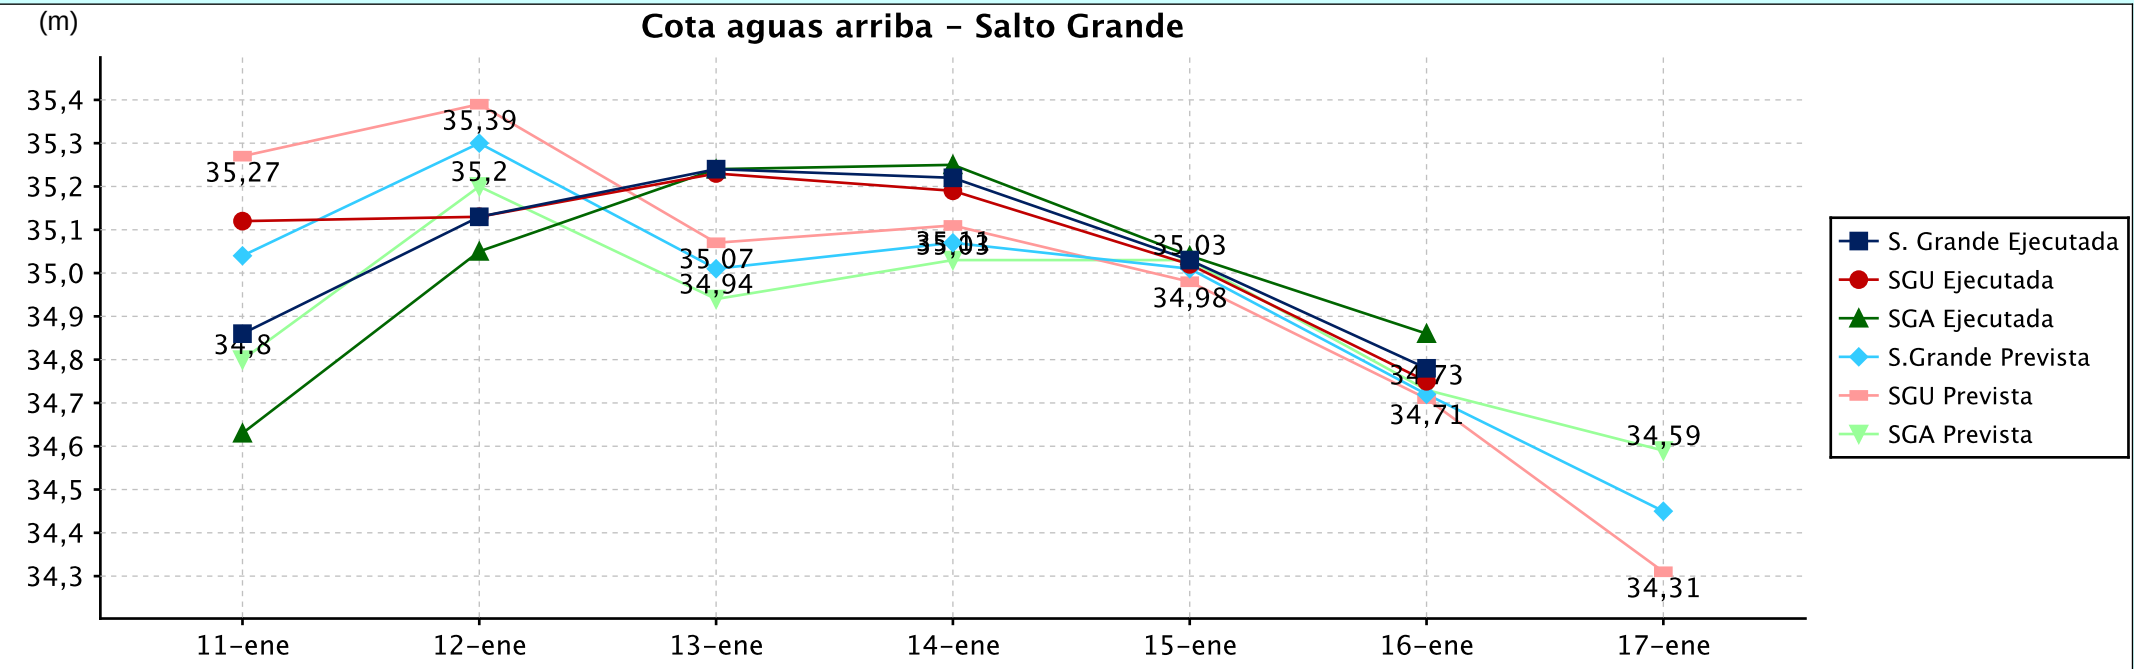

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,75
Cota Vista Arg	34,86
Cota real	34,78
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-2.098

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	678	665
Baygorria	678	668
Palmar	1.252	1.292
SGU	2.654	2.713

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	409	639
Baygorria	0	17
Palmar	50	244
SGU	1.700	1.722

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
