




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 18 de enero de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	3.769
Sala B	872
5ta.	0
6ta.	1.747
Motores	1.150
Central La Tablada	-8
Central P. del Tigre	5.616
APR A	1.087
APR B	1.141
APR C	1.198
Aggreko	52
Aggreko MVA	25
Aggreko MVB	28
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.237
C. Baygorria	2.016
C. Palmar	7.763
C. Salto Grande	9.940
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.622
TOTAL Generación	37.432

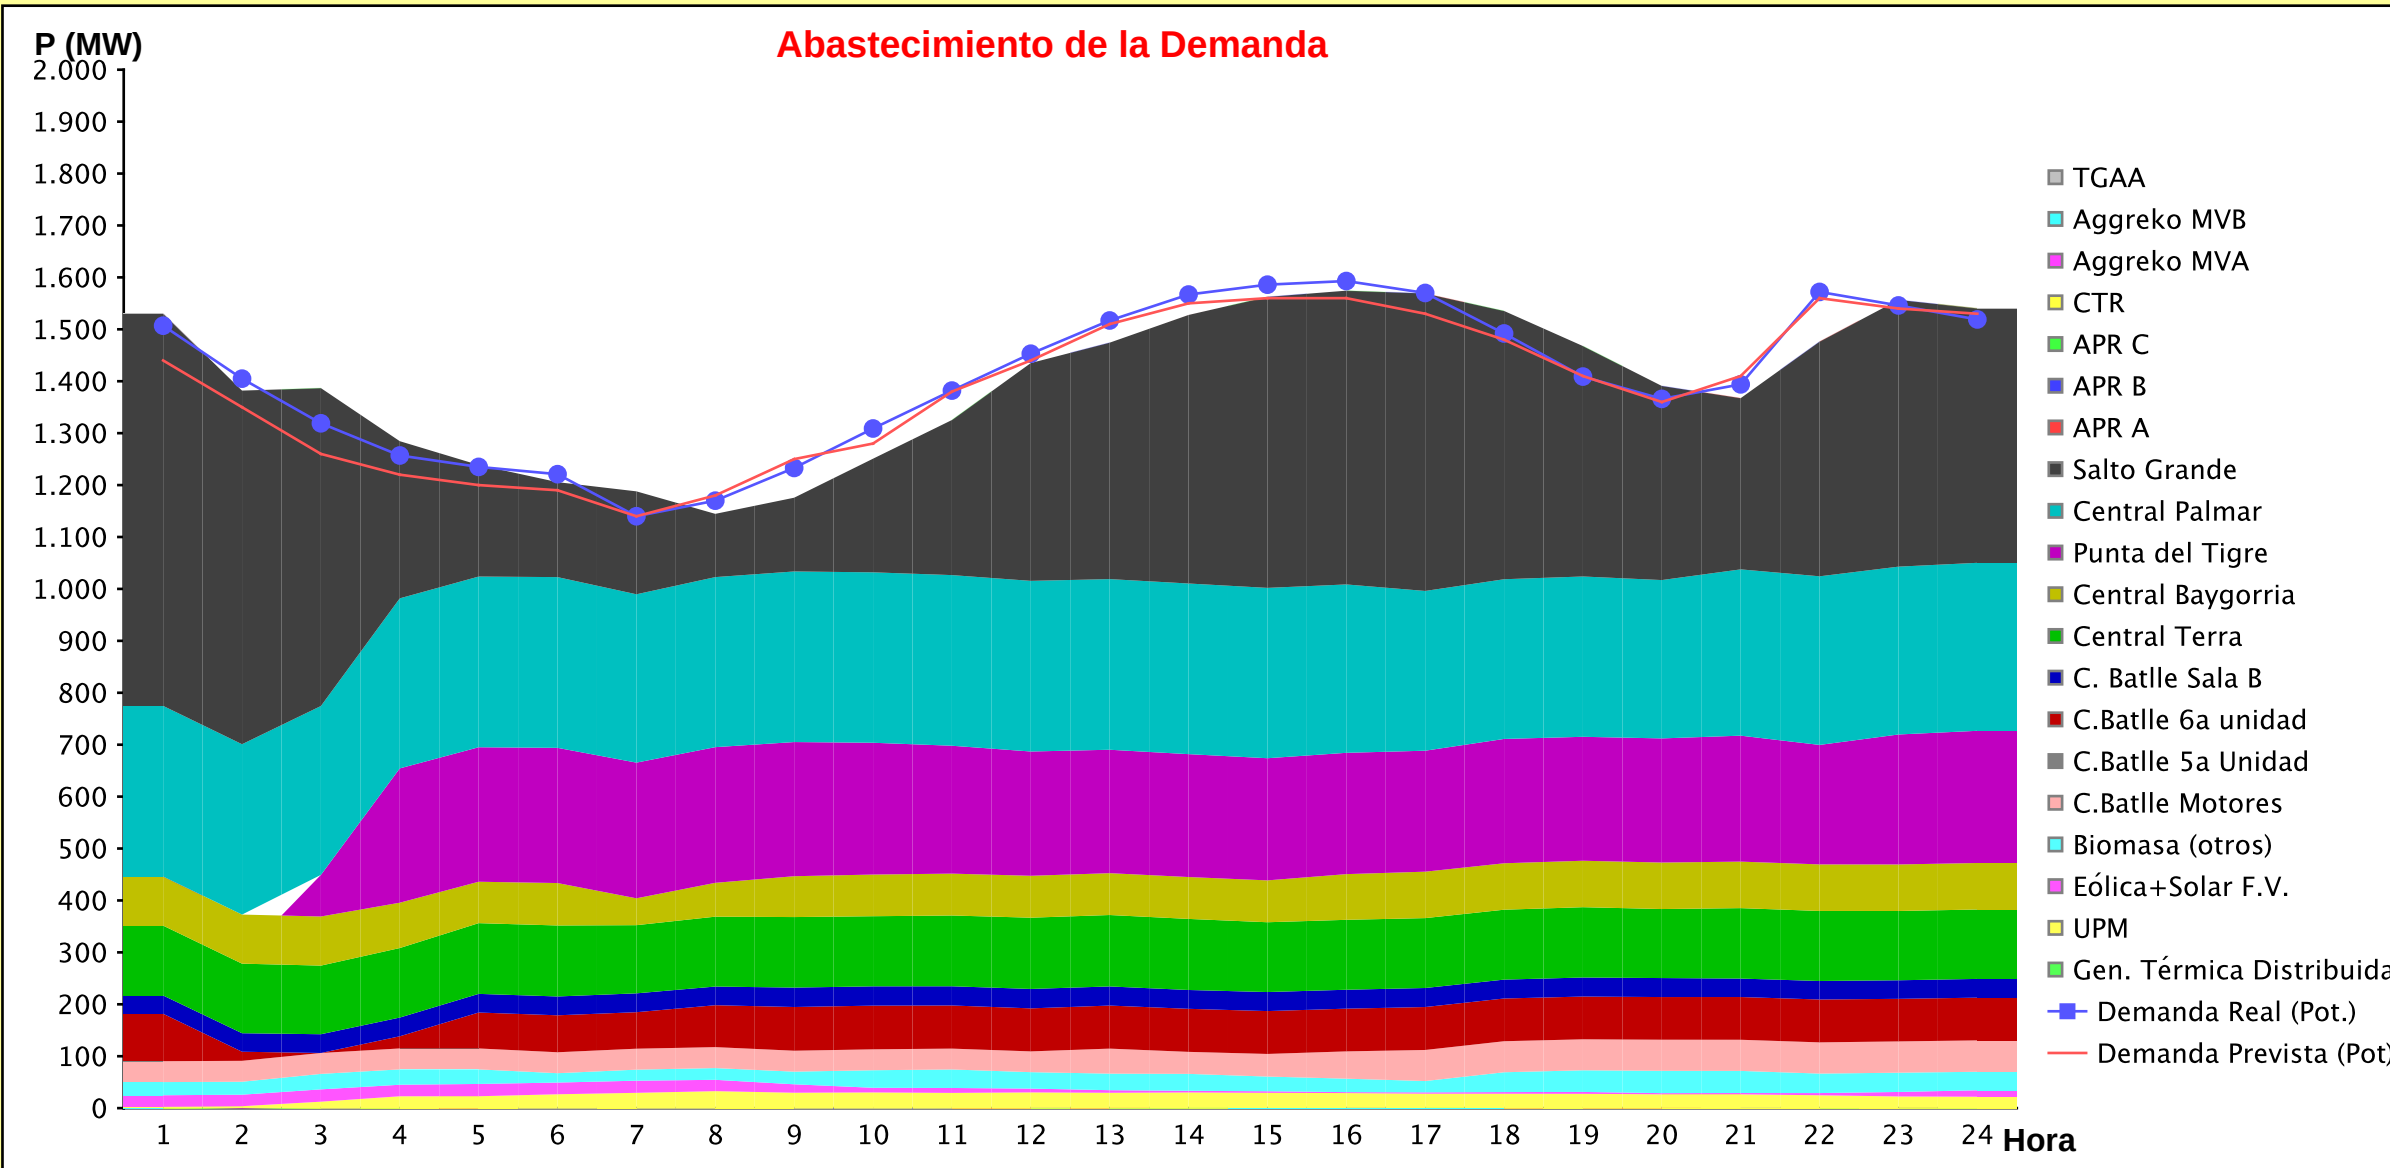

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.881
Hidráulica	0
Térmica	3.881
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.881




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.552
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	33.330
Diferencia (MWh)	222
Ejecutada - Programada	0,67 %

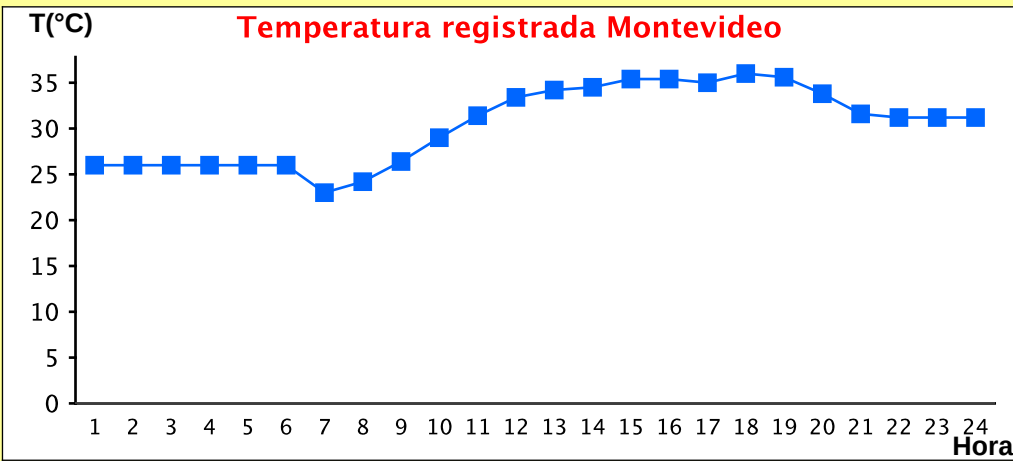



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1605,42 Hora 15:40
Potencia mínima:	1130,42 Hora 07:02
Pico noche:	1582,55 Hora 22:03

Generación Media (MW)	
Eólica	11,9
Biomasa	59,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

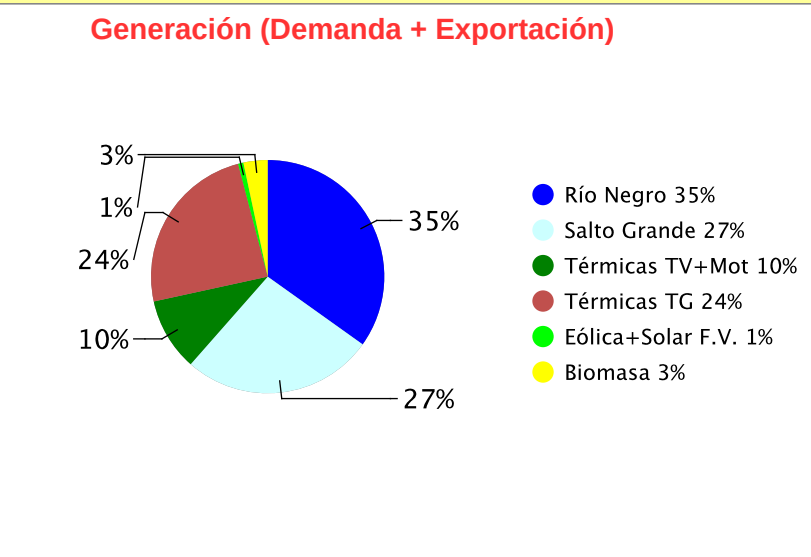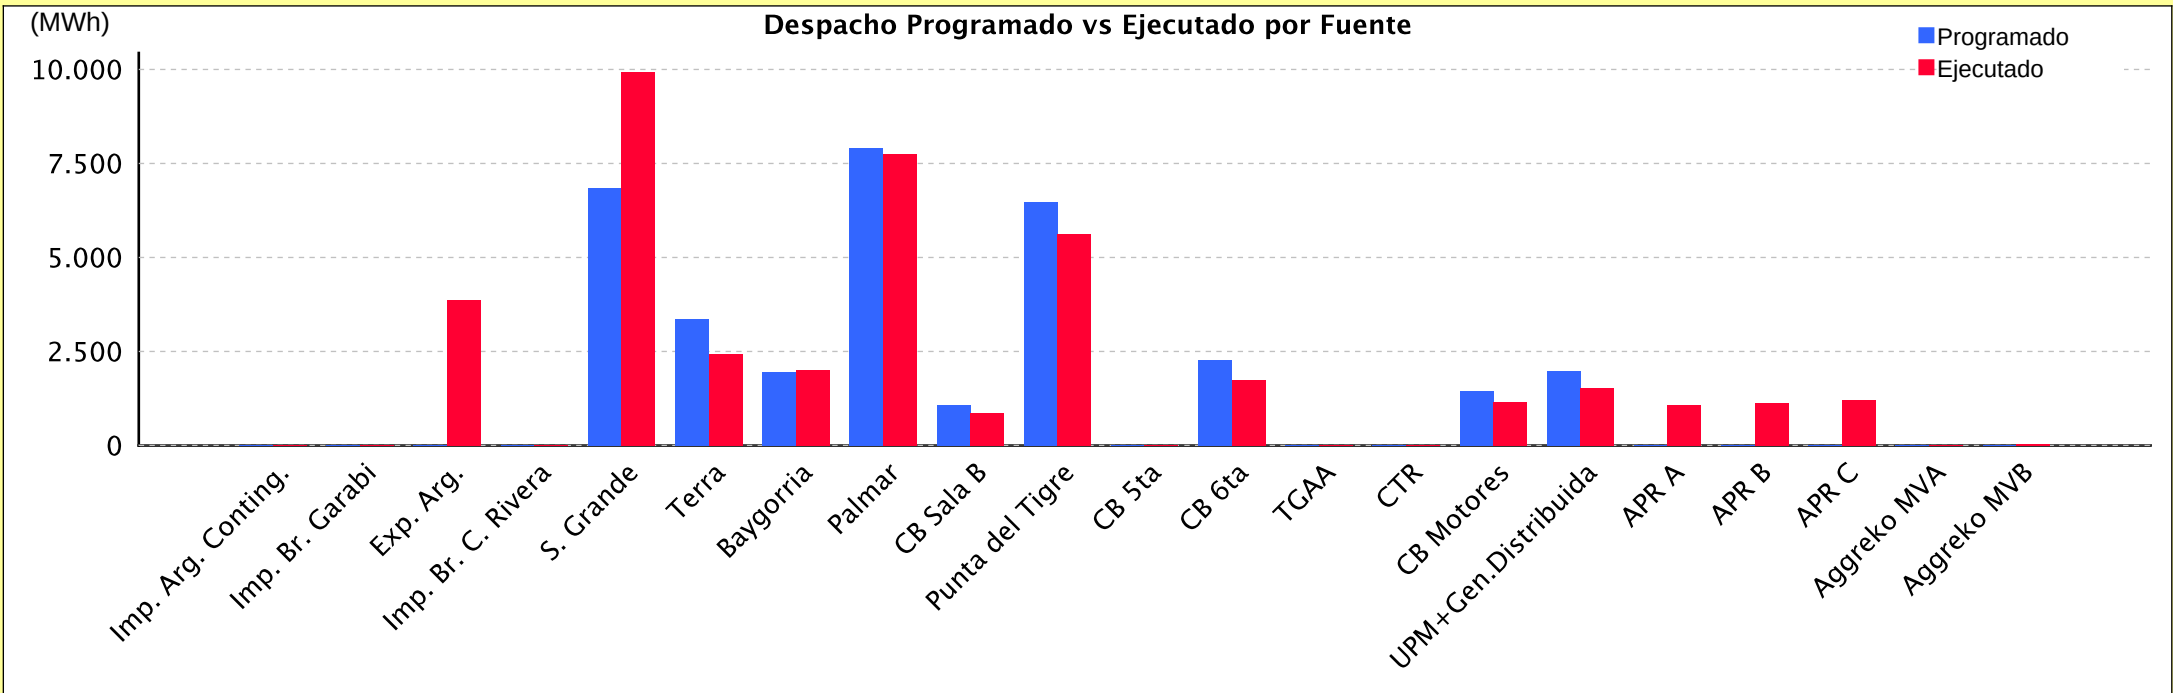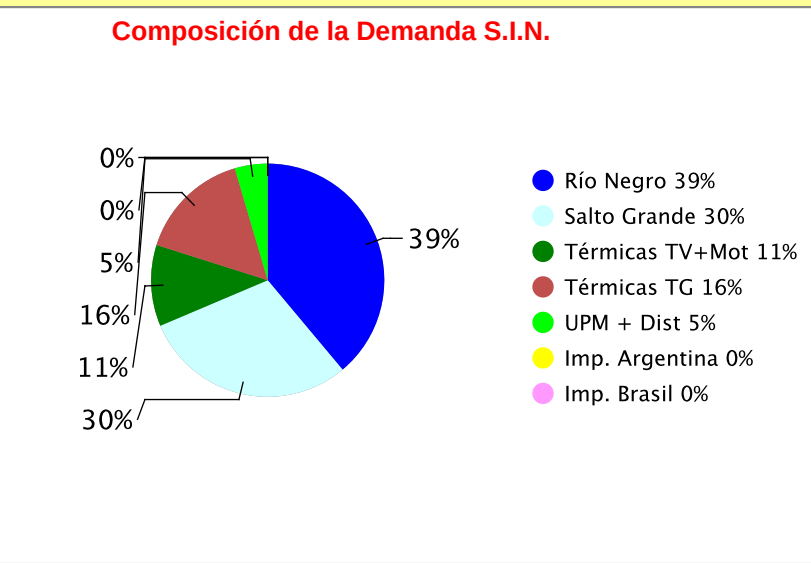



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

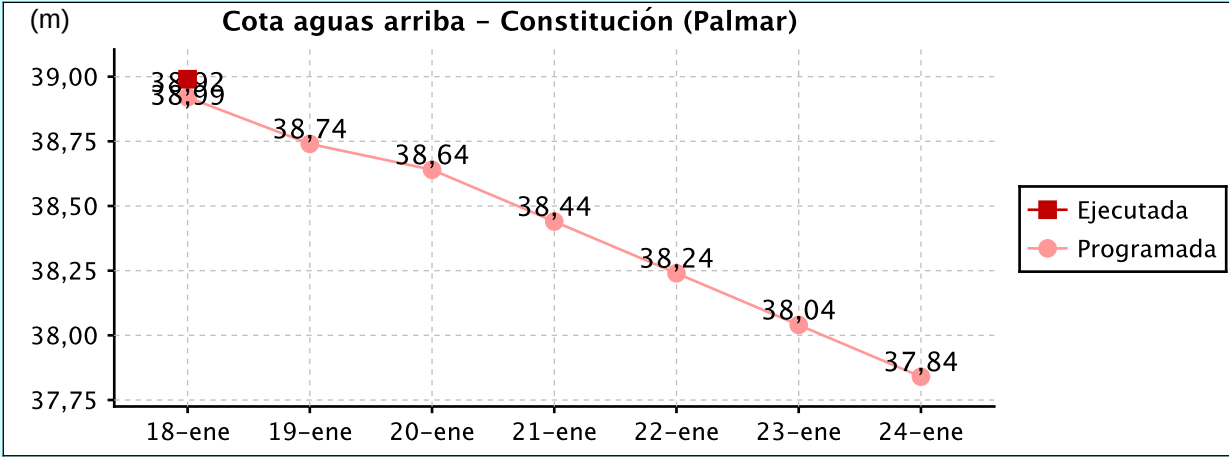
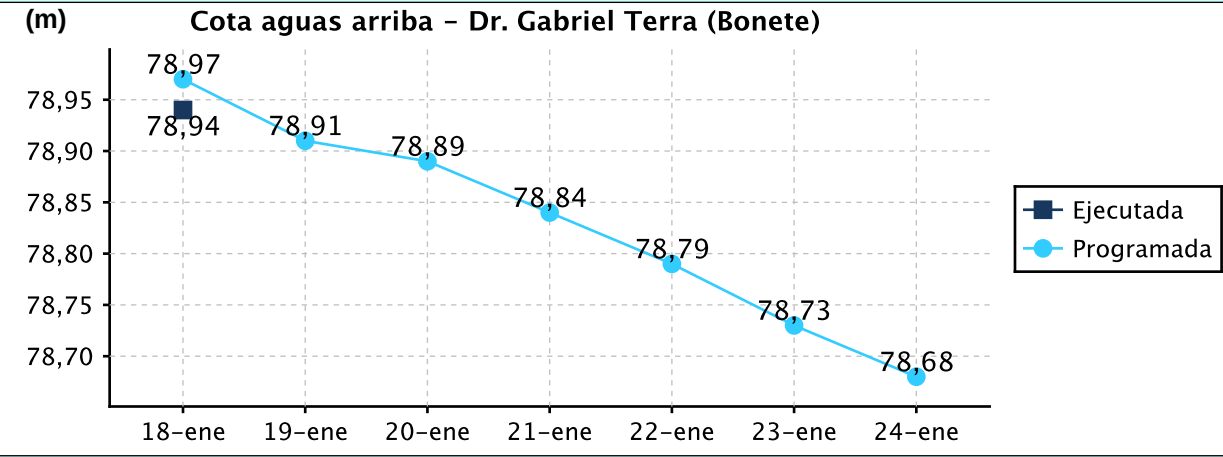


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,97	78,94
Baygorria	53,81	53,73
Palmar	38,92	38,99
SGU	34,31	34,26

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

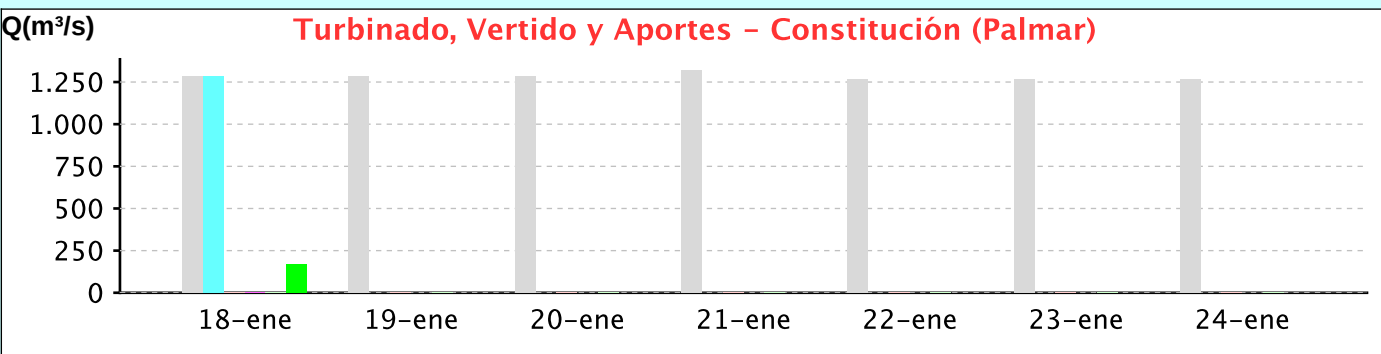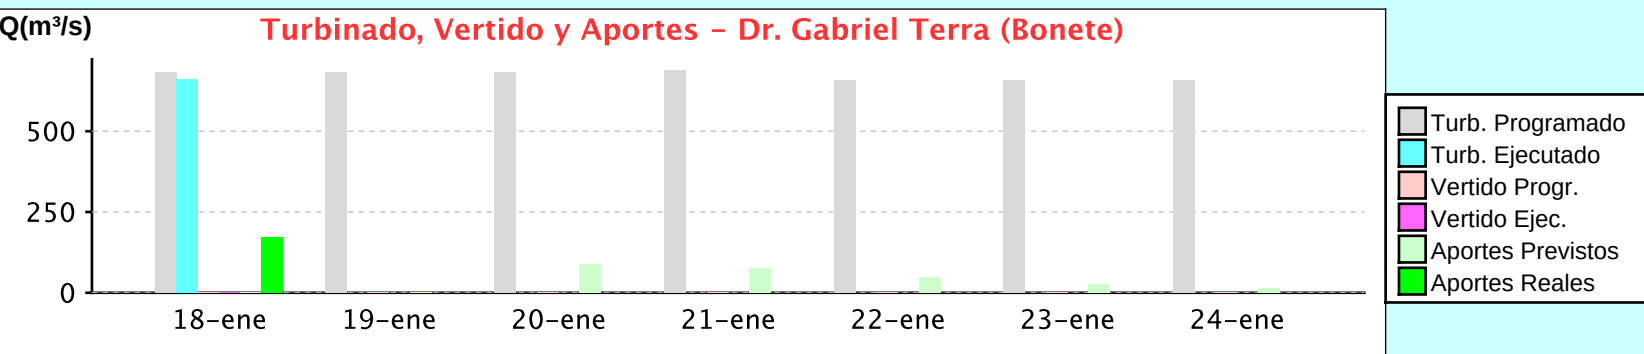

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

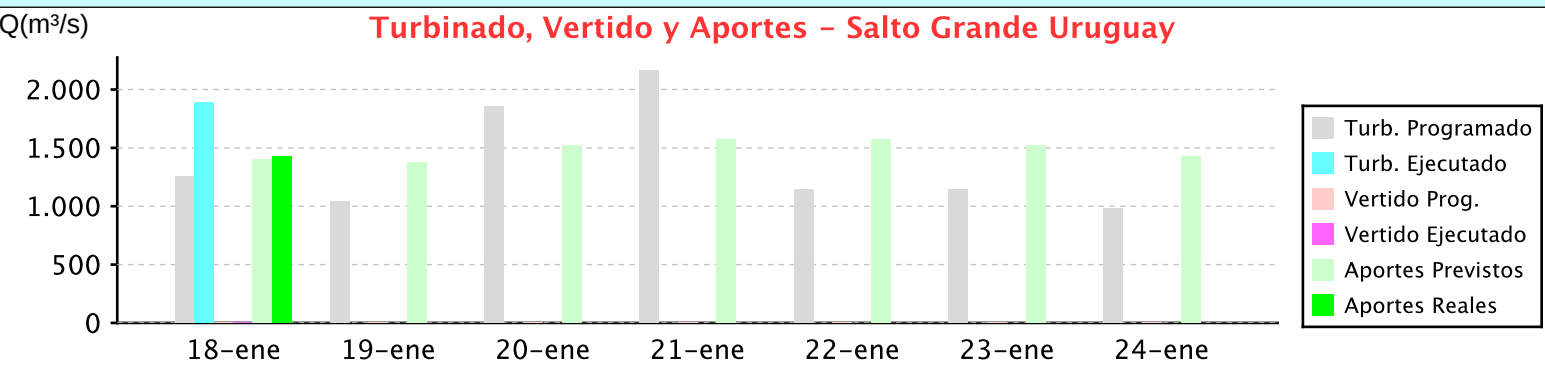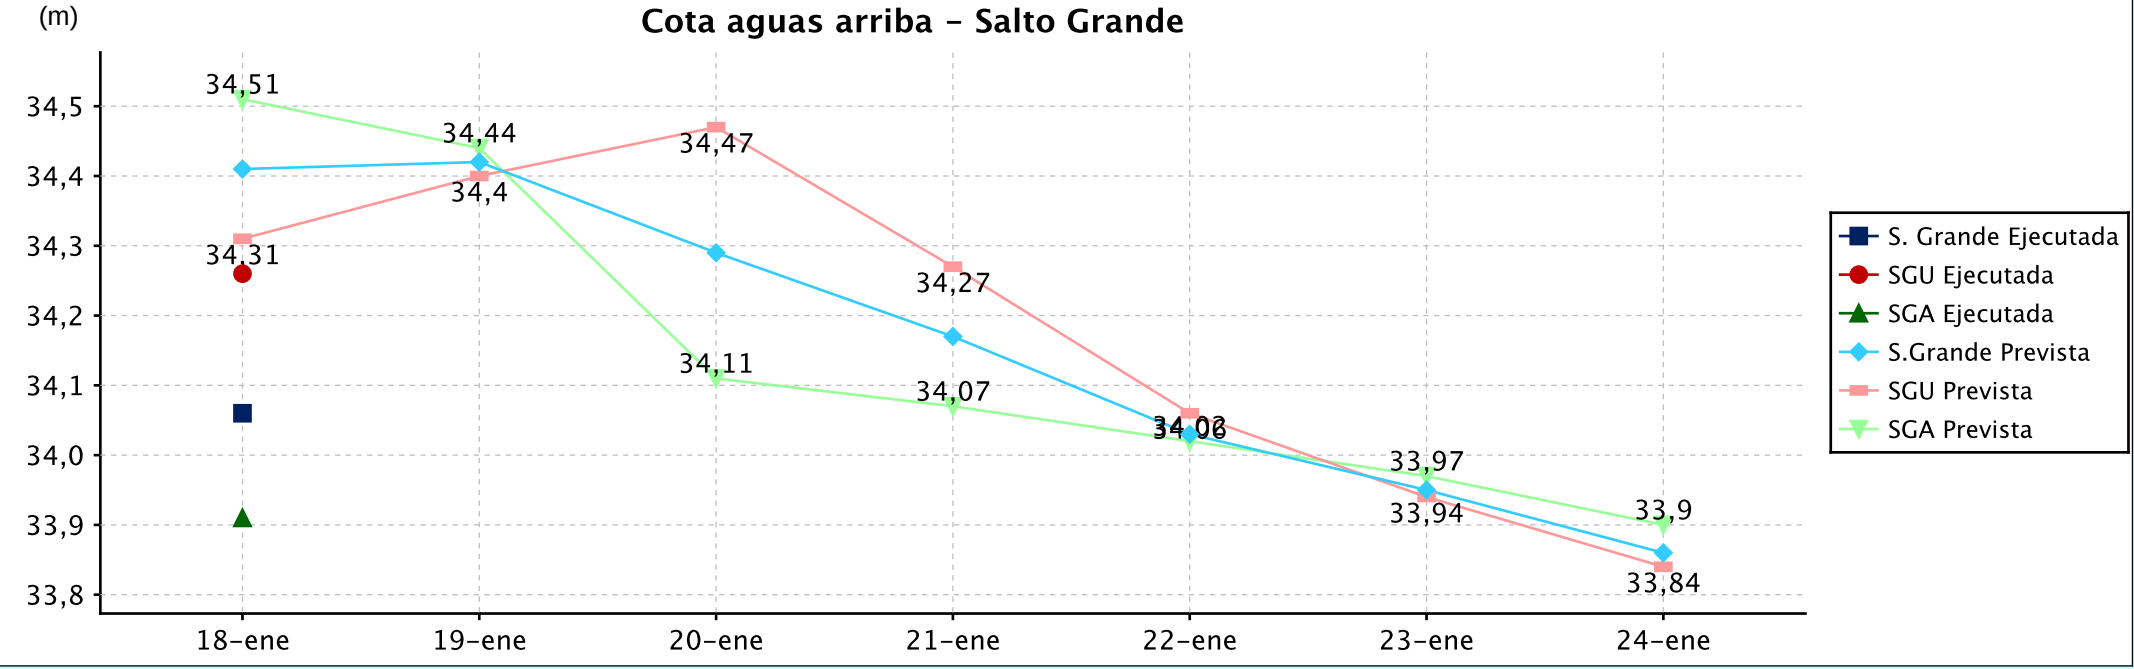

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,26
Cota Vista Arg	33,91
Cota real	34,06

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	7.437
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	681	662
Baygorria	680	698
Palmar	1.286	1.285
SGU	1.256	1.887

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	173
Baygorria	0	26
Palmar	0	171
SGU	1.400	1.426

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 161,7 MW medios hacia Argentina por modalidad contingente
