




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 20 de enero de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	4.252
Sala B	873
5ta.	0
6ta.	1.987
Motores	1.393
Central La Tablada	840
Central P. del Tigre	5.977
APR A	982
APR B	1.041
APR C	1.045
Aggreko	558
Aggreko MVA	279
Aggreko MVB	279
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.216
C. Baygorria	1.879
C. Palmar	7.784
C. Salto Grande	7.638
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.839
TOTAL Generación	37.052

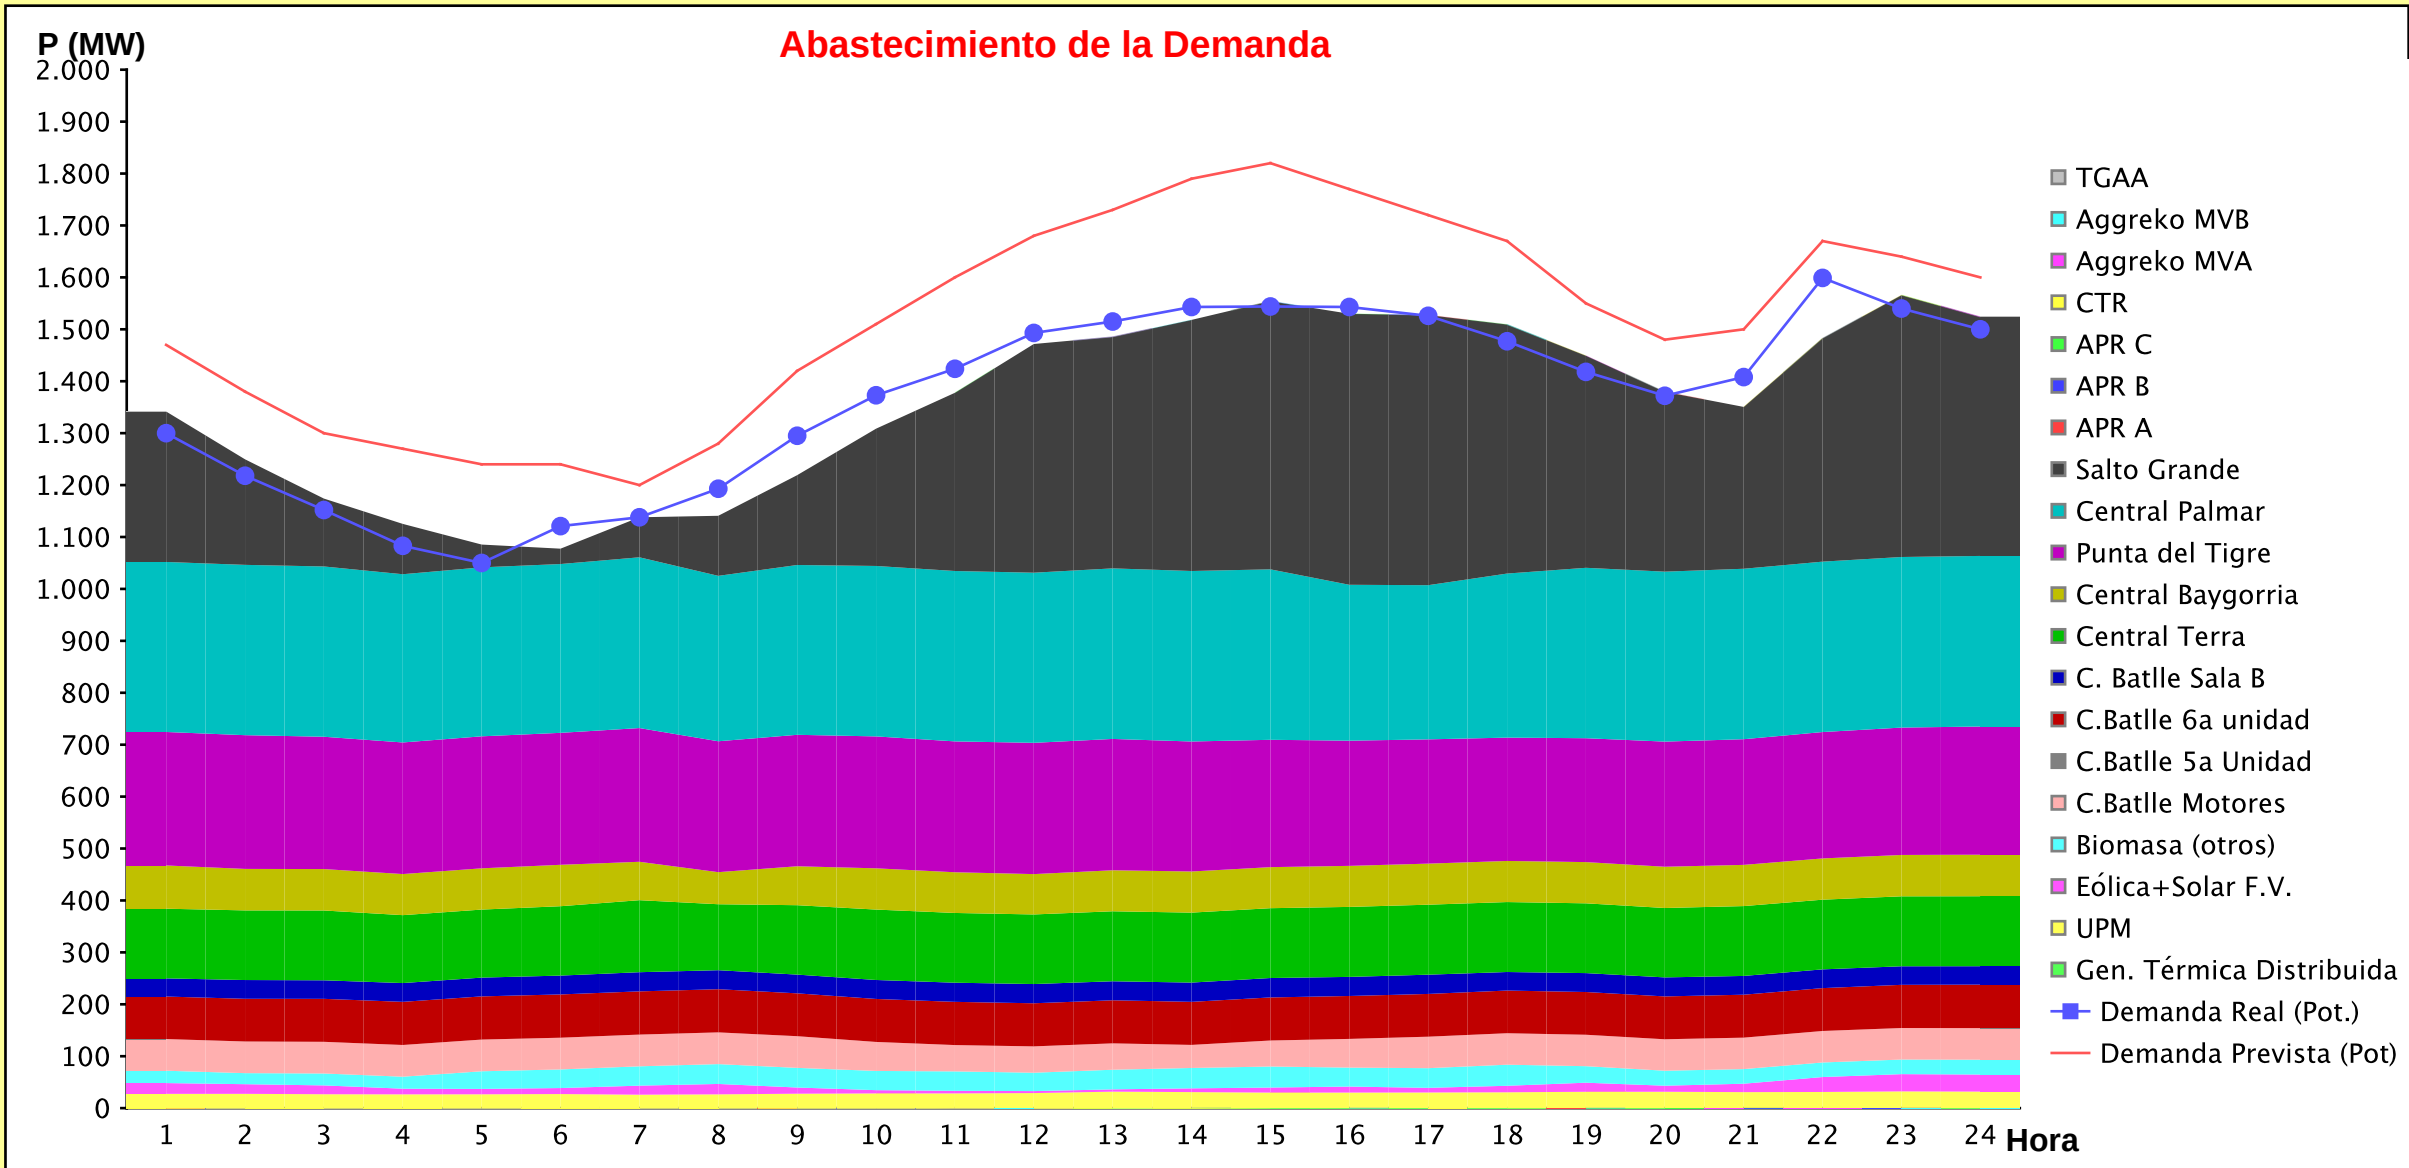

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.495
Hidráulica	0
Térmica	4.495
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.495




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.557
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	36.530
Diferencia (MWh)	-3.973
Ejecutada - Programada	-10,88 %

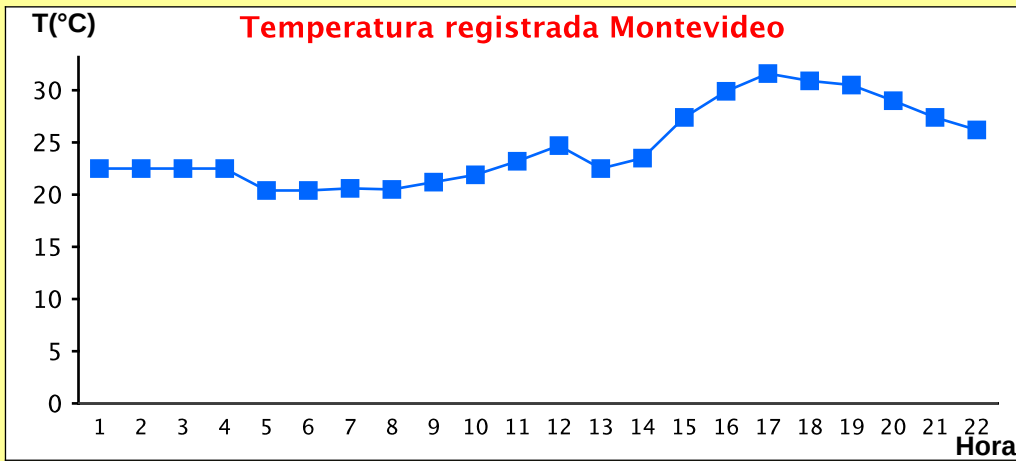



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1564,15 Hora 15:08
Potencia mínima:	1059,06 Hora 04:39
Pico noche:	1604,71 Hora 21:54

Generación Media (MW)	
Eólica	14,8
Biomasa	65,1
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

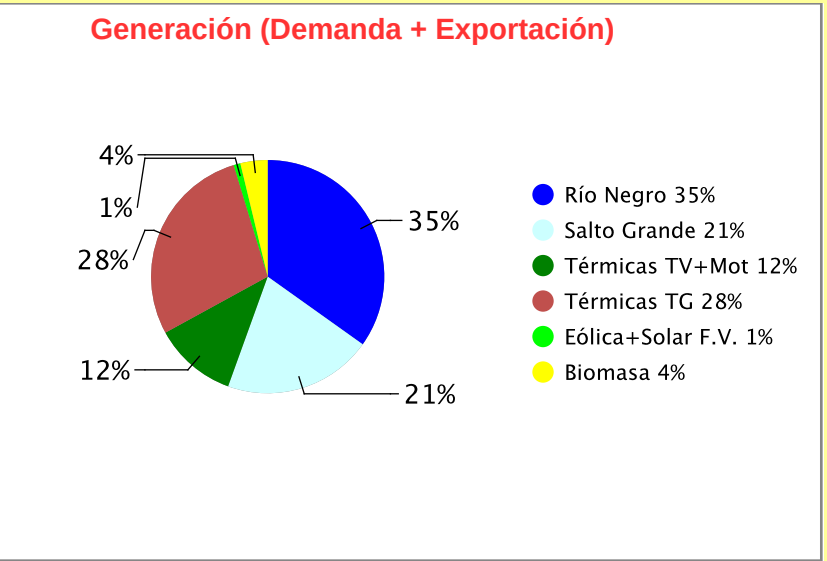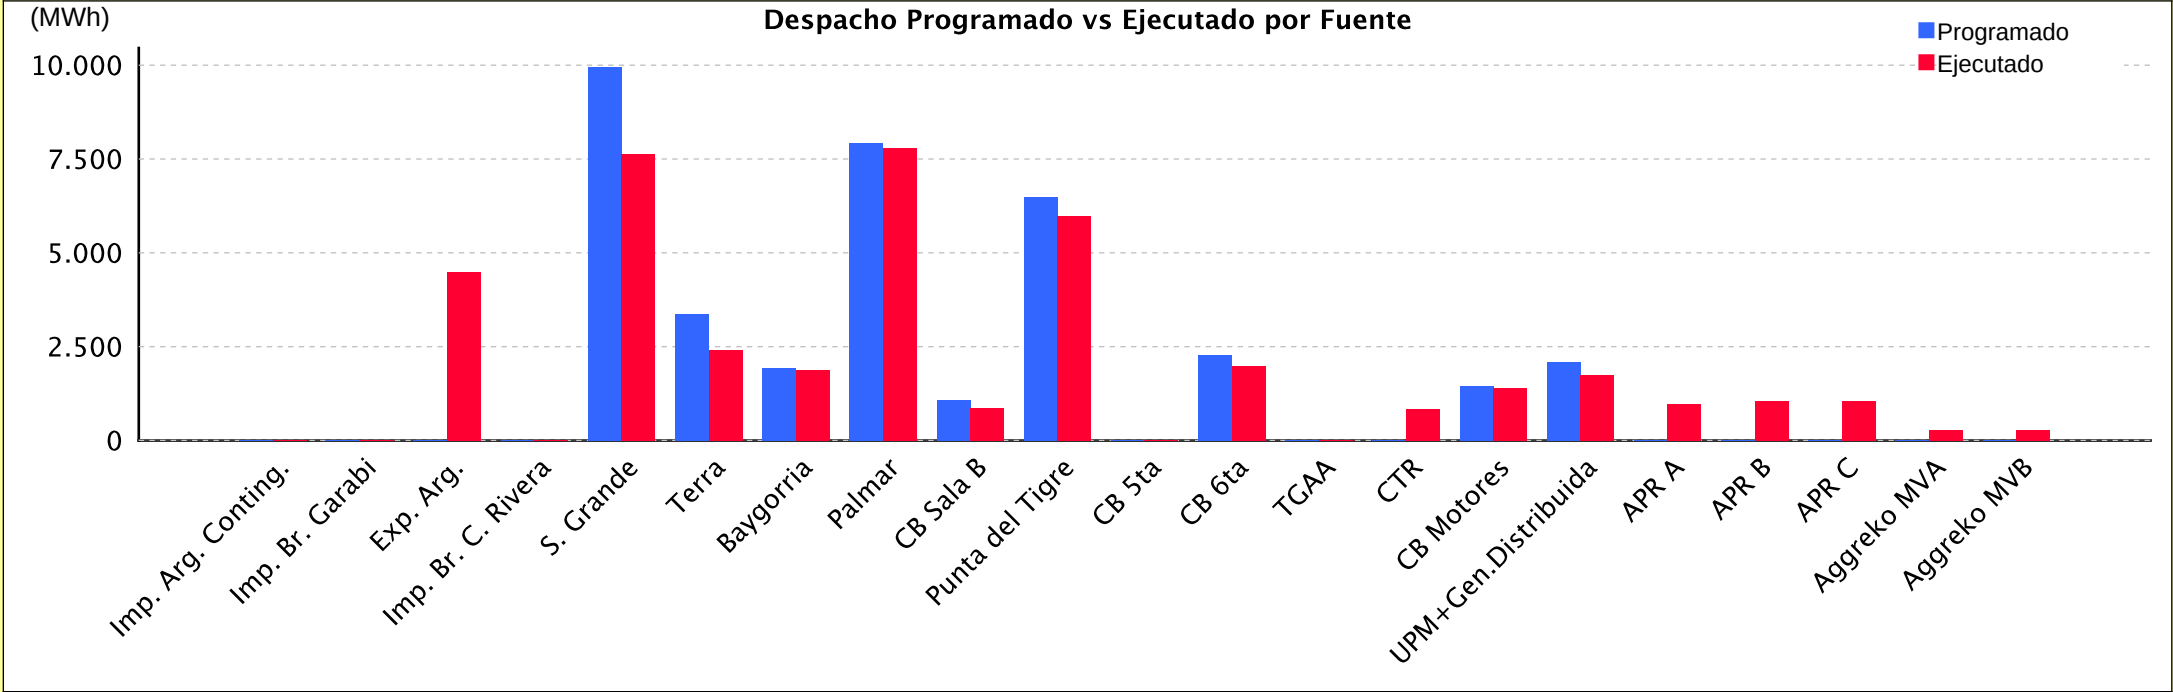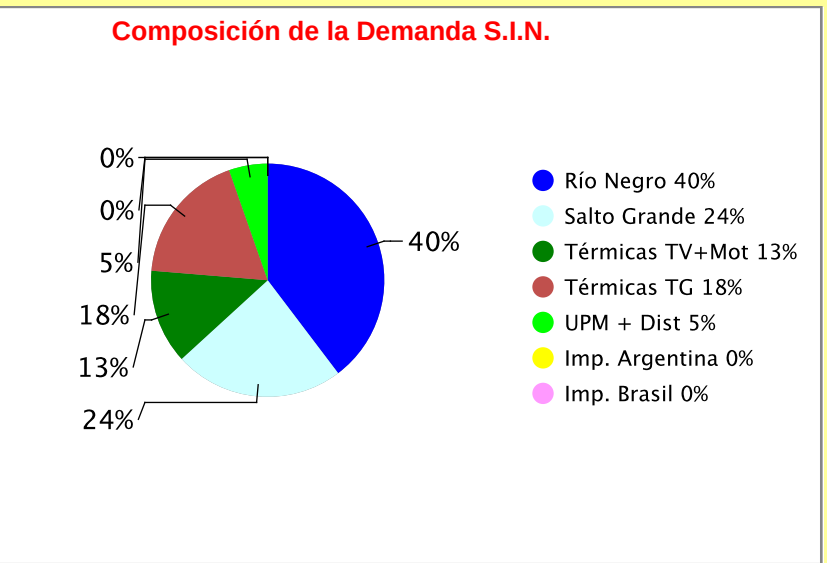



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

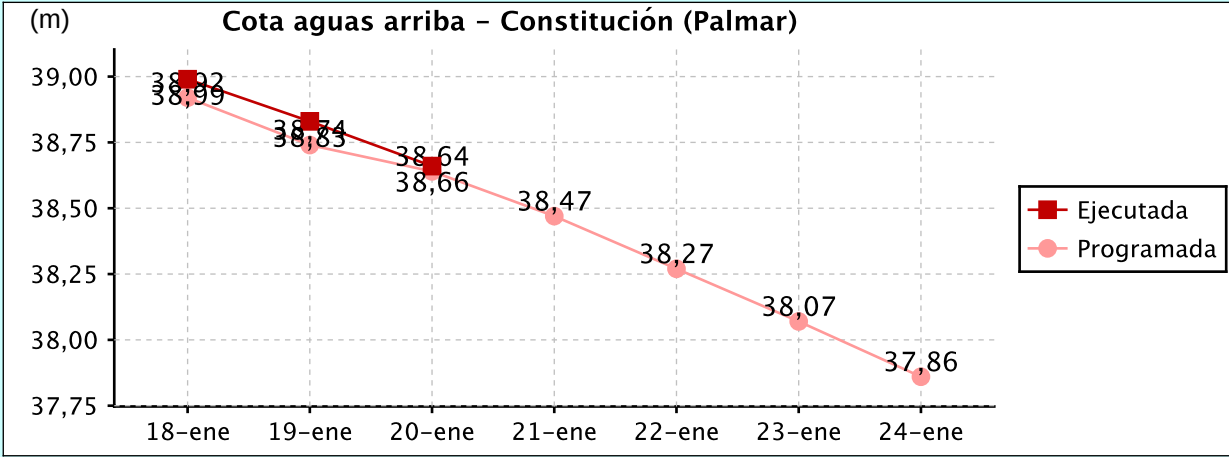
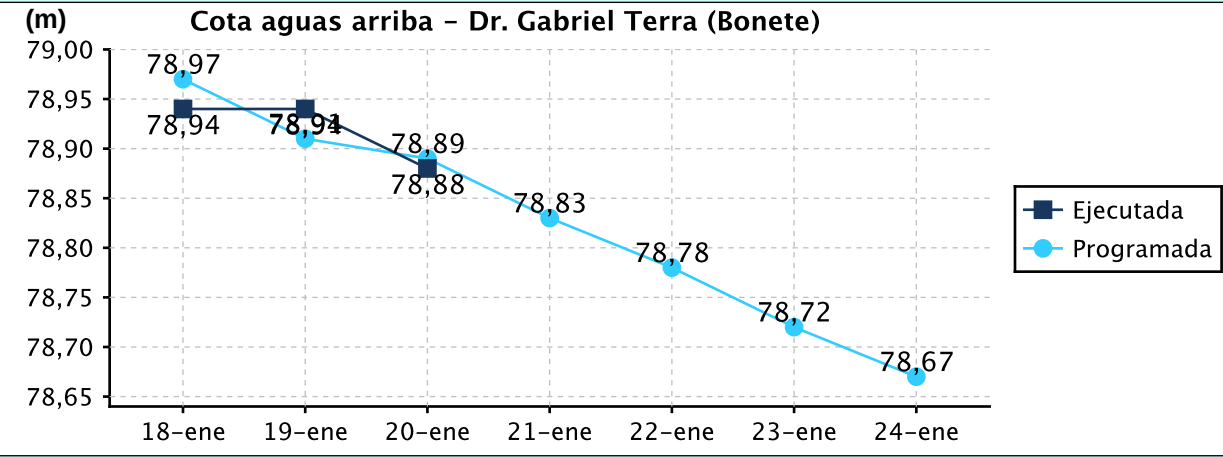


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,89	78,88
Baygorria	53,74	53,75
Palmar	38,64	38,66
SGU	34,47	34,4

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

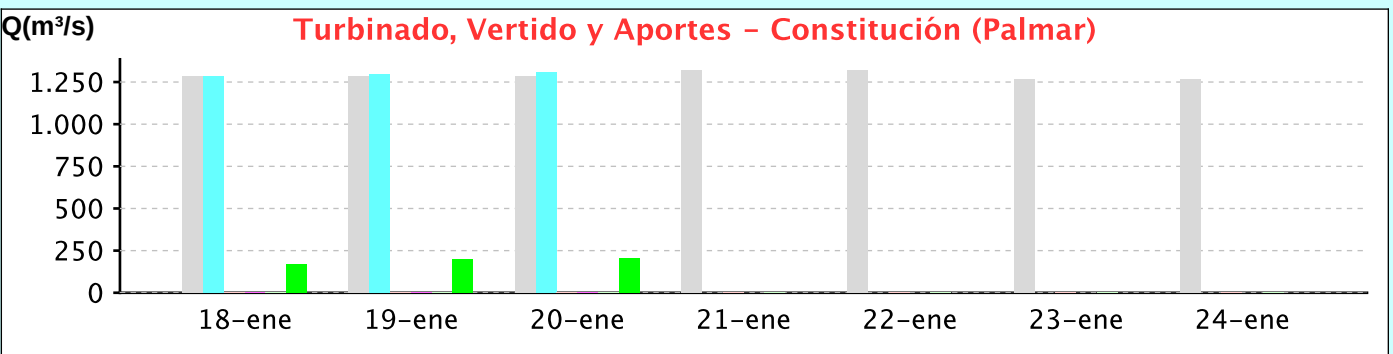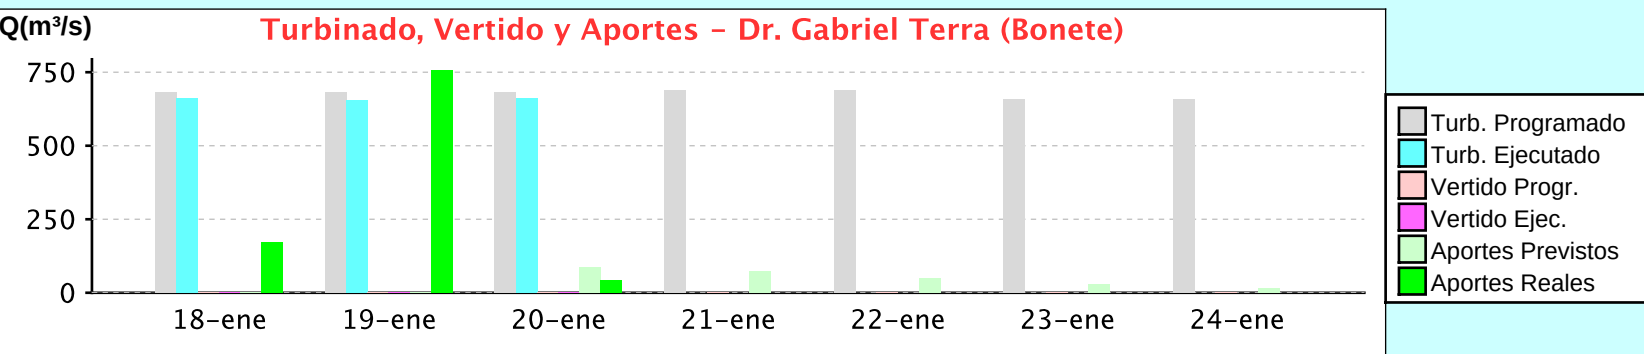

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

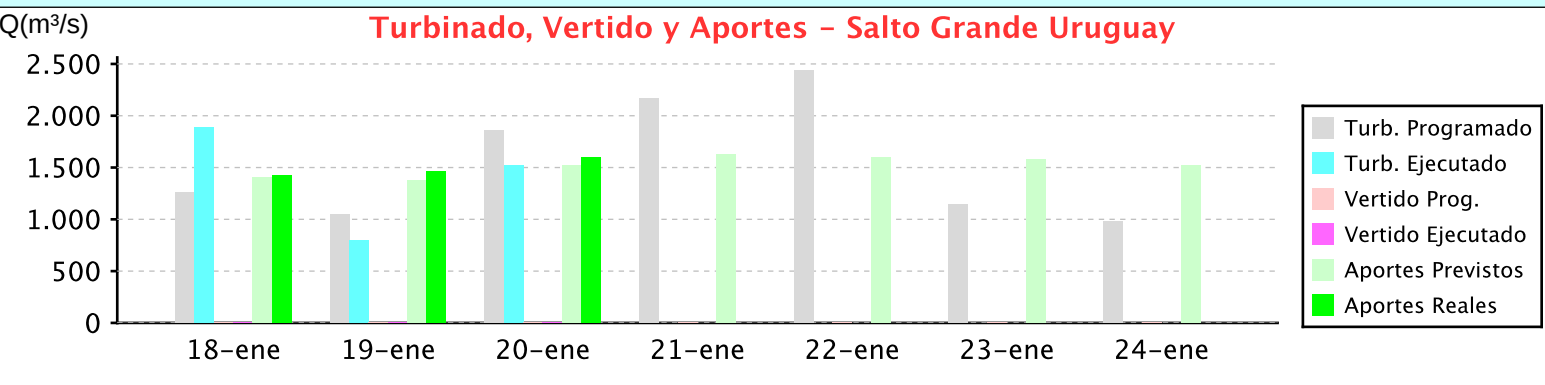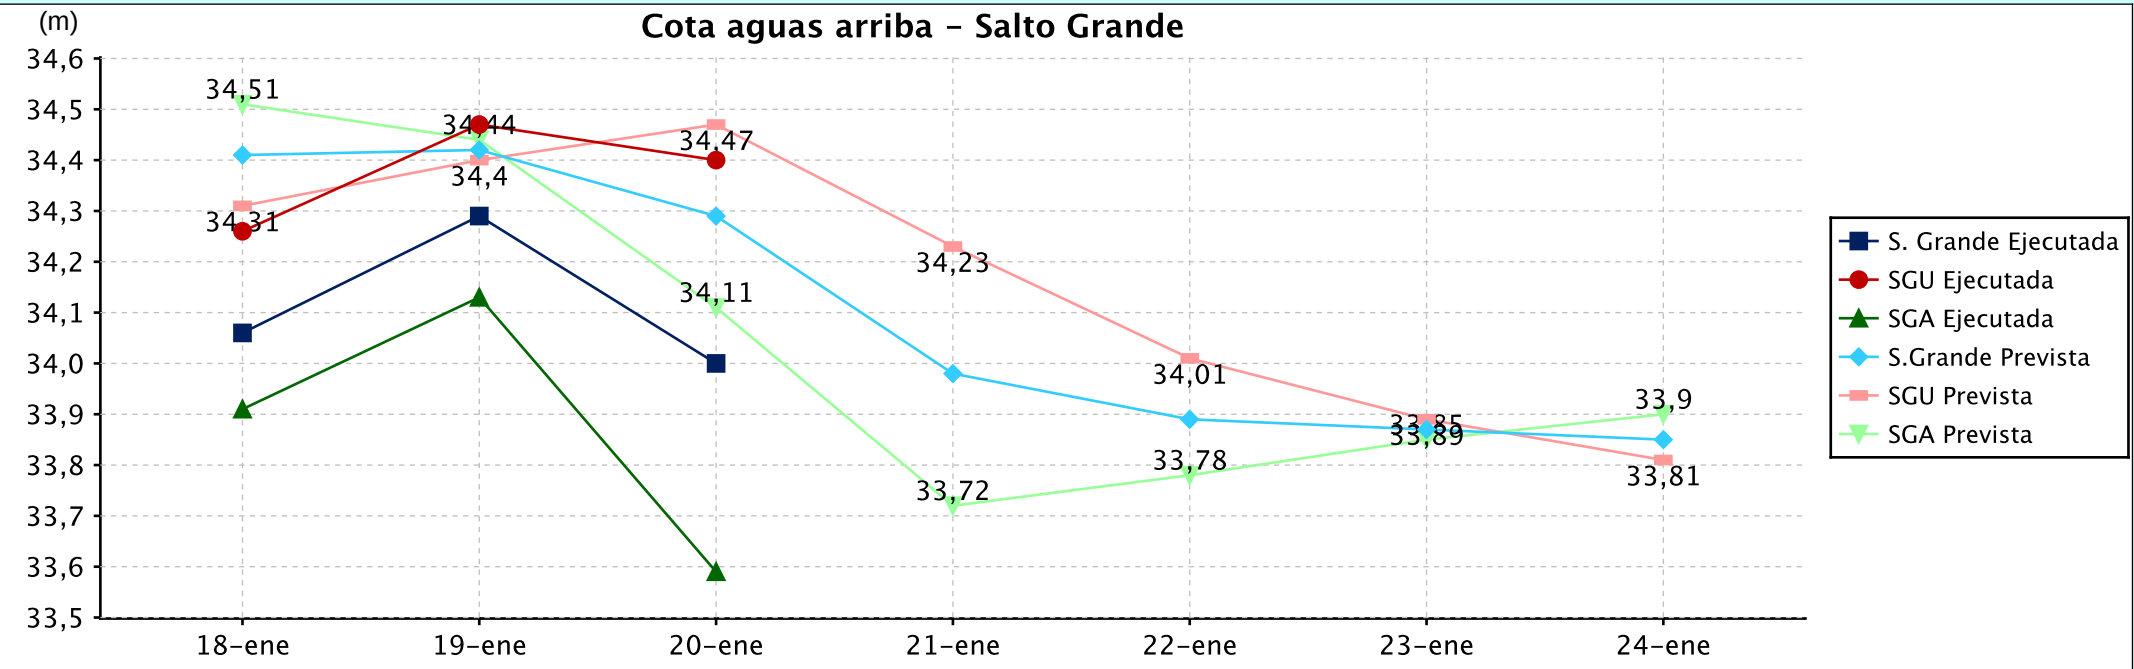

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,40
Cota Vista Arg	33,59
Cota real	34,00

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	16.772
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	681	661
Baygorria	669	630
Palmar	1.286	1.310
SGU	1.859	1.522

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	87	44
Baygorria	0	18
Palmar	0	204
SGU	1.525	1.598

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 187,3 MW medios en modalidad contingente hacia Argentina.
La demanda ejecutada fue sensiblemente inferior a la prevista debido al descenso en las temperaturas.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

21/01/2014 15:29
