



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 03 de febrero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	4.169
Sala B	539
5ta.	0
6ta.	2.376
Motores	1.254
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-11
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-0
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.934
C. Baygorria	2.132
C. Palmar	7.770
C. Salto Grande	9.014
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.359
TOTAL Generación	27.321

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.321
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	



Demanda Programada (MWh)	29.210
Diferencia (MWh)	-1.889
Ejecutada - Programada	-6,47 %

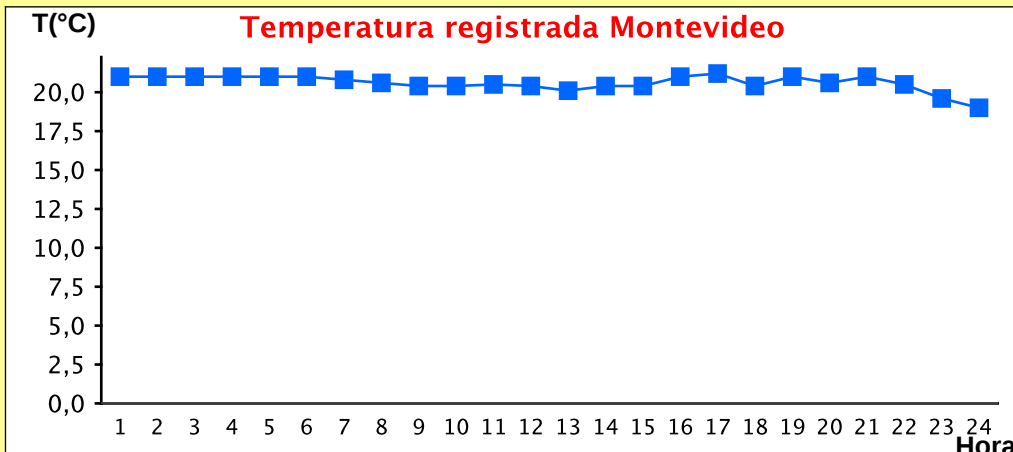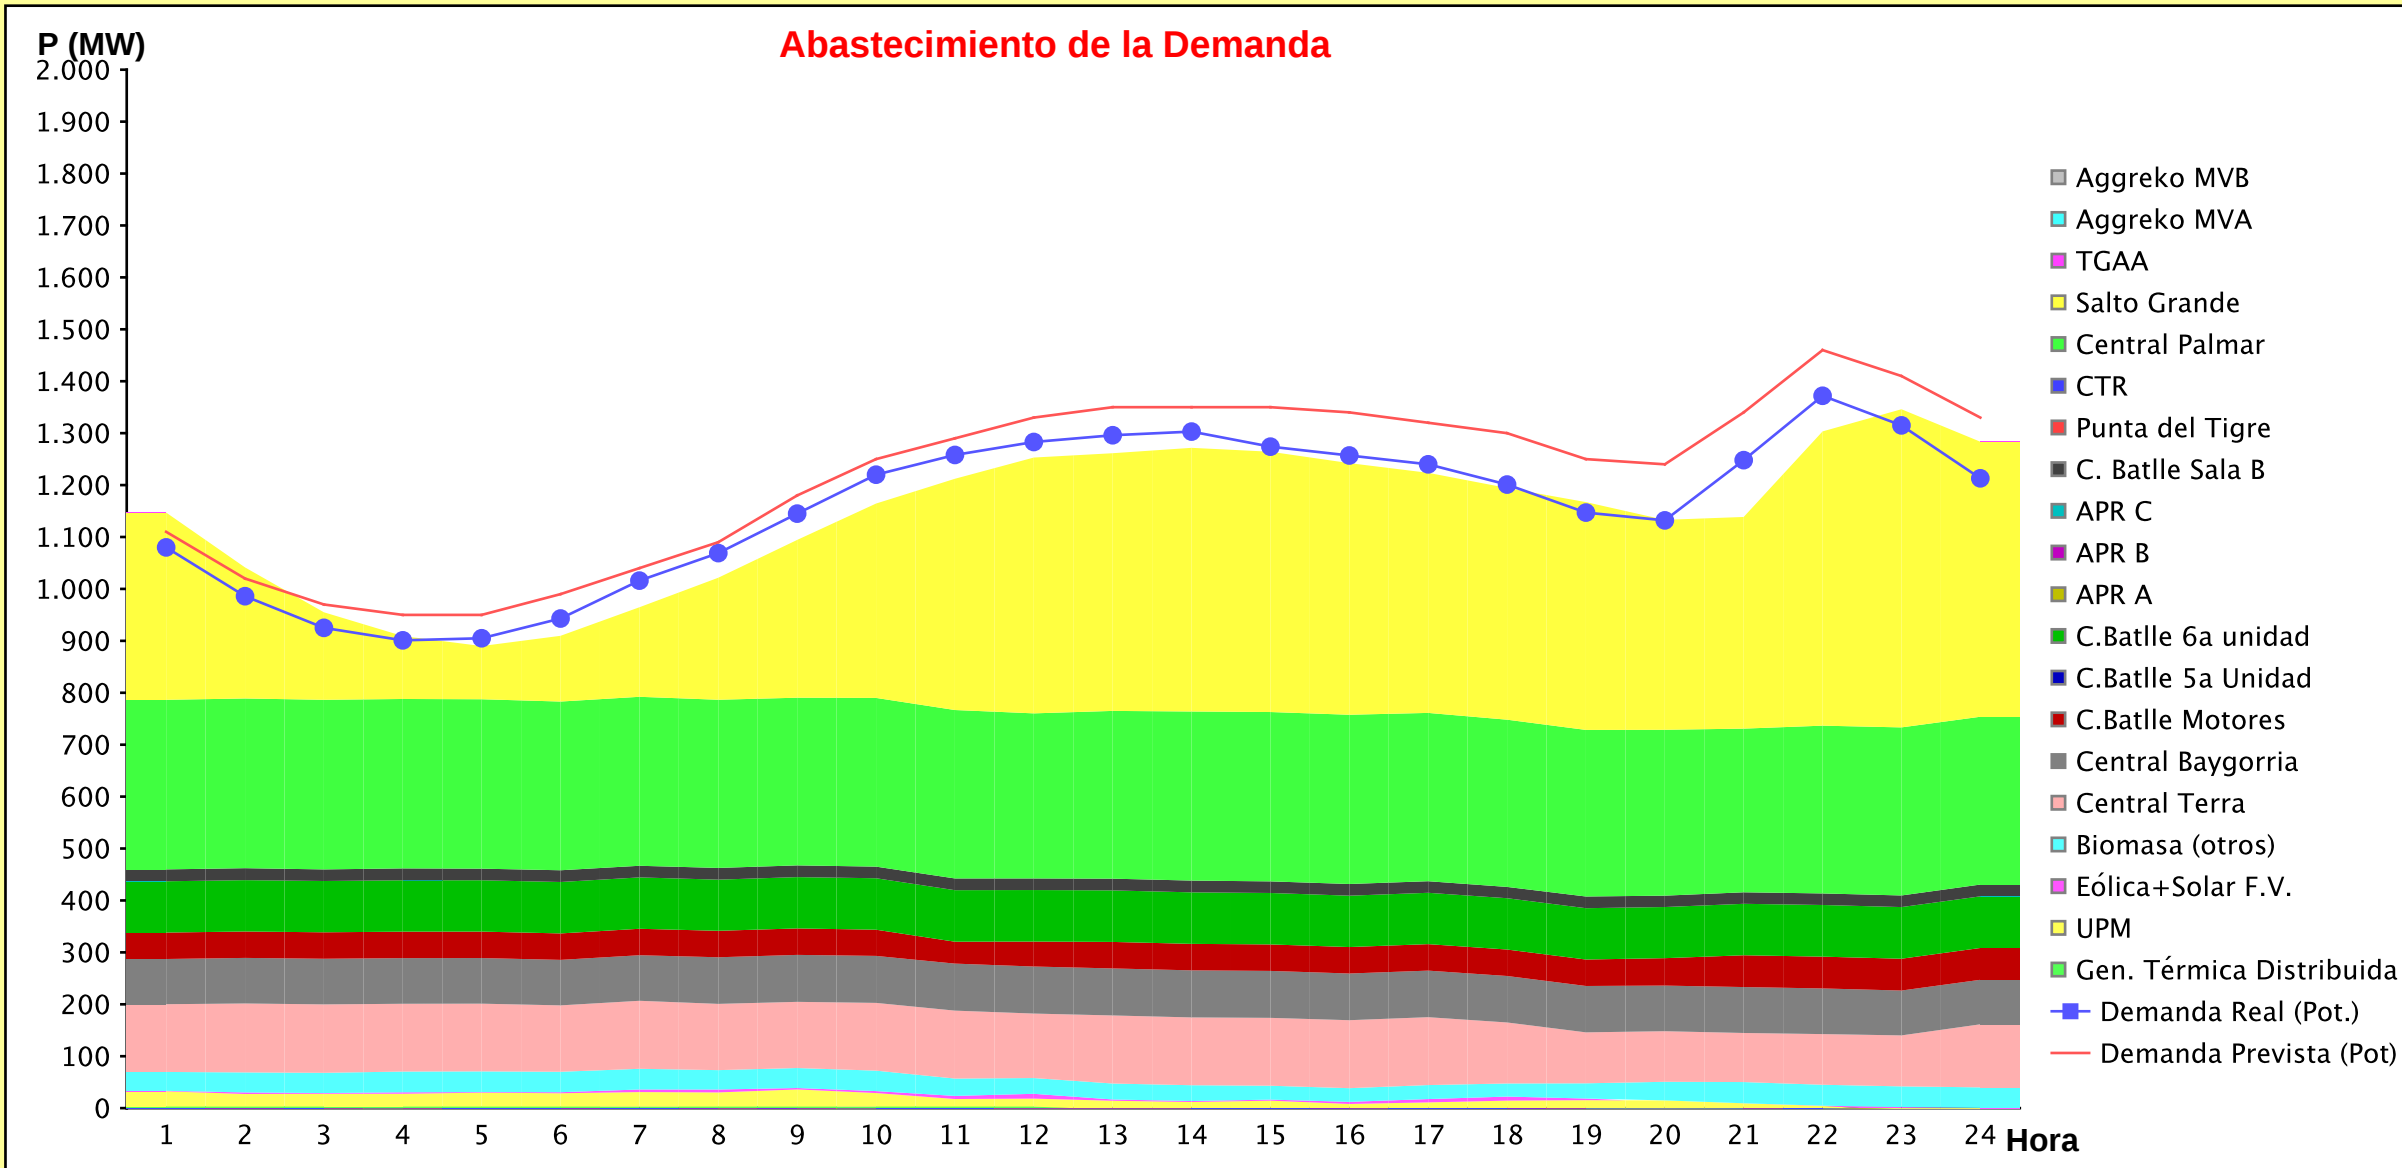


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1318,43 Hora 13:25
Potencia mínima:	892,08 Hora 04:35
Pico noche:	1394,81 Hora 22:04

Generación Media (MW)	
Eólica	3,8
Biomasa	54,7
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	1,5
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

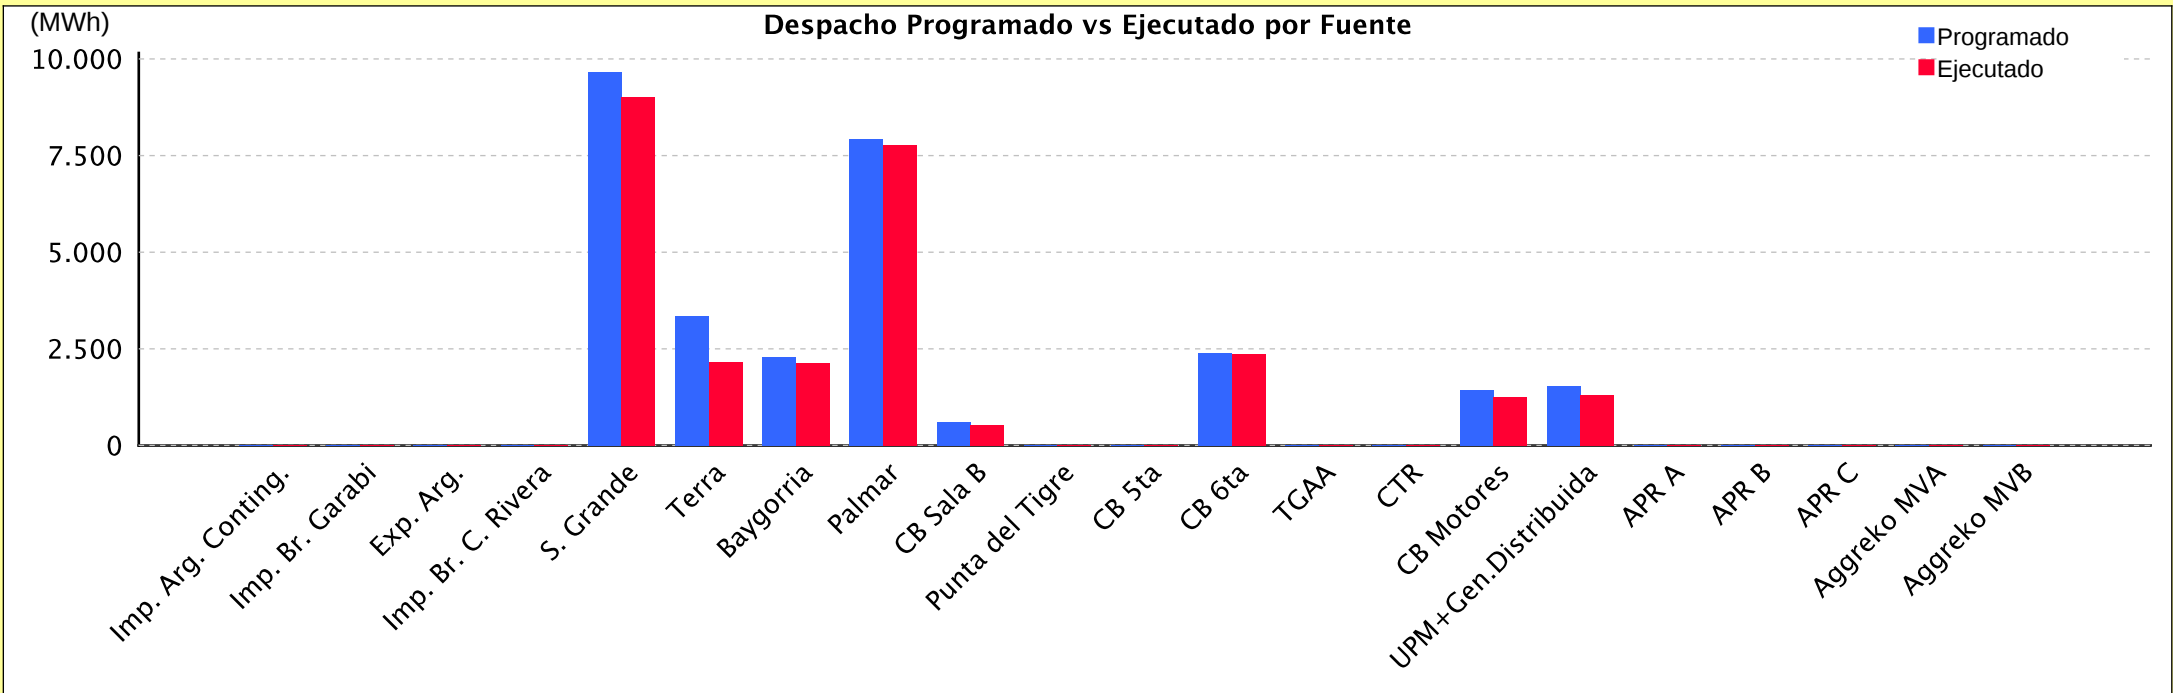
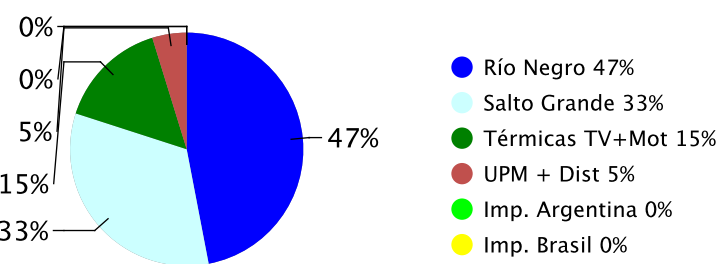


Generación (Demanda + Exportación)

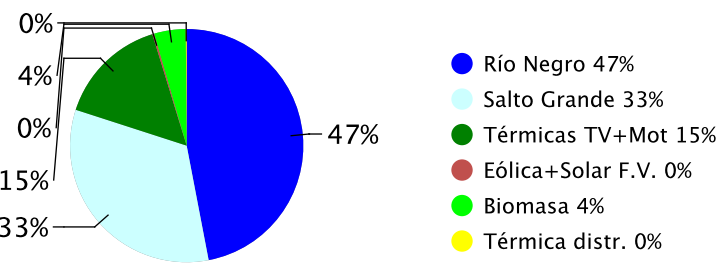



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

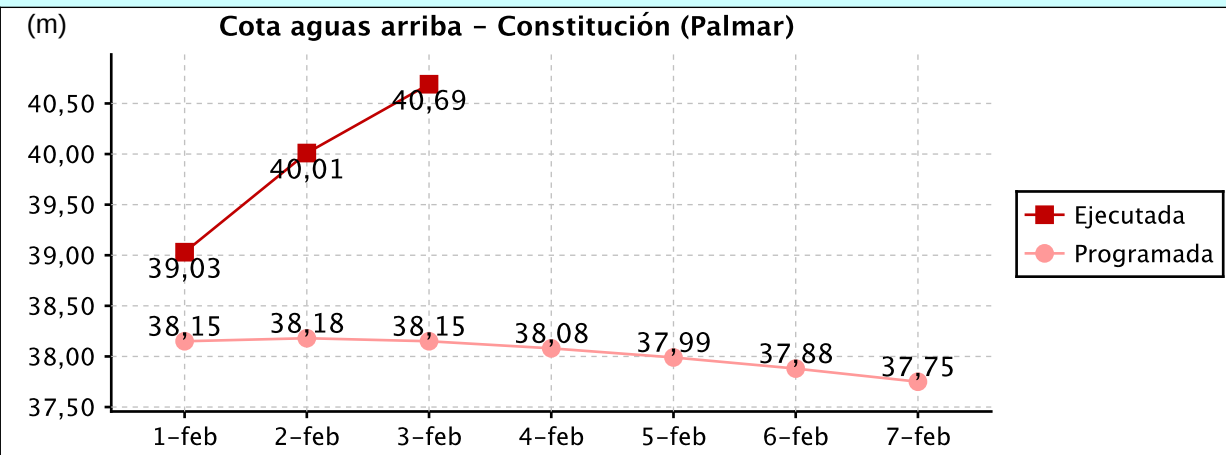
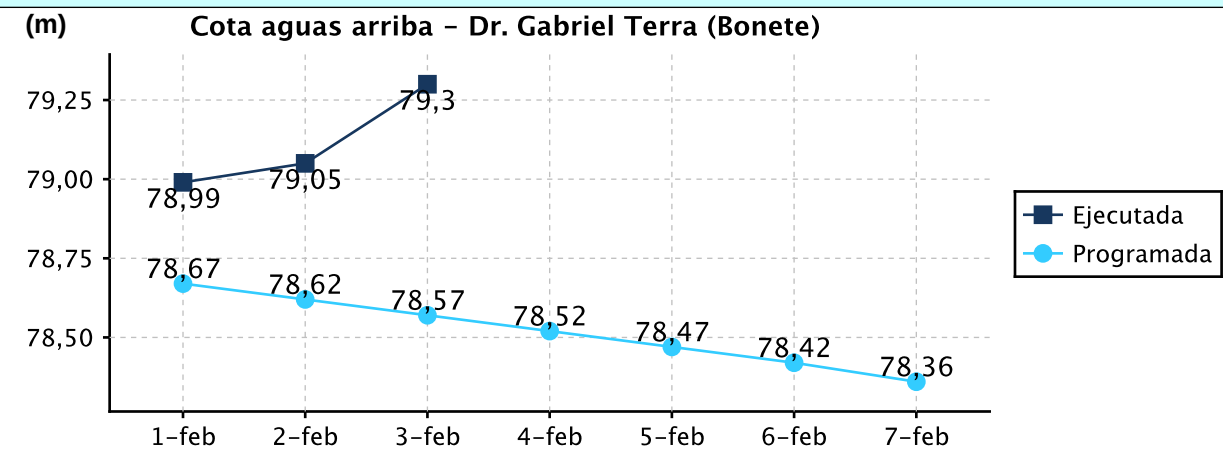


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,57	79,3
Baygorria	54,23	54,27
Palmar	38,15	40,69
SGU	33,23	33,59

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

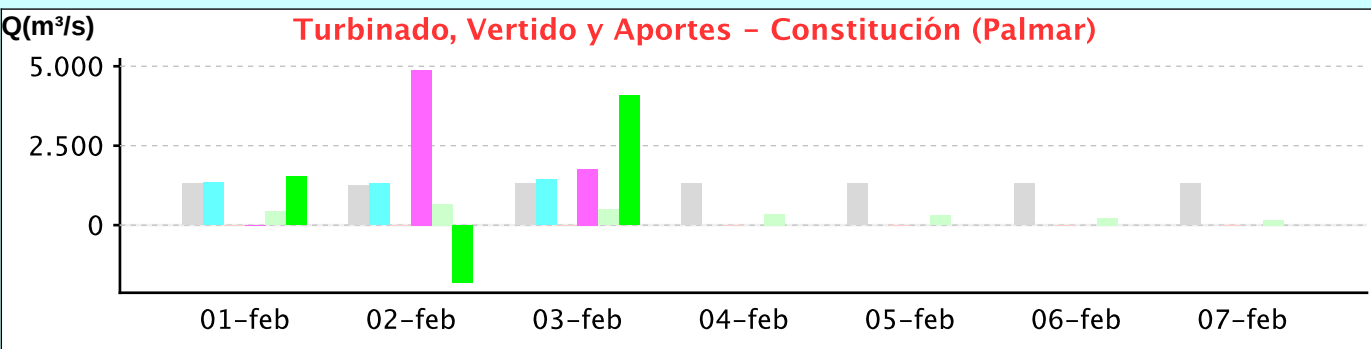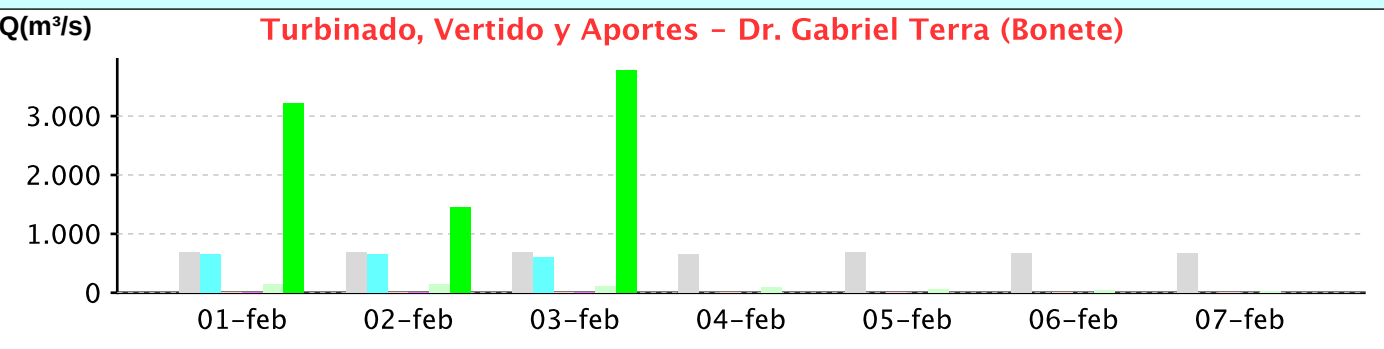

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

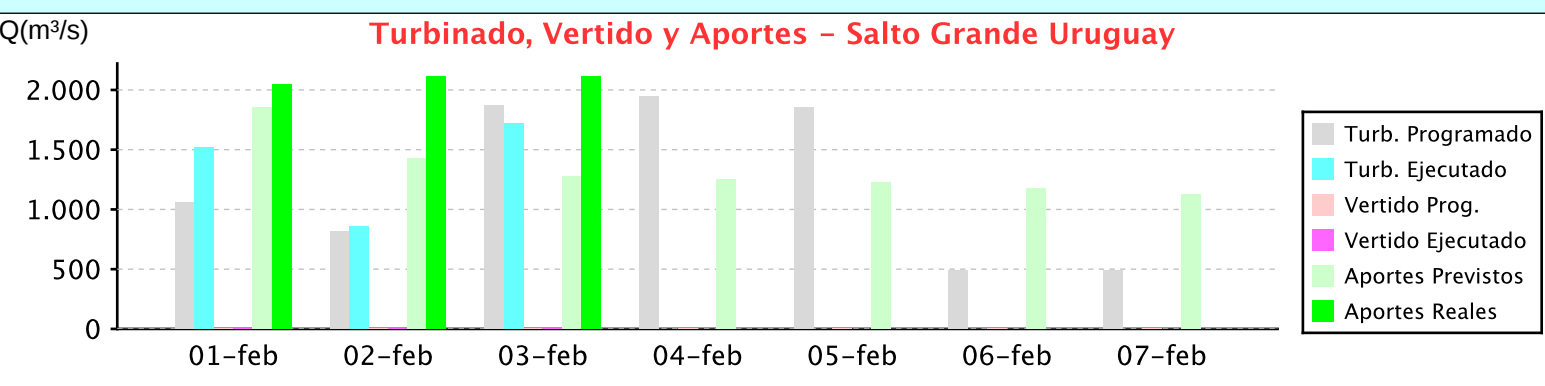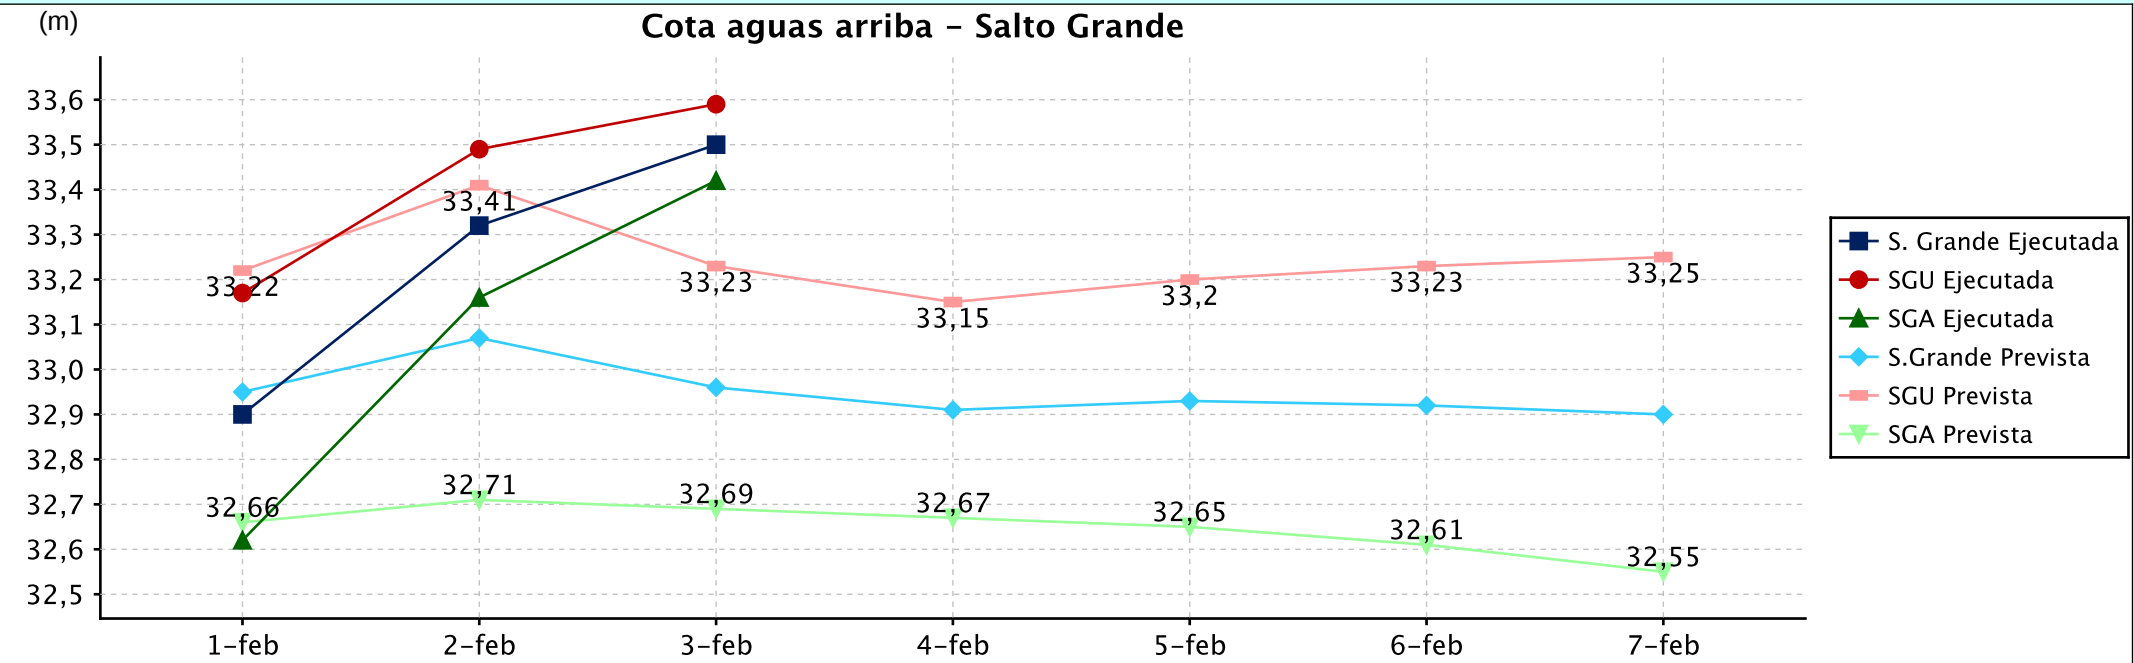

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,59
Cota Vista Arg	33,42
Cota real	33,50
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
3.291	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	688	608
Baygorria	788	828
Palmar	1.319	1.445
SGU	1.873	1.718

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	117	3.775
Baygorria	47	1.225
Palmar	503	4.071
SGU	1.275	2.110

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	716
Palmar	0	1.766
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
