




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 04 de febrero de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	4.015
Sala B	347
5ta.	0
6ta.	2.332
Motores	1.336
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-11
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.924
C. Baygorria	2.073
C. Palmar	7.550
C. Salto Grande	11.036
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	791
TOTAL Generación	28.331

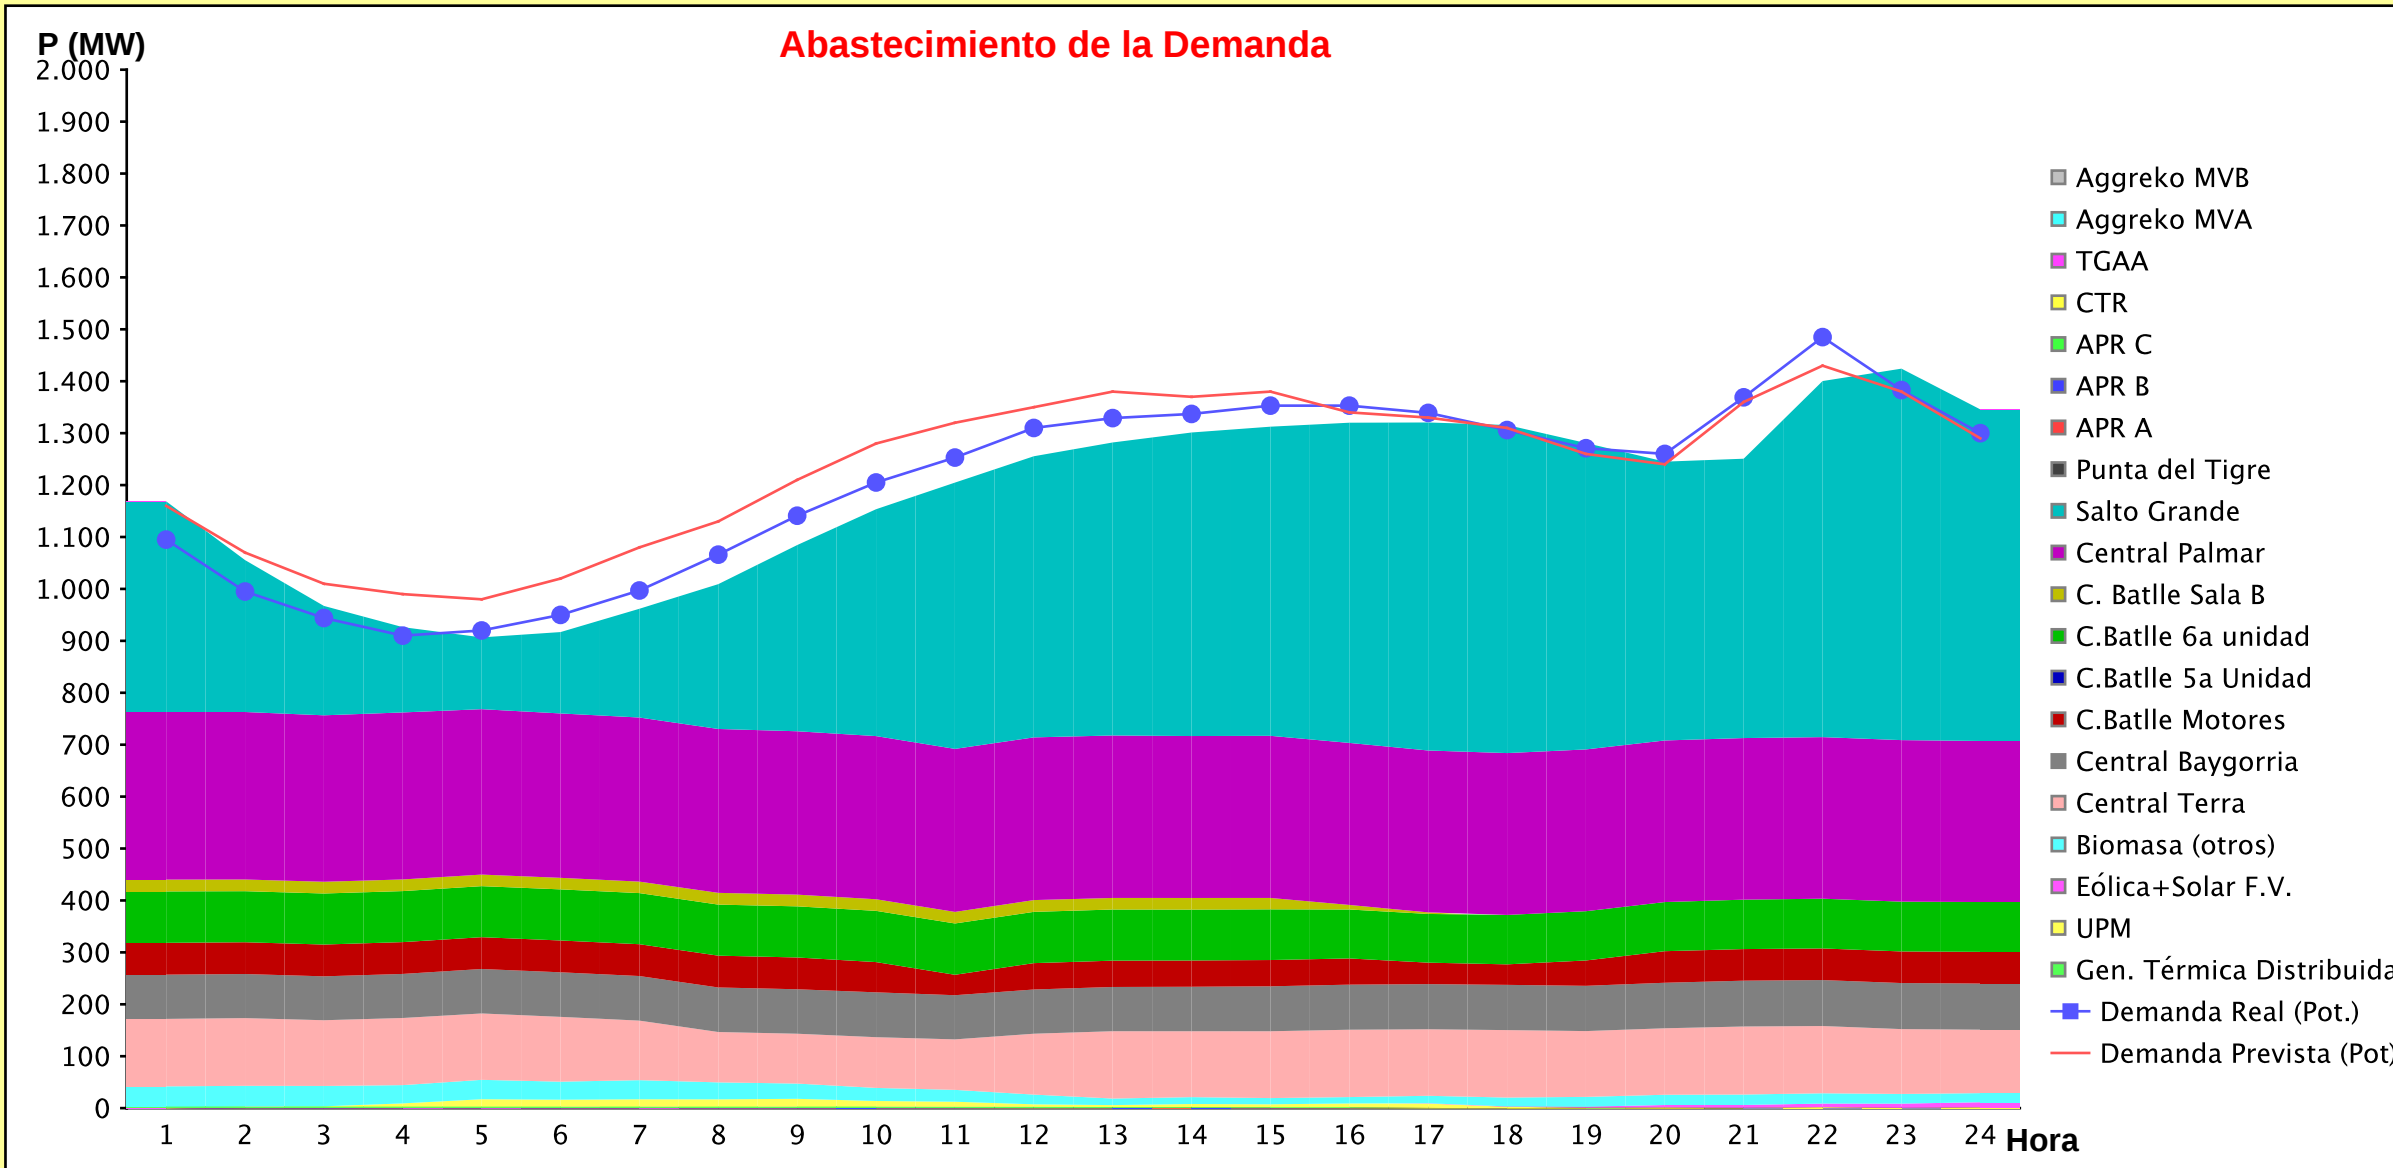

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.331
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	



Demanda Programada (MWh)	29.670
Diferencia (MWh)	-1.339
Ejecutada - Programada	-4,51 %

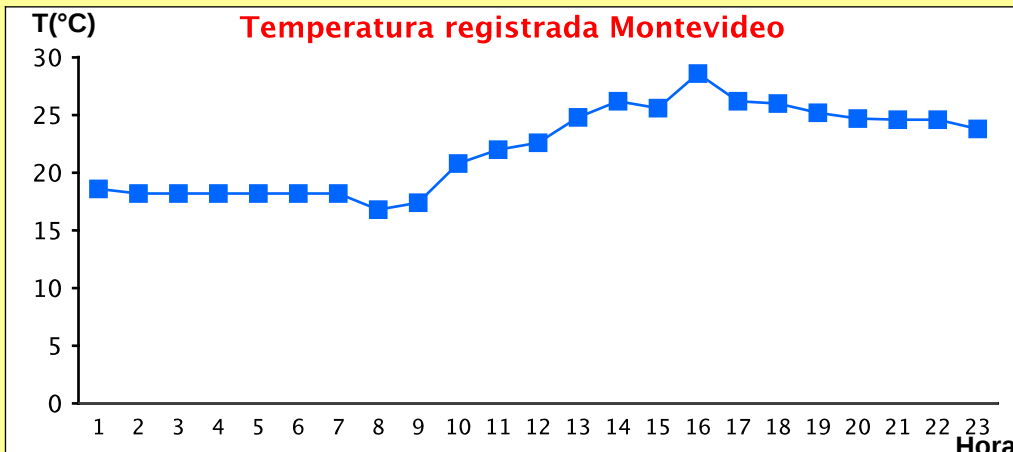


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1369,87 Hora 15:19
Potencia mínima:	903,33 Hora 04:23
Pico noche:	1491,28 Hora 21:53

Generación Media (MW)	
Eólica	1,8
Biomasa	36,0
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	1,8
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

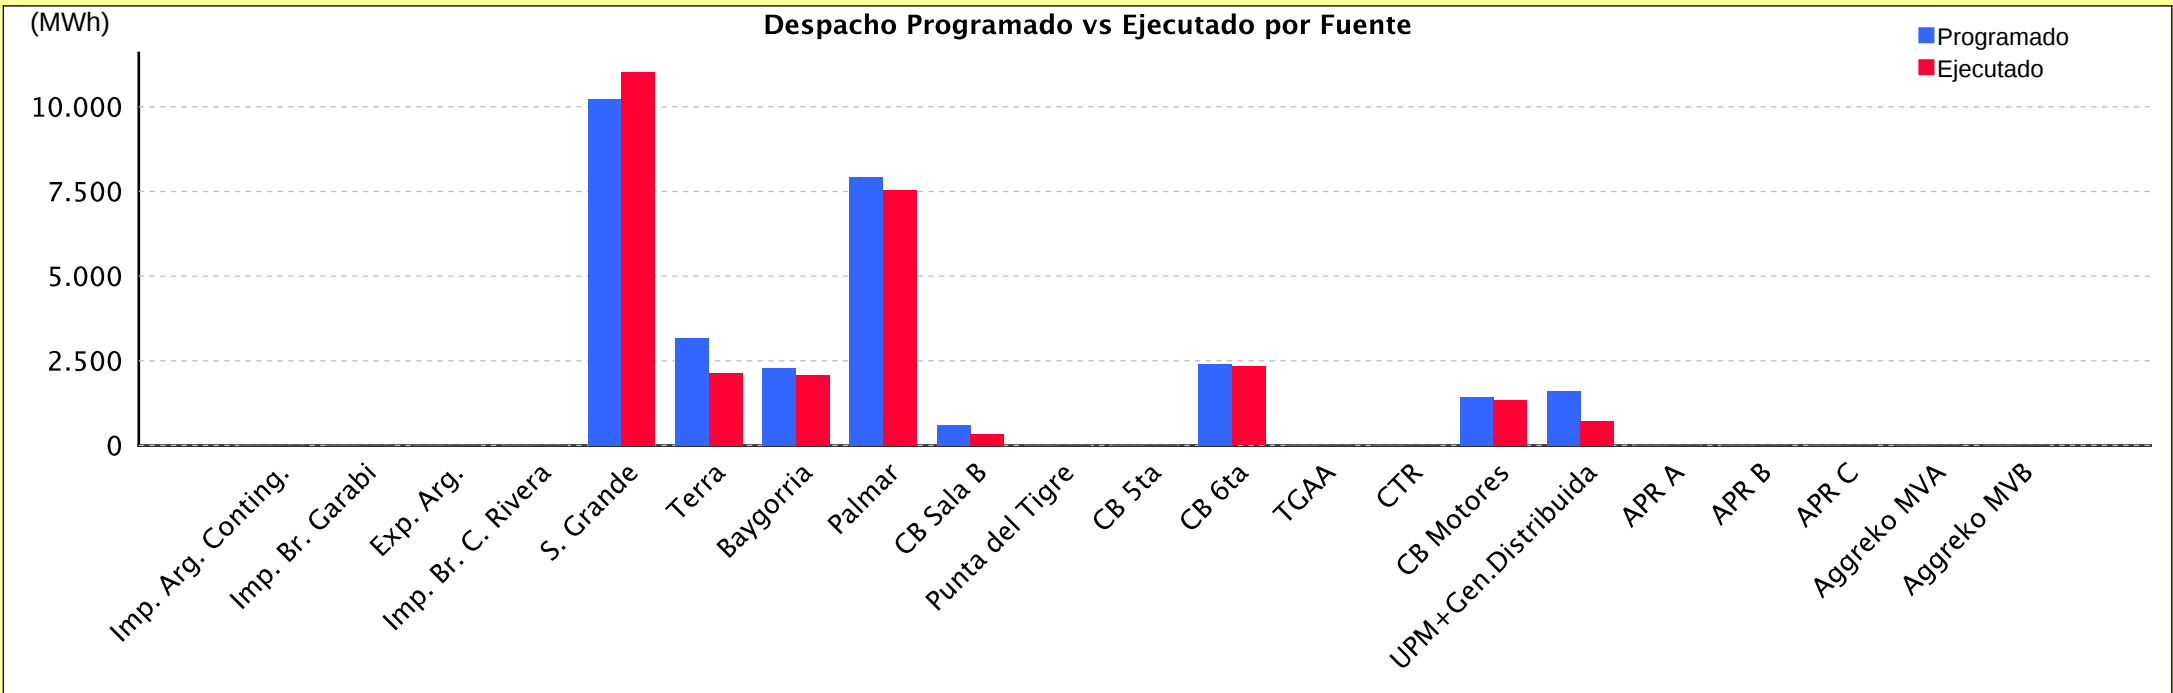
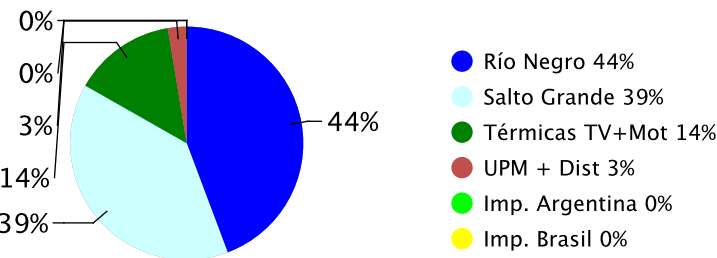


Generación (Demanda + Exportación)

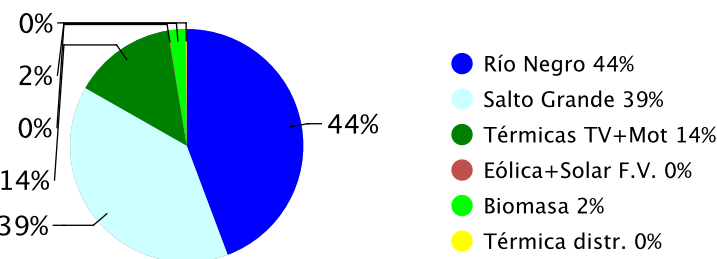



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

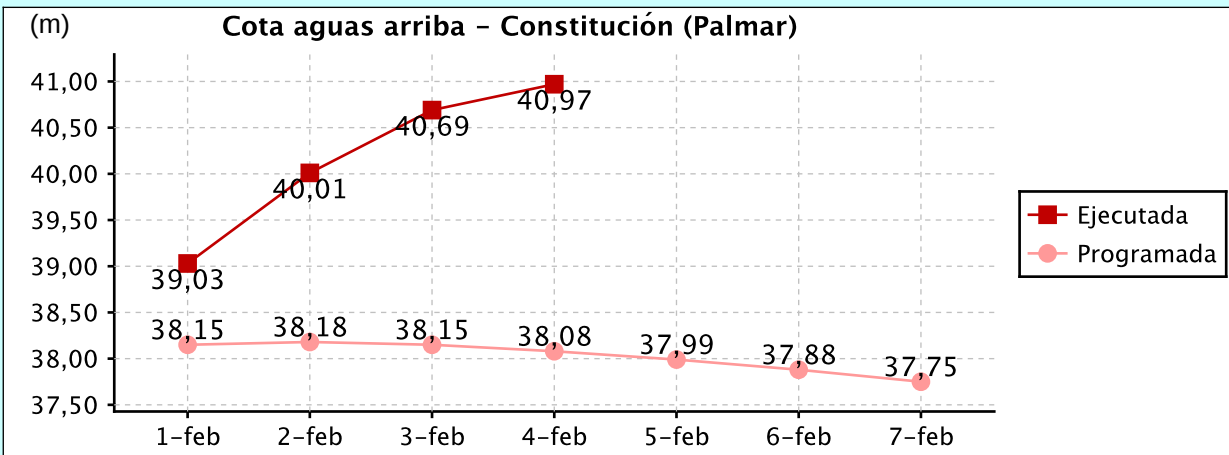
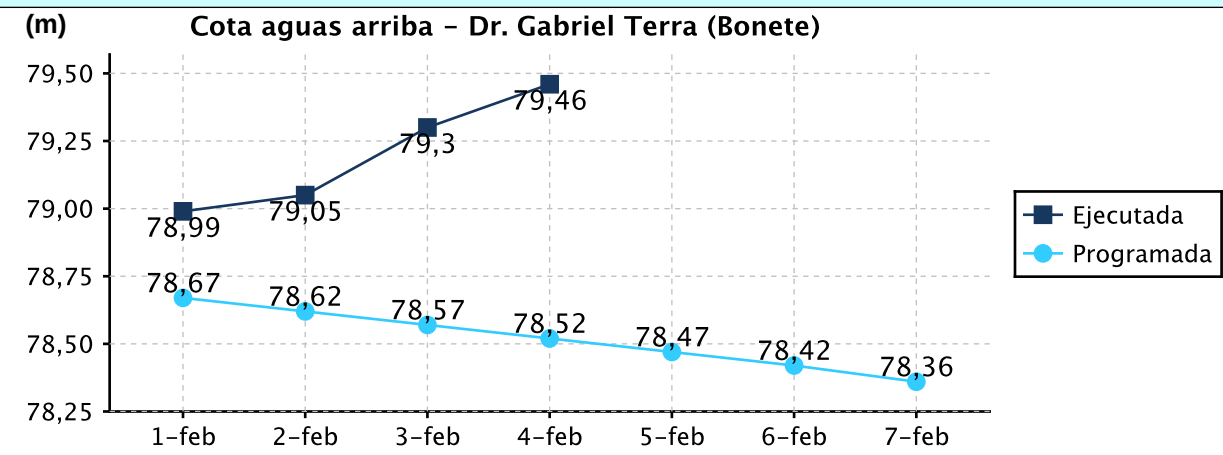


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,52	79,46
Baygorria	54,20	54,18
Palmar	38,08	40,97
SGU	33,15	33,94

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

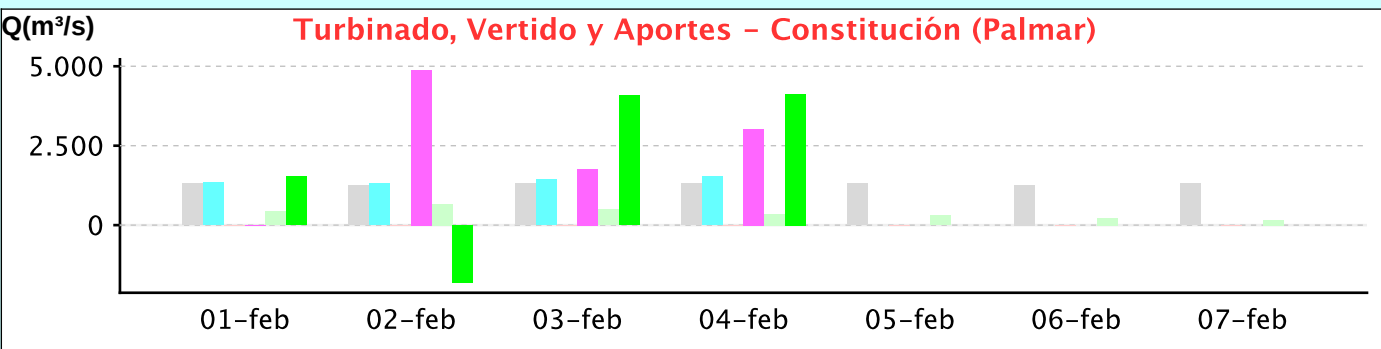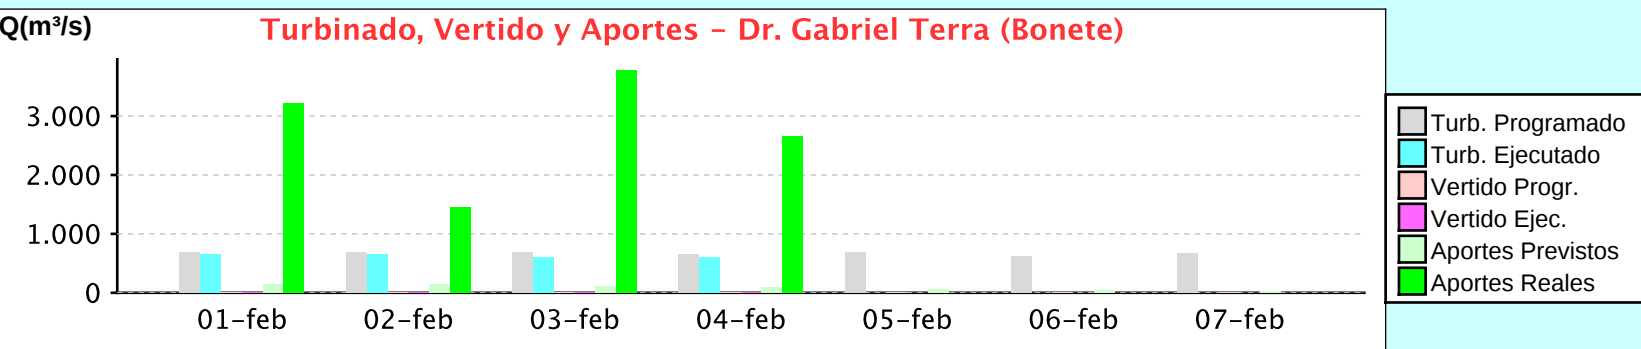

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

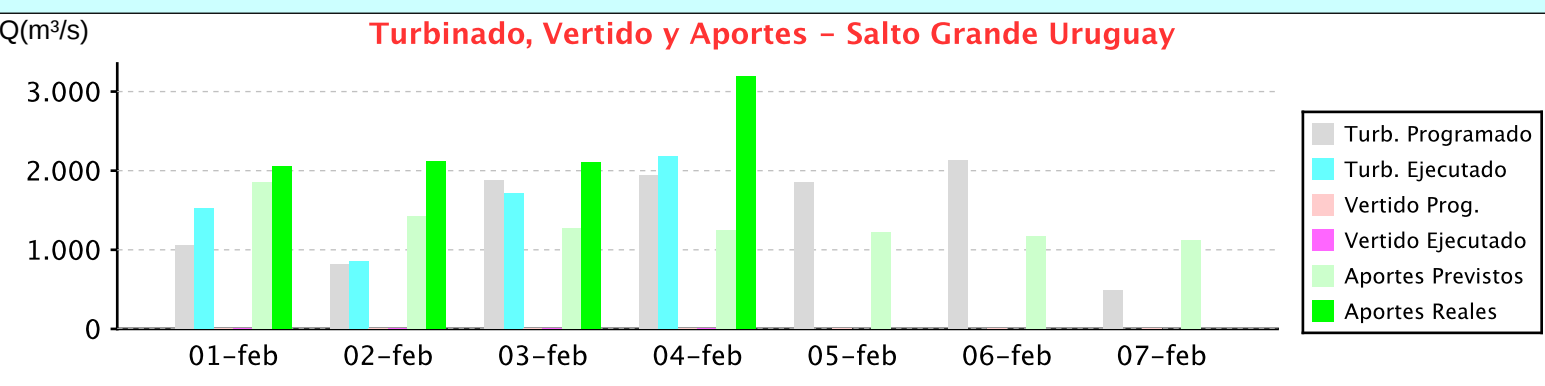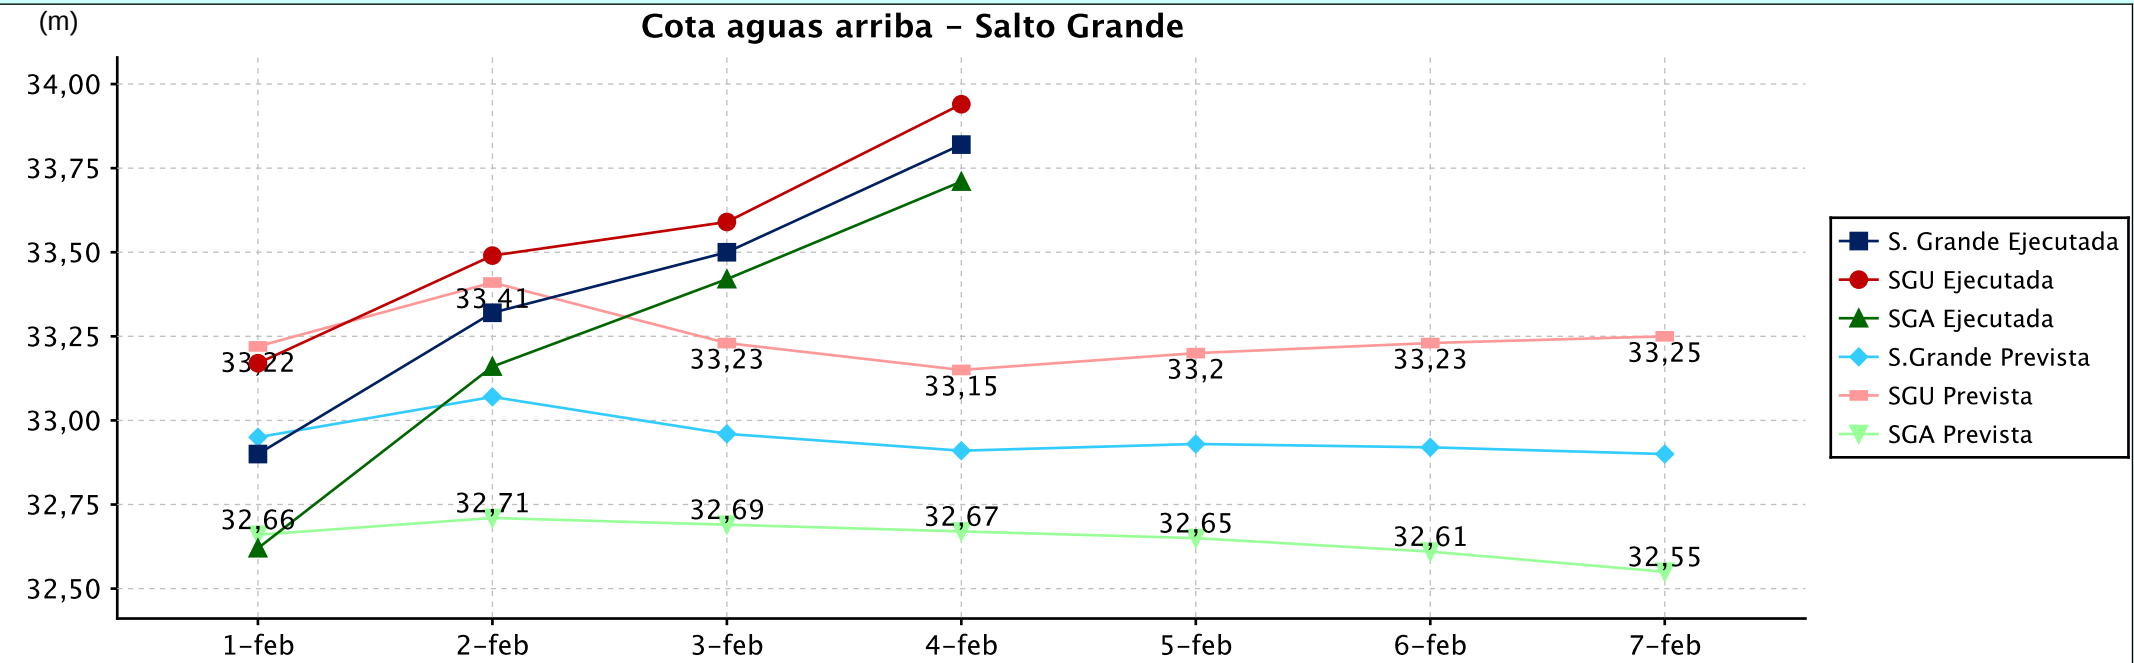

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,94
Cota Vista Arg	33,71
Cota real	33,82
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	4.787

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	652	598
Baygorria	788	832
Palmar	1.319	1.540
SGU	1.944	2.184

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	95	2.656
Baygorria	24	934
Palmar	346	4.127
SGU	1.250	3.196

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	804
Palmar	0	3.022
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

A las hora energética 17 se decidió reprogramar la semana, sacando la central SALA B.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

05/02/2014 17:17
