




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 08 de febrero de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	1.198
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.201
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-11
APR A	114
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.376
C. Baygorria	2.180
C. Palmar	7.696
C. Salto Grande	13.034
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.745
TOTAL Generación	29.287

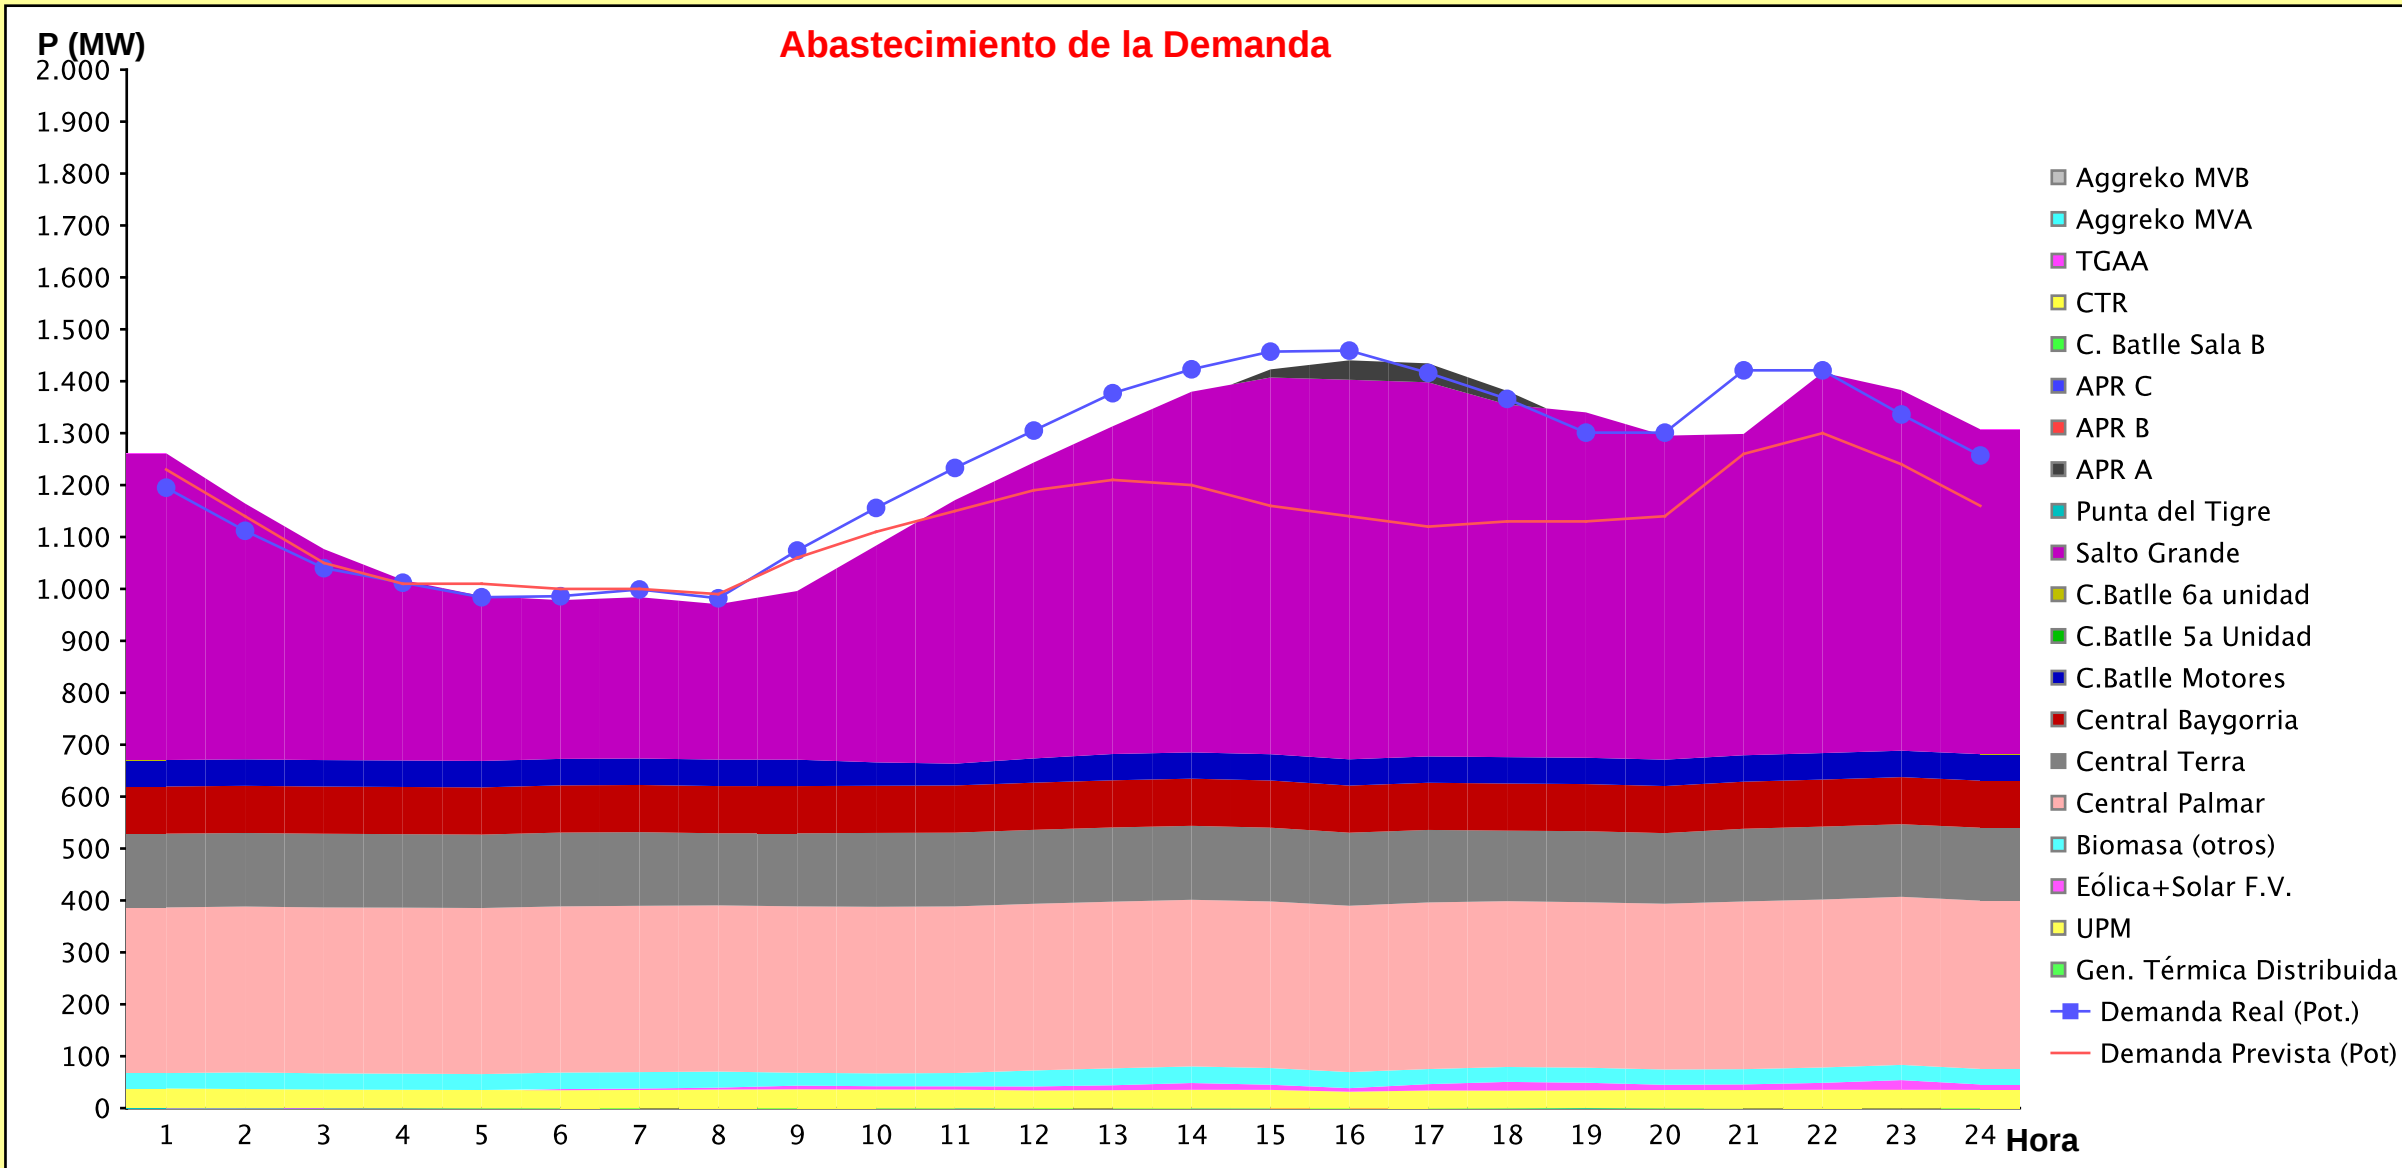

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.287
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.130
Diferencia (MWh)	2.157
Ejecutada - Programada	7,95 %

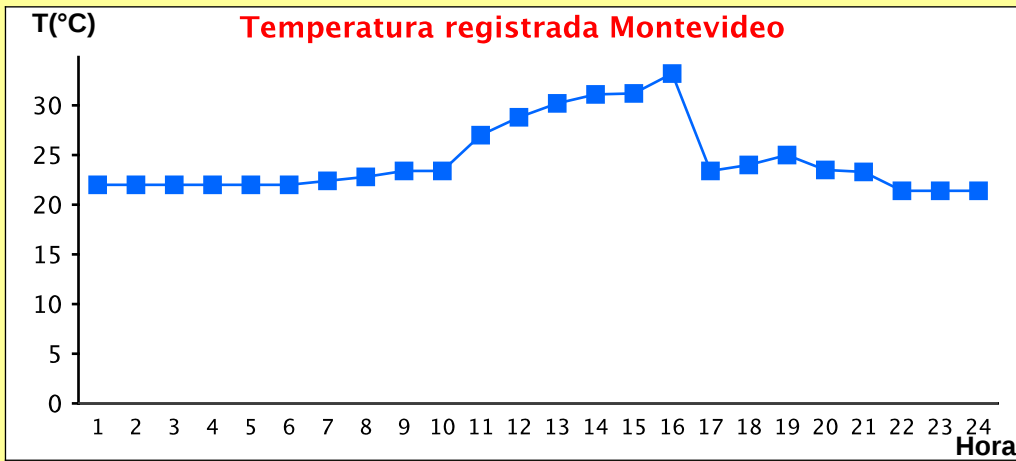



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1471,77 Hora 15:57
Potencia mínima:	964,05 Hora 07:28
Pico noche:	1451,82 Hora 21:24

Generación Media (MW)	
Eólica	8,0
Biomasa	68,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

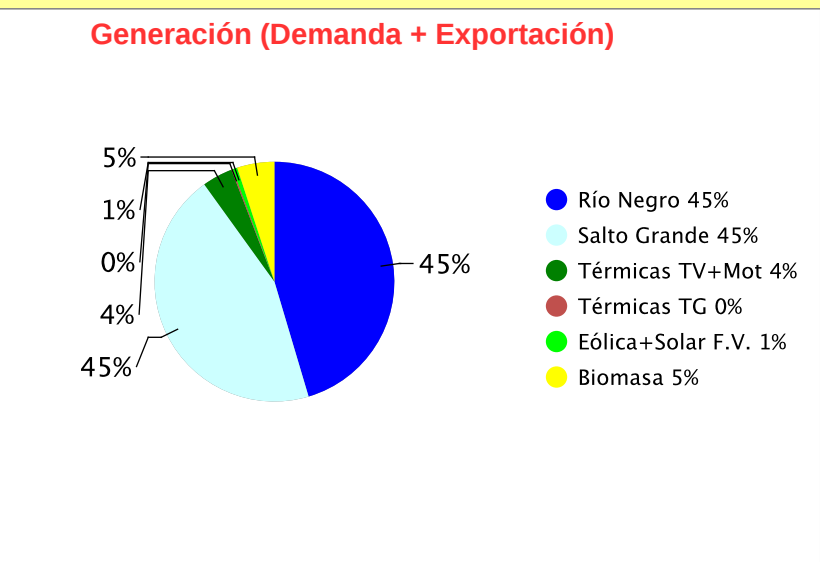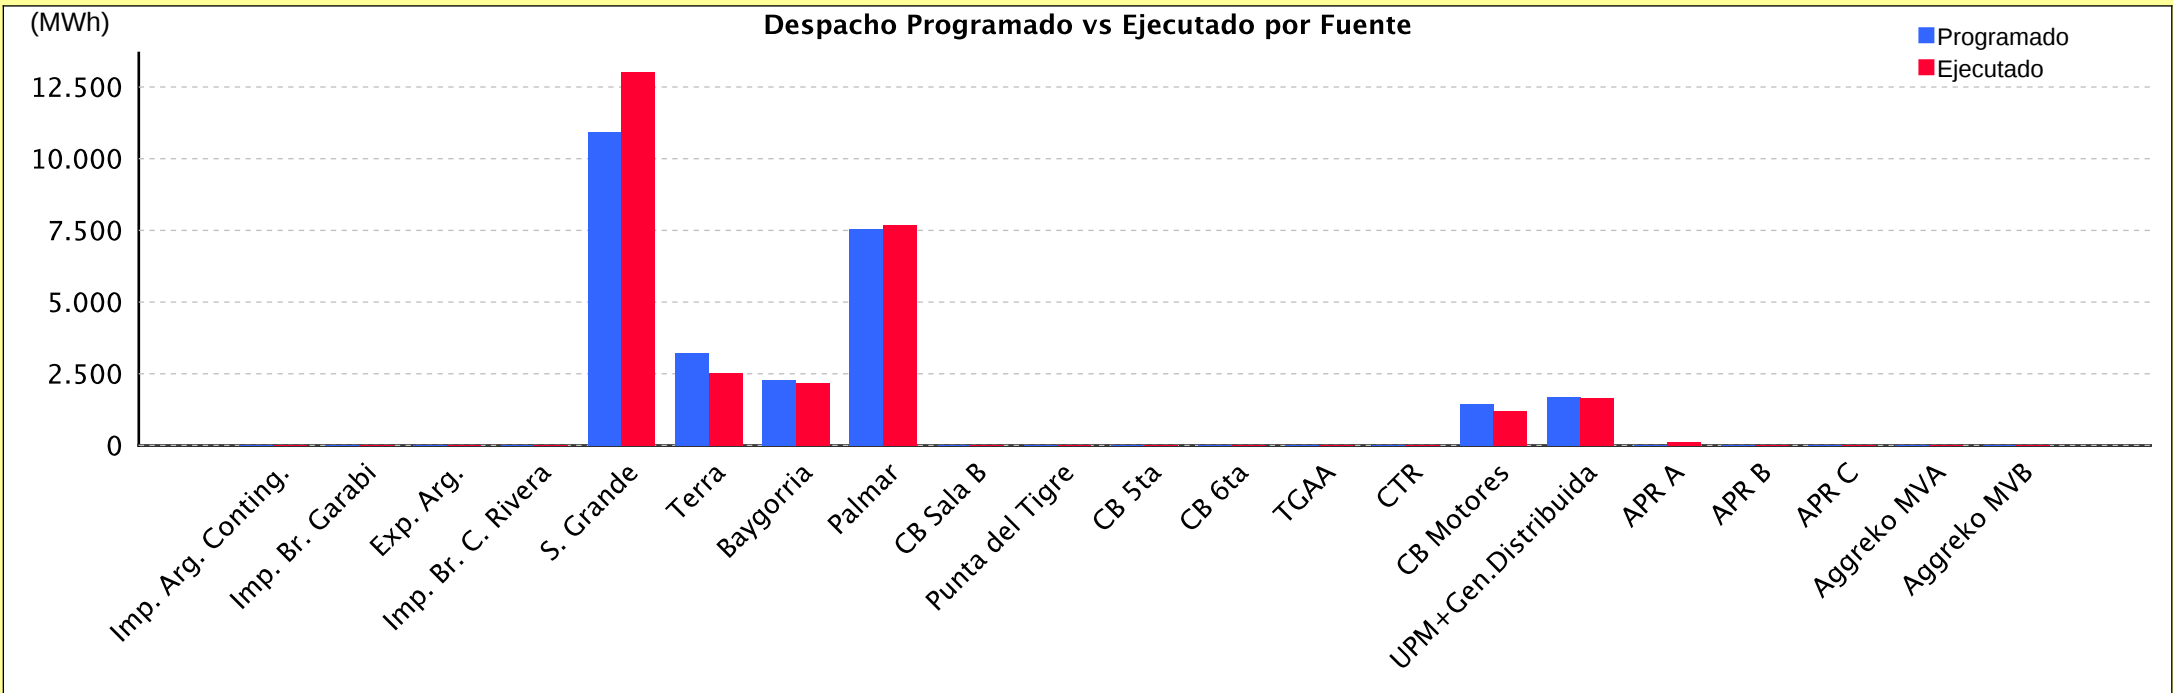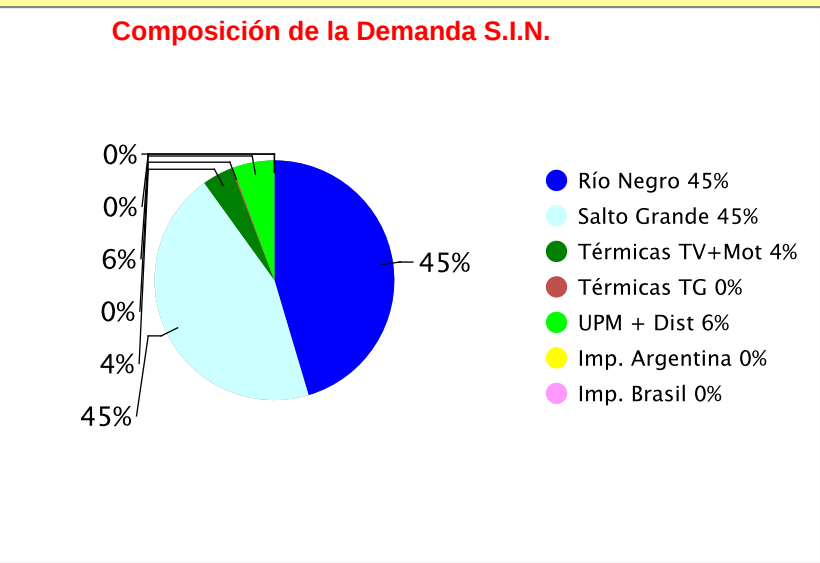



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

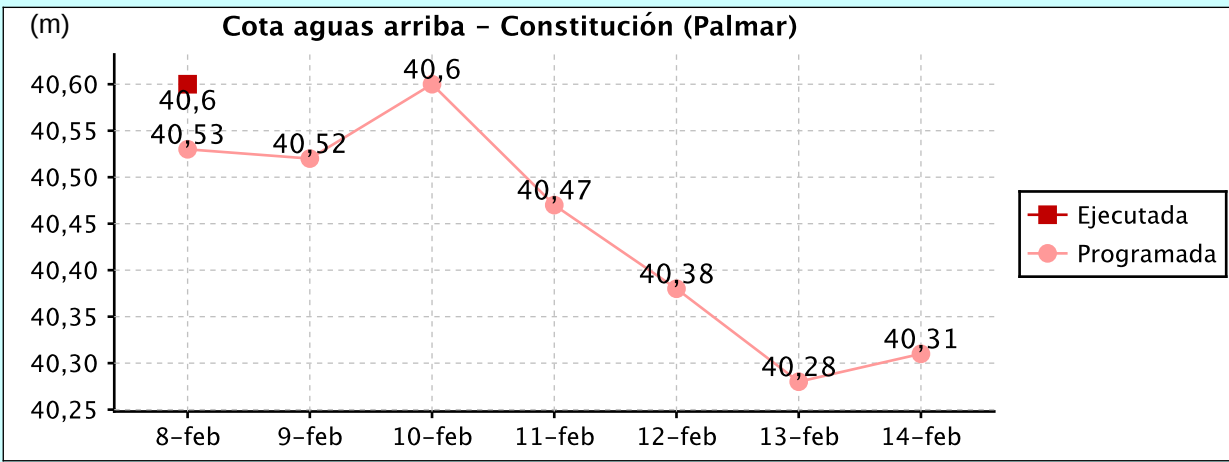
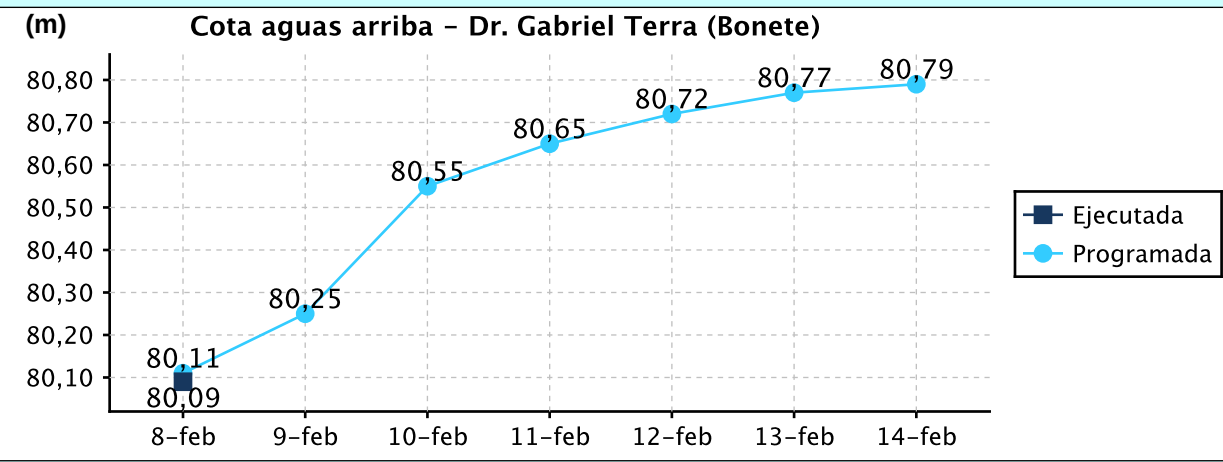


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,11	80,09
Baygorria	53,91	53,8
Palmar	40,53	40,6
SGU	33,90	33,58

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

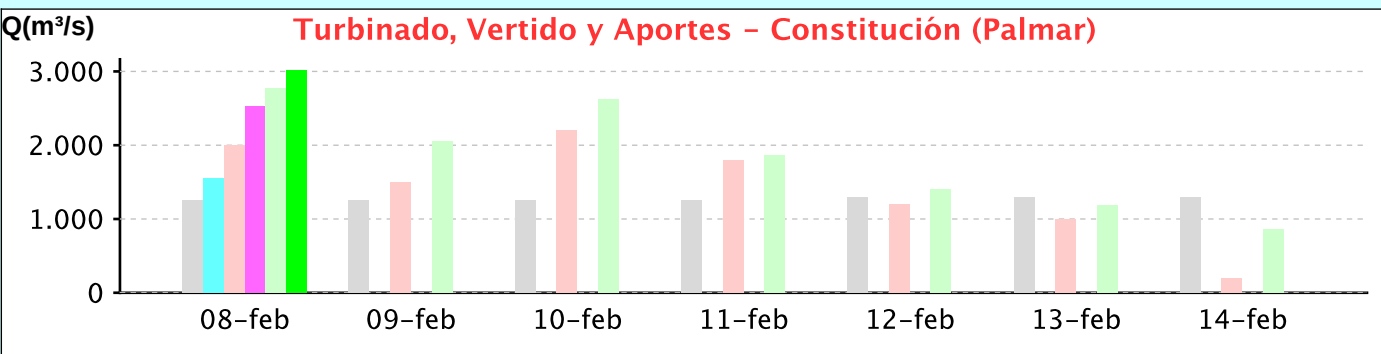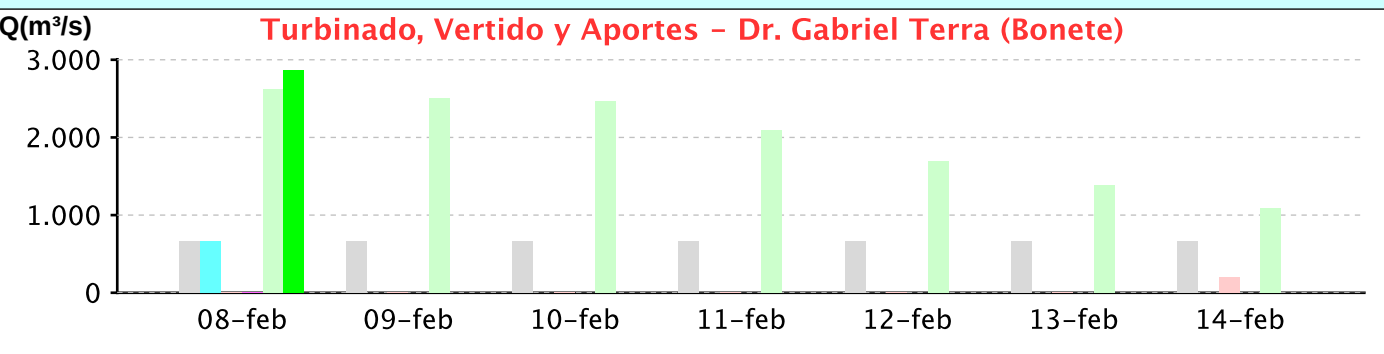

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

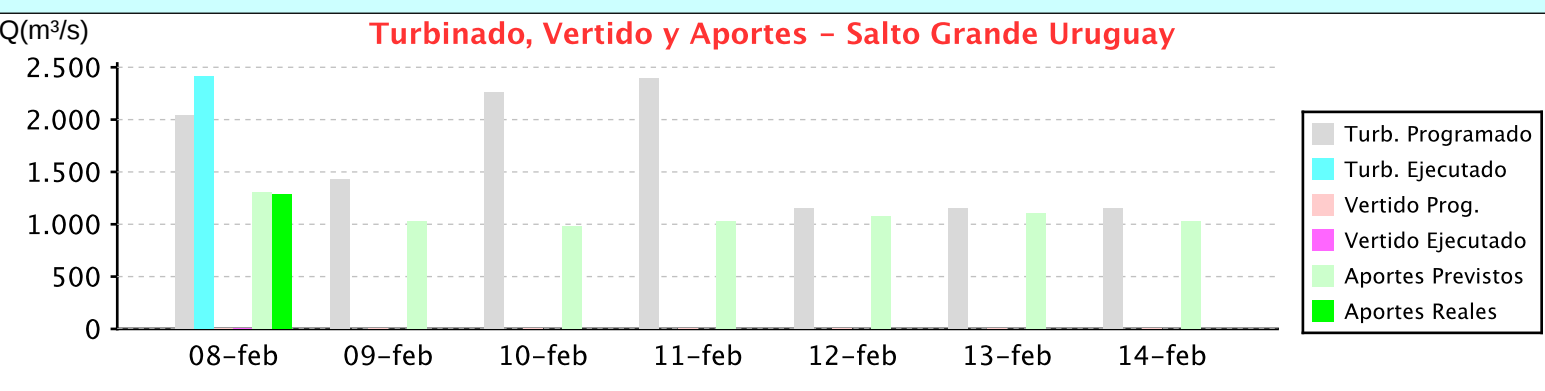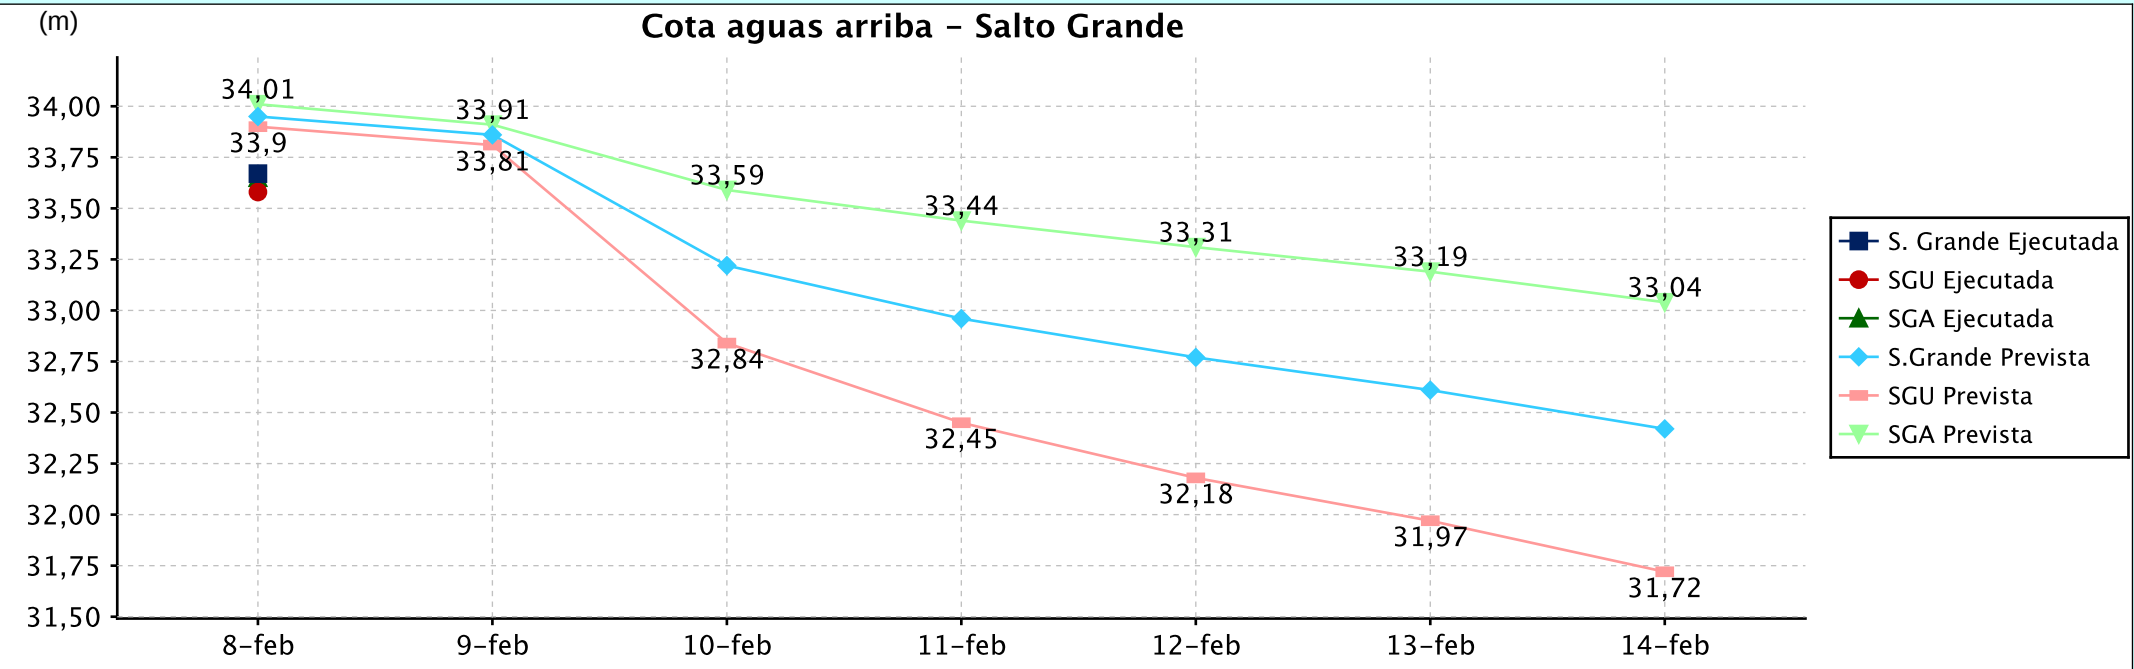

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,58
Cota Vista Arg	33,65
Cota real	33,67
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-1.362

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	664	662
Baygorria	788	848
Palmar	1.259	1.551
SGU	2.040	2.416

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.626	2.863
Baygorria	0	129
Palmar	2.766	3.014
SGU	1.300	1.290

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	2.000	2.533
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
