



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 11 de febrero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	1.071
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.075
Central La Tablada	-39
Central P. del Tigre	4.118
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.358
C. Baygorria	1.597
C. Palmar	7.843
C. Salto Grande	10.800
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	2.057
TOTAL Generación	30.800

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.800
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.860
Diferencia (MWh)	-1.060
Ejecutada - Programada	-3,33 %

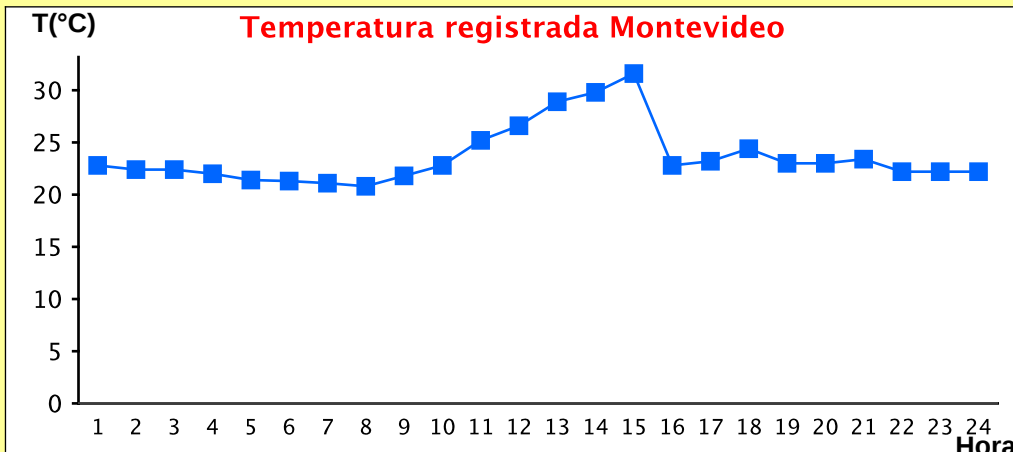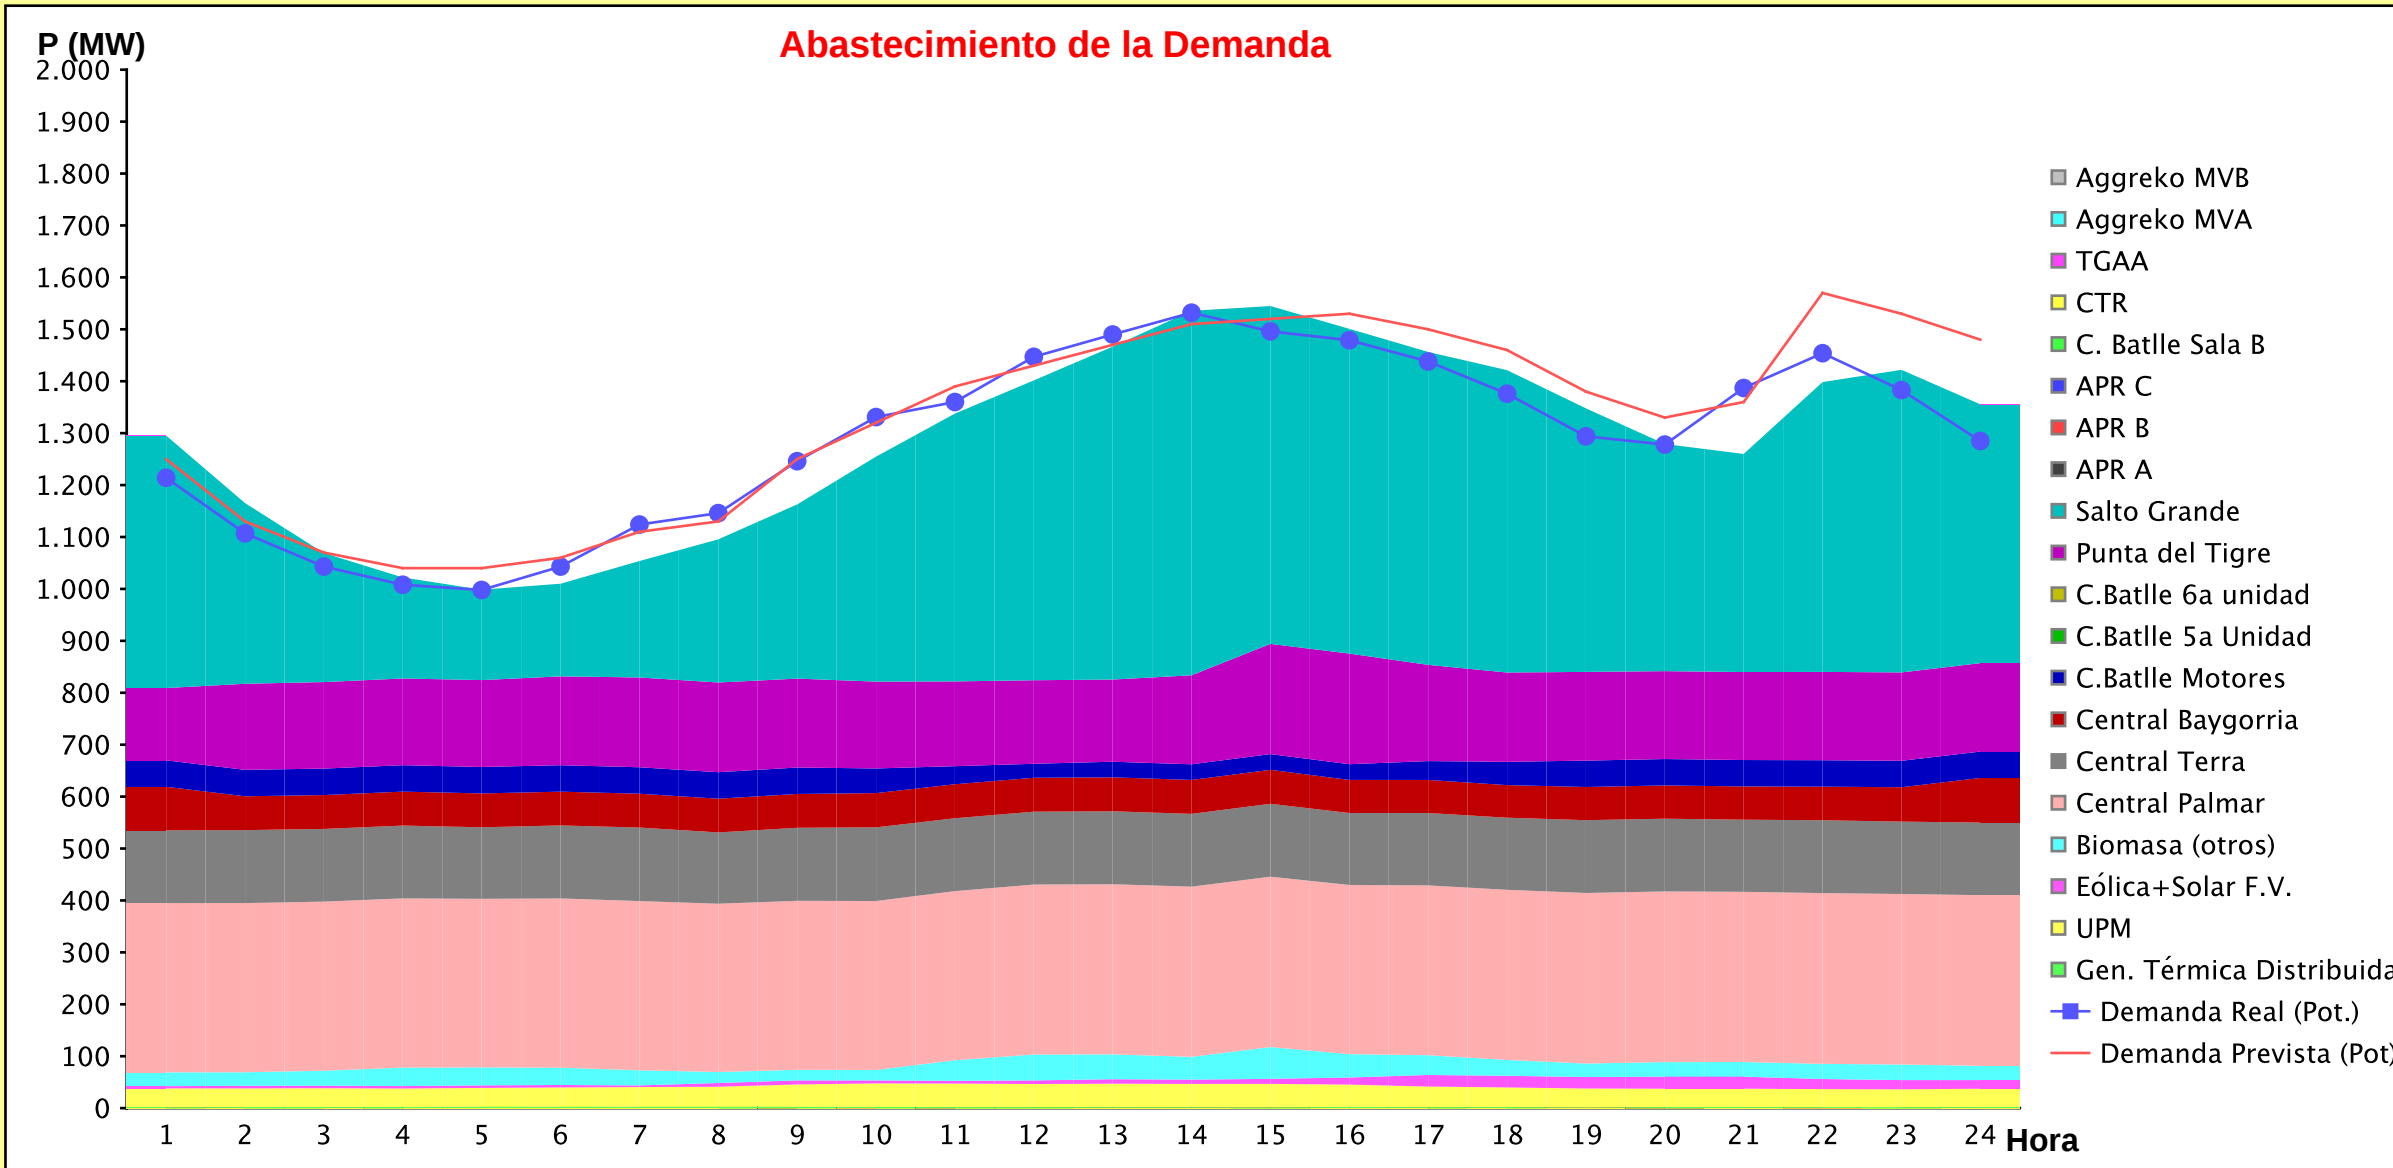



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1581,69 Hora 14:07
Potencia mínima:	992,64 Hora 04:27
Pico noche:	1462,62 Hora 22:03

Generación Media (MW)	
Eólica	12,0
Biomasa	77,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	2,1
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

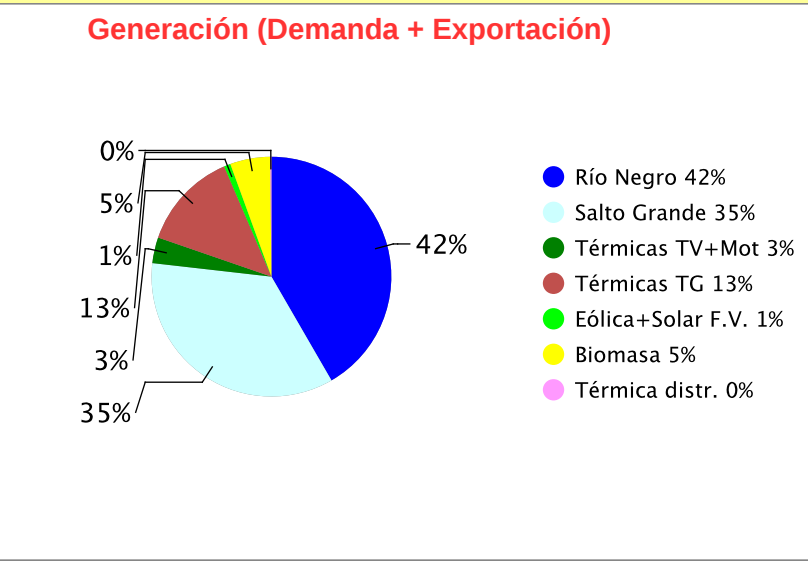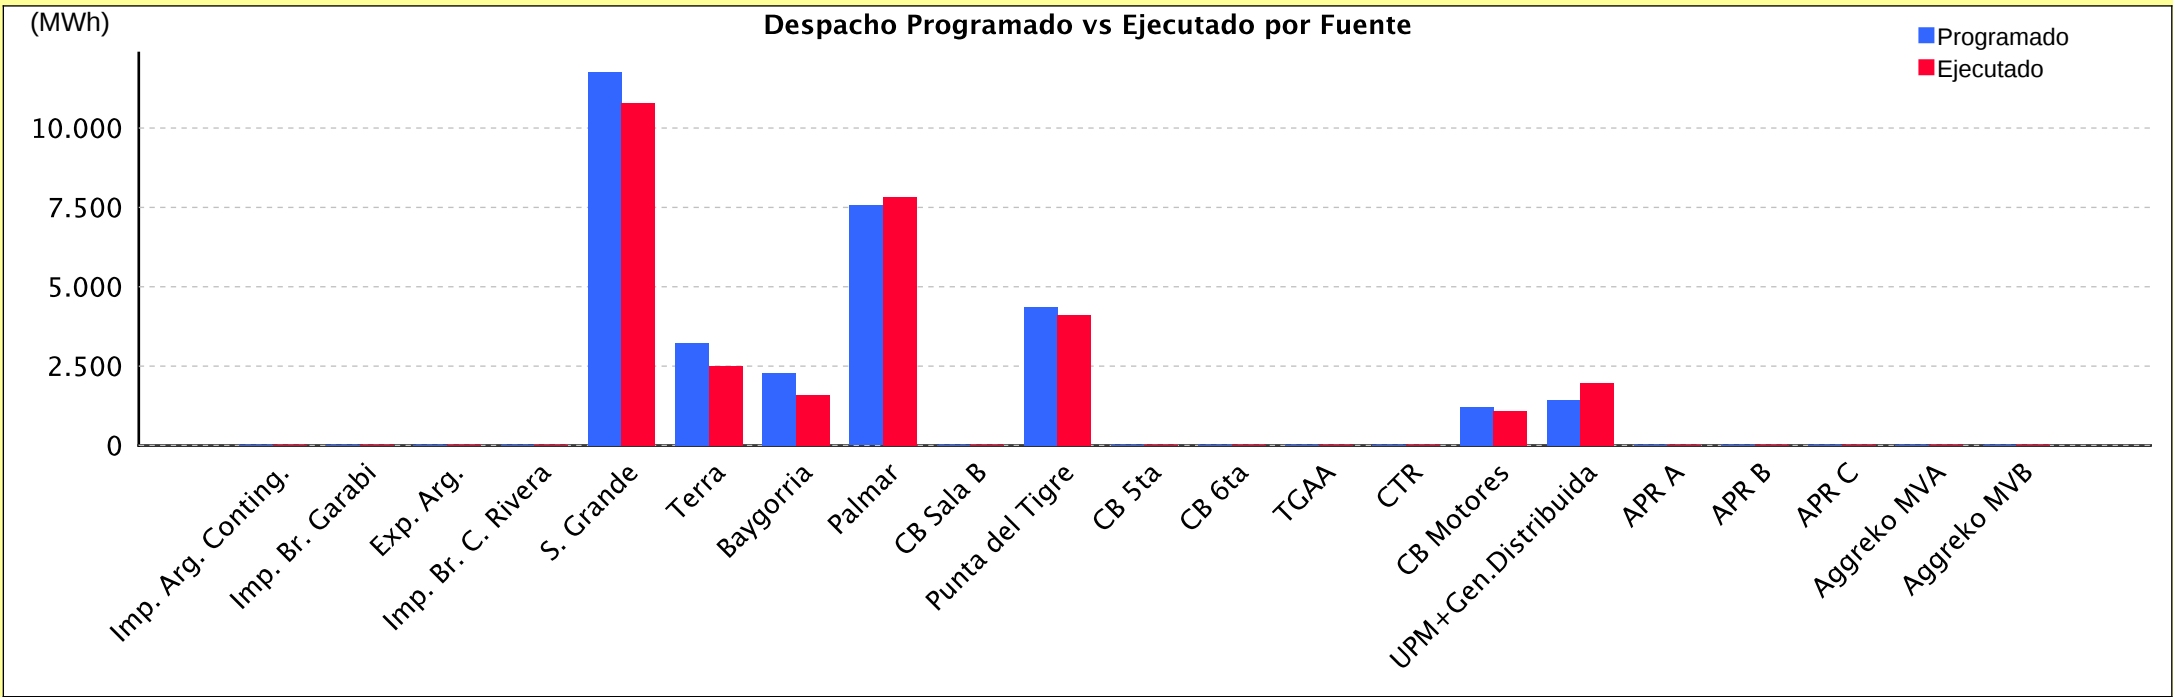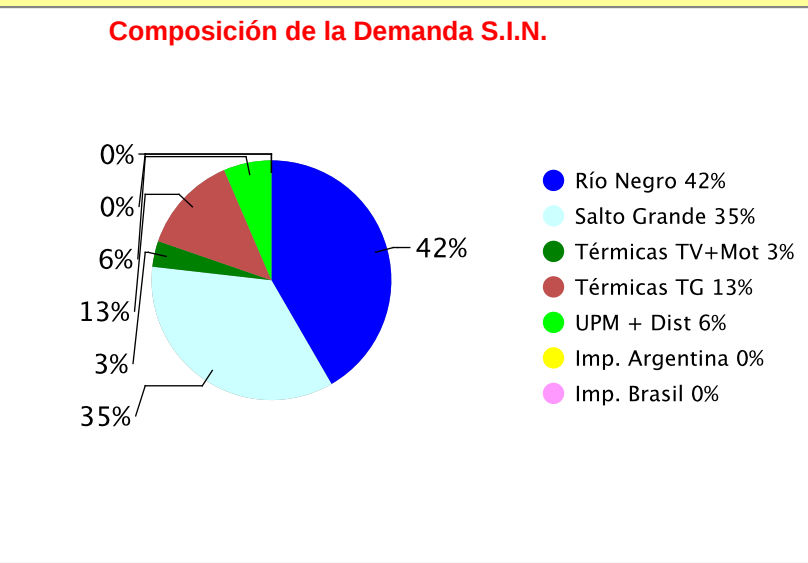



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

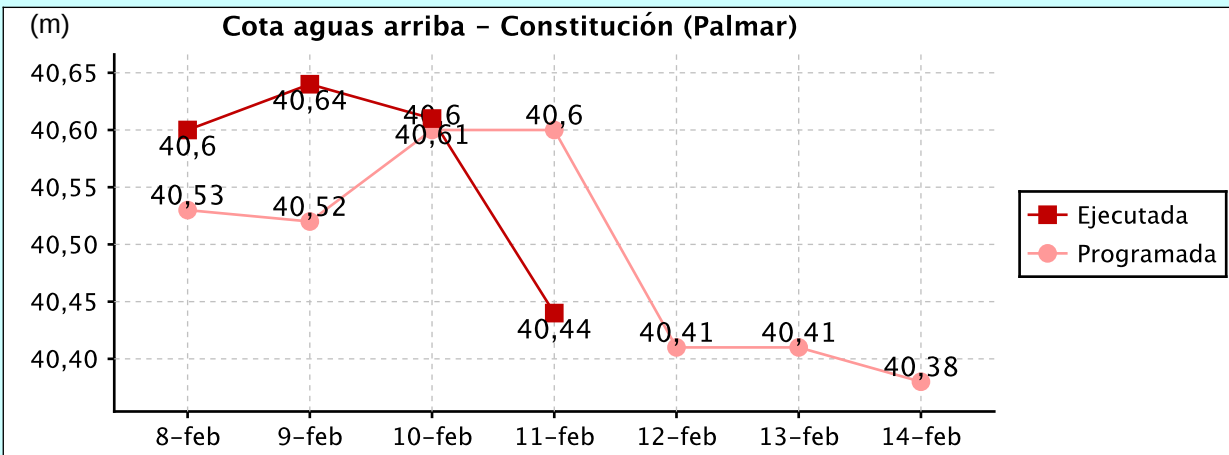
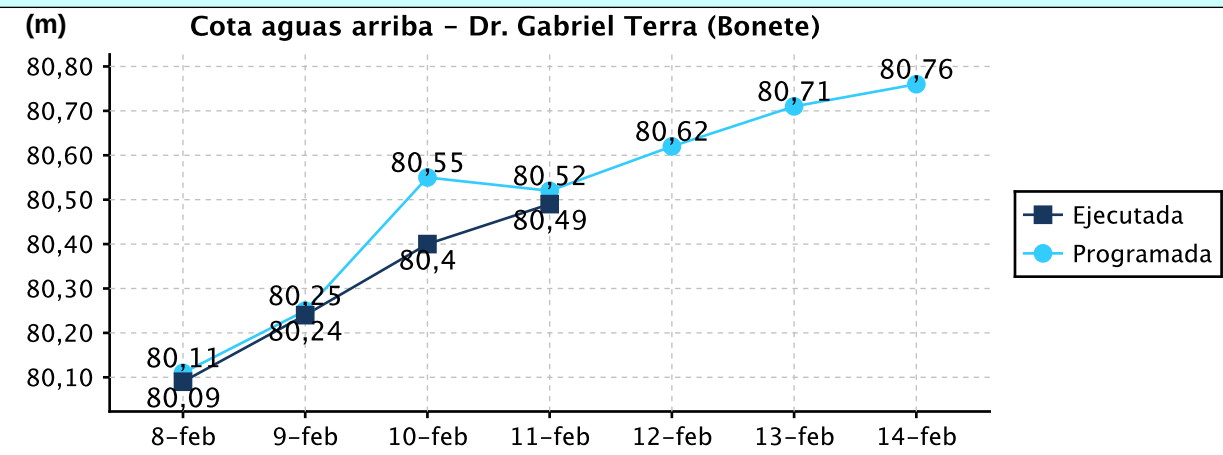


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,52	80,49
Baygorria	53,56	53,6
Palmar	40,60	40,44
SGU	32,54	32,66

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

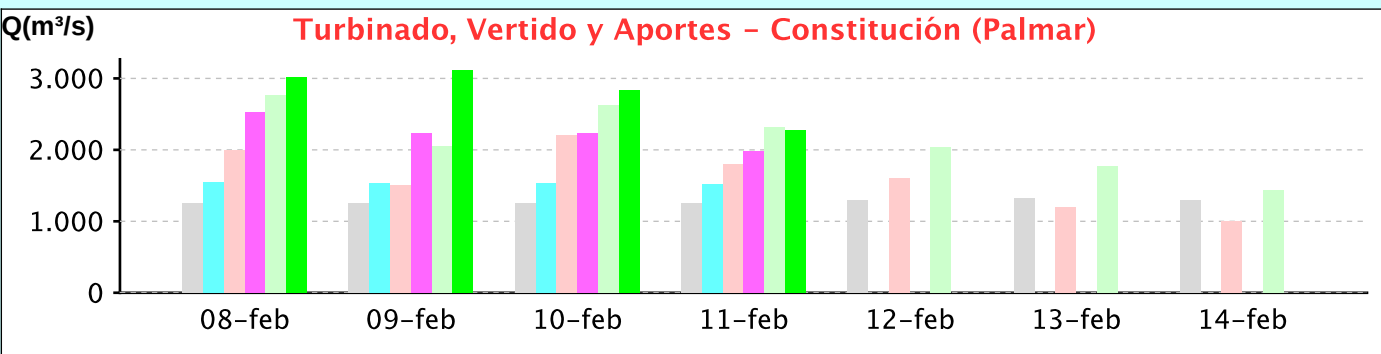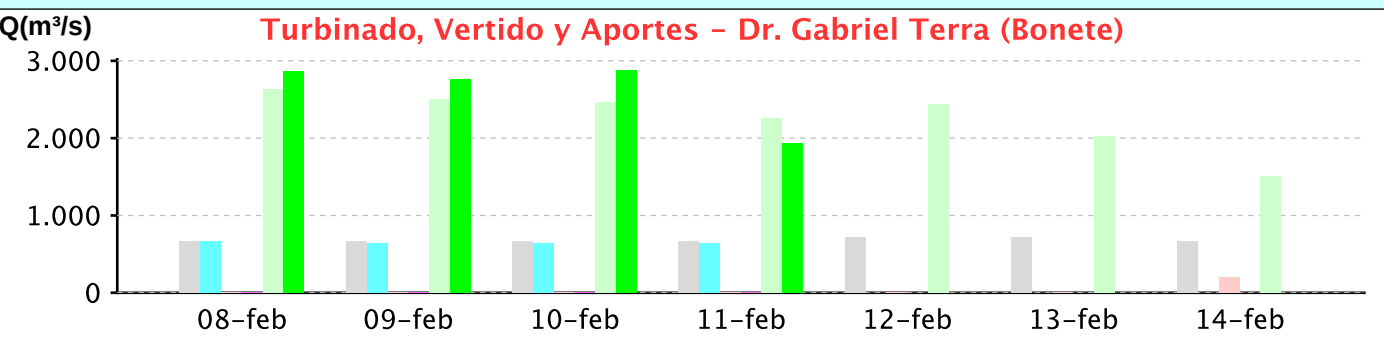

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

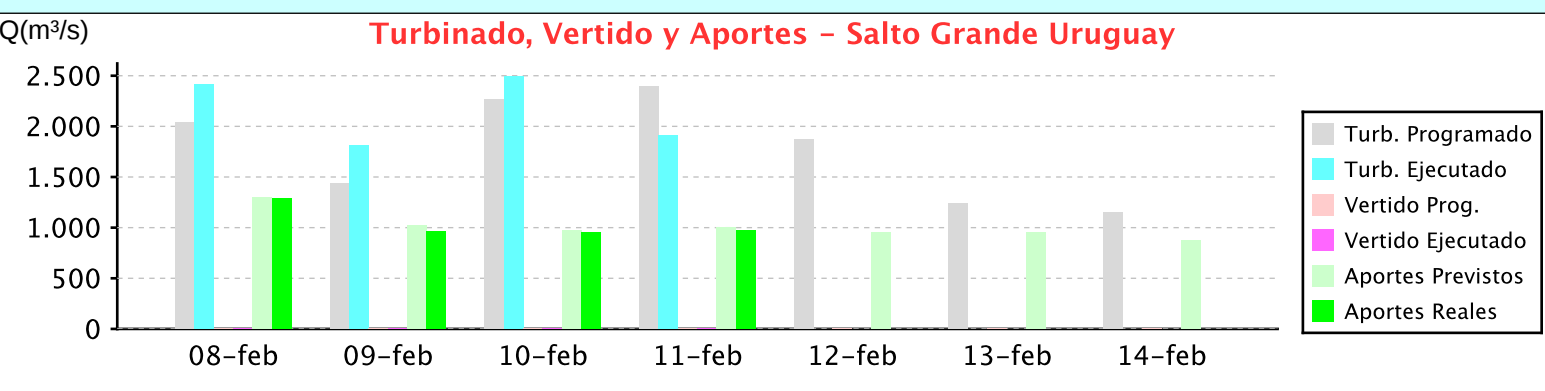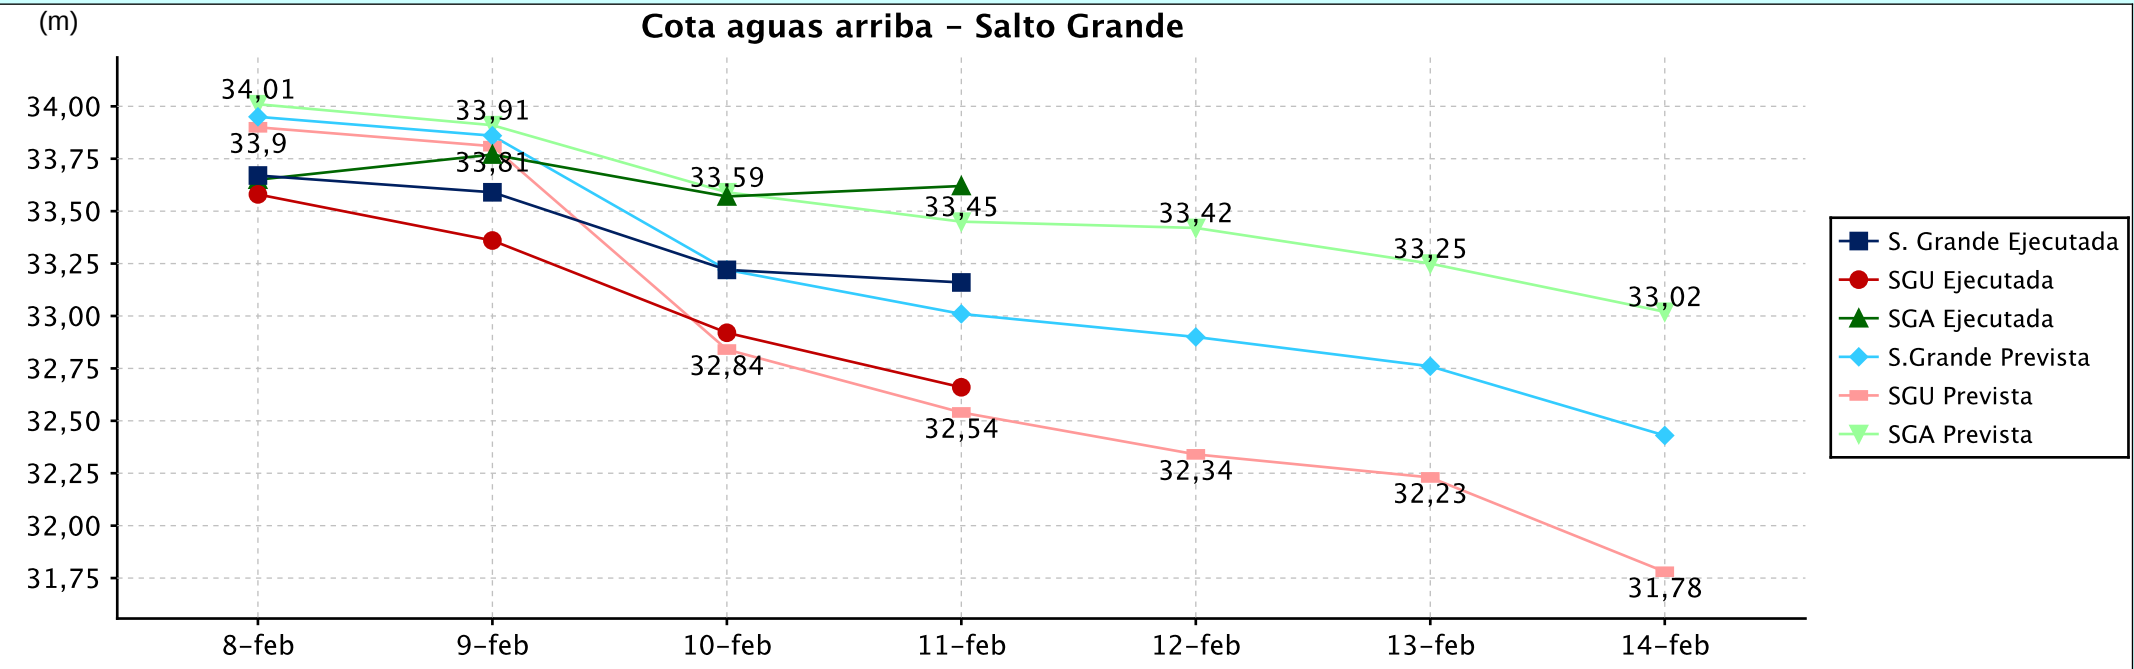

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,66
Cota Vista Arg	33,62
Cota real	33,16
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-17.472

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	664	636
Baygorria	788	605
Palmar	1.259	1.521
SGU	2.391	1.909

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.255	1.938
Baygorria	95	73
Palmar	2.320	2.277
SGU	1.000	970

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	1.800	1.987
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
