



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 12 de febrero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	1.465
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	256
Motores	1.214
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	4.038
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.343
C. Baygorria	1.746
C. Palmar	7.879
C. Salto Grande	9.408
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.817
TOTAL Generación	29.649

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.649
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.480
Diferencia (MWh)	-831
Ejecutada - Programada	-2,73 %

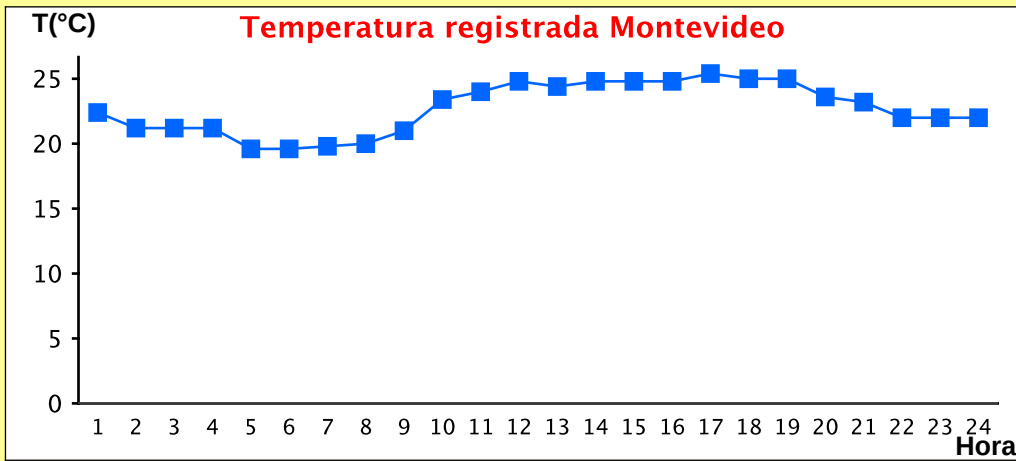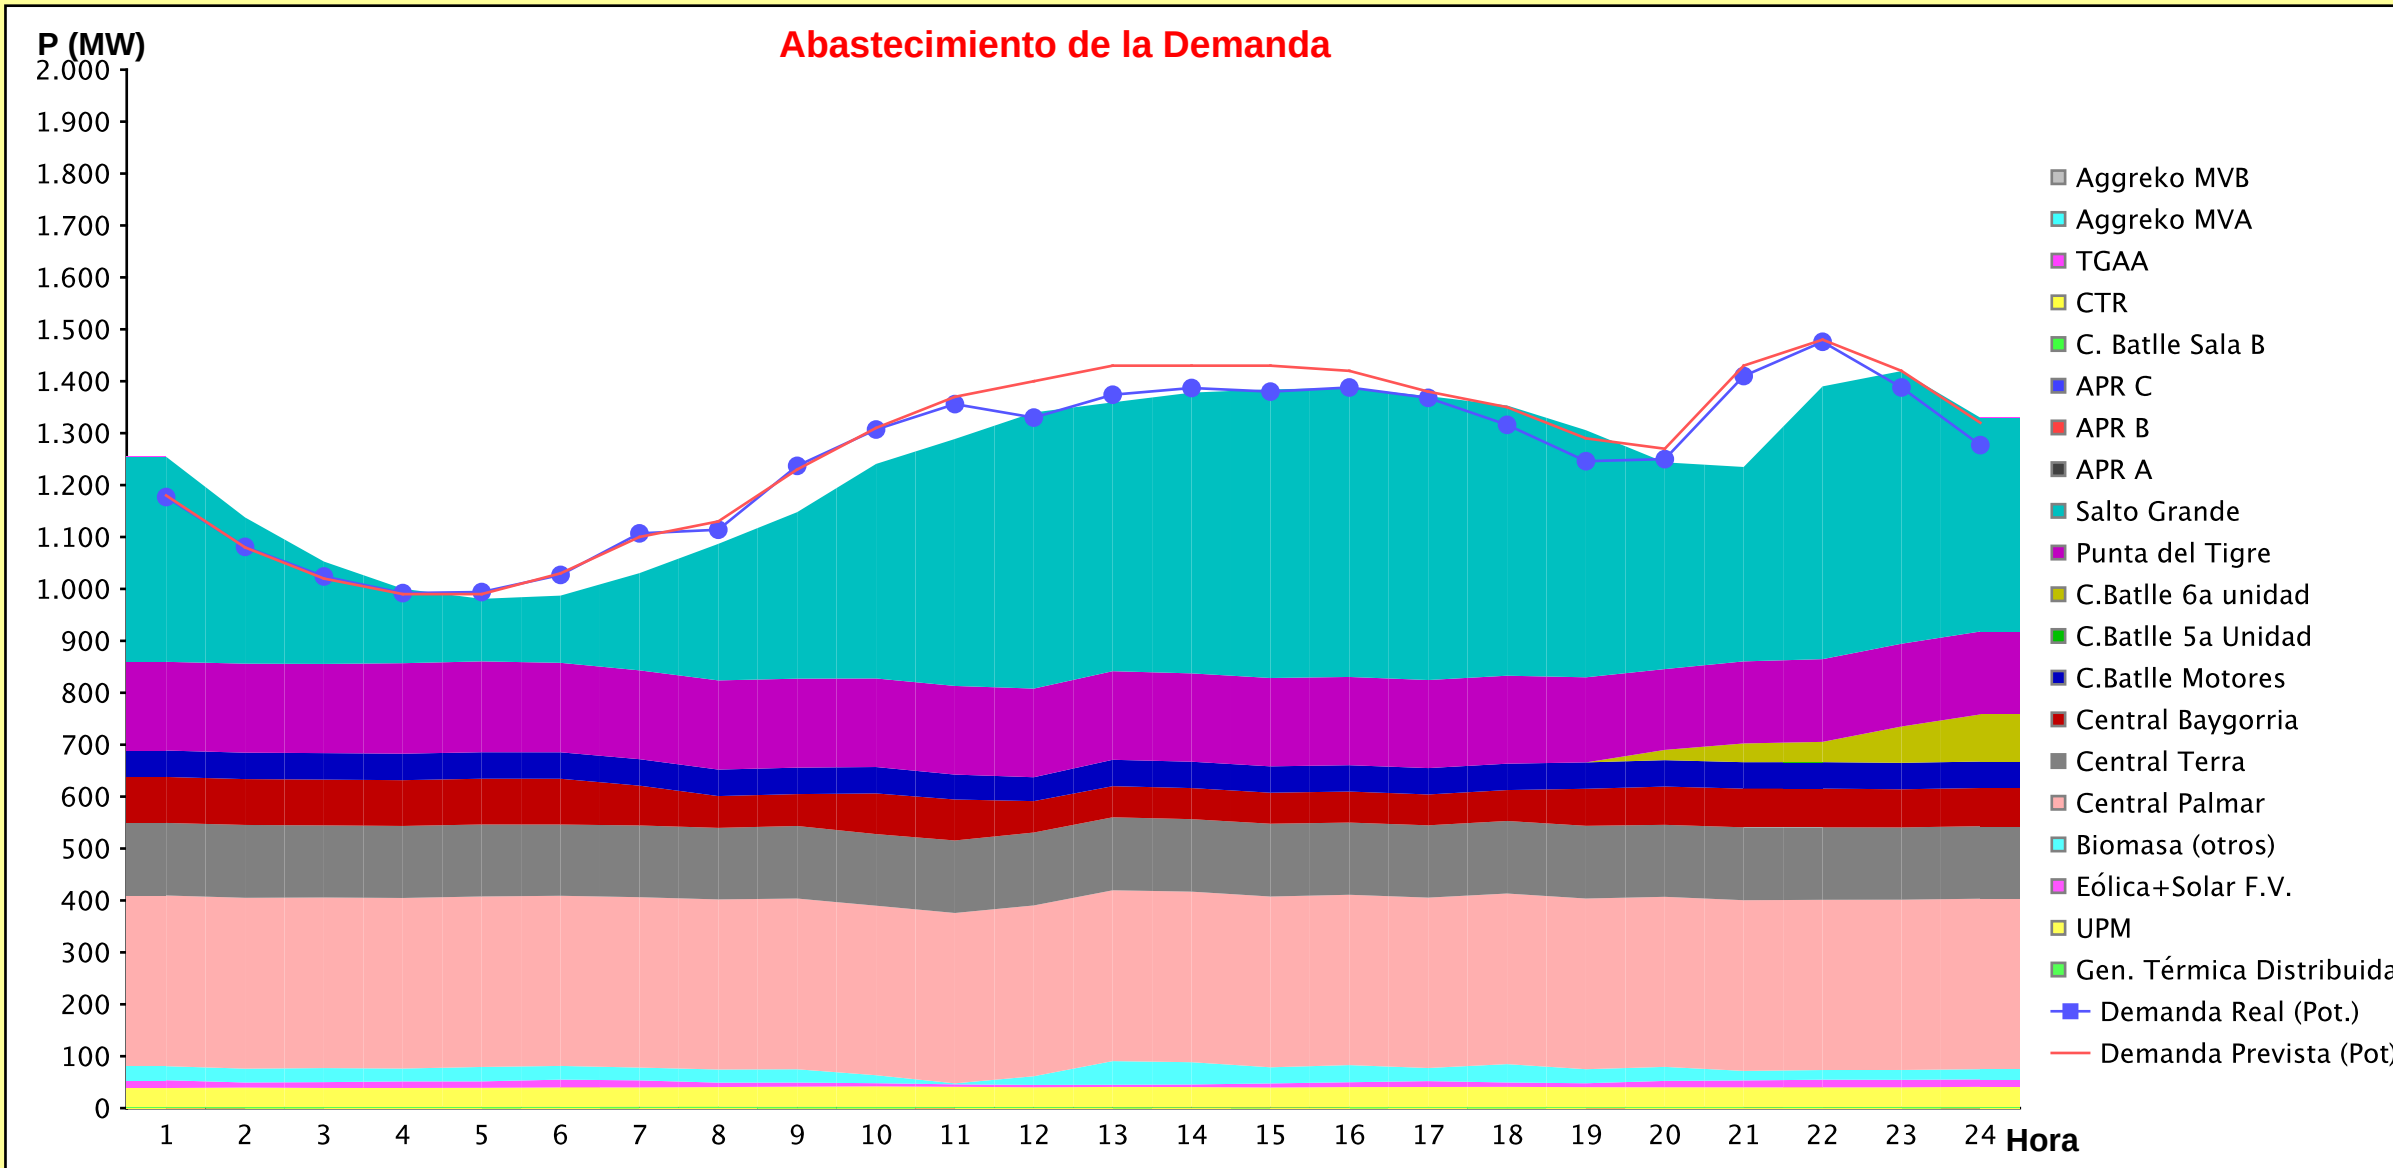



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1415,05 Hora 15:08
Potencia mínima:	978,11 Hora 04:09
Pico noche:	1475,65 Hora 21:59

Generación Media (MW)	
Eólica	10,7
Biomasa	69,9
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	2,1
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

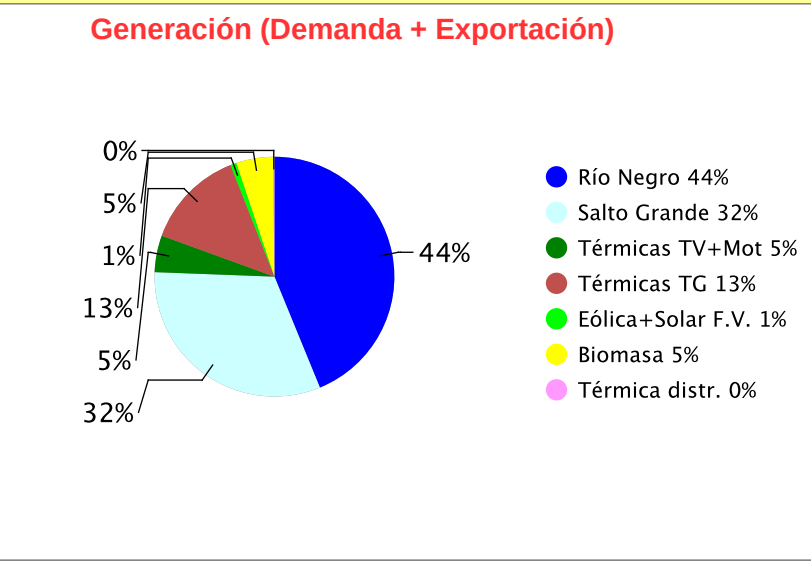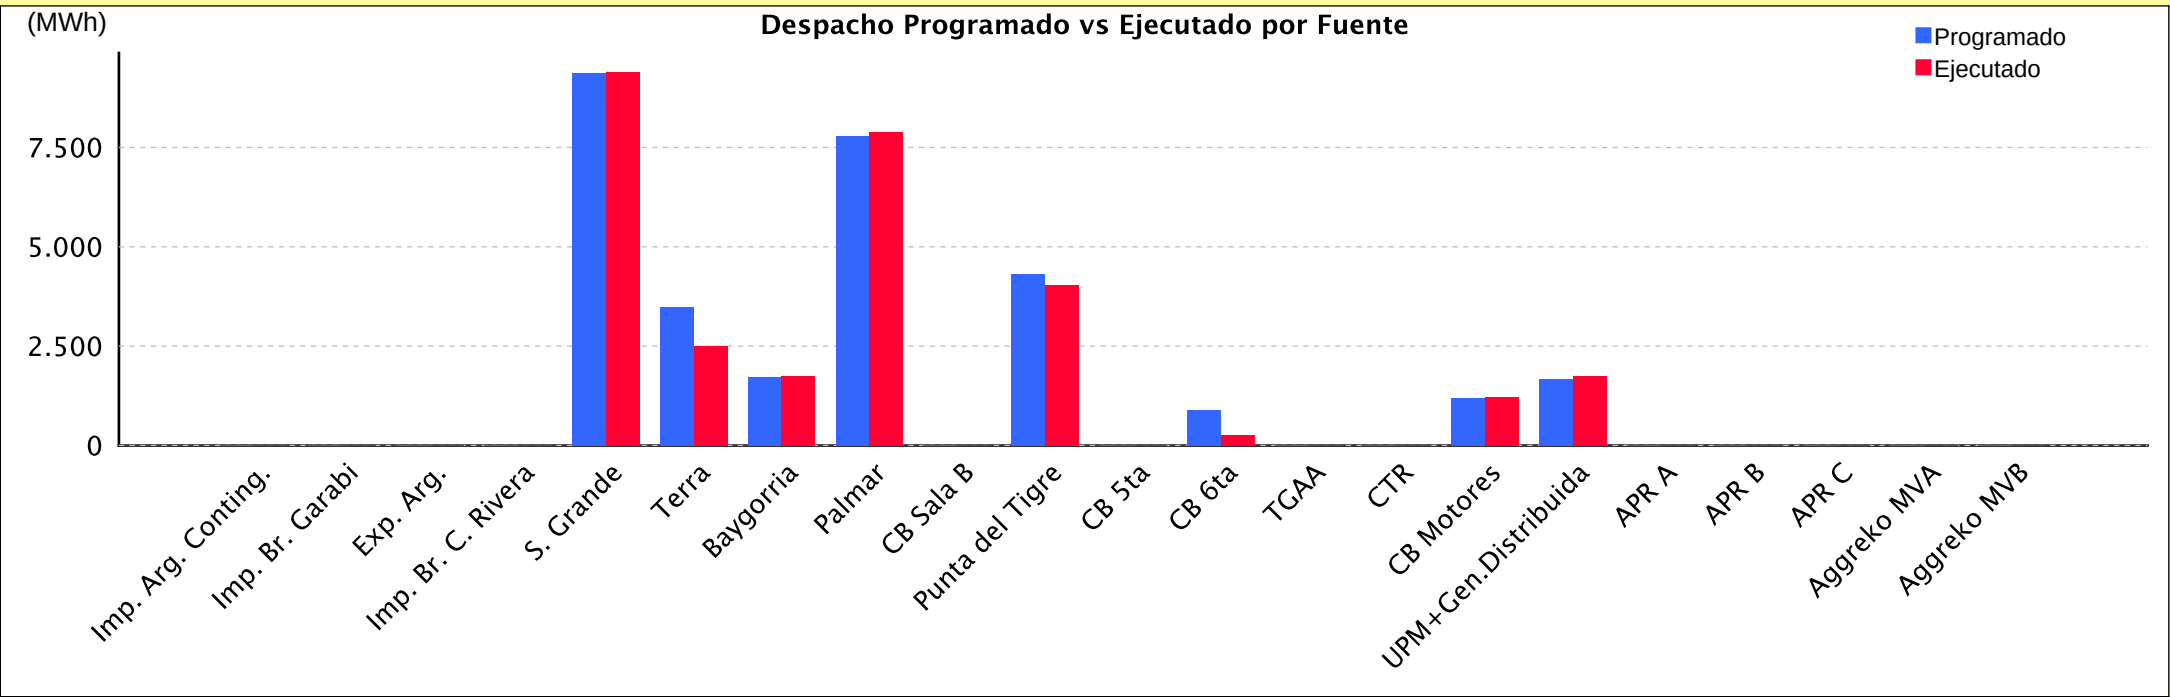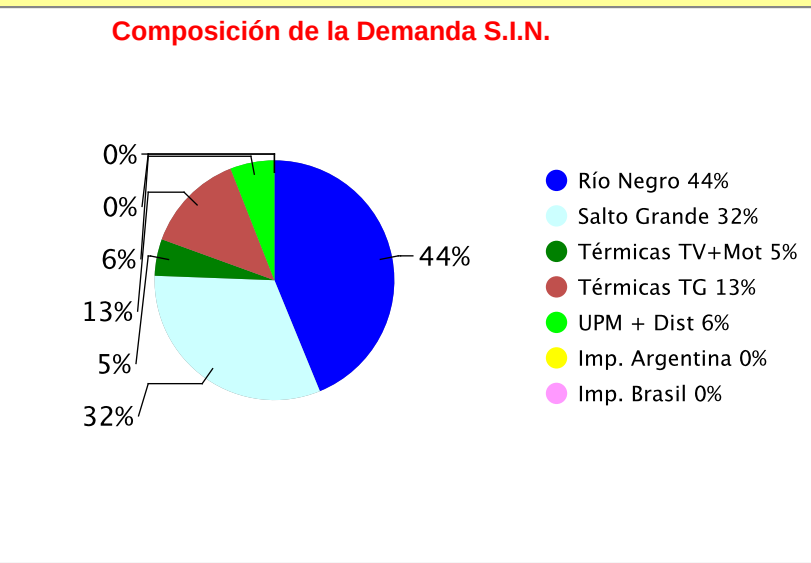



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

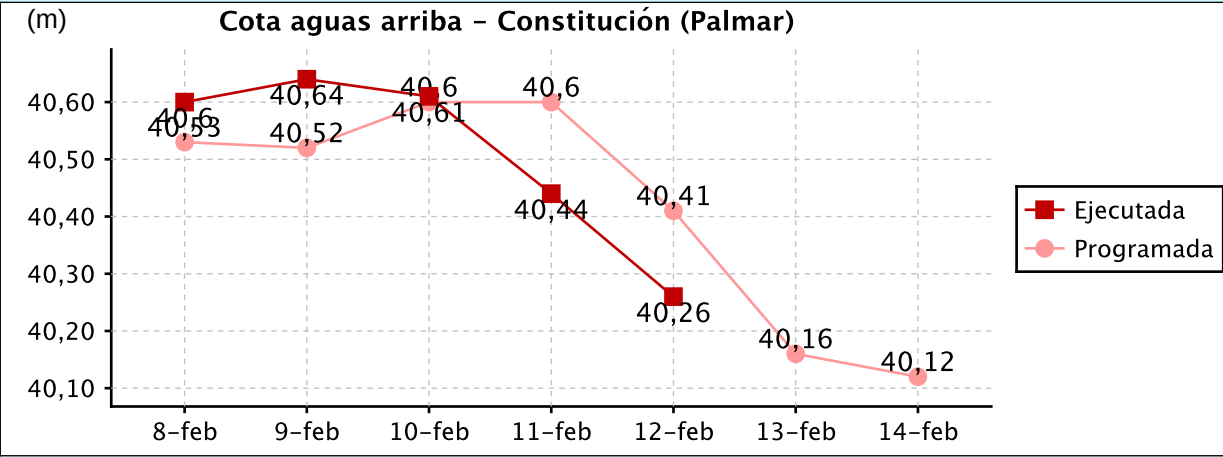
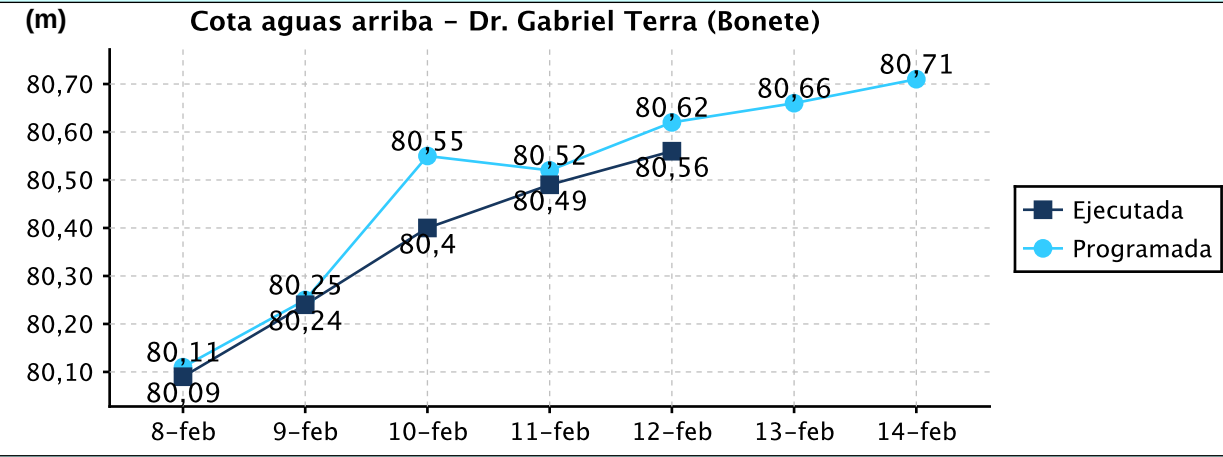


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,62	80,56
Baygorria	53,67	53,58
Palmar	40,41	40,26
SGU	32,34	32,46

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

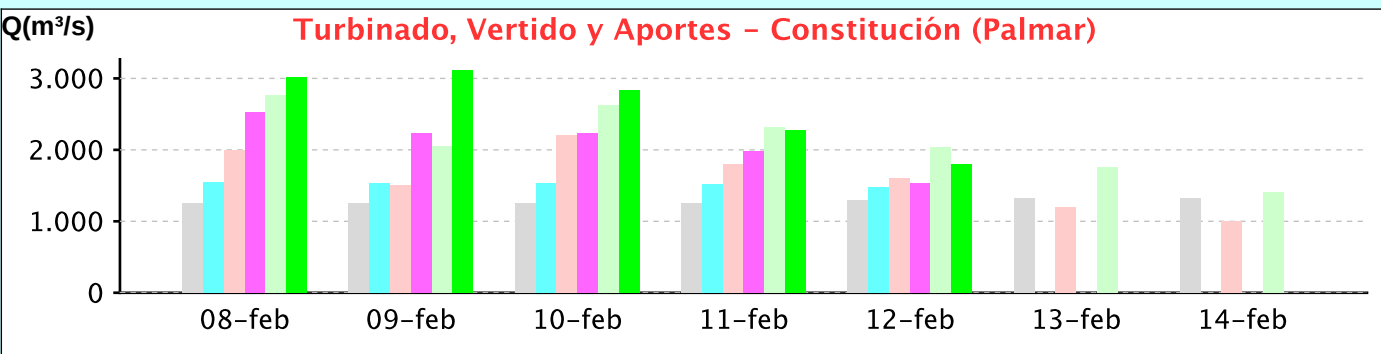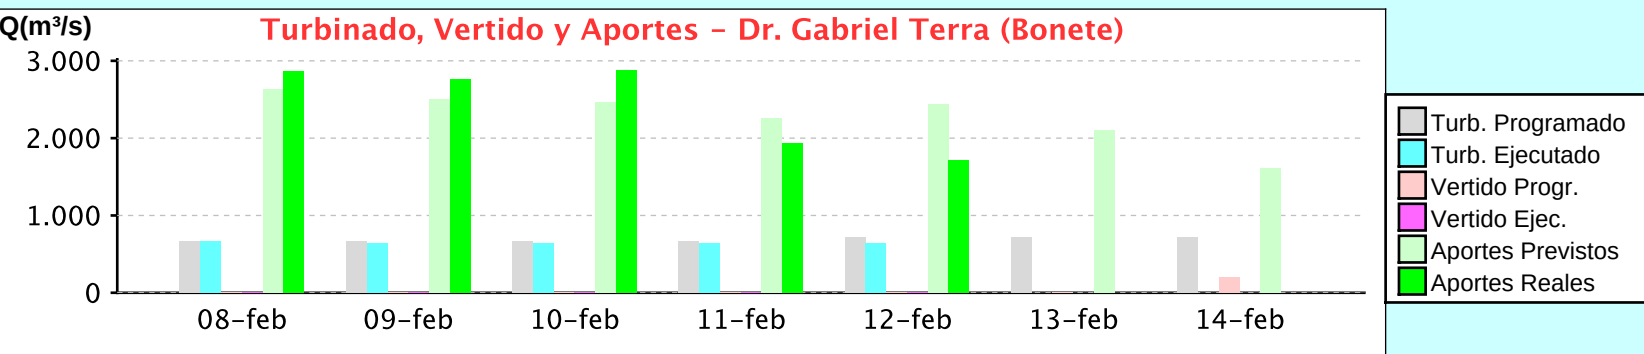

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

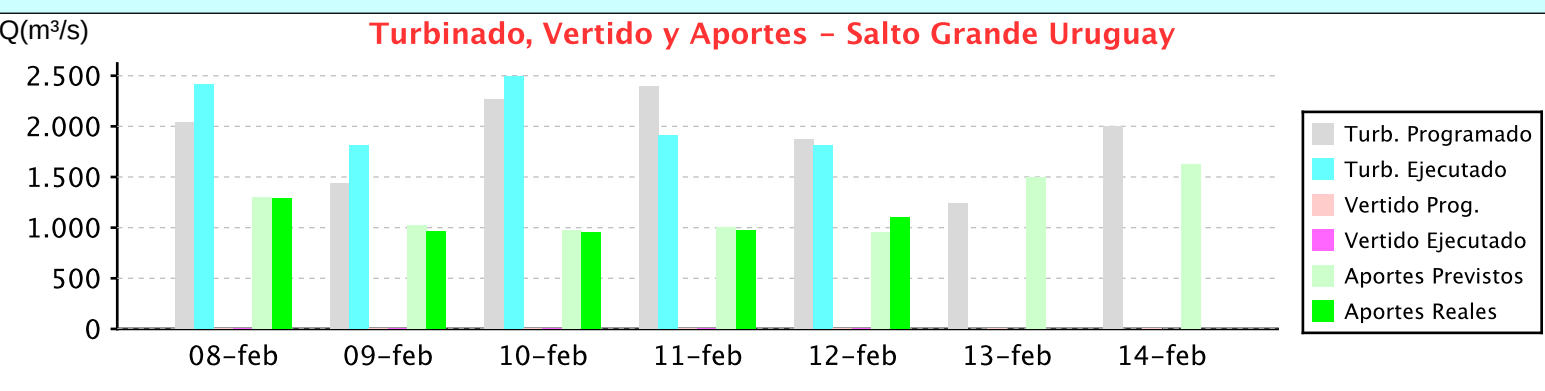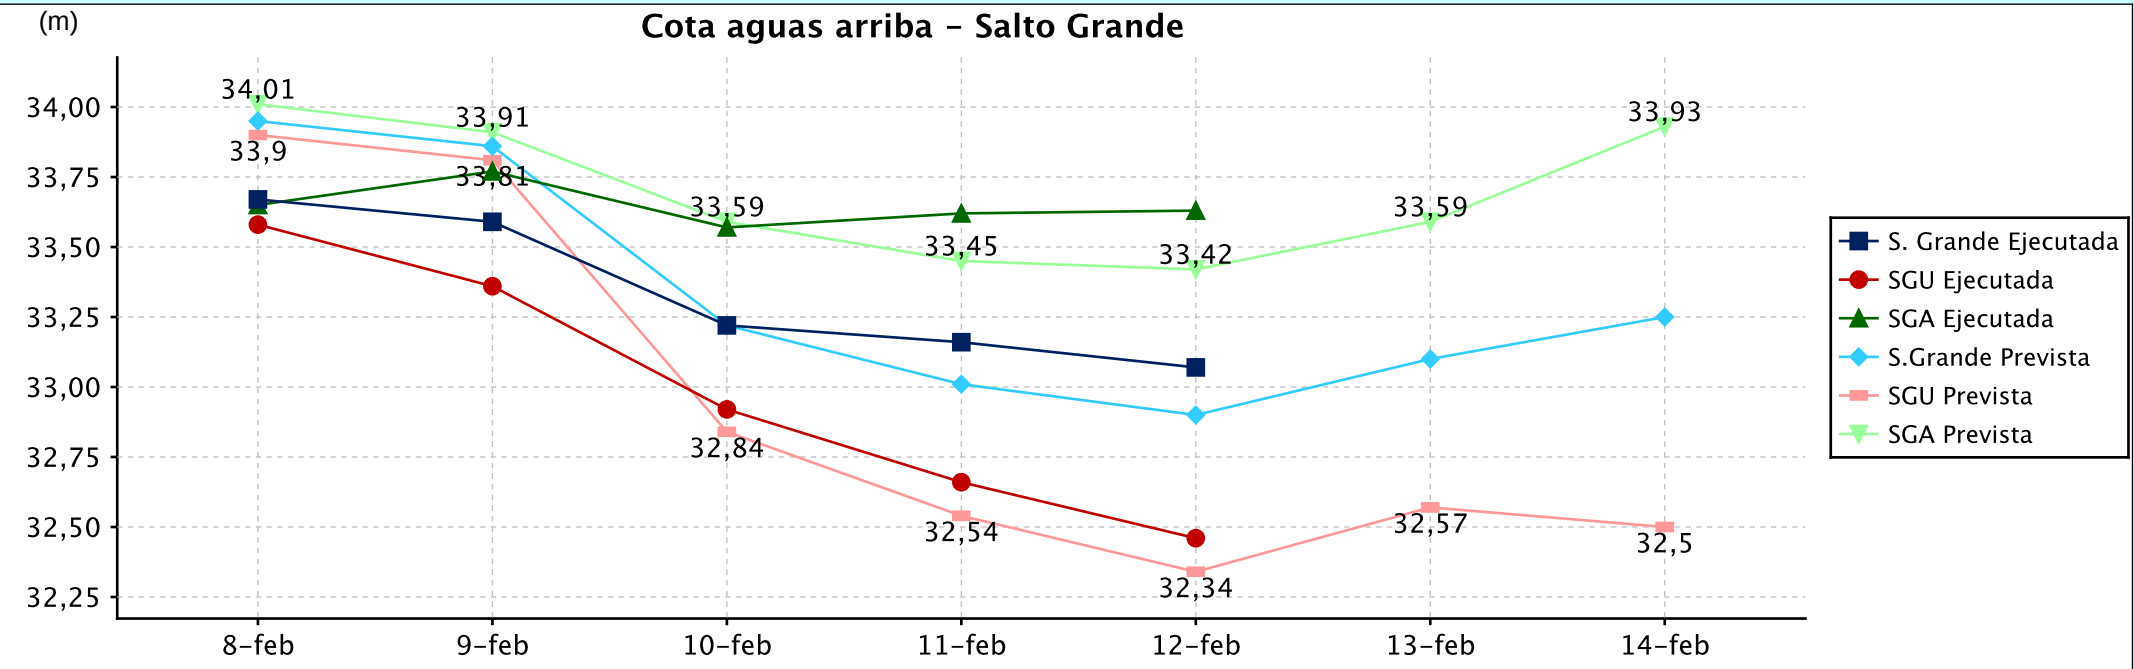

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,46
Cota Vista Arg	33,63
Cota real	33,07

Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	-20.924

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	713	640
Baygorria	598	662
Palmar	1.299	1.479
SGU	1.867	1.810

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.442	1.711
Baygorria	122	9
Palmar	2.038	1.803
SGU	950	1.104

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	1.600	1.532
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
