




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 14 de febrero de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	3.420
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.170
Motores	1.254
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	60
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.360
C. Baygorria	1.452
C. Palmar	7.869
C. Salto Grande	9.070
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.655
TOTAL Generación	26.841

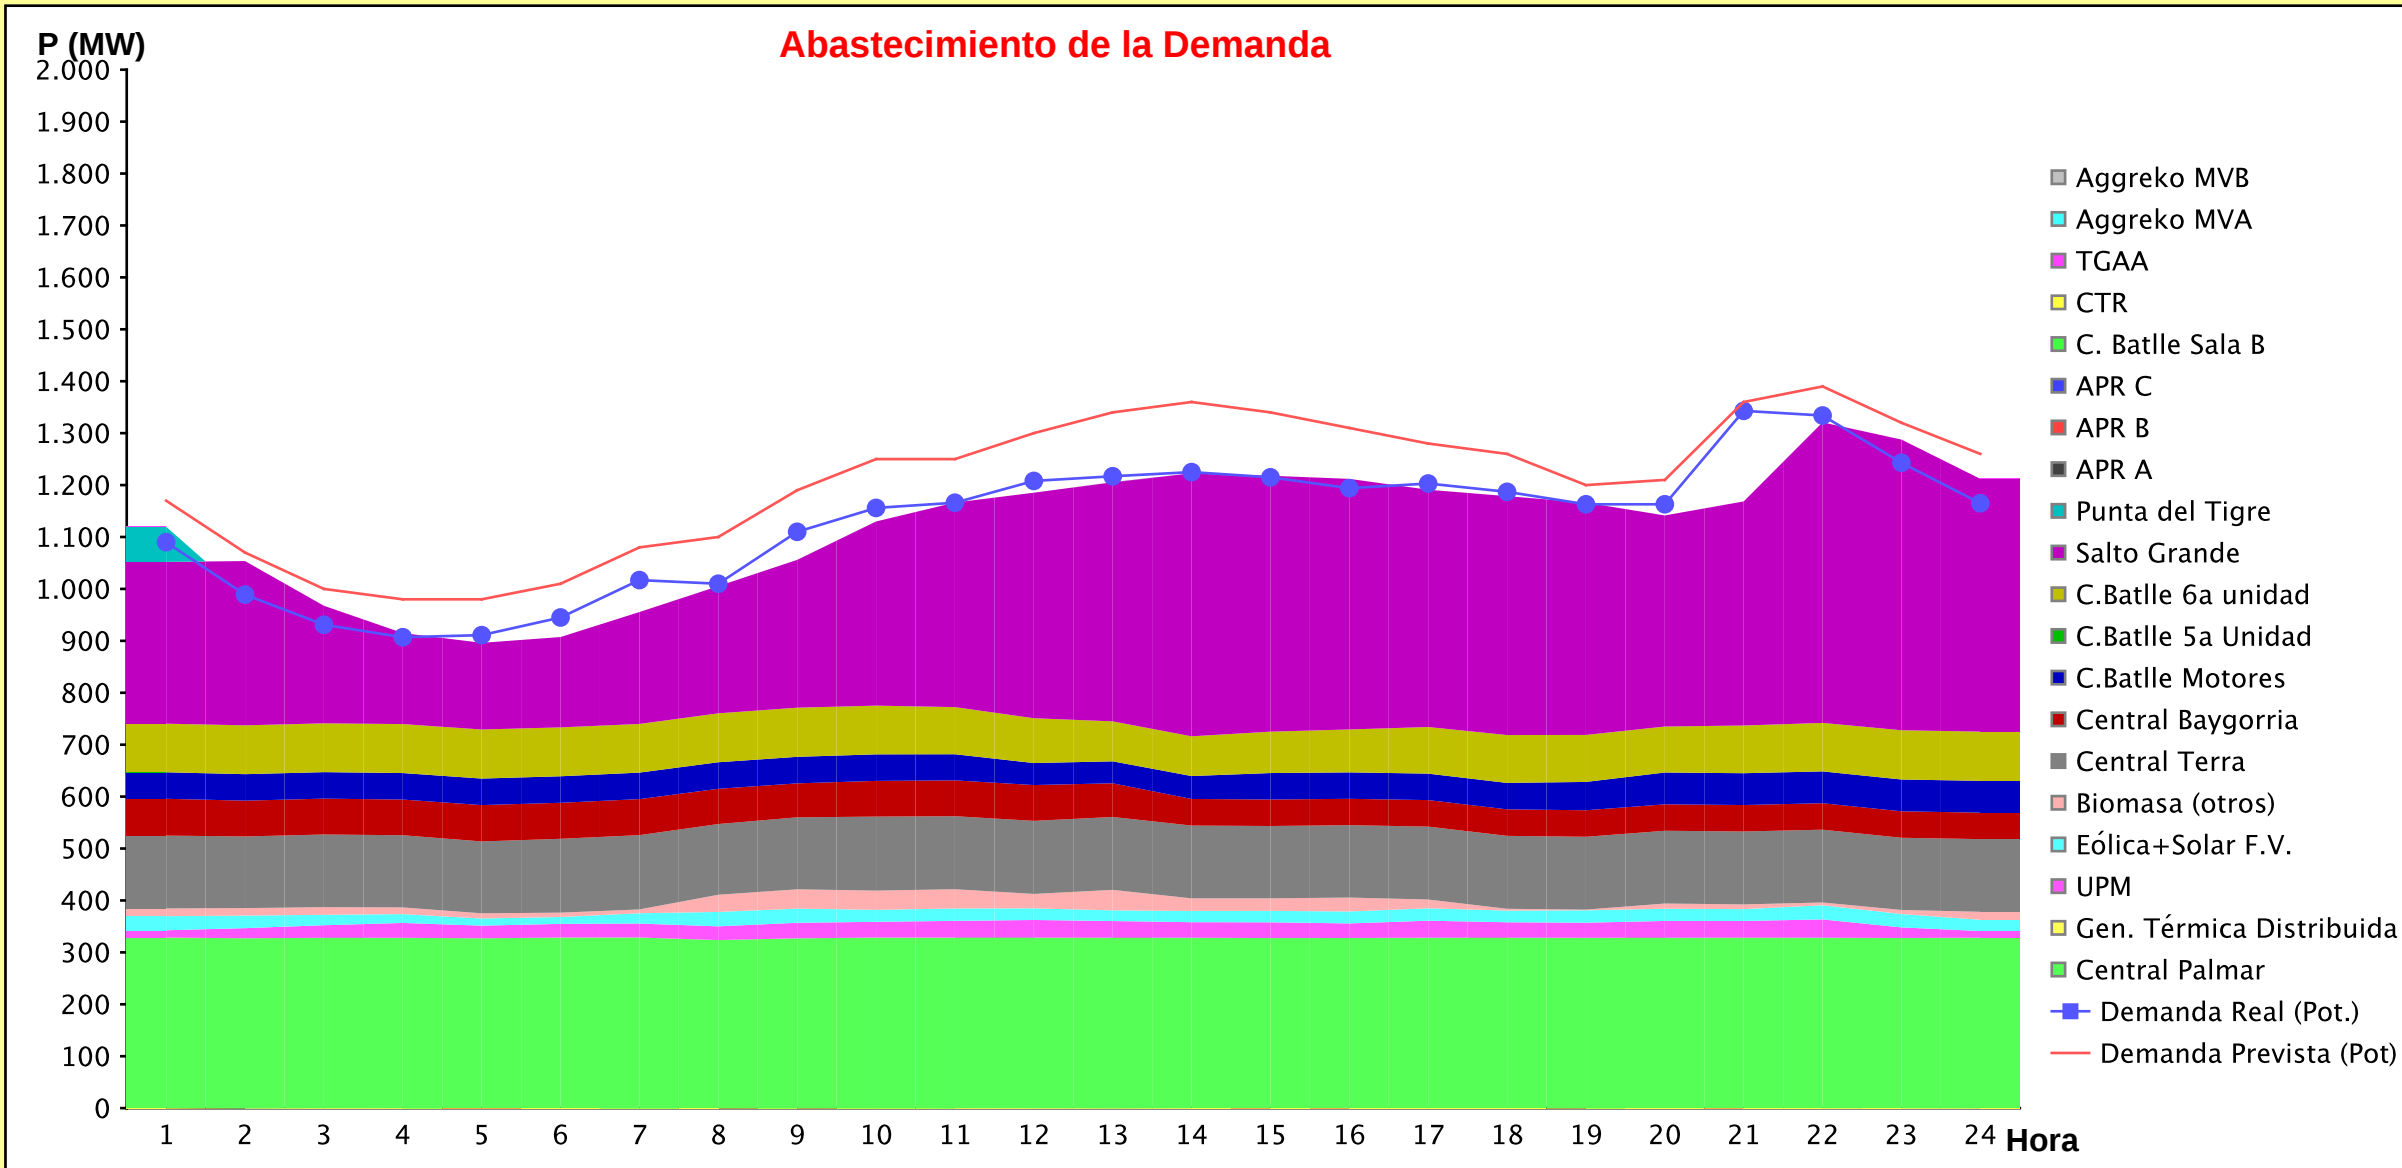

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.841
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	



Demanda Programada (MWh)	29.010
Diferencia (MWh)	-2.169
Ejecutada - Programada	-7,48 %

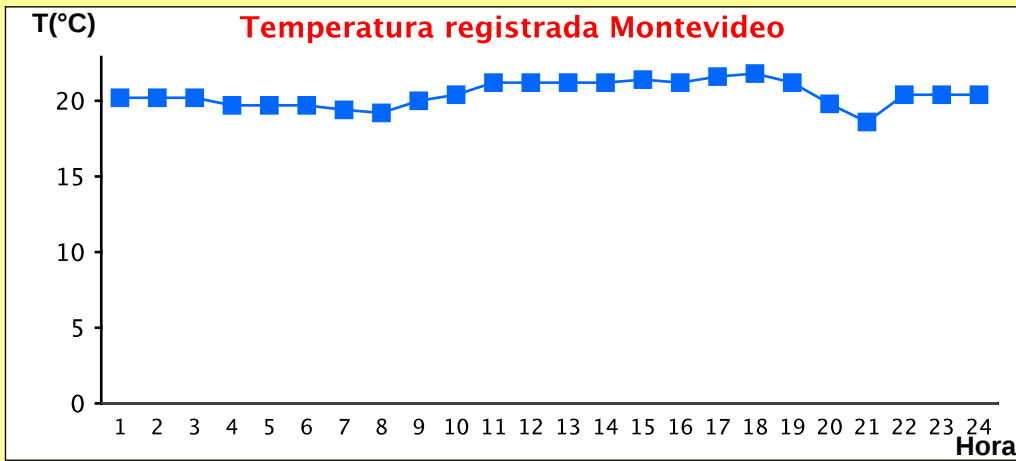


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1245,88 Hora 13:26
Potencia mínima:	920,51 Hora 03:55
Pico noche:	1374,68 Hora 21:21

Generación Media (MW)	
Eólica	22,3
Biomasa	55,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

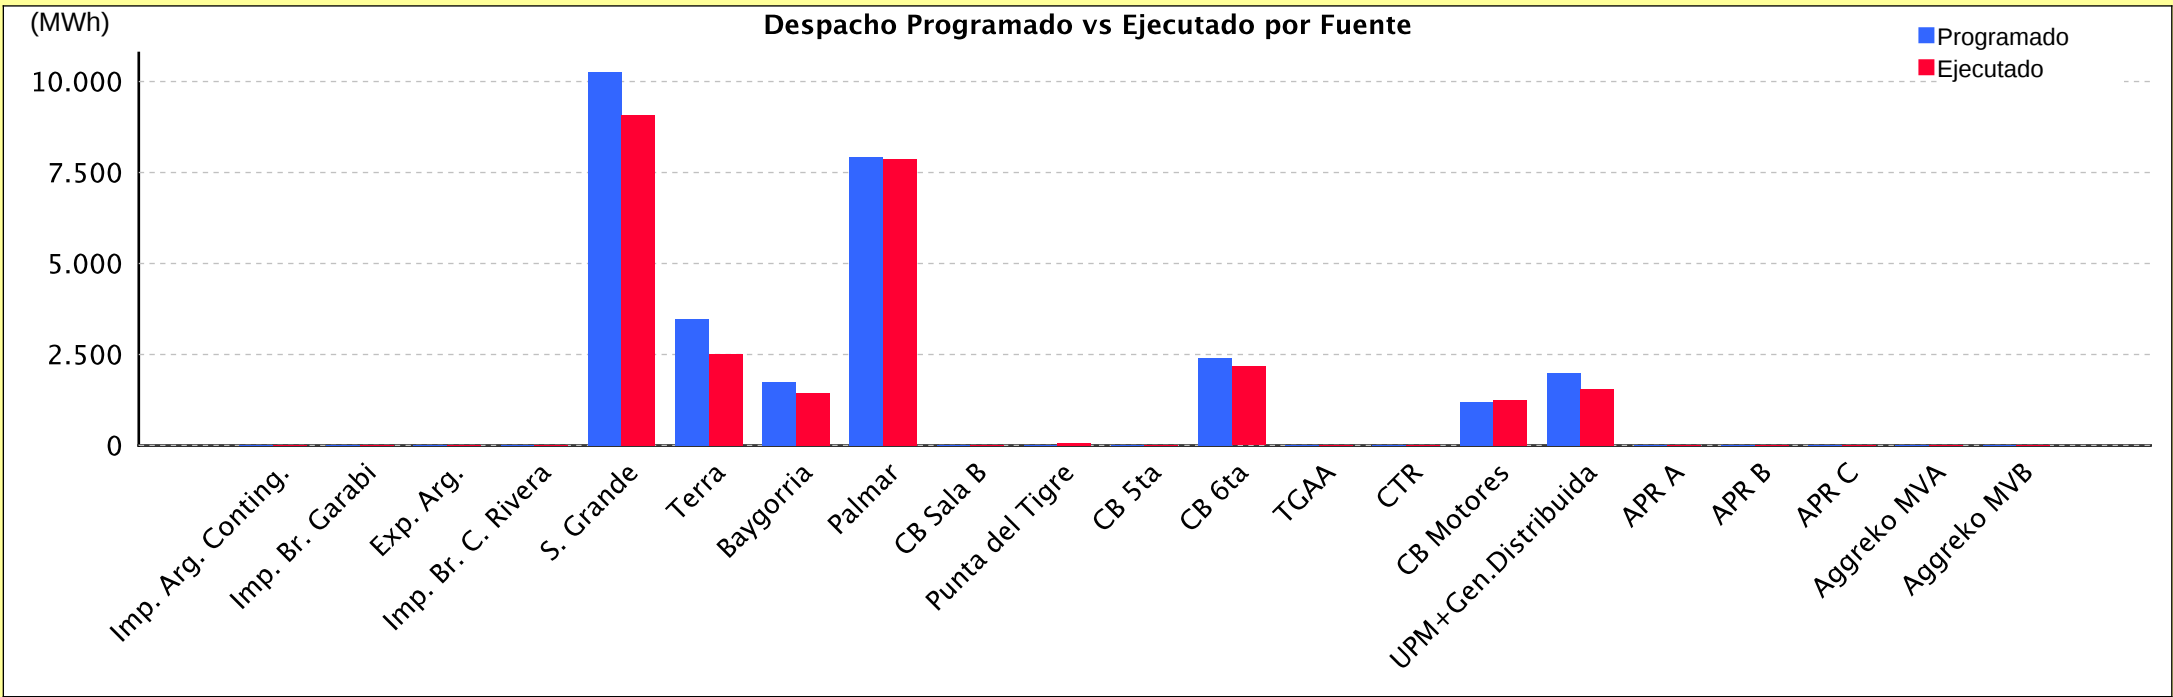
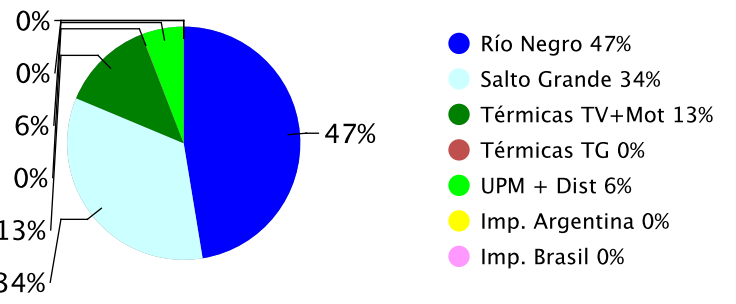


Generación (Demanda + Exportación)

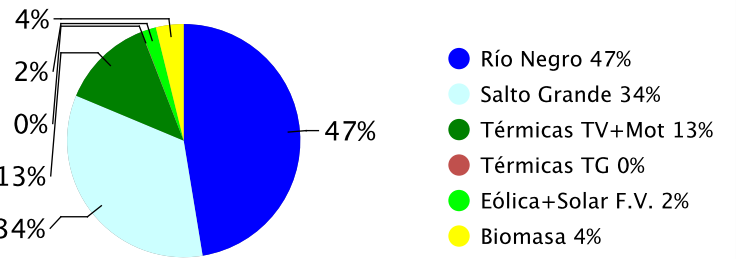



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

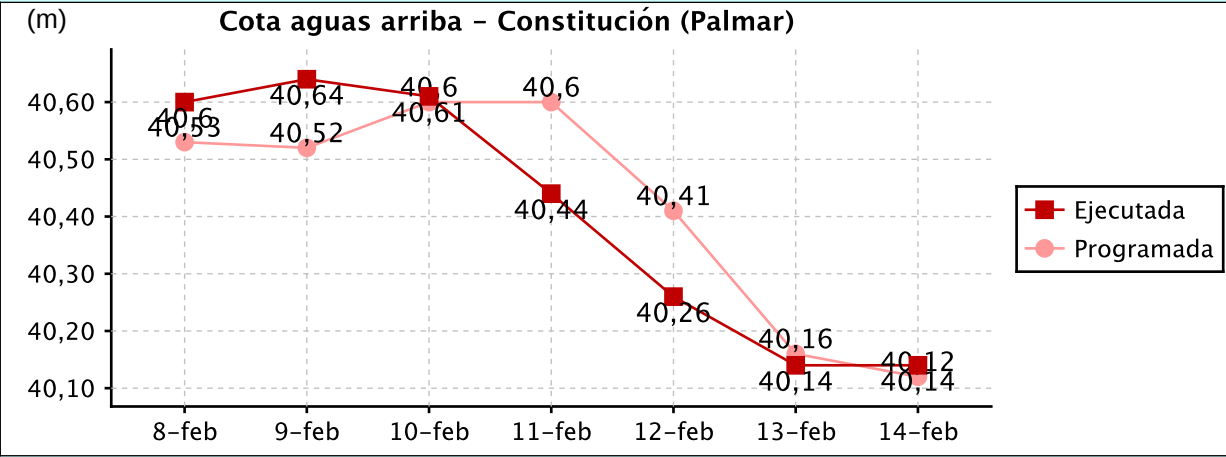
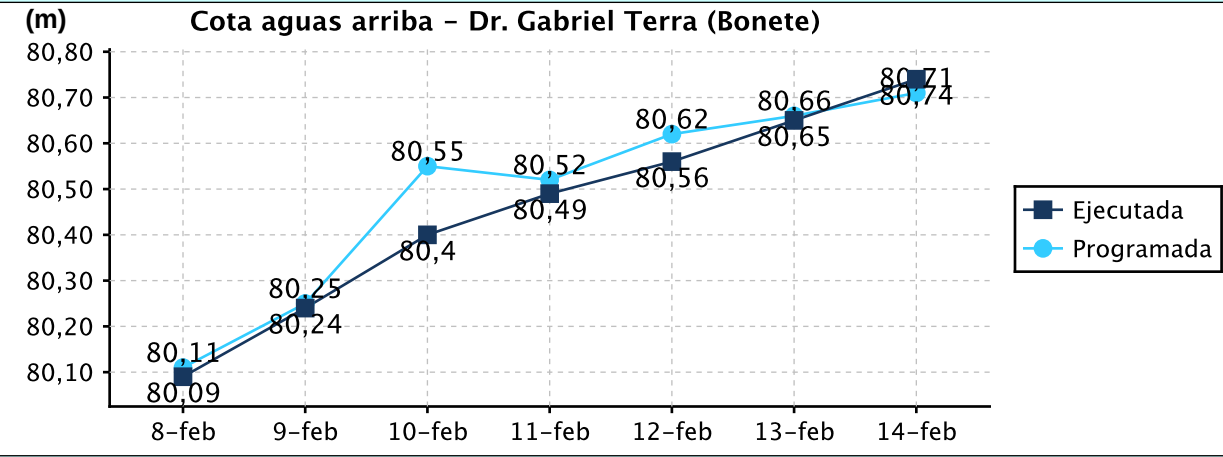


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,71	80,74
Baygorria	53,67	53,72
Palmar	40,12	40,14
SGU	32,50	32,68

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

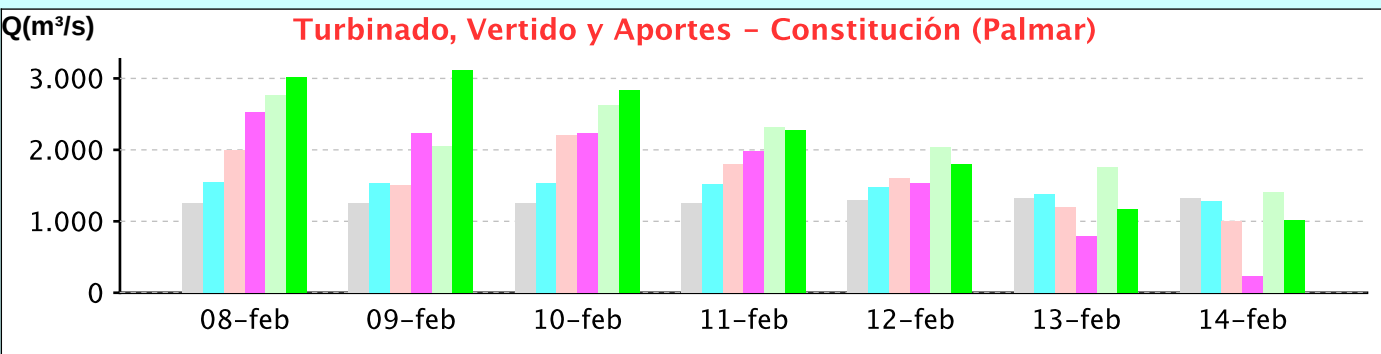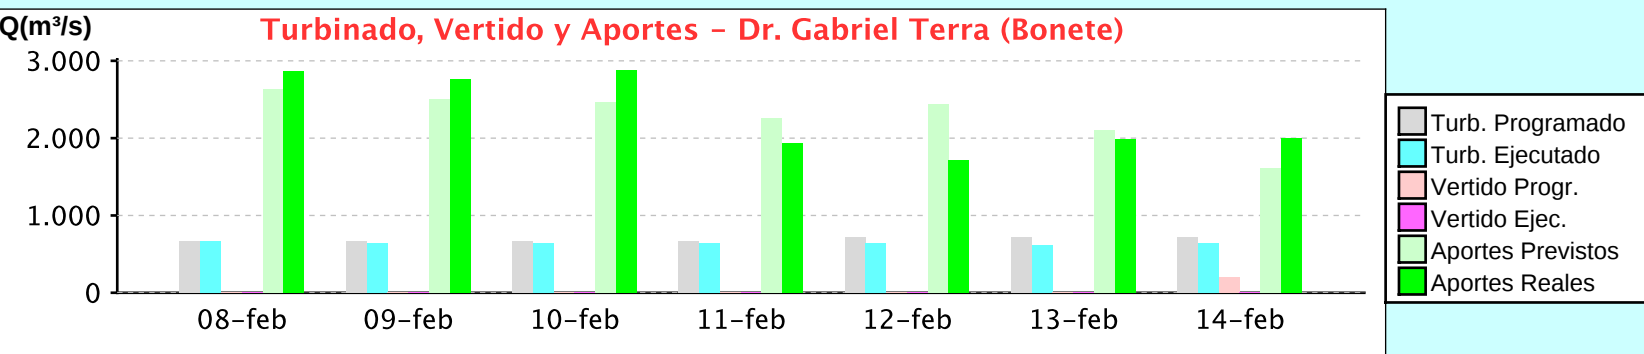

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

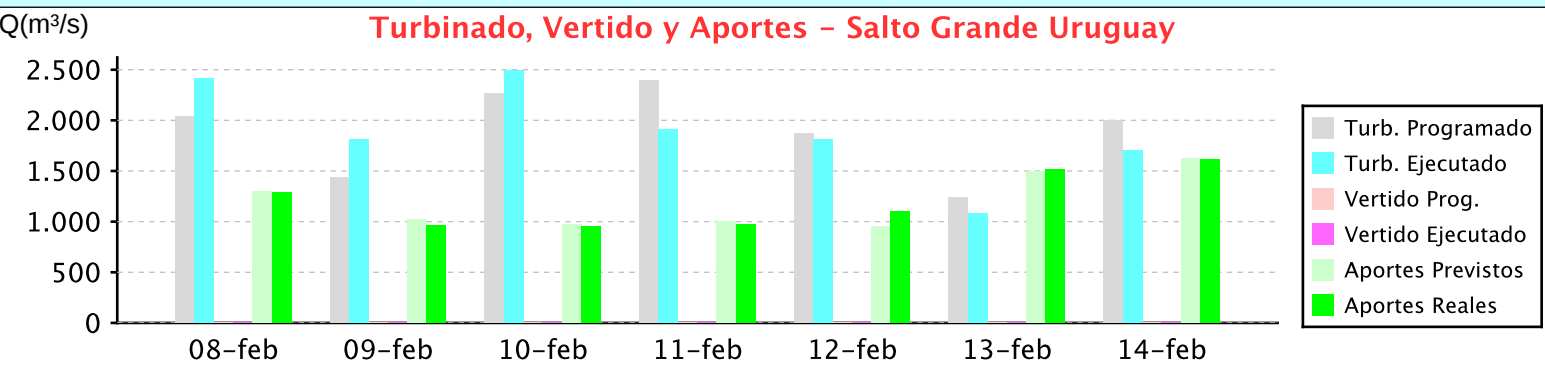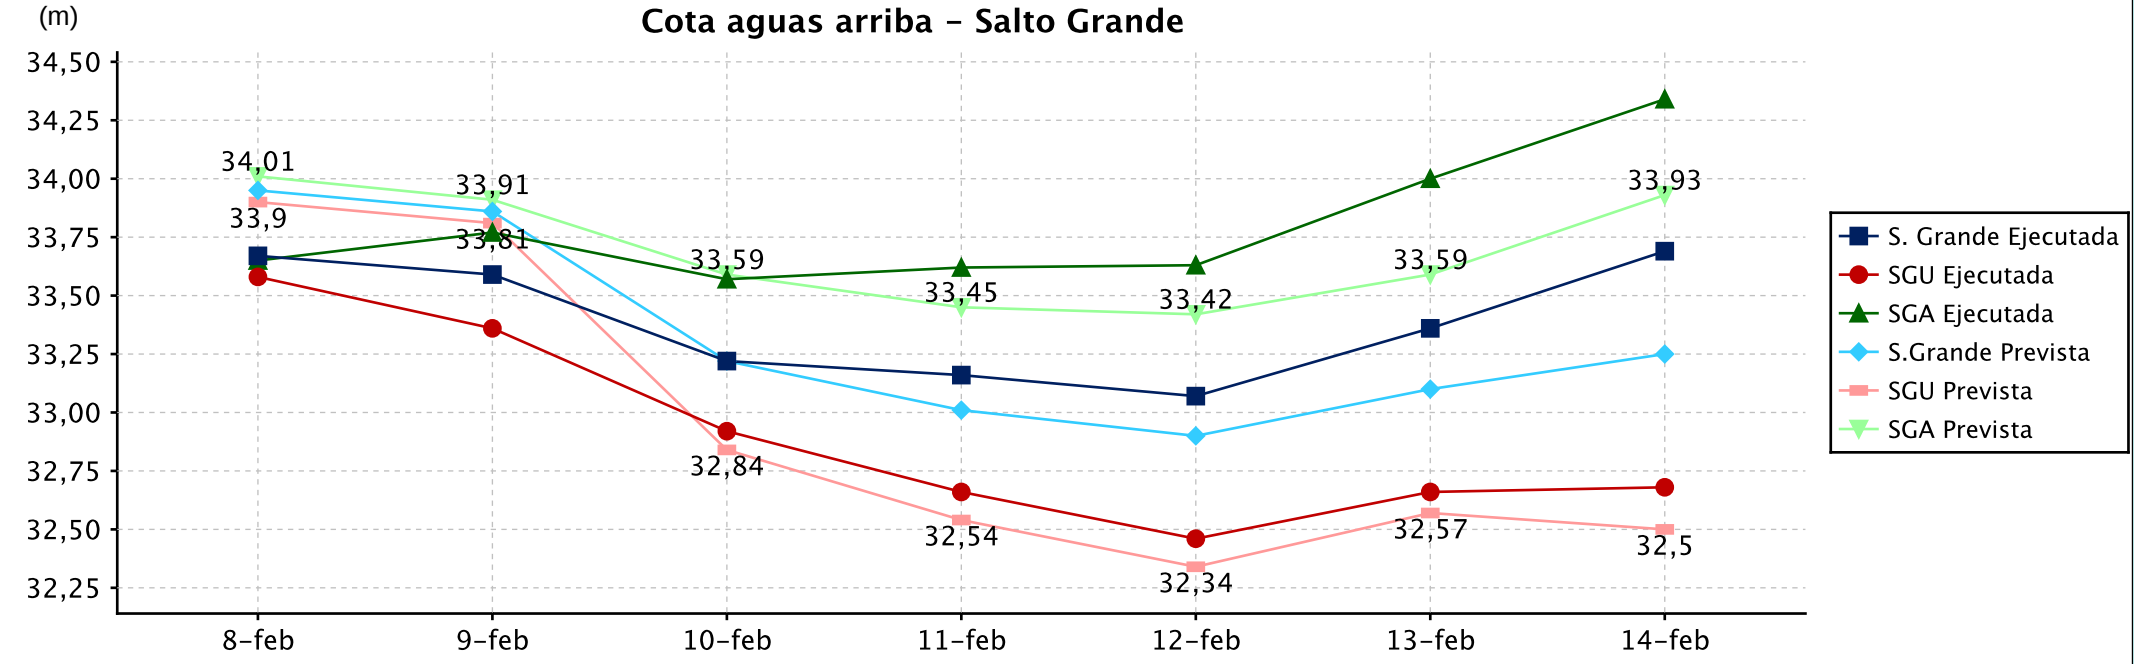

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,68
Cota Vista Arg	34,34
Cota real	33,69
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-32.063

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	713	638
Baygorria	601	530
Palmar	1.319	1.283
SGU	1.998	1.699

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.612	2.000
Baygorria	35	18
Palmar	1.413	1.011
SGU	1.625	1.618

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	200	0
Baygorria	0	0
Palmar	1.000	226
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
