



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 23 de febrero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.625
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.427
Motores	1.202
Central La Tablada	-47
Central P. del Tigre	1.966
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.373
C. Baygorria	2.238
C. Palmar	7.777
C. Salto Grande	3.421
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.437
TOTAL Generación	23.785

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.785
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.400
Diferencia (MWh)	385
Ejecutada - Programada	1,64 %

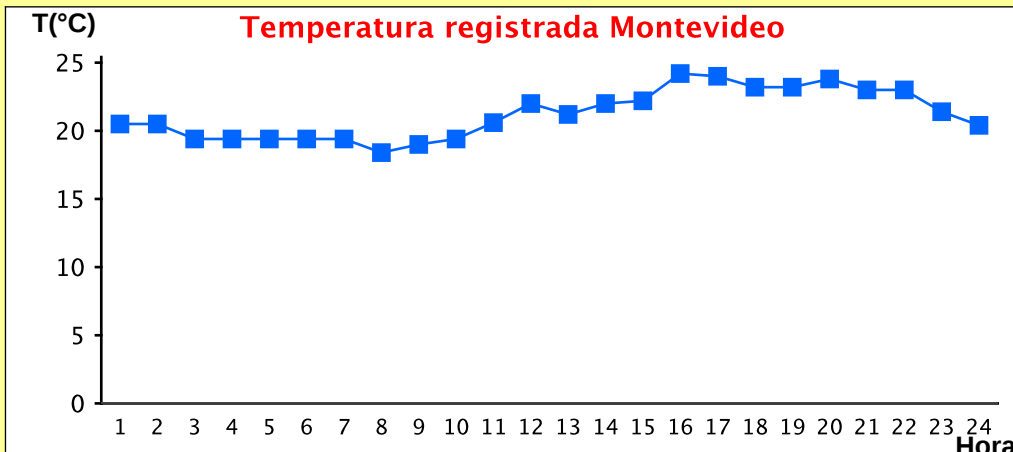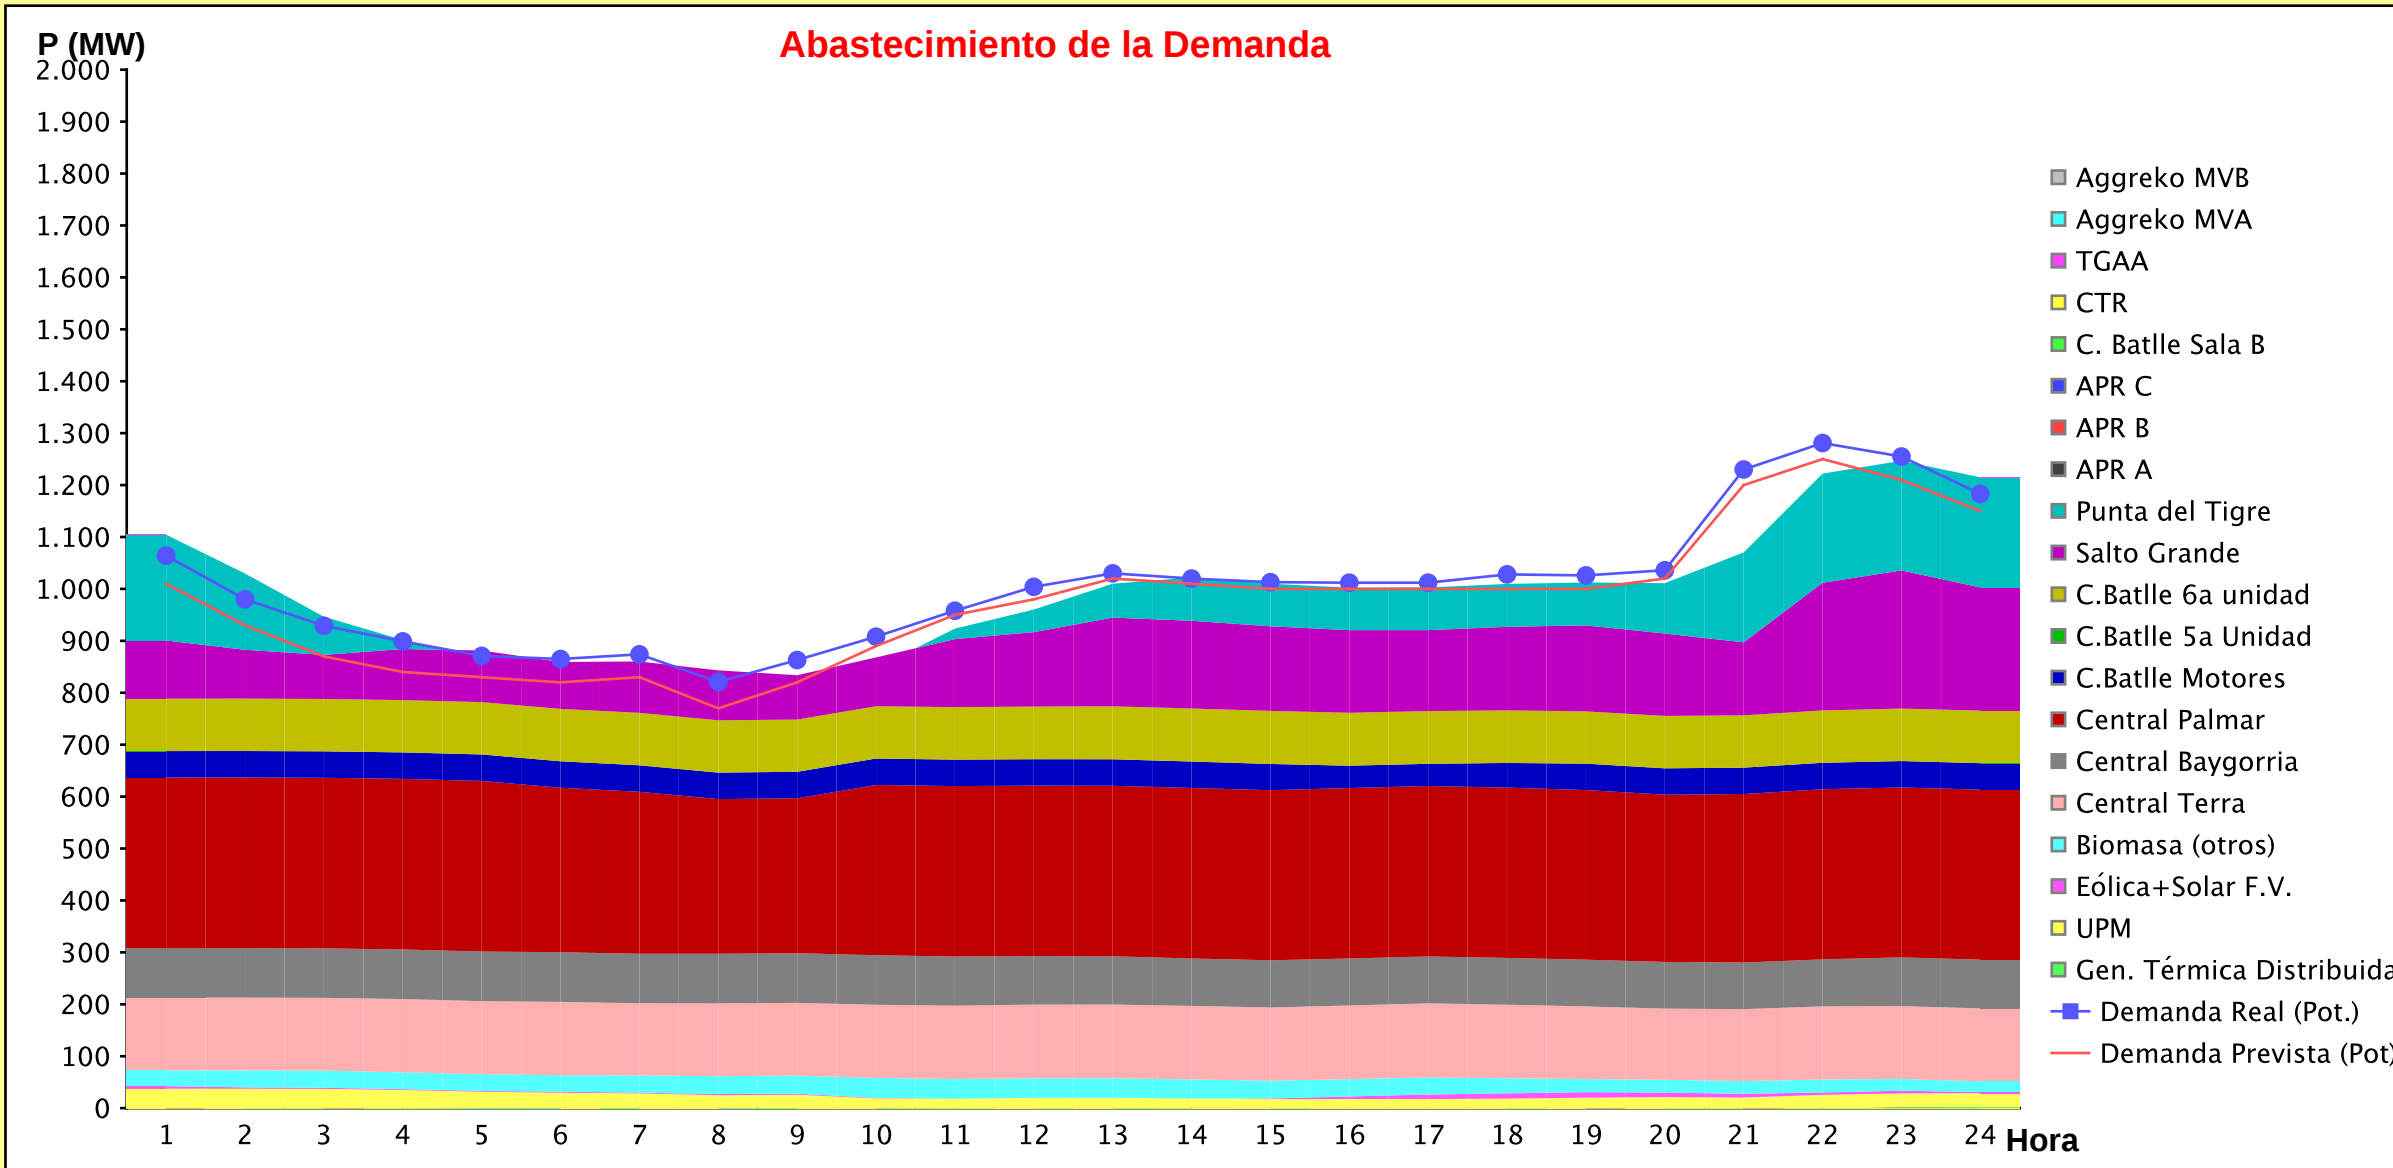



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1037,94 Hora 13:27
Potencia mínima:	816,15 Hora 07:48
Pico noche:	1282,77 Hora 22:03

Generación Media (MW)	
Eólica	3,6
Biomasa	59,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,2
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

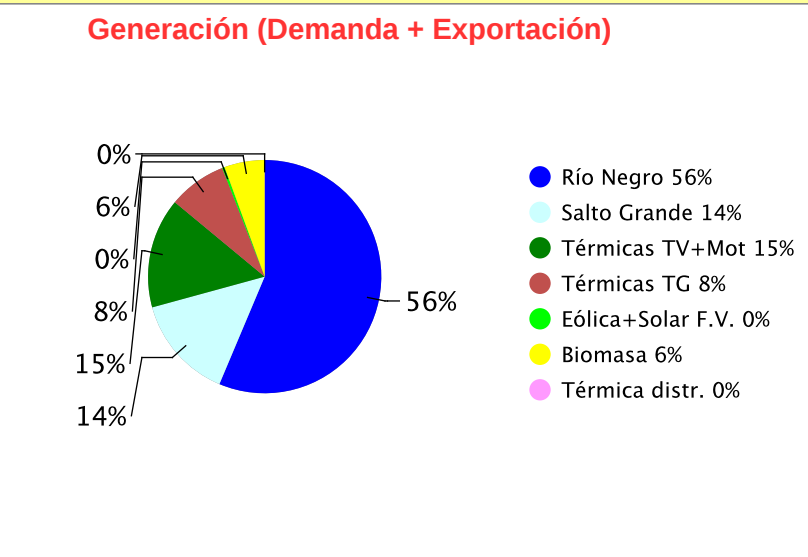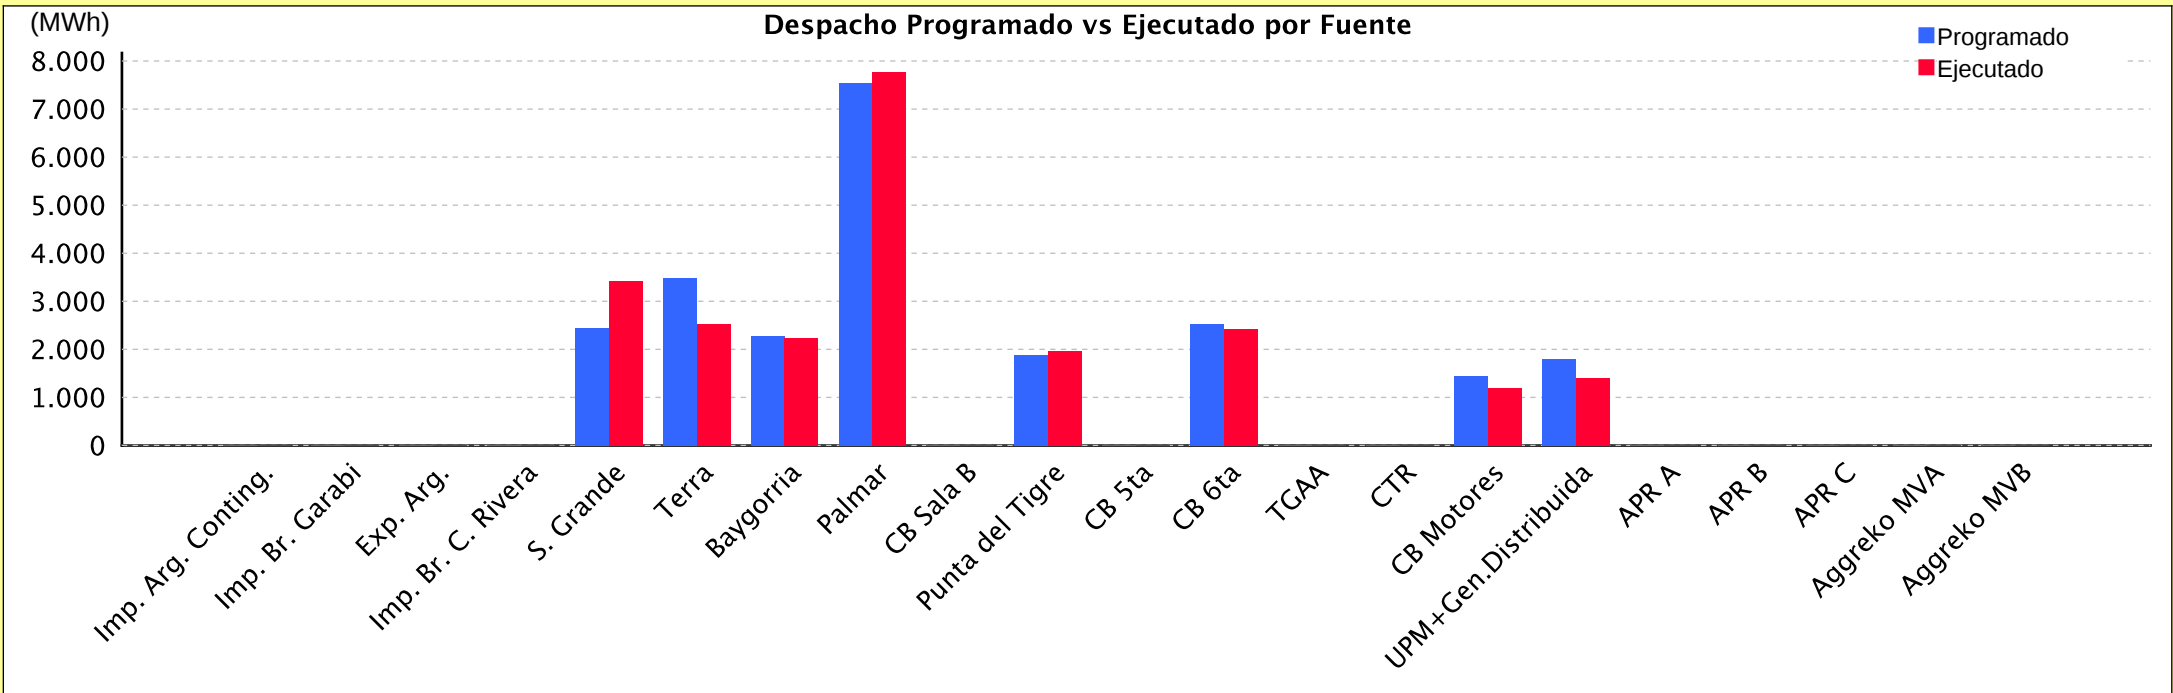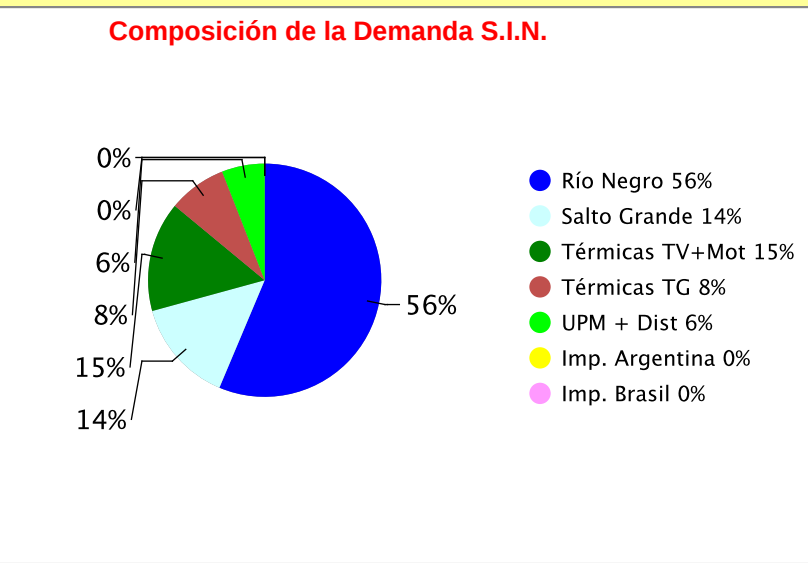



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

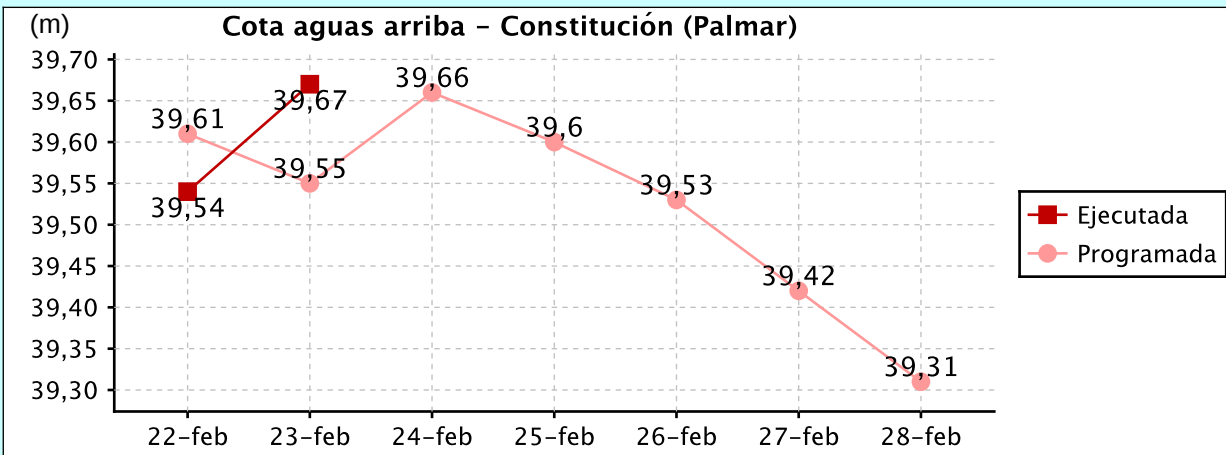
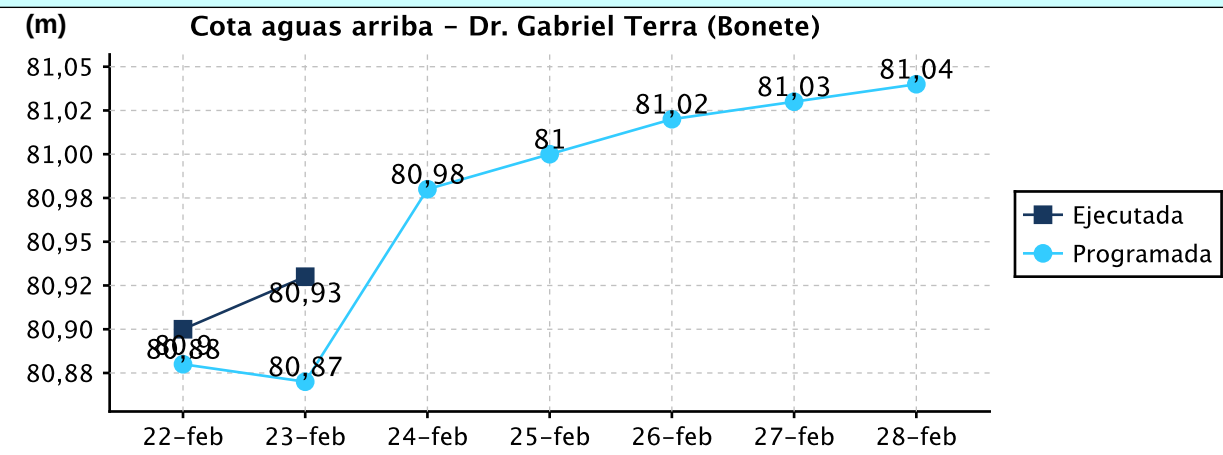


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,87	80,93
Baygorria	54,13	54,18
Palmar	39,55	39,67
SGU	32,19	32,2

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

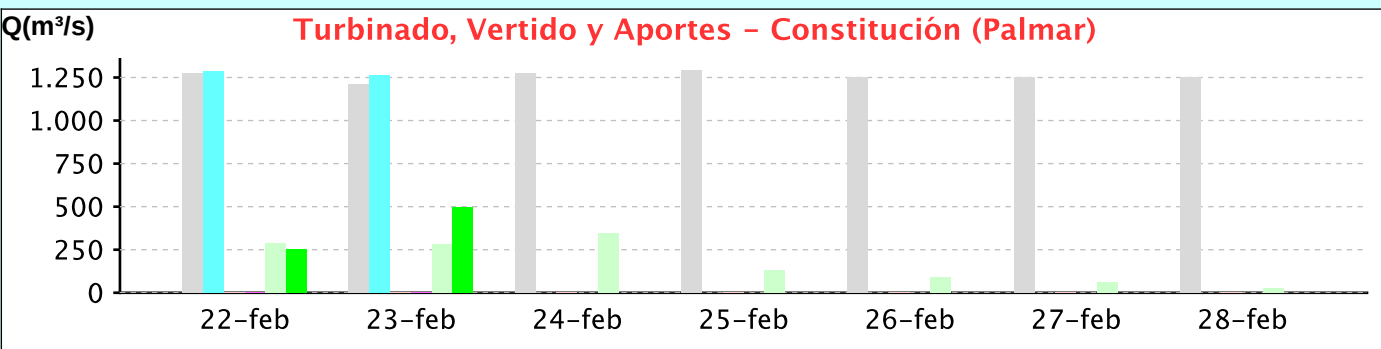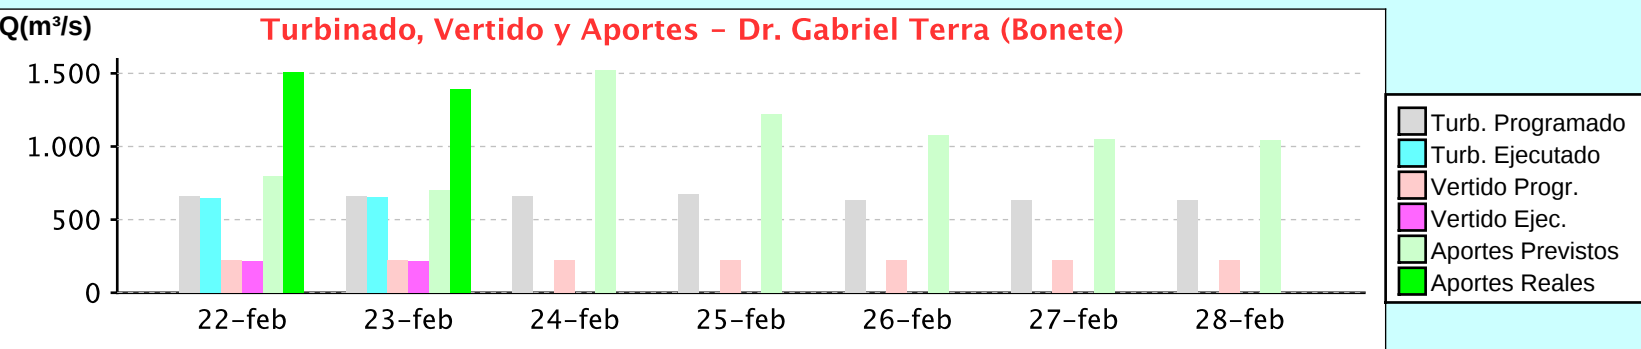

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

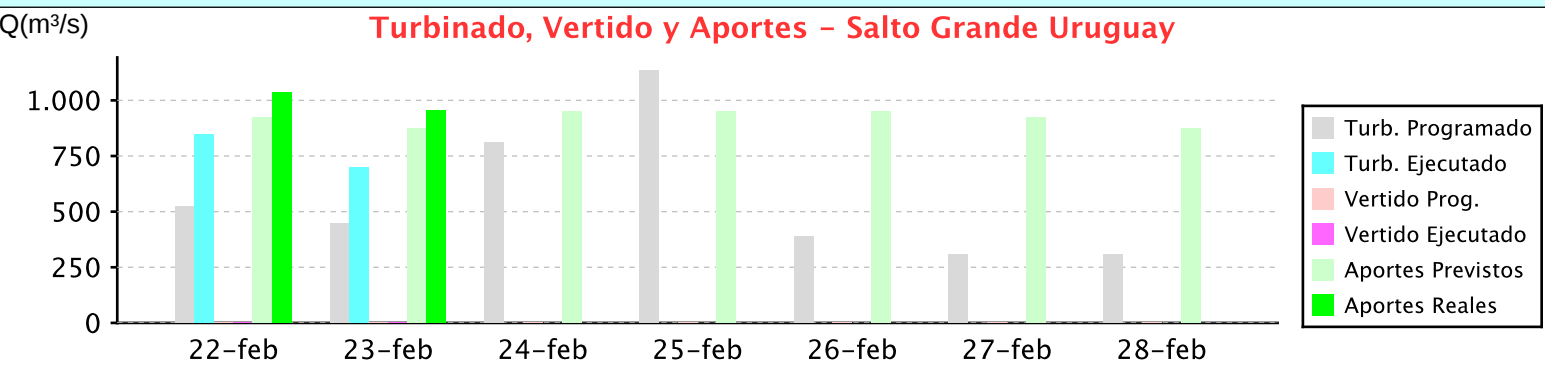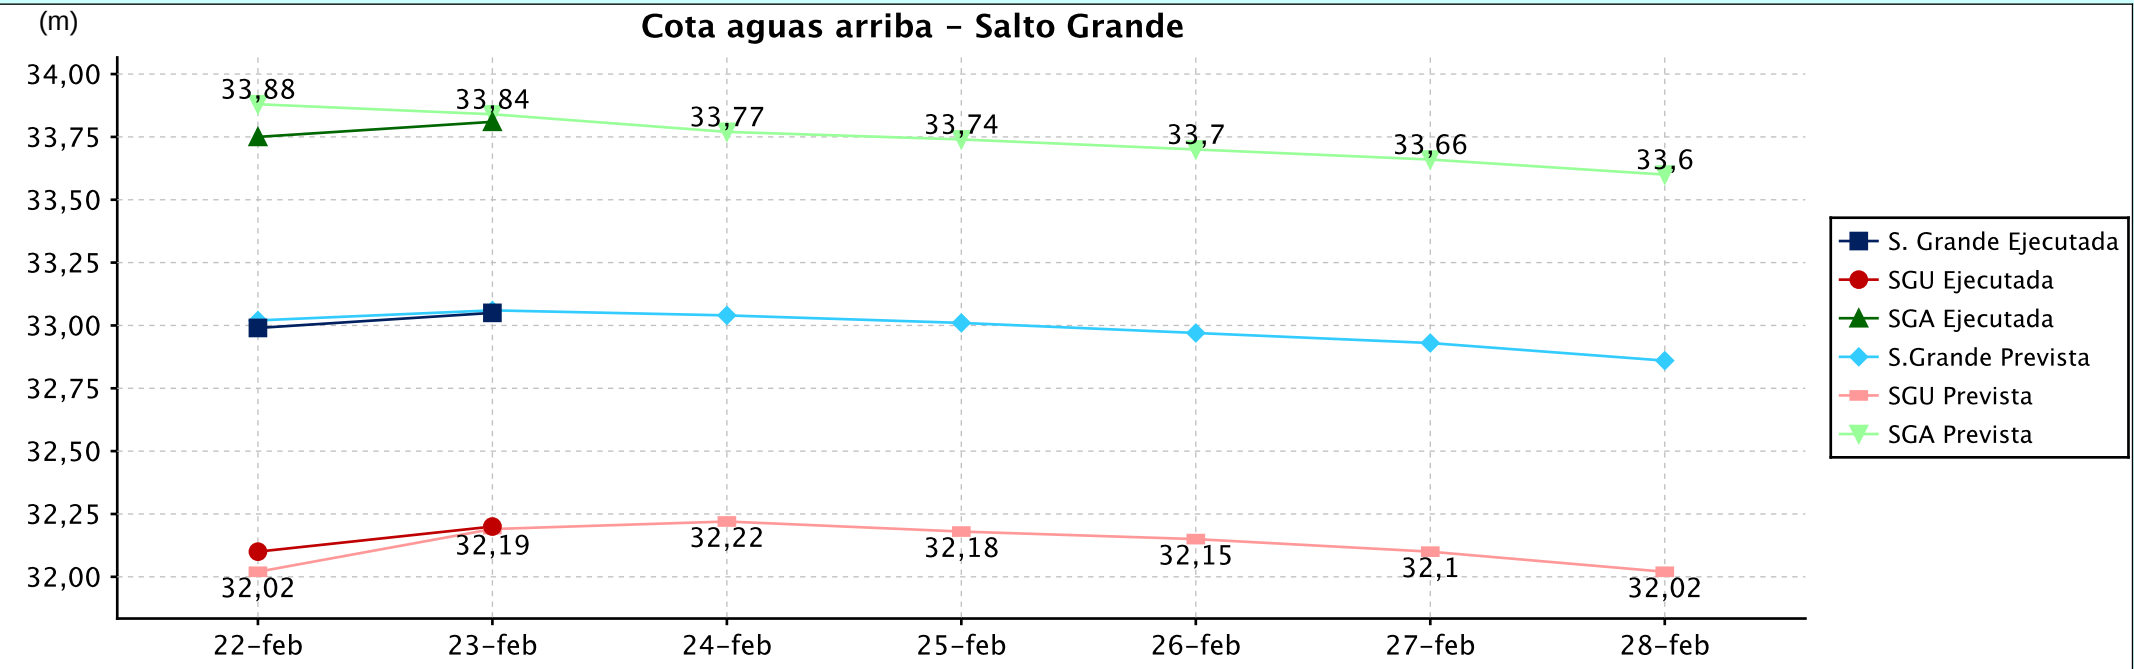

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,20
Cota Vista Arg	33,81
Cota real	33,05

Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	-28.796

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	660	655
Baygorria	825	819
Palmar	1.212	1.266
SGU	449	699

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	701	1.389
Baygorria	1	646
Palmar	283	496
SGU	875	954

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	217
Baygorria	110	455
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
