



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 01 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.779
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.323
Motores	1.461
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	-11
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.355
C. Baygorria	2.297
C. Palmar	7.882
C. Salto Grande	6.878
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	945
TOTAL Generación	25.075

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.075
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.720
Diferencia (MWh)	-1.645
Ejecutada - Programada	-6,15 %

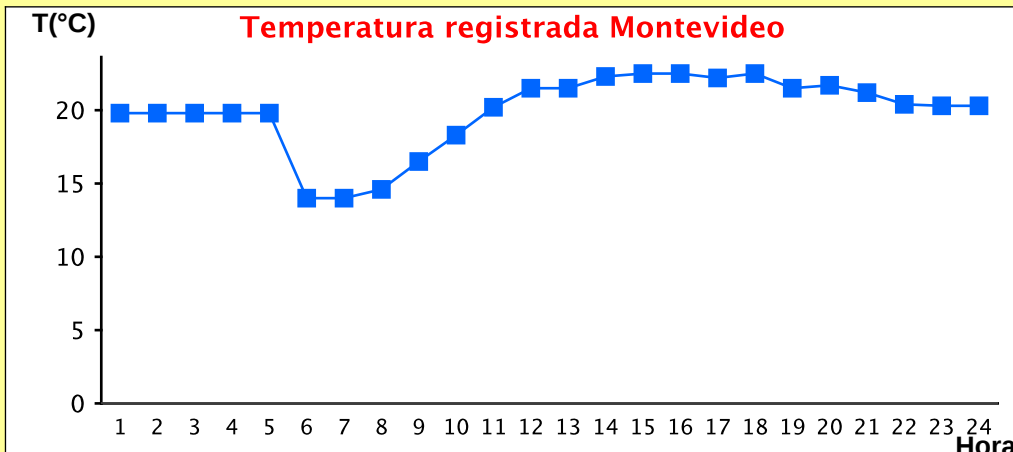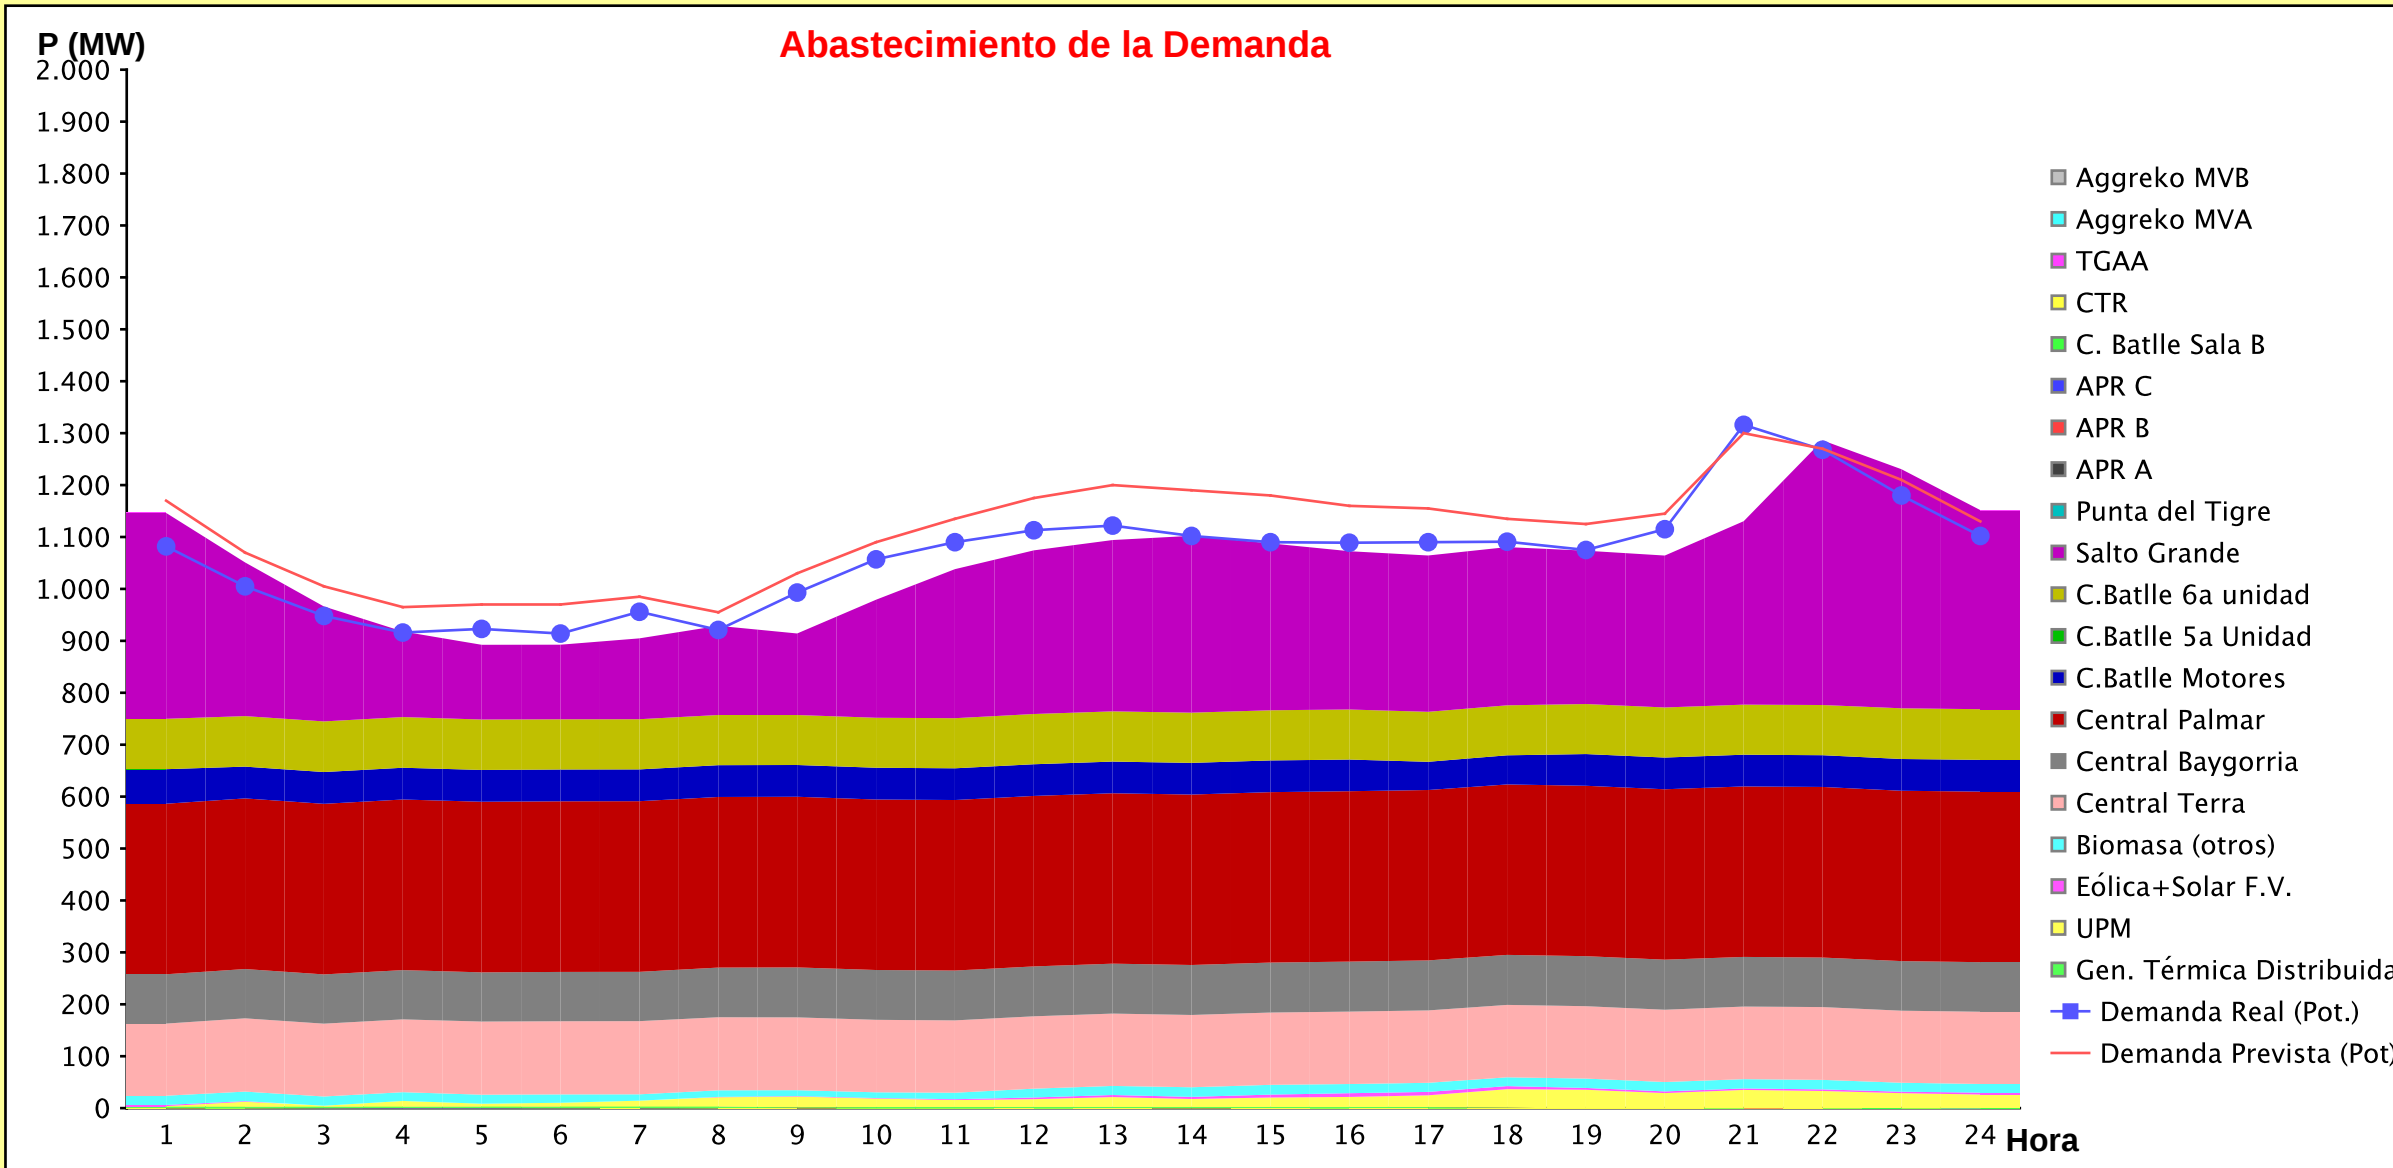



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1130,42 Hora 13:12
Potencia mínima:	904,17 Hora 04:08
Pico noche:	1322,03 Hora 21:15

Generación Media (MW)	
Eólica	2,8
Biomasa	46,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	1,8
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

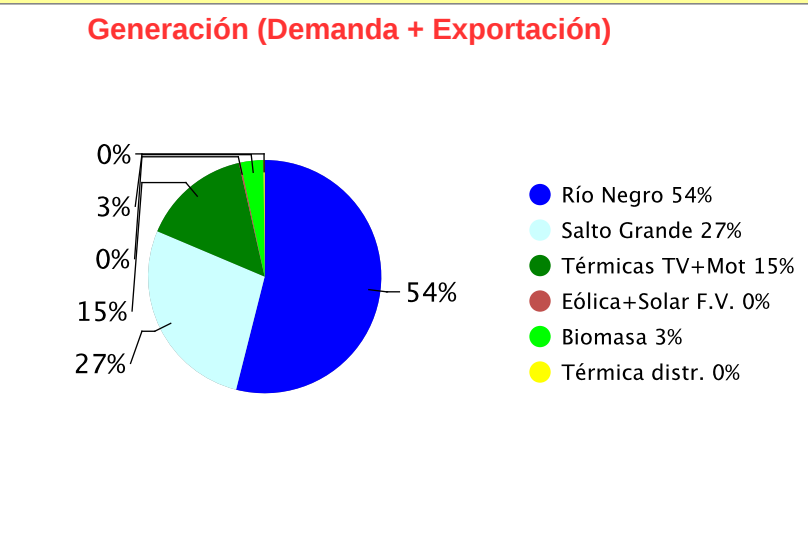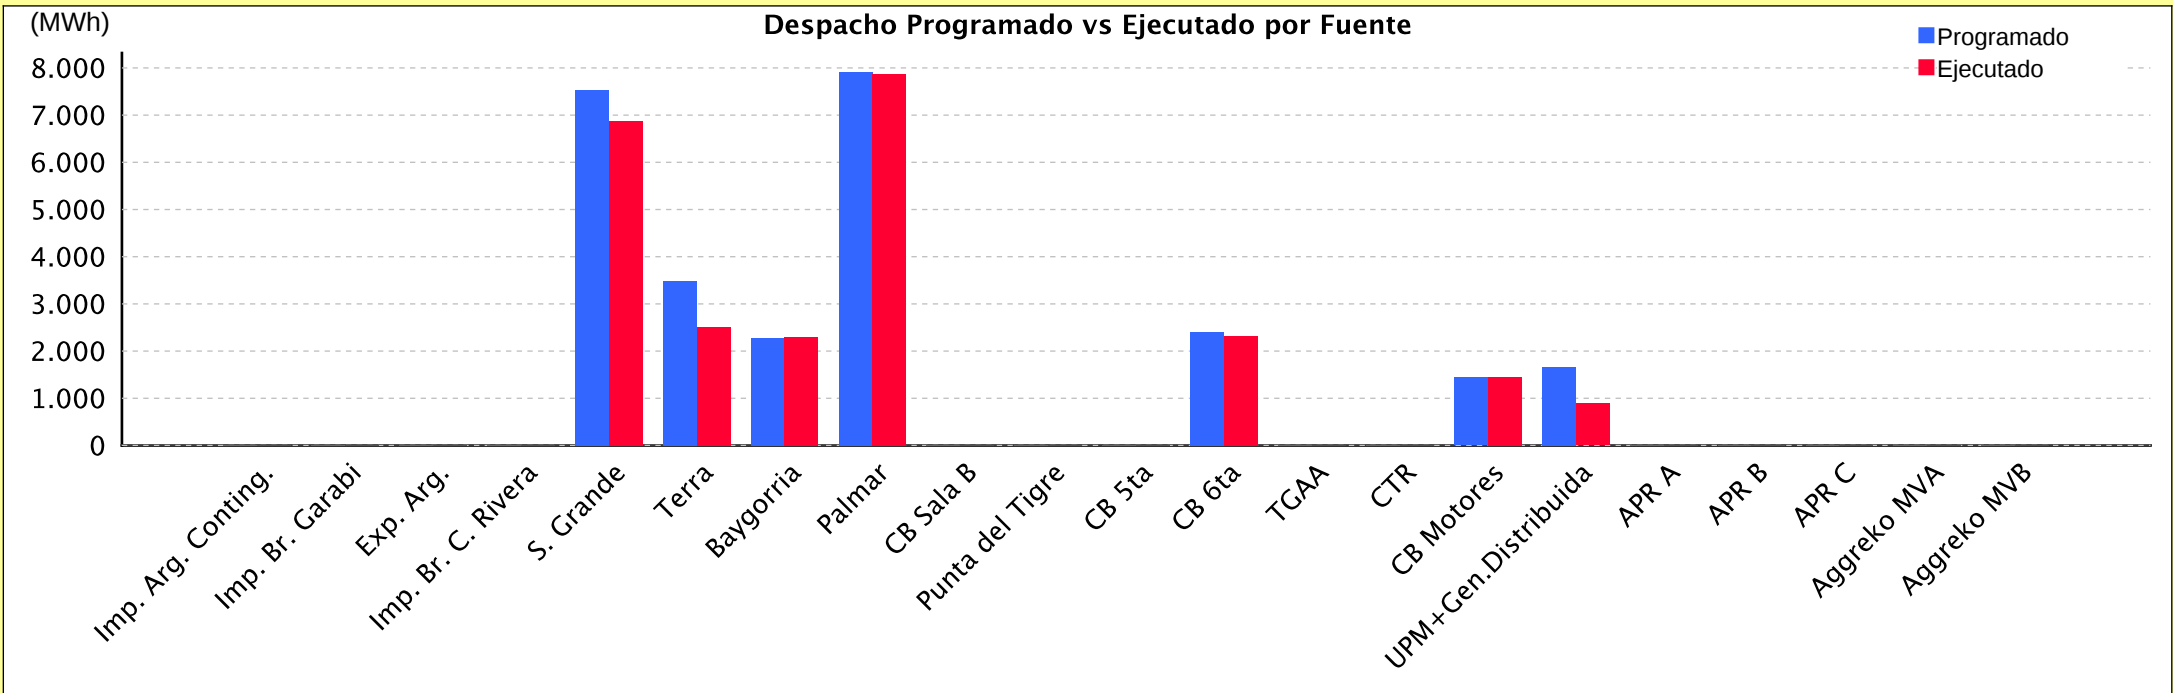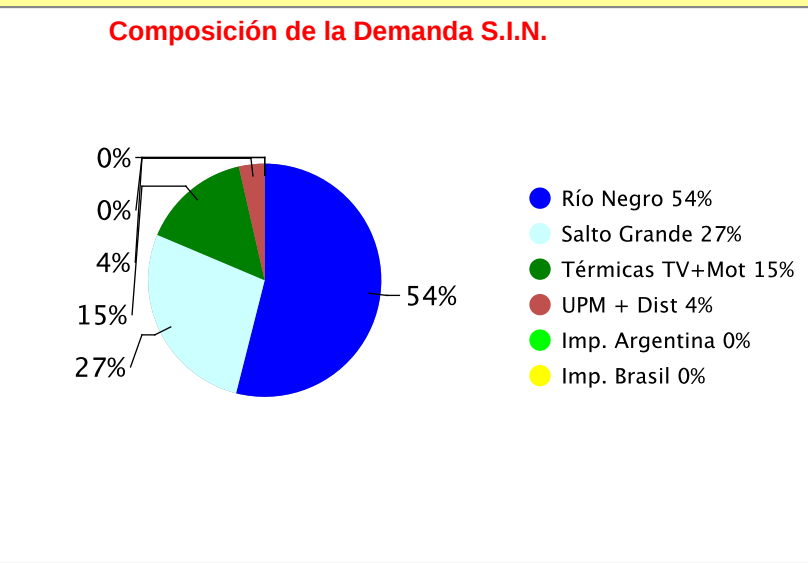



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

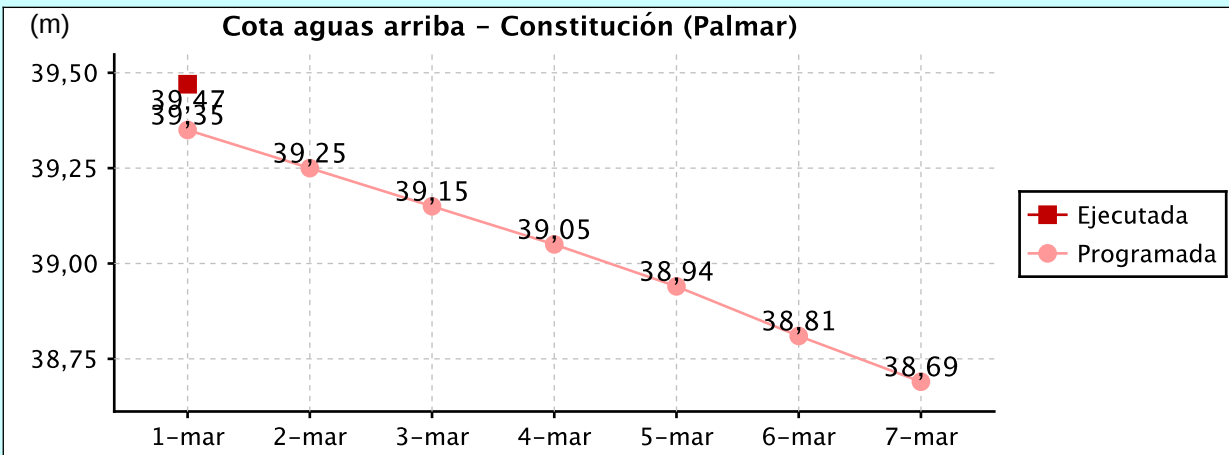
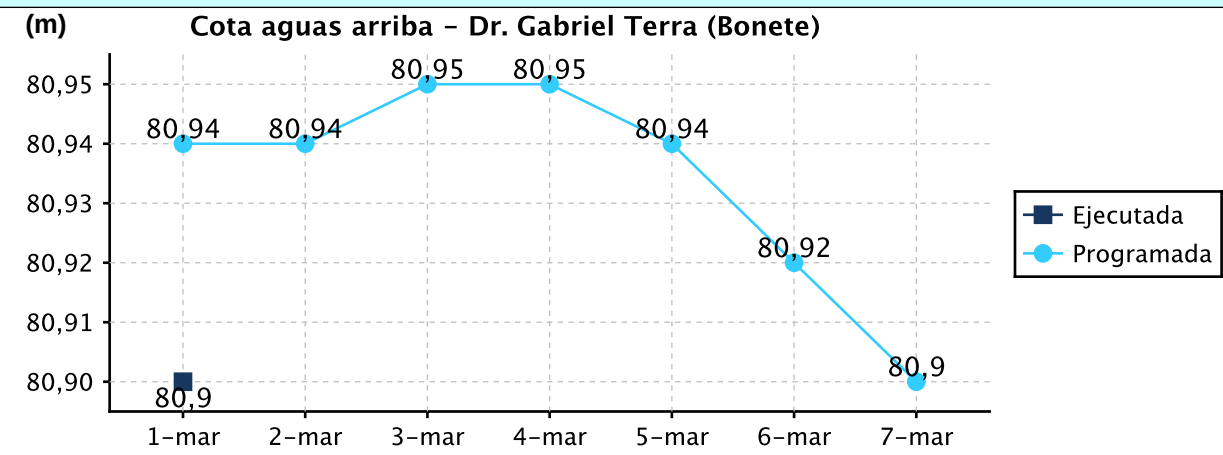


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,94	80,9
Baygorria	54,29	54,17
Palmar	39,35	39,47
SGU	32,44	32,5

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

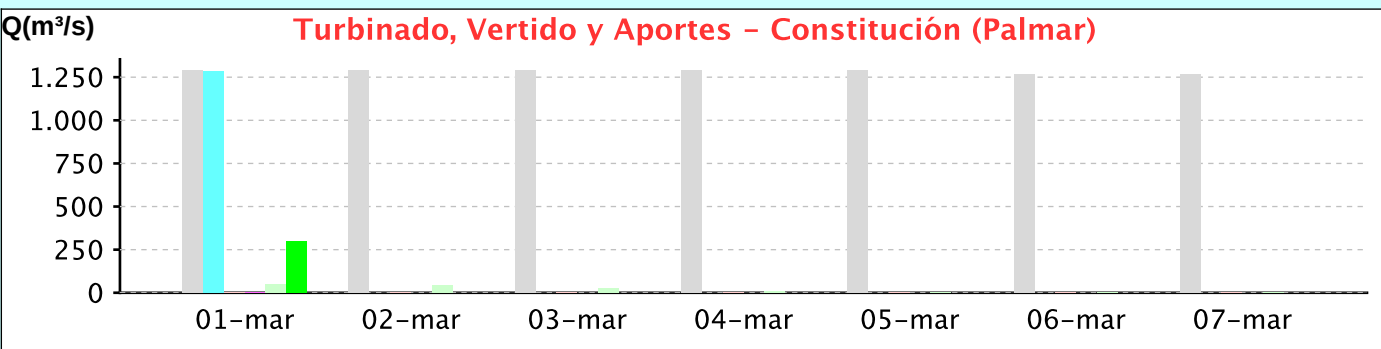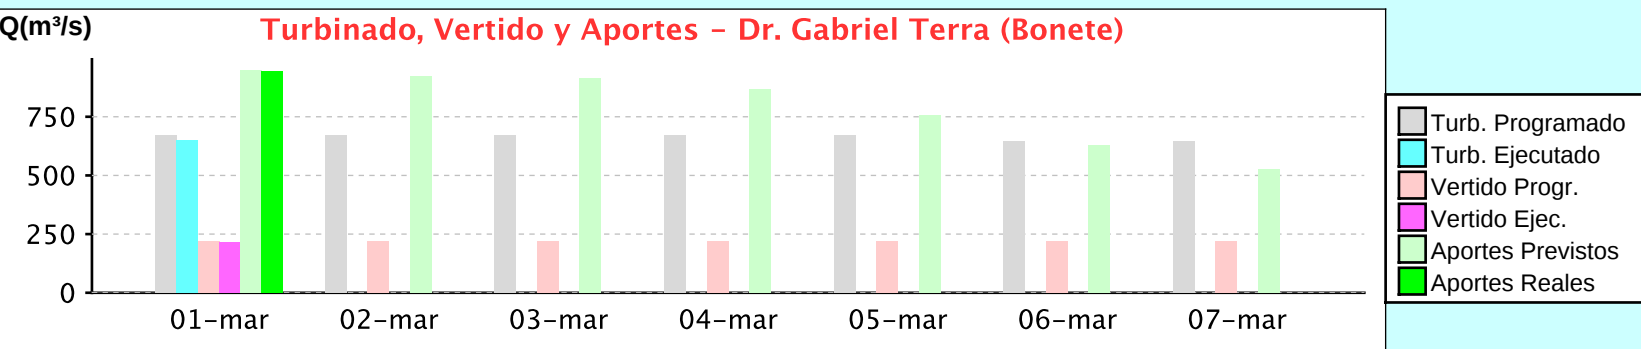

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

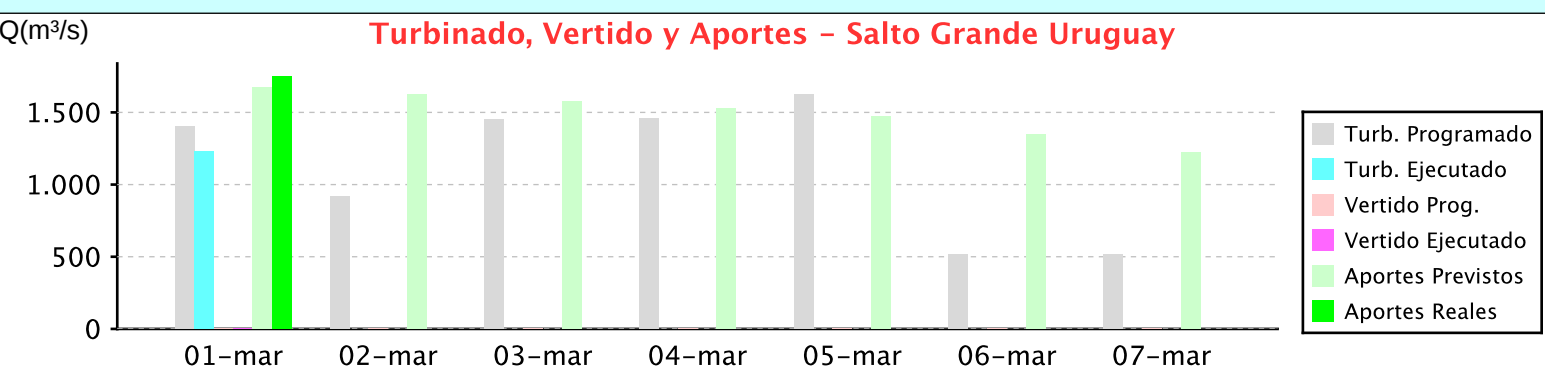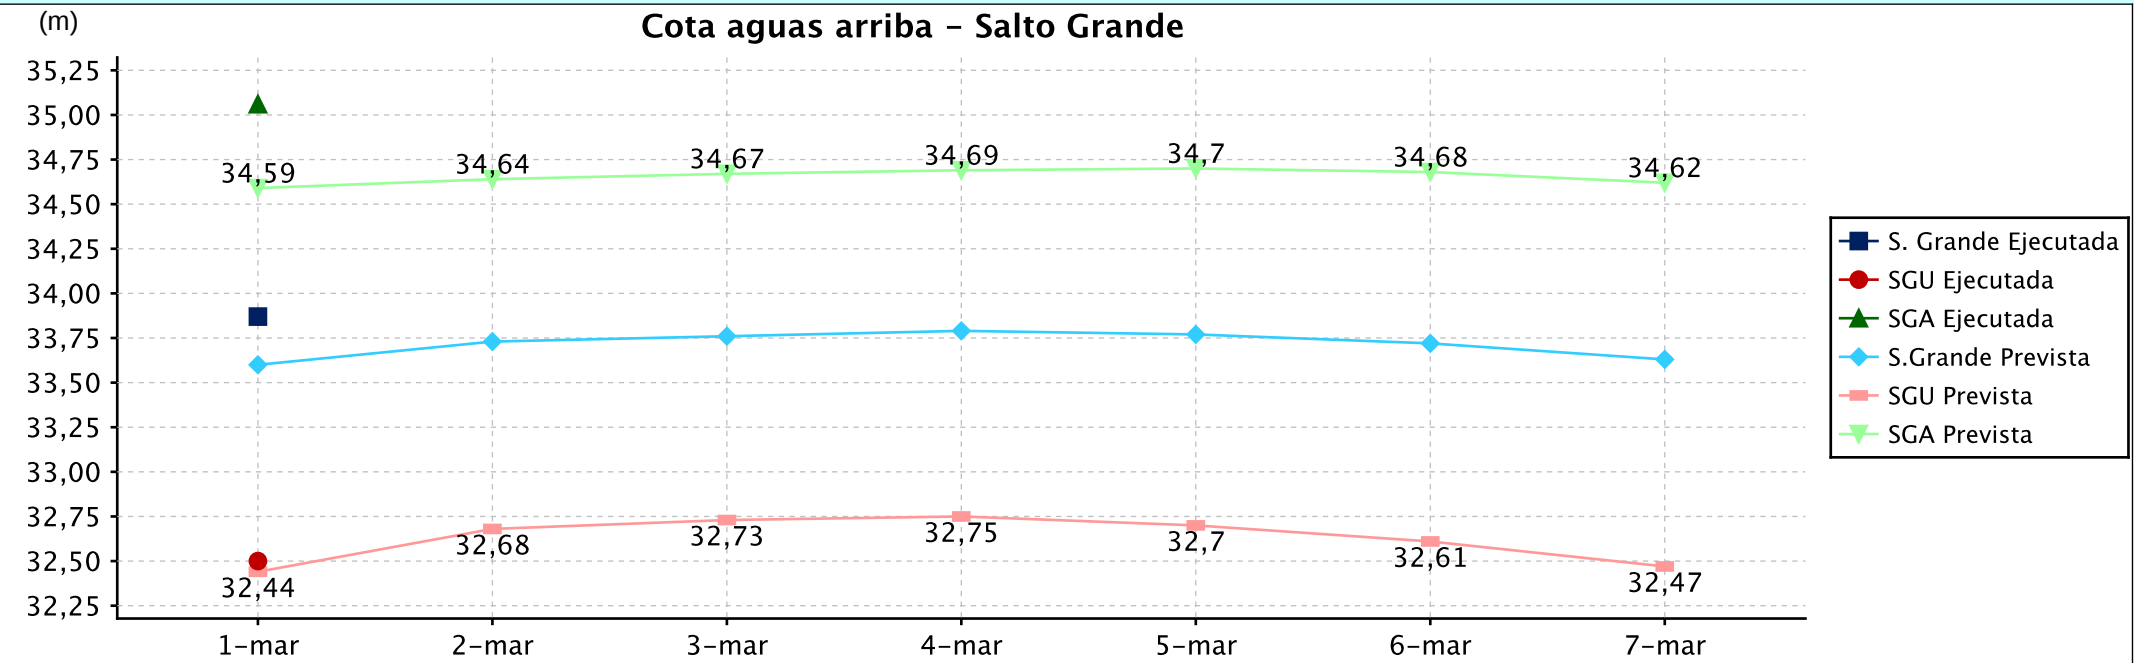

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,50
Cota Vista Arg	35,06
Cota real	33,87

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-51.466
------------------------------------	---------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	672	648
Baygorria	812	802
Palmar	1.289	1.282
SGU	1.406	1.226

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	947	944
Baygorria	0	-7
Palmar	51	299
SGU	1.675	1.752

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	217
Baygorria	100	81
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
