



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 03 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.859
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.493
Motores	1.371
Central La Tablada	-49
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	105
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.342
C. Baygorria	2.285
C. Palmar	7.840
C. Salto Grande	6.369
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.431
TOTAL Generación	25.170

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.170
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.965
Diferencia (MWh)	-1.795
Ejecutada - Programada	-6,66 %

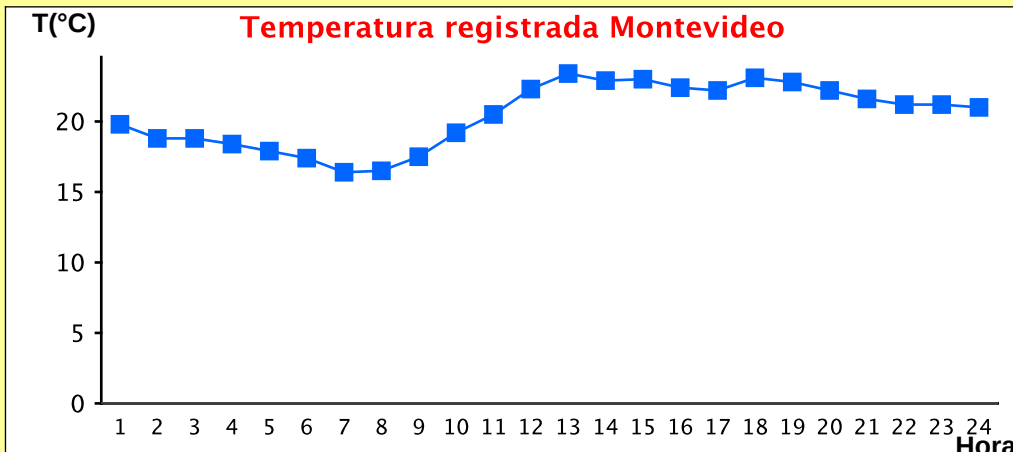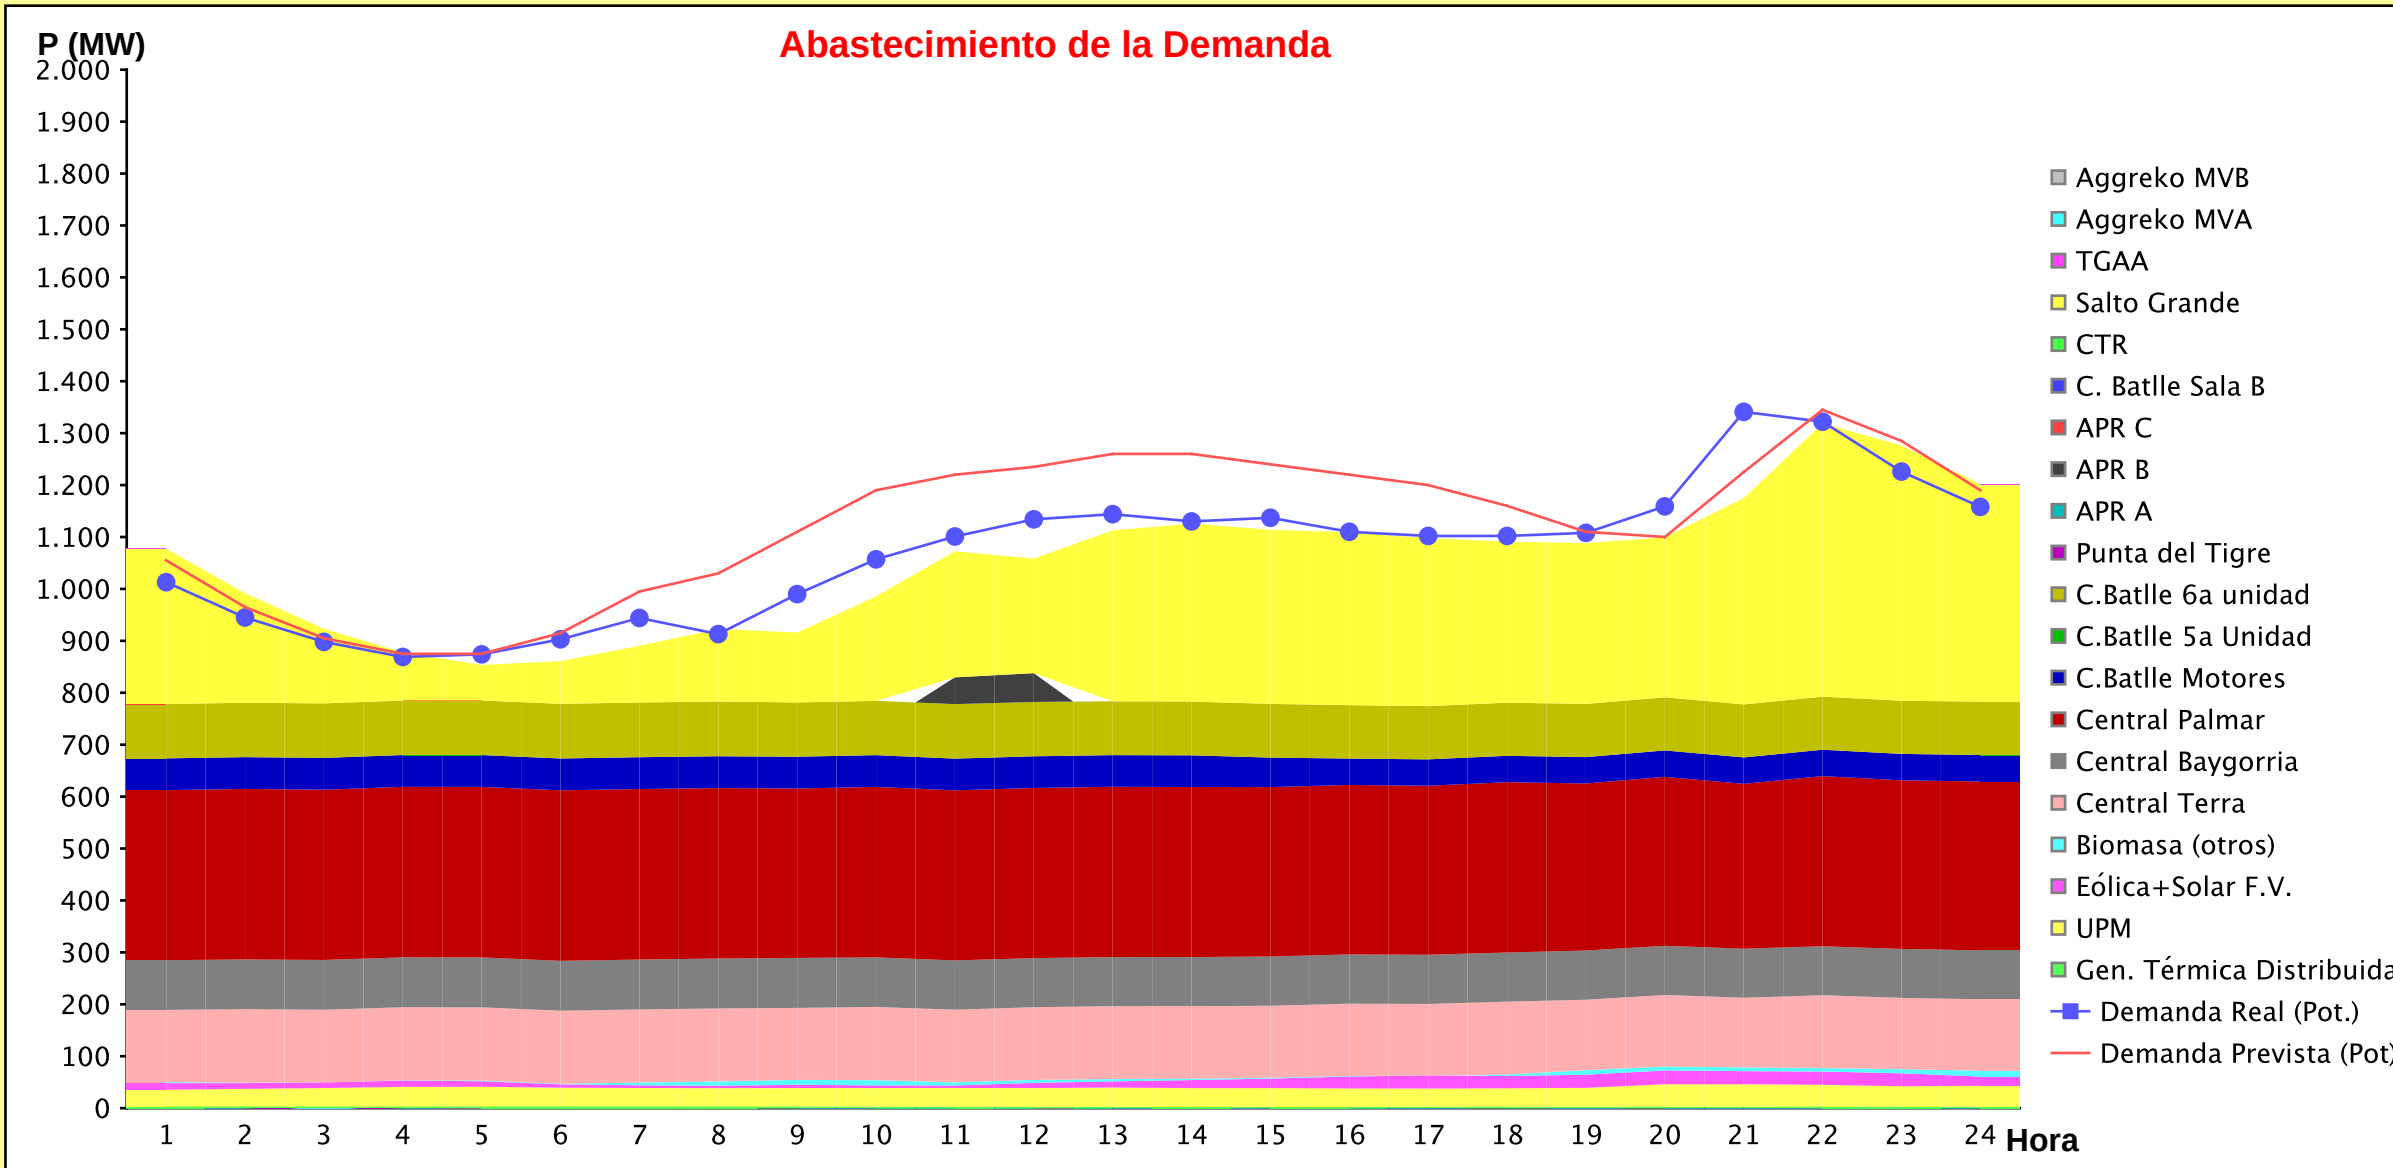



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1161,51 Hora 13:17
Potencia mínima:	856,51 Hora 04:43
Pico noche:	1361,85 Hora 21:13

Generación Media (MW)	
Eólica	15,2
Biomasa	53,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	2,6
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

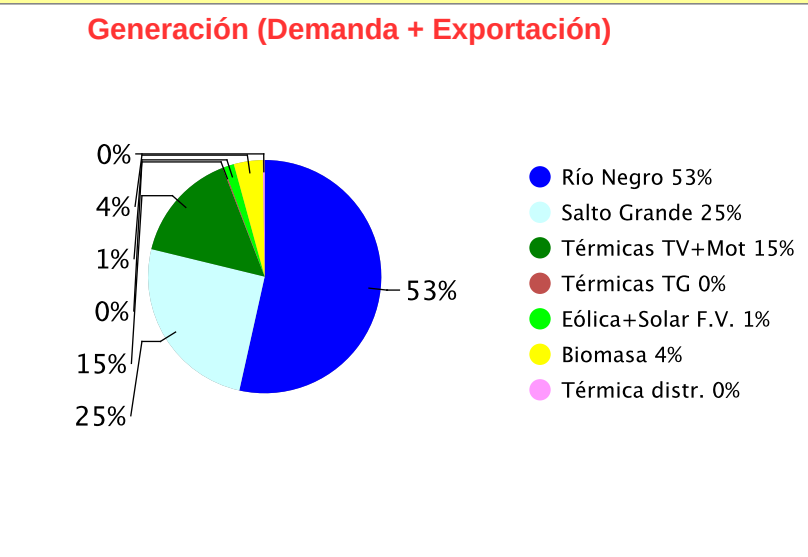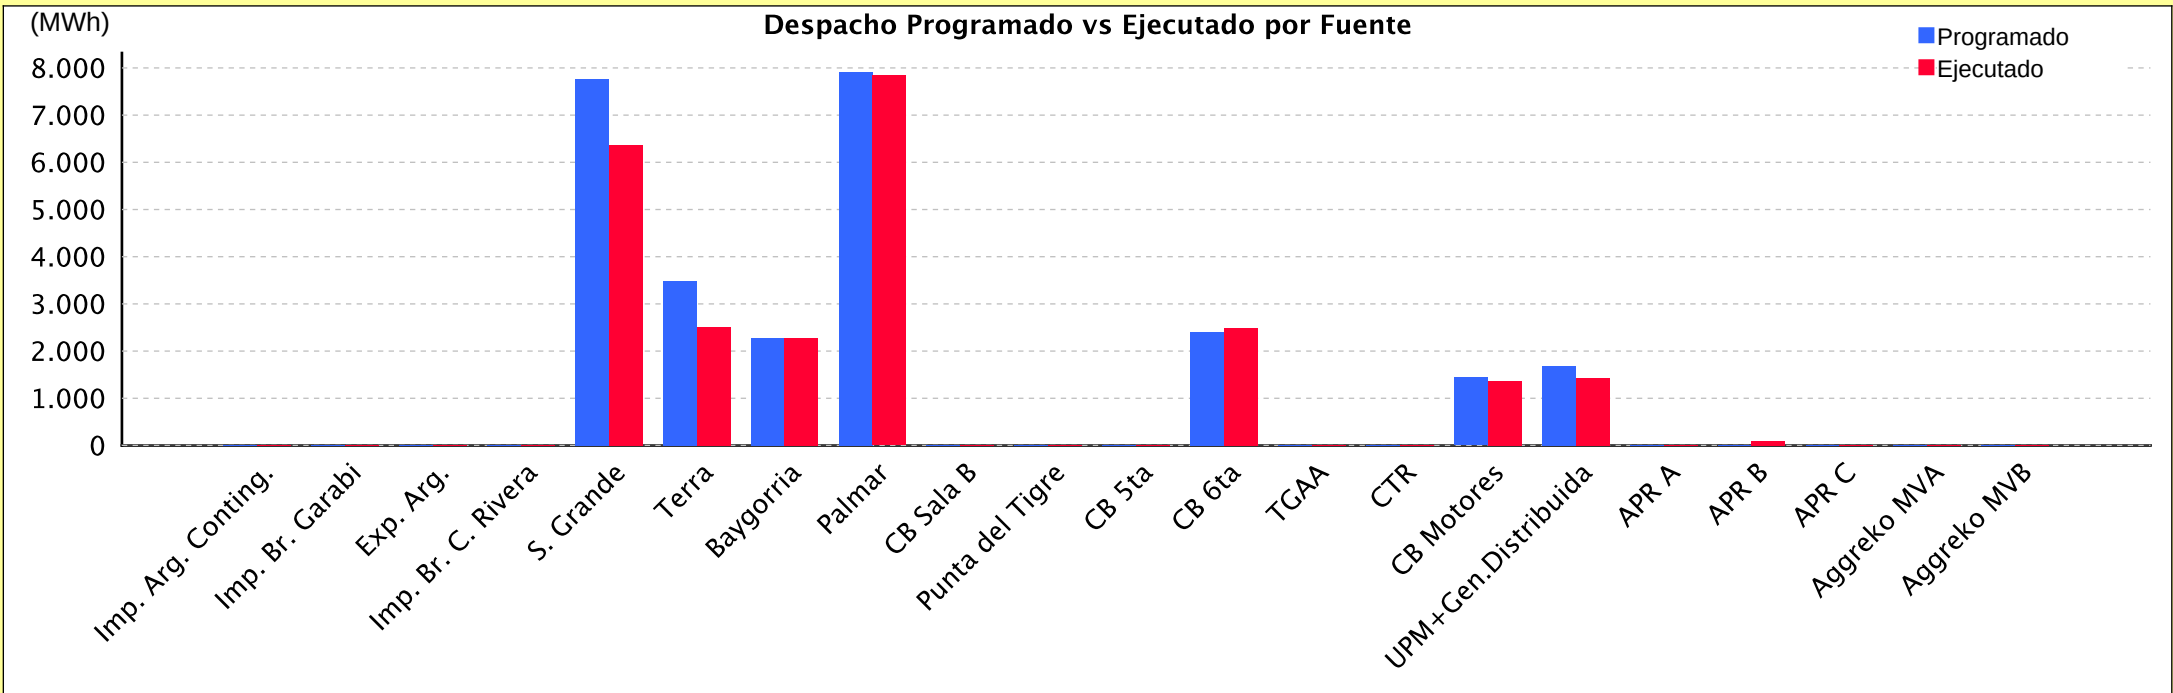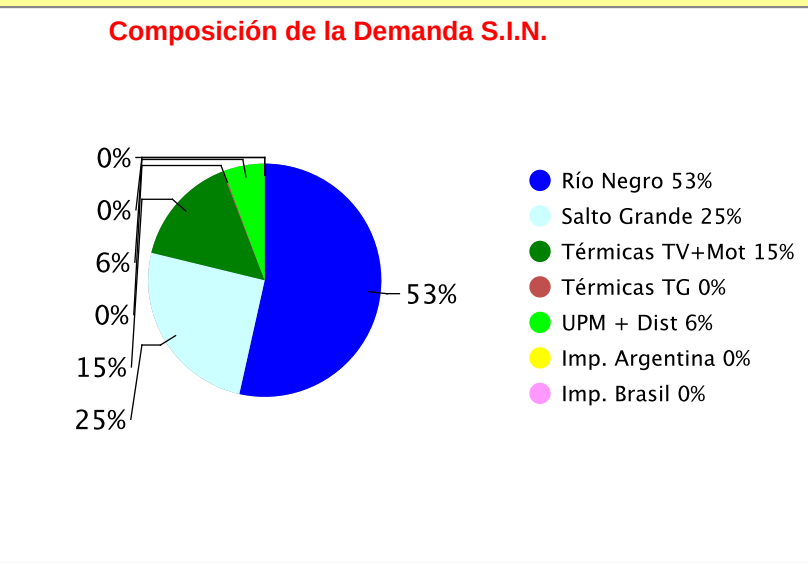



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

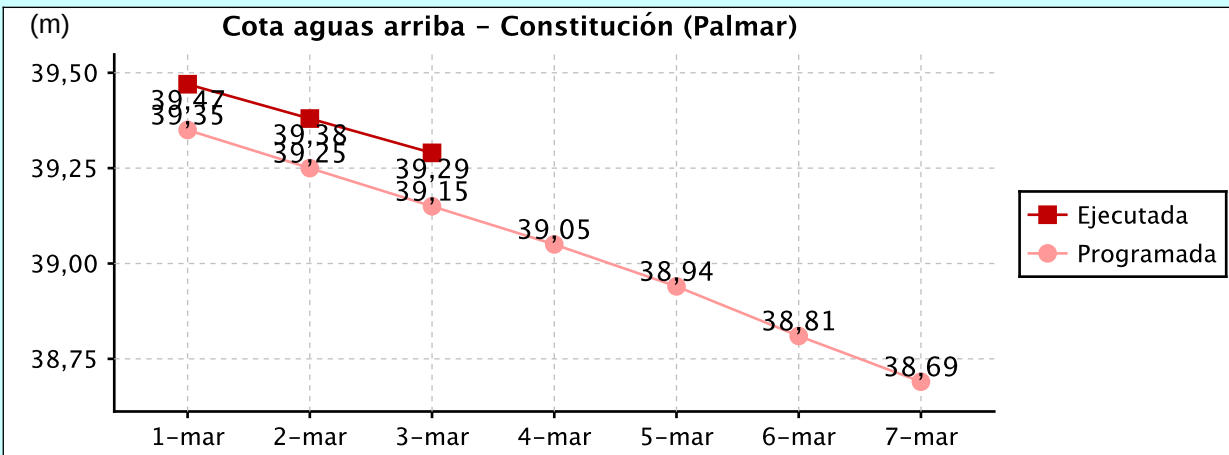
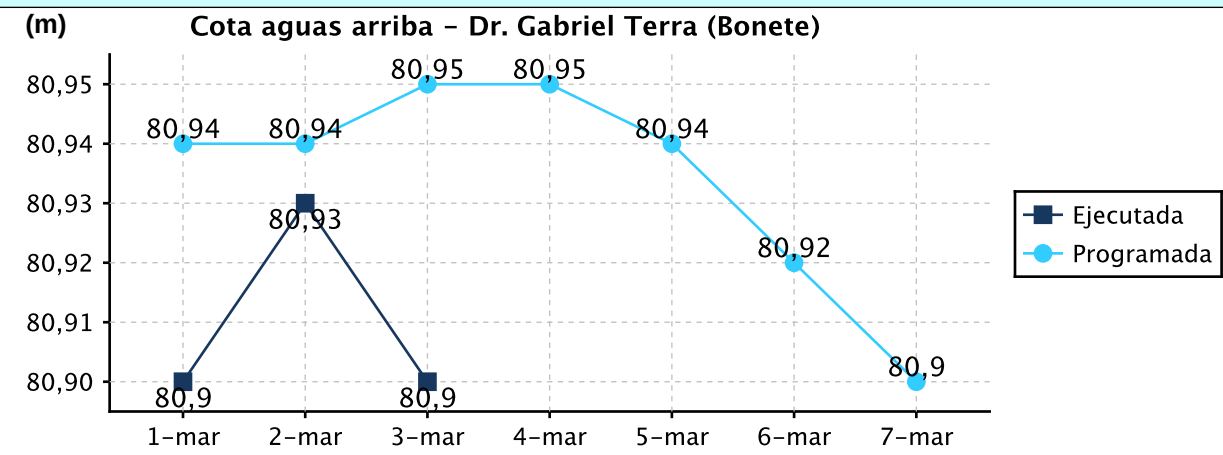


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,95	80,9
Baygorria	54,23	54,15
Palmar	39,15	39,29
SGU	32,73	33,66

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

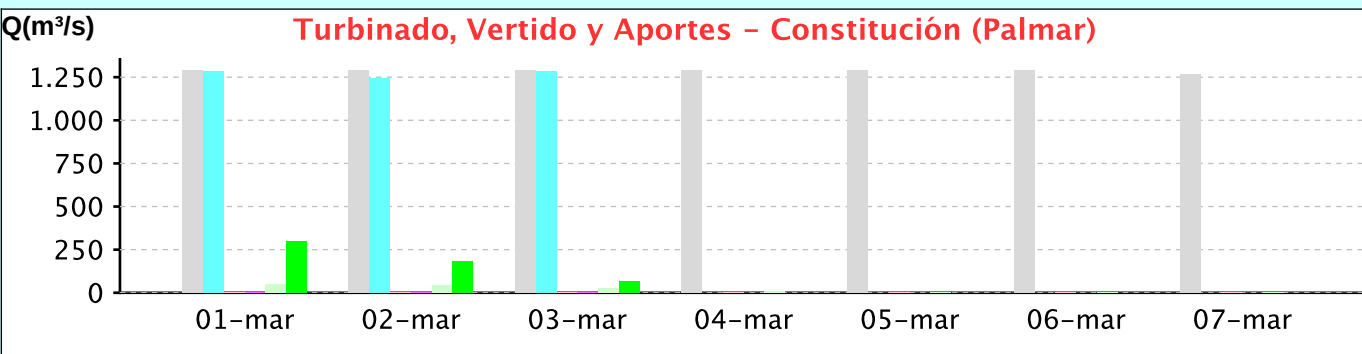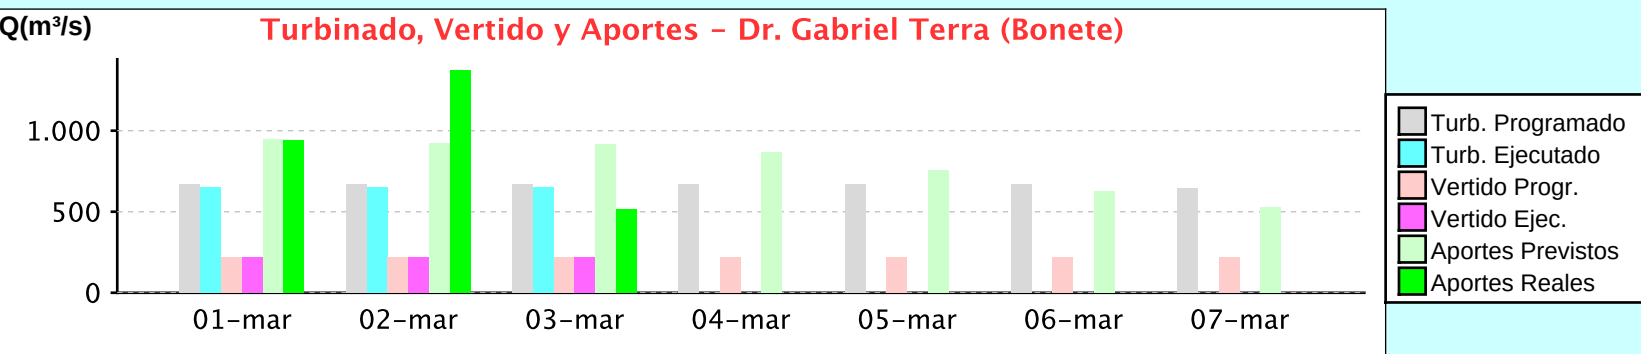

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

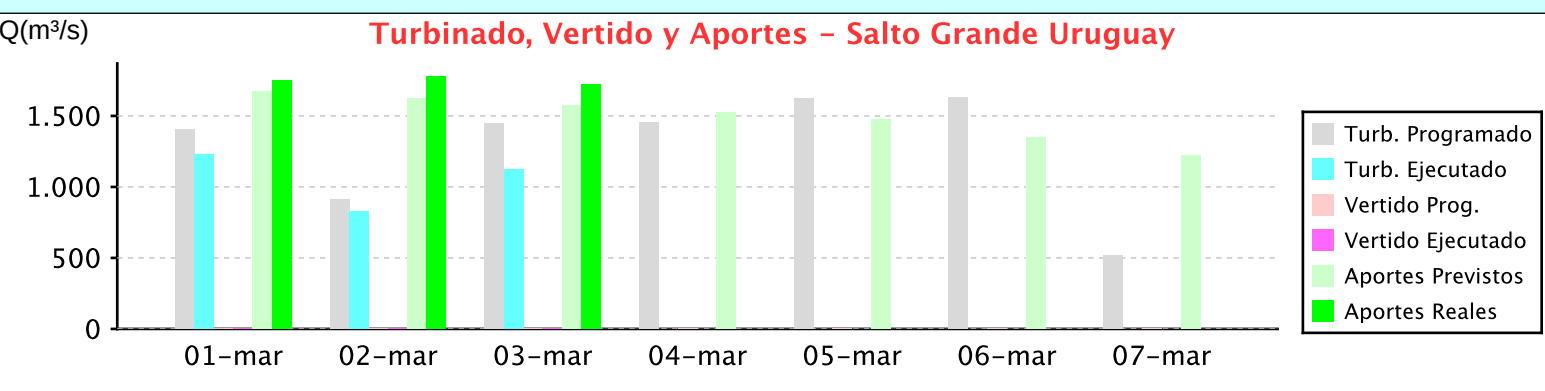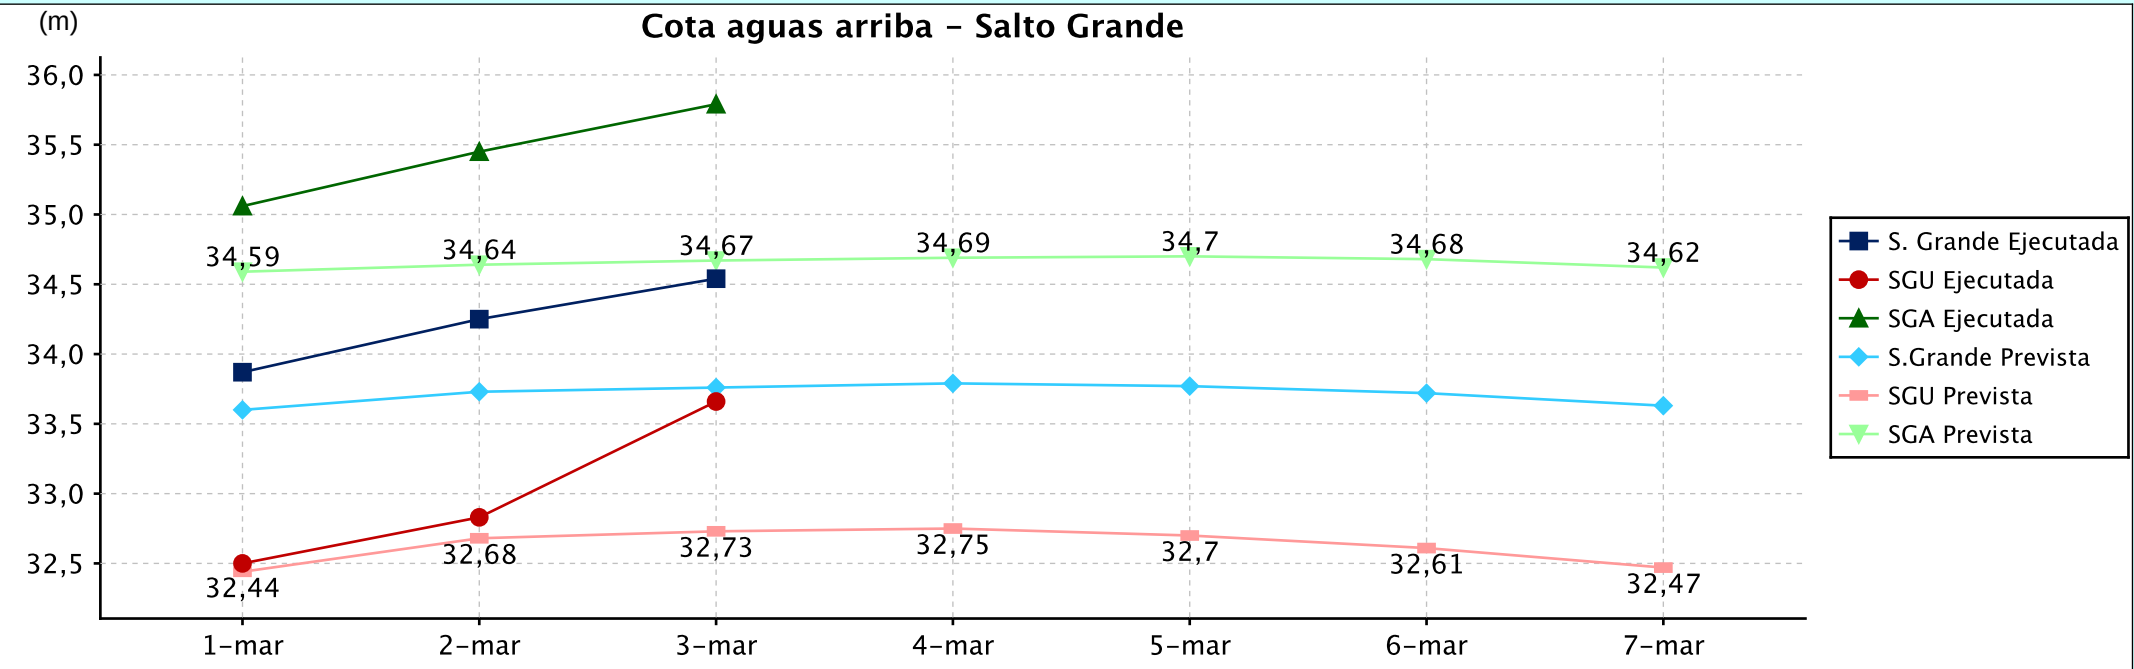

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,66
Cota Vista Arg	35,79
Cota real	34,54
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
-59.675	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	672	649
Baygorria	812	783
Palmar	1.289	1.286
SGU	1.450	1.126

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	914	516
Baygorria	0	8
Palmar	25	68
SGU	1.575	1.718

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	217
Baygorria	100	173
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
