



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 05 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.595
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.396
Motores	1.203
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-0
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.369
C. Baygorria	2.252
C. Palmar	7.870
C. Salto Grande	9.522
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	455
TOTAL Generación	27.008

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.008
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.890
Diferencia (MWh)	-882
Ejecutada - Programada	-3,16 %

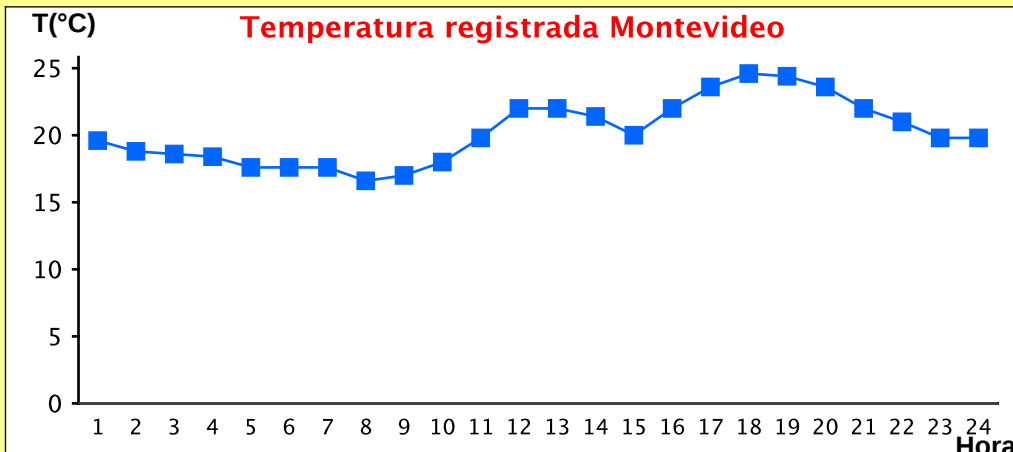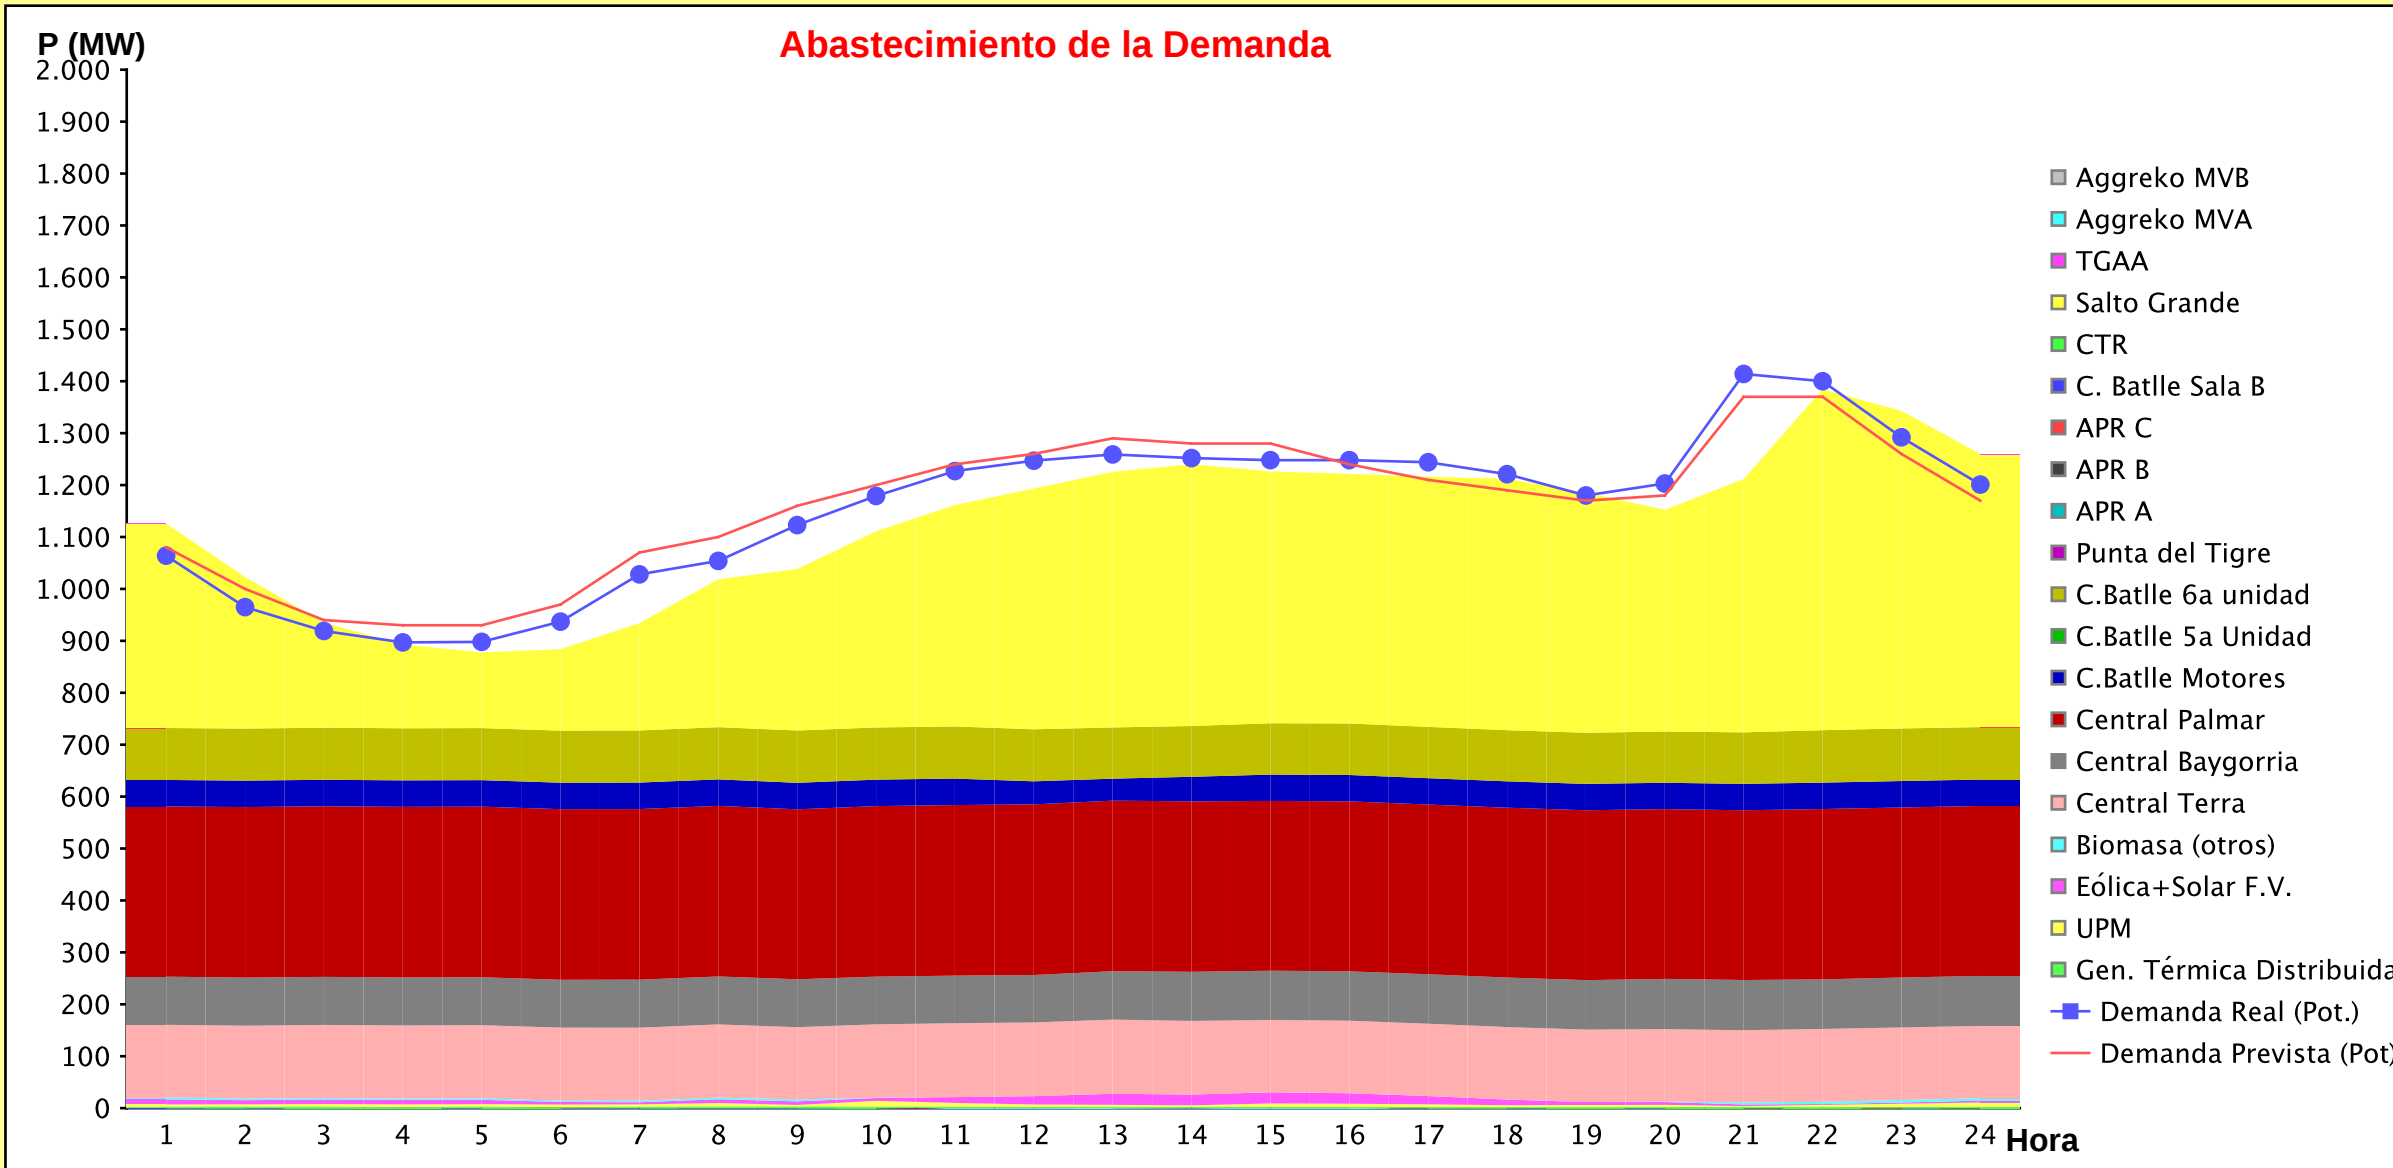



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1278,8 Hora 13:12
Potencia mínima:	881,14 Hora 04:16
Pico noche:	1424,23 Hora 21:08

Generación Media (MW)	
Eólica	9,8
Biomasa	21,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	2,4
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

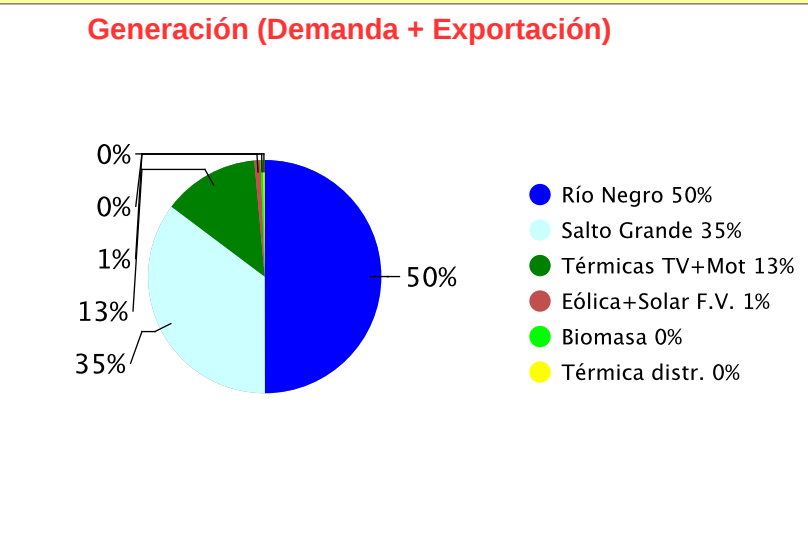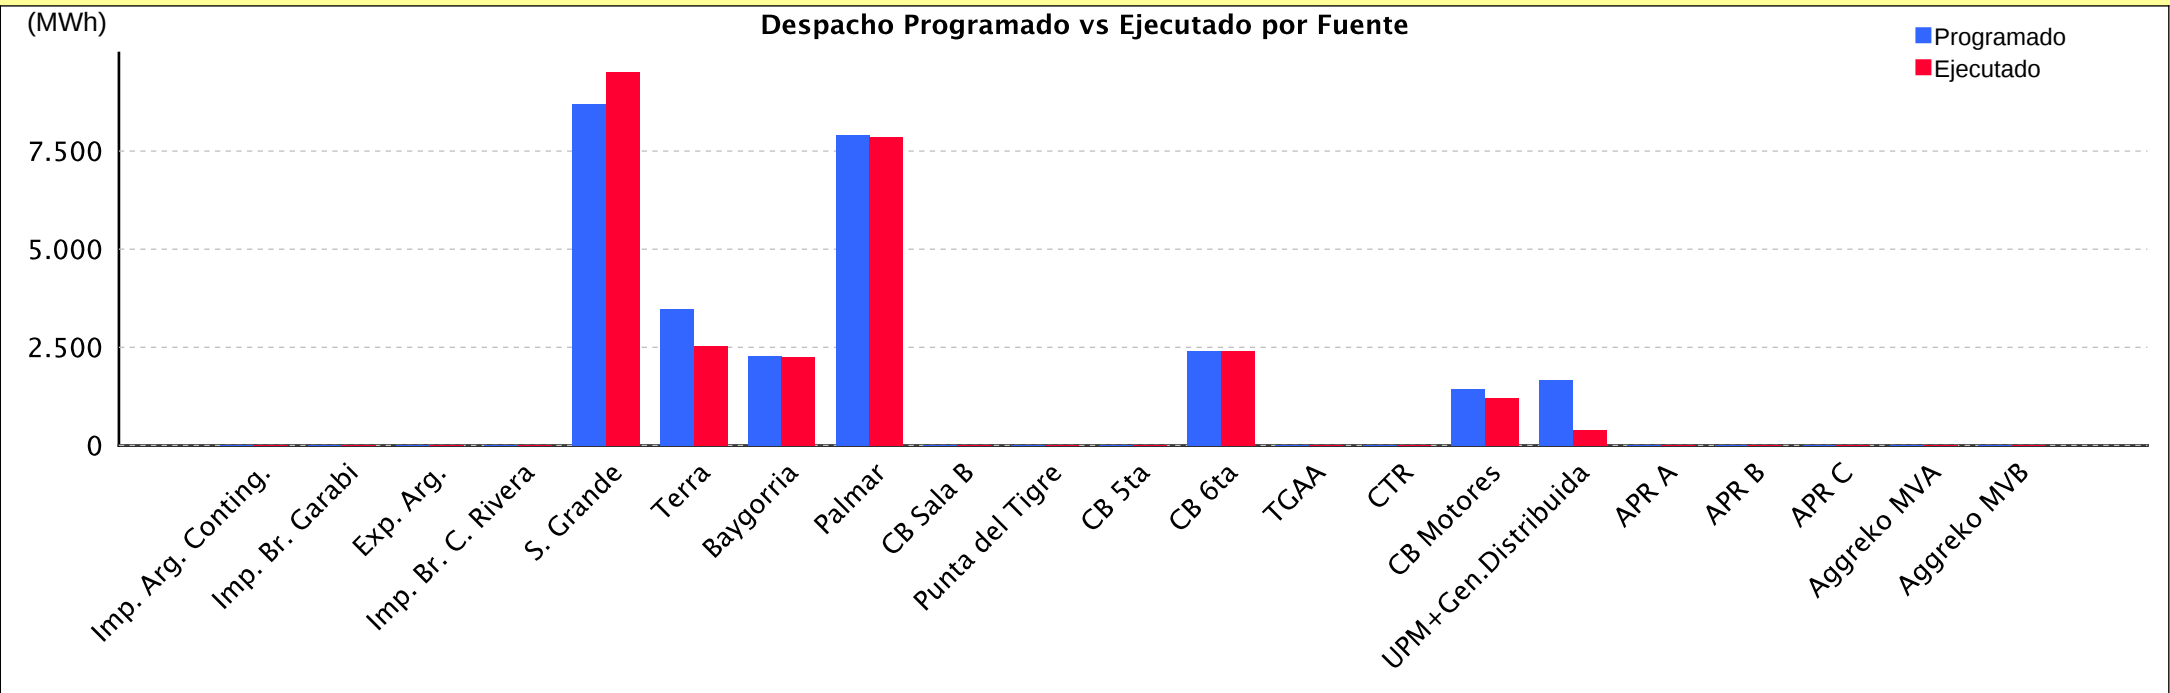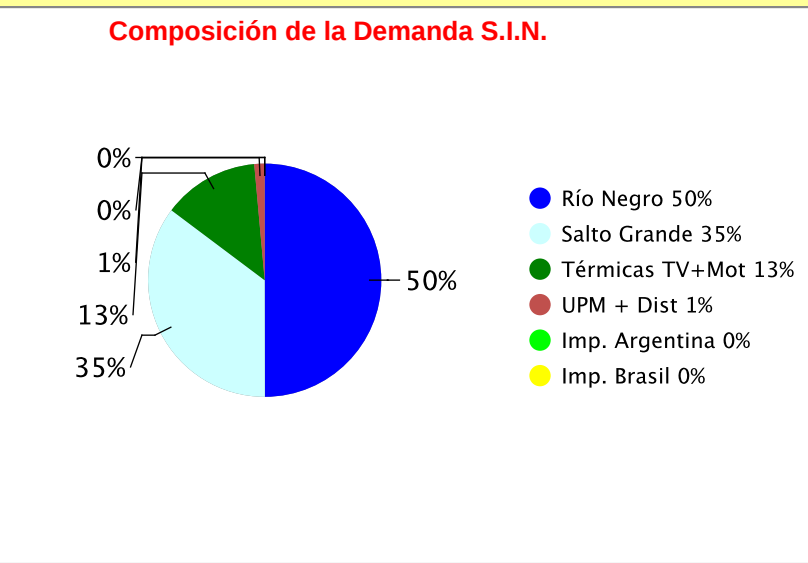



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

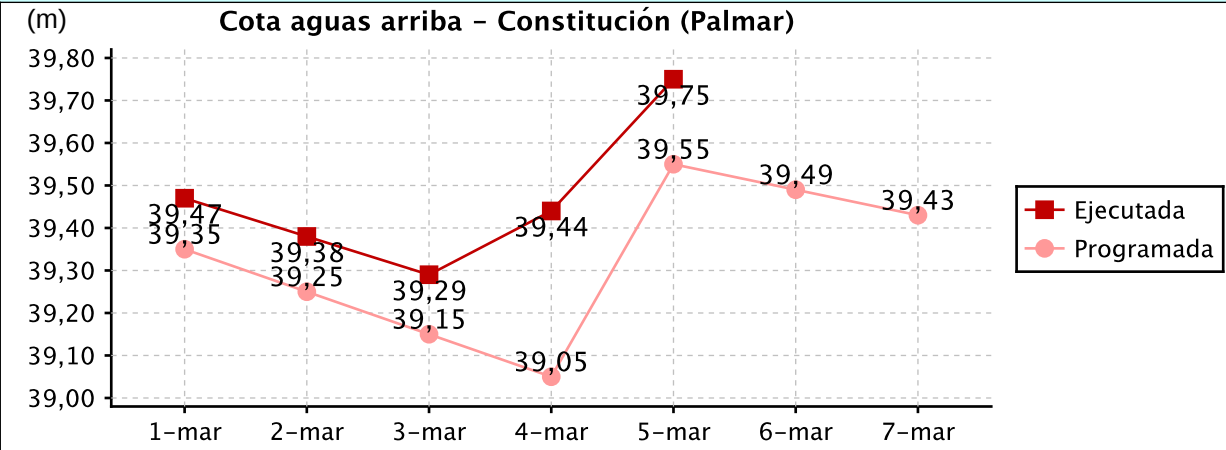
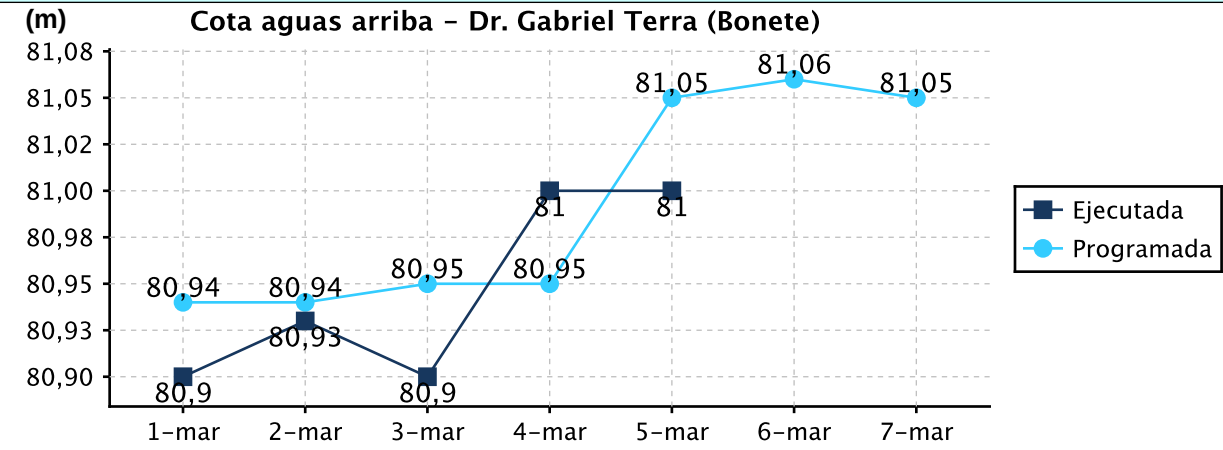


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,05	81
Baygorria	54,18	54,12
Palmar	39,55	39,75
SGU	33,28	33,08

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

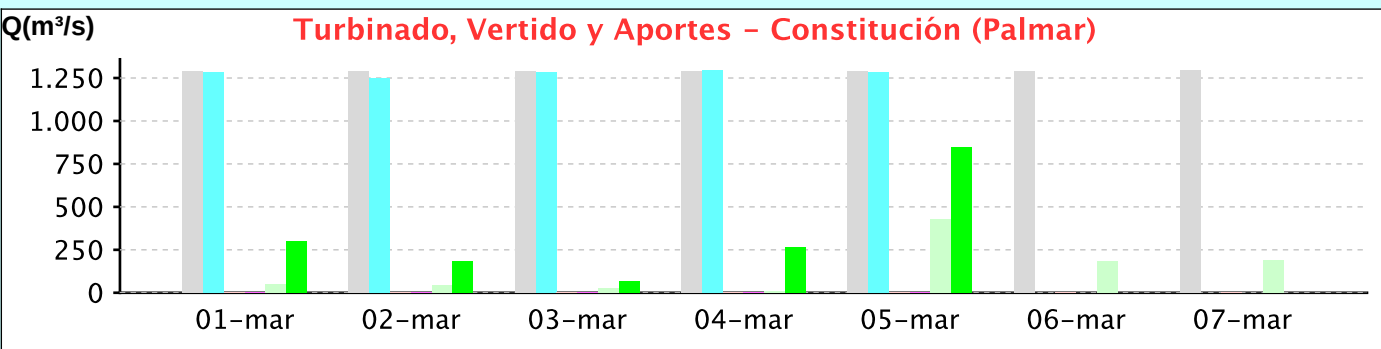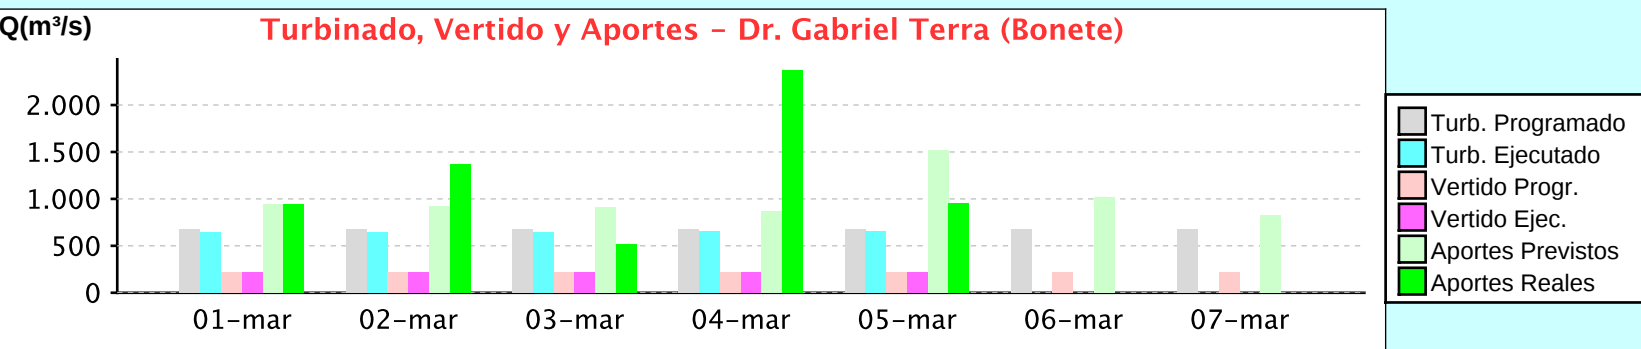

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

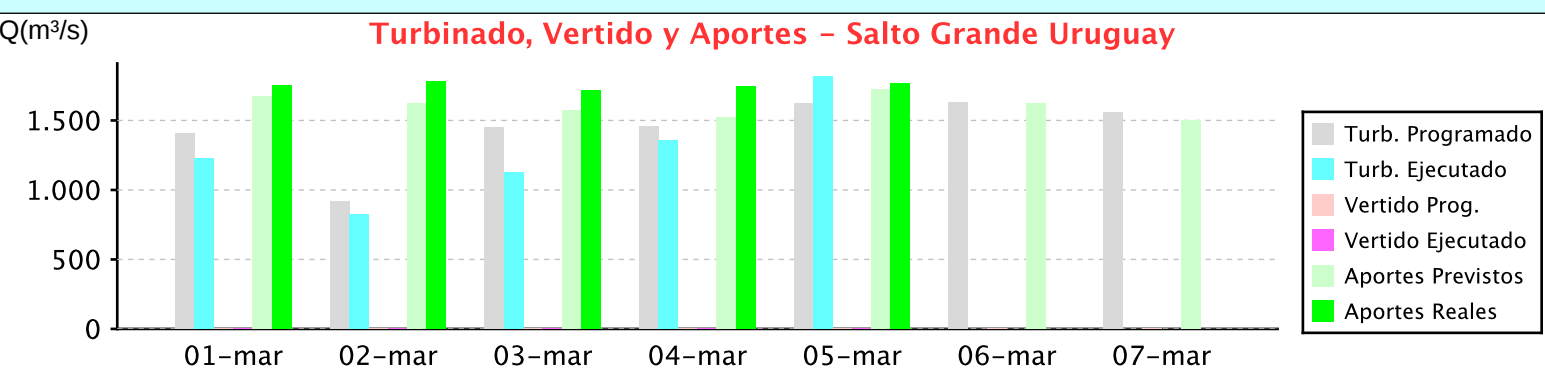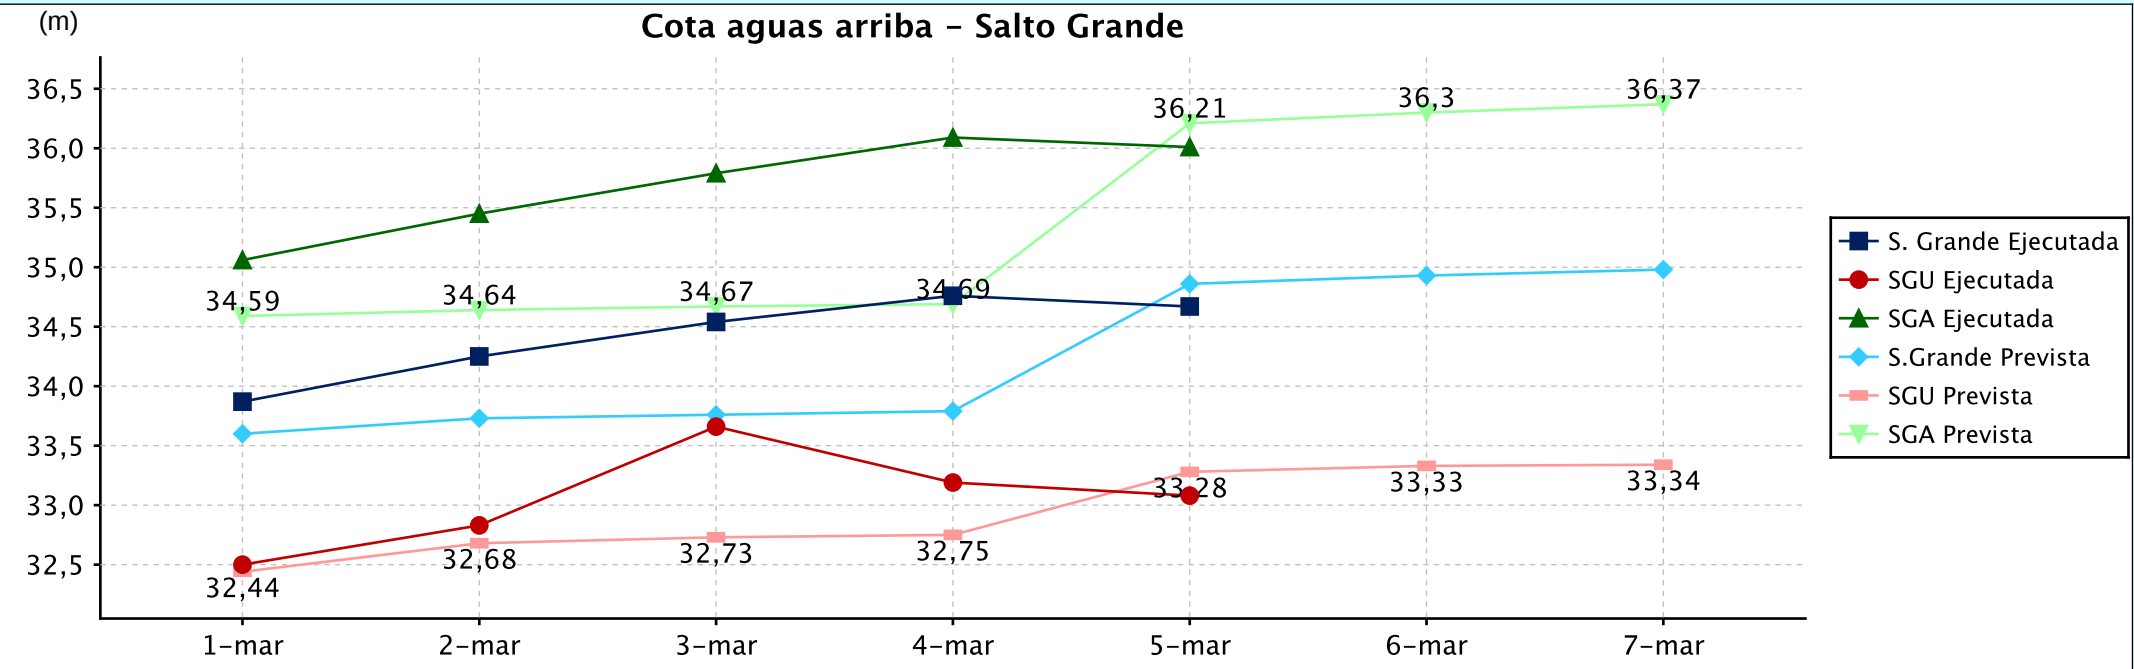

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,08
Cota Vista Arg	36,01
Cota real	34,67

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-65.021
------------------------------------	---------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	672	651
Baygorria	812	857
Palmar	1.289	1.282
SGU	1.622	1.819

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.518	949
Baygorria	270	572
Palmar	427	849
SGU	1.725	1.767

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	220
Baygorria	450	725
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
