



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 07 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.614
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.382
Motores	1.236
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.367
C. Baygorria	2.288
C. Palmar	7.870
C. Salto Grande	8.754
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.032
TOTAL Generación	26.869

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.869
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.490
Diferencia (MWh)	-621
Ejecutada - Programada	-2,26 %

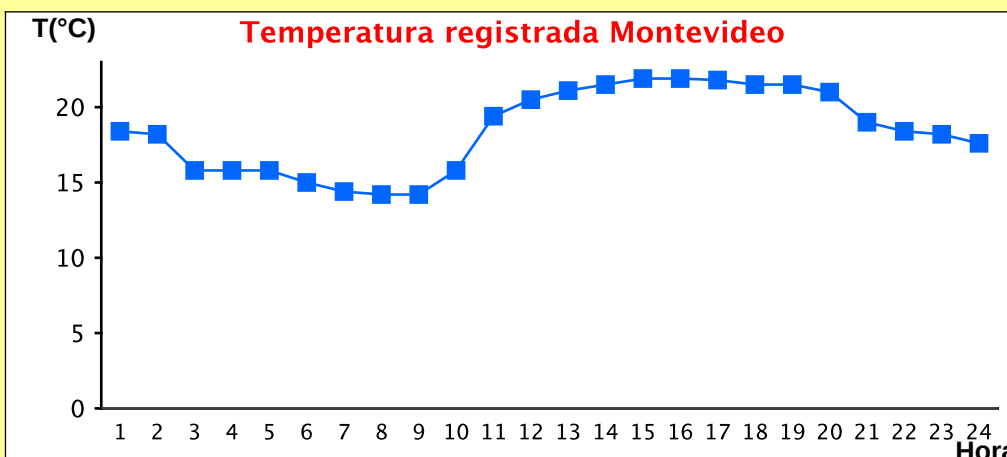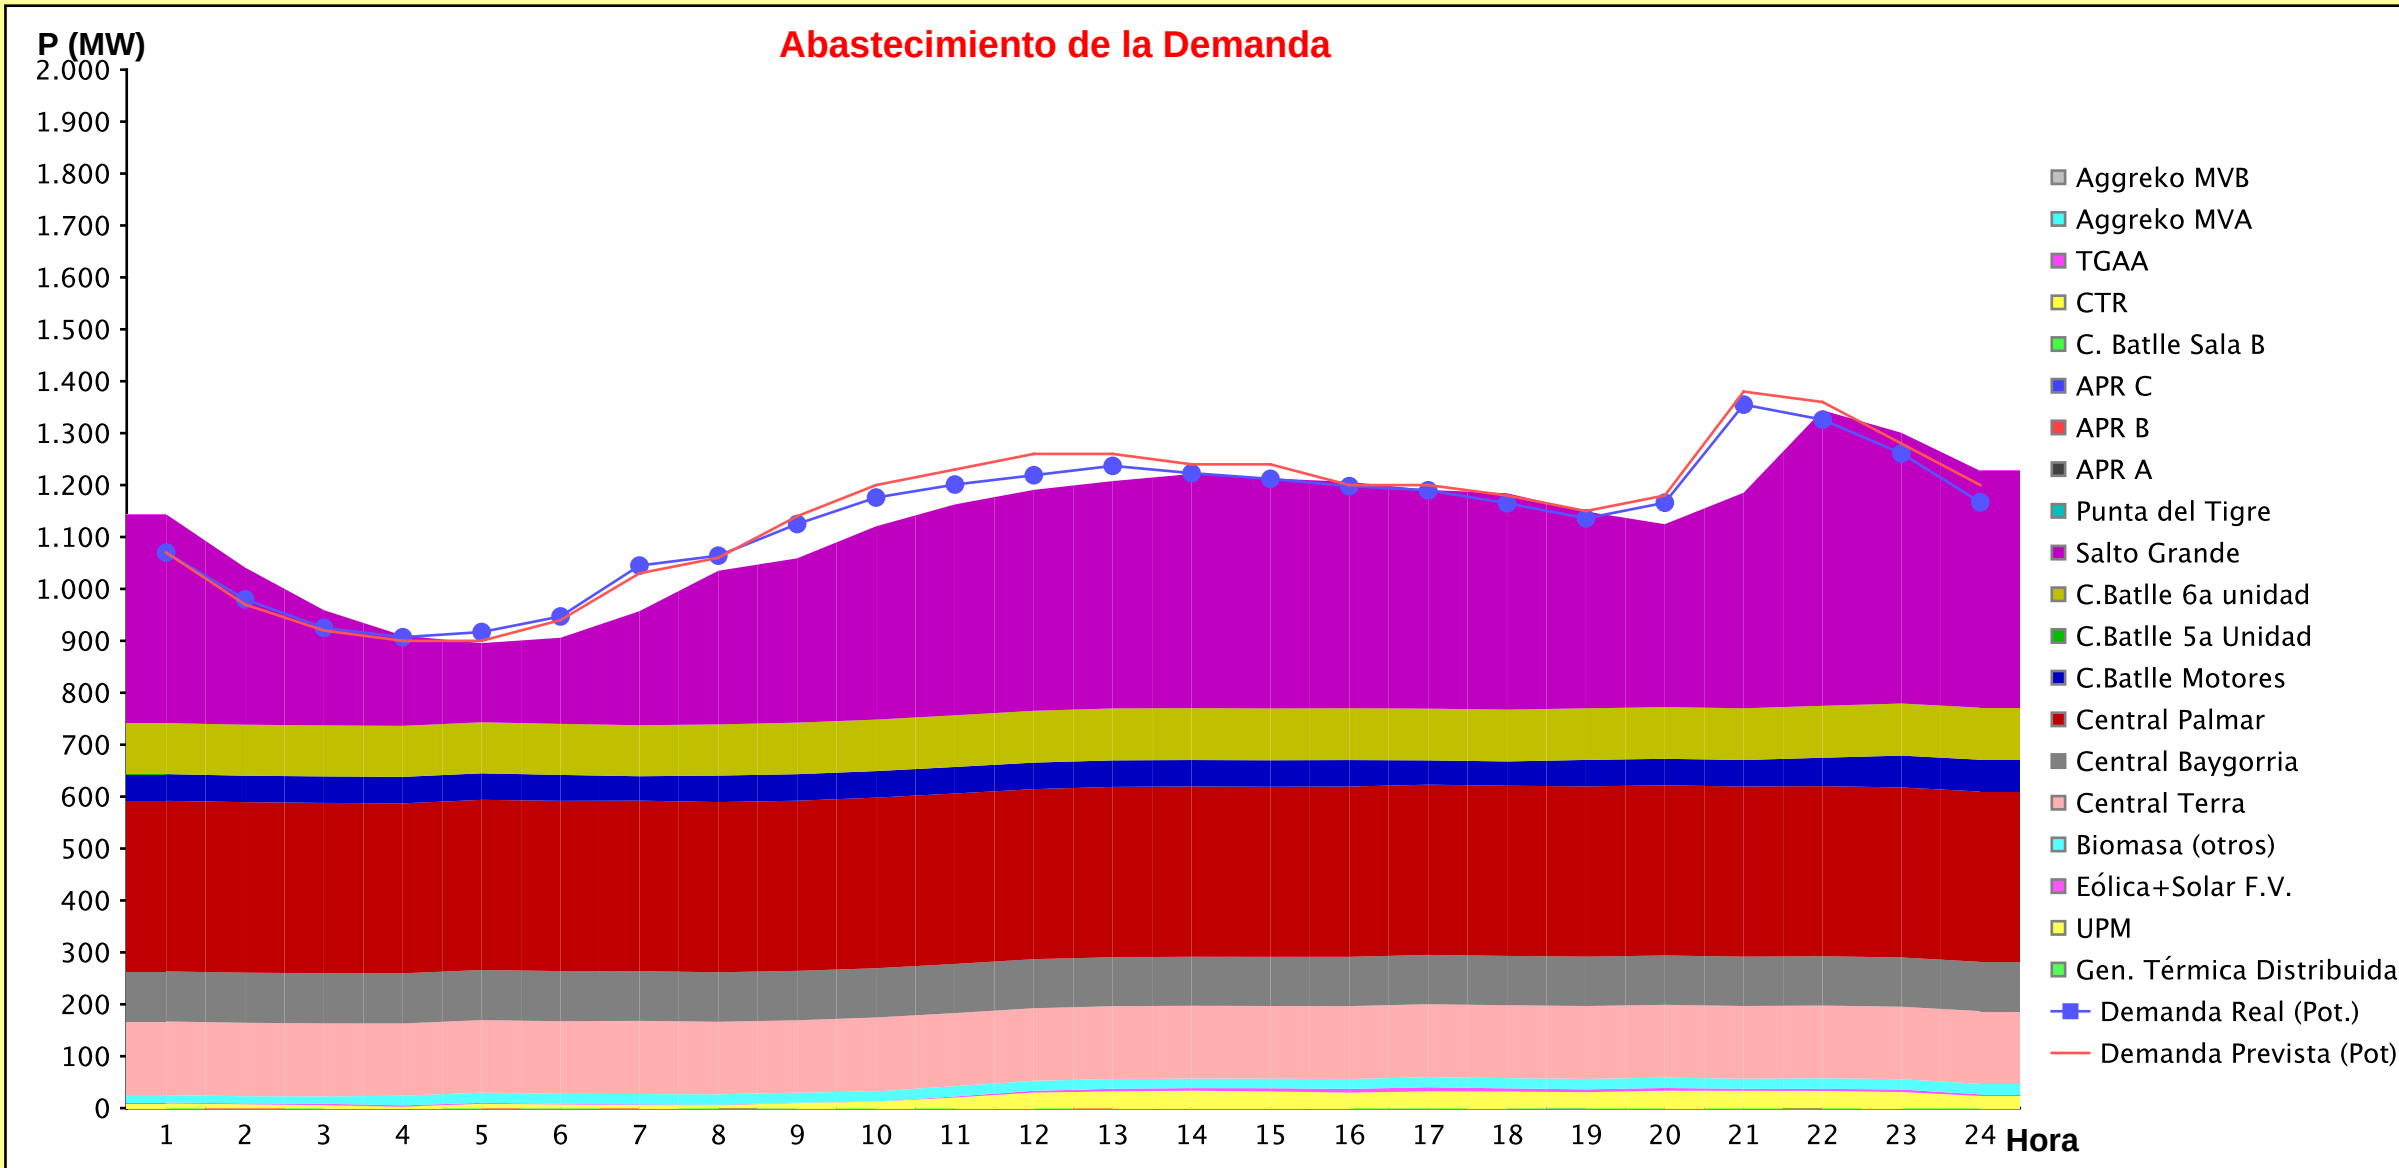



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1254,9 Hora 13:12
Potencia mínima:	895,73 Hora 04:16
Pico noche:	1373,44 Hora 21:25

Generación Media (MW)	
Eólica	4,0
Biomasa	46,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

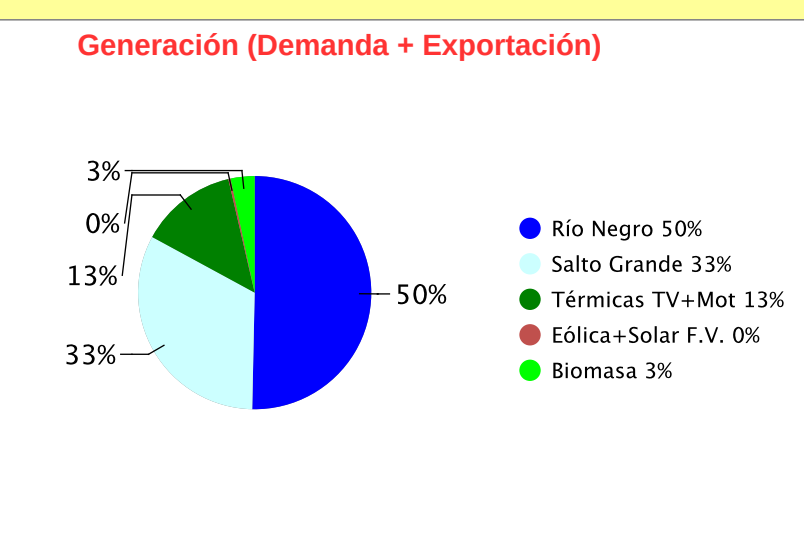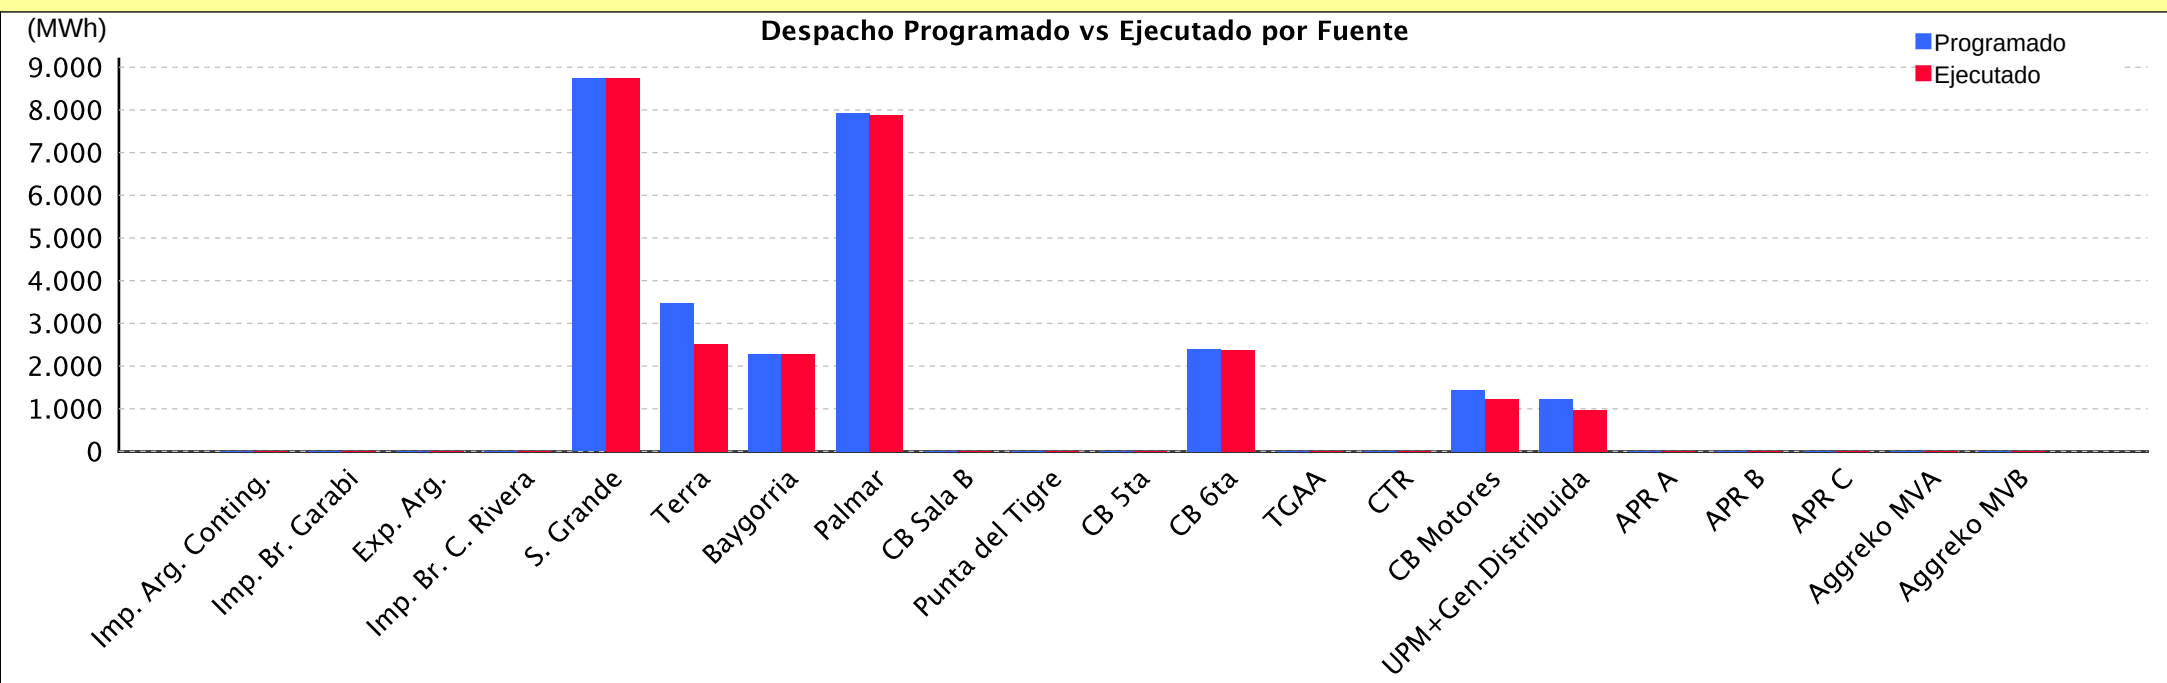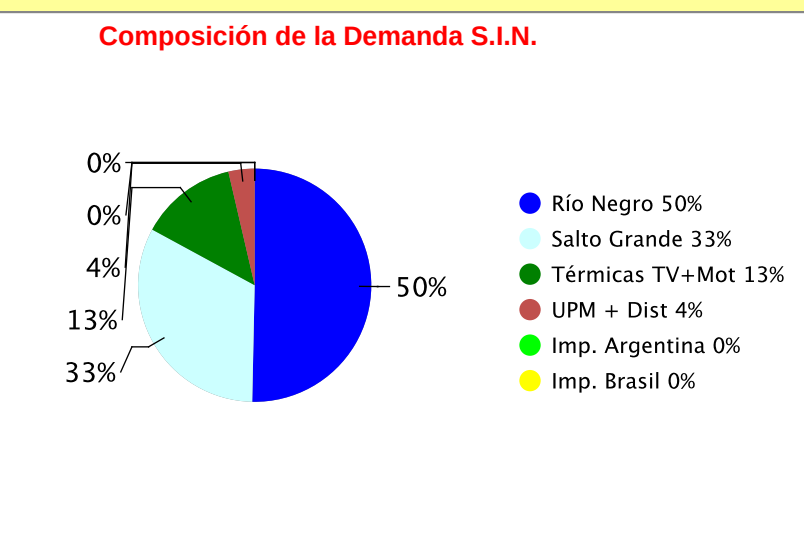



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

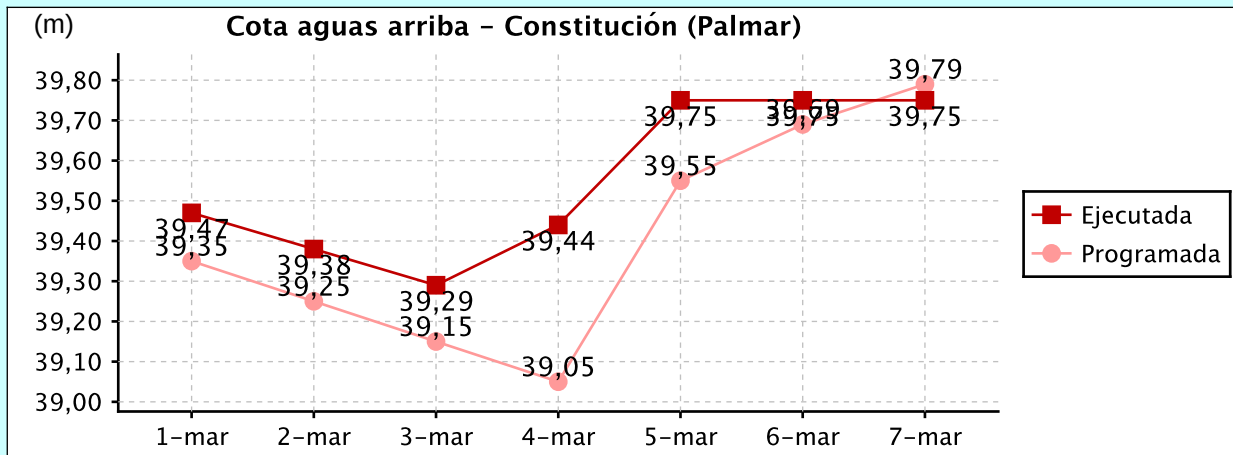
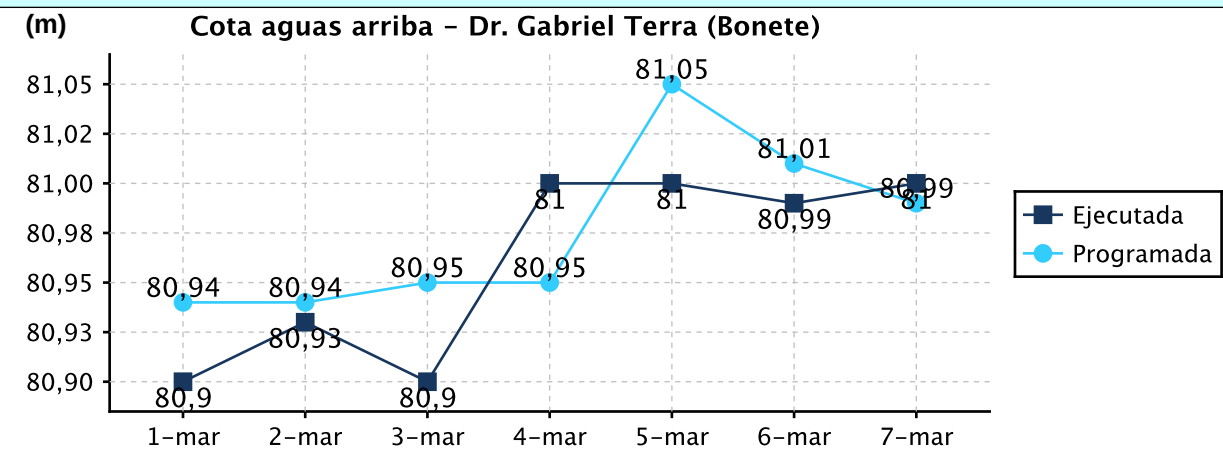


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,99	81
Baygorria	54,10	54,2
Palmar	39,79	39,75
SGU	33,06	33

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

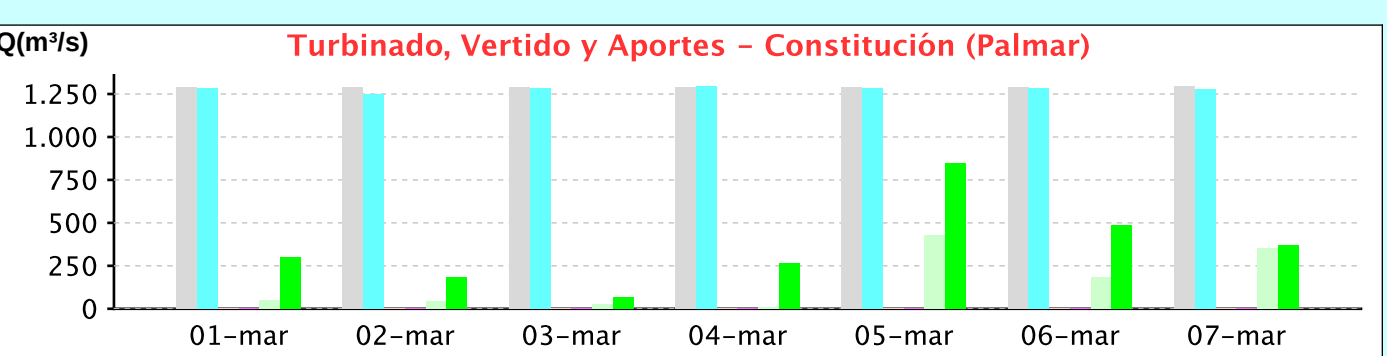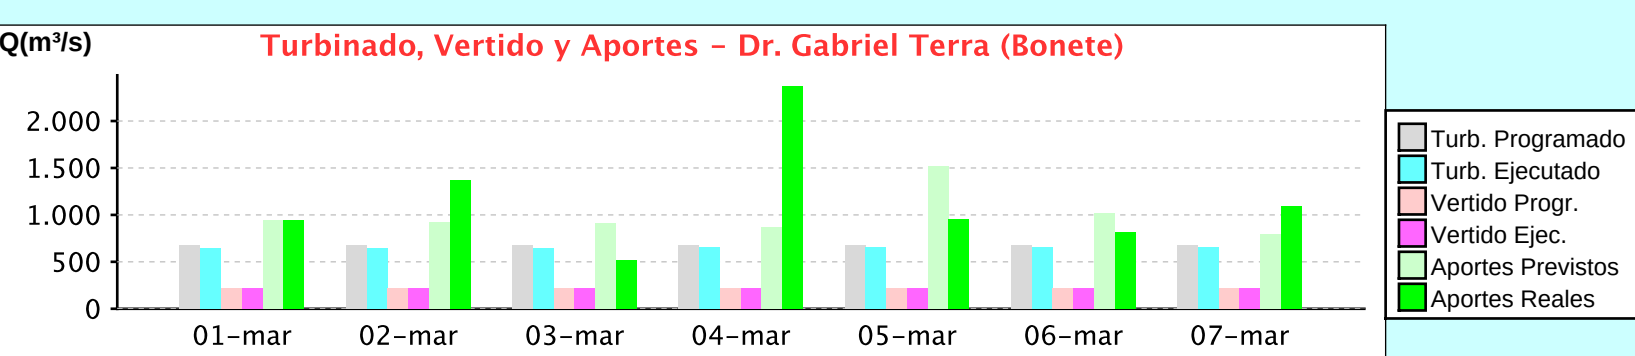

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

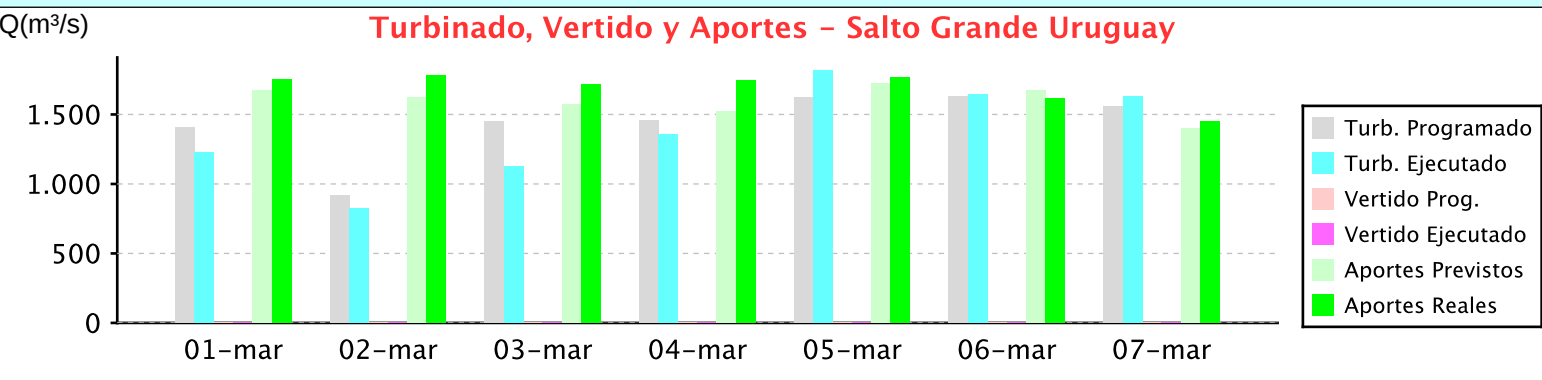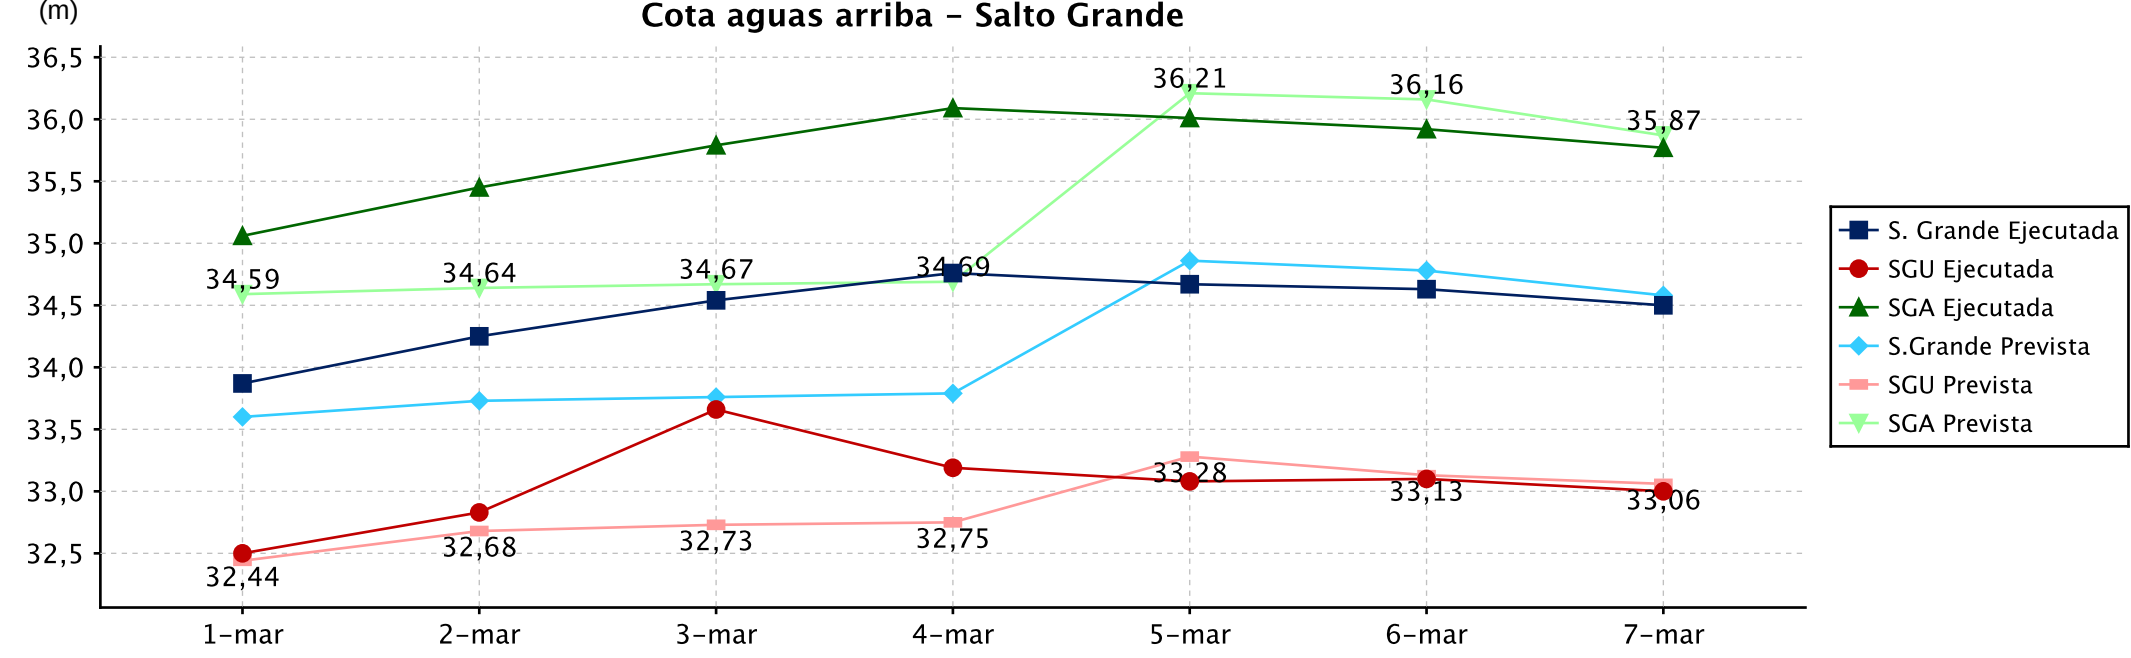

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,00
Cota Vista Arg	35,77
Cota real	34,50

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-60.297
------------------------------------	---------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	675	650
Baygorria	785	809
Palmar	1.293	1.280
SGU	1.561	1.627

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	797	1.088
Baygorria	37	34
Palmar	352	368
SGU	1.400	1.450

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	220
Baygorria	300	131
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
