



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 12 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.542
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.358
Motores	1.188
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.375
C. Baygorria	2.322
C. Palmar	7.851
C. Salto Grande	9.002
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.191
TOTAL Generación	27.227

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.227
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.140
Diferencia (MWh)	87
Ejecutada - Programada	0,32 %

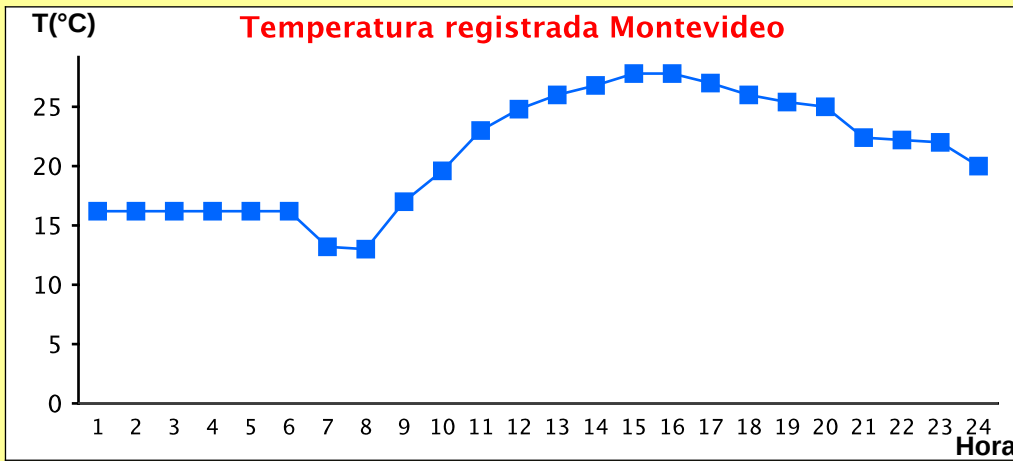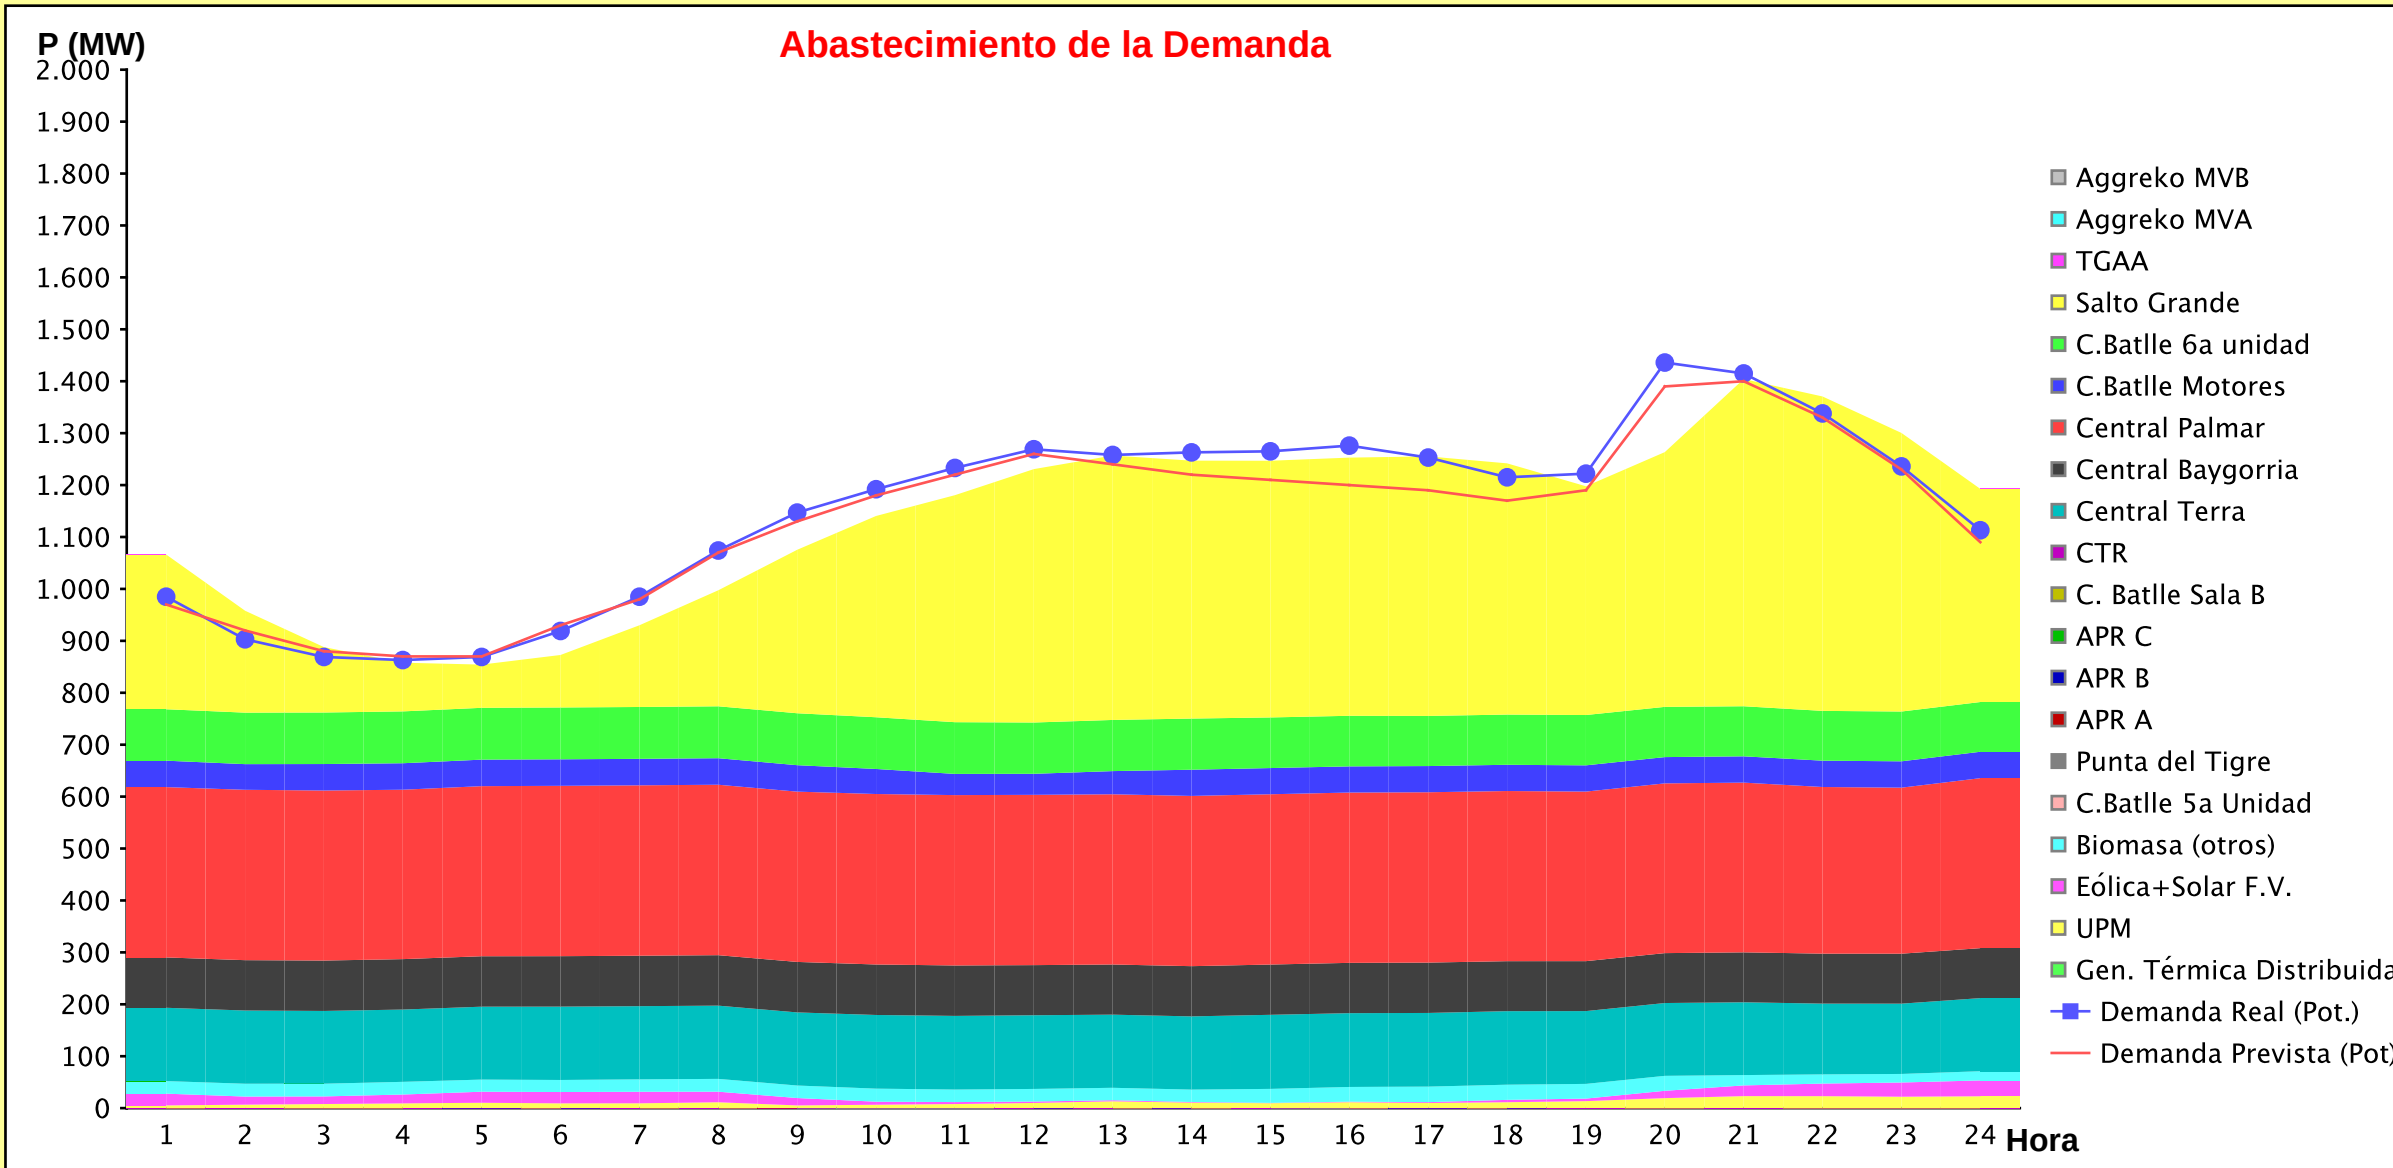



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1288,97 Hora 16:22
Potencia mínima:	861,44 Hora 04:03
Pico noche:	1480,59 Hora 20:39

Generación Media (MW)	
Eólica	13,2
Biomasa	42,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

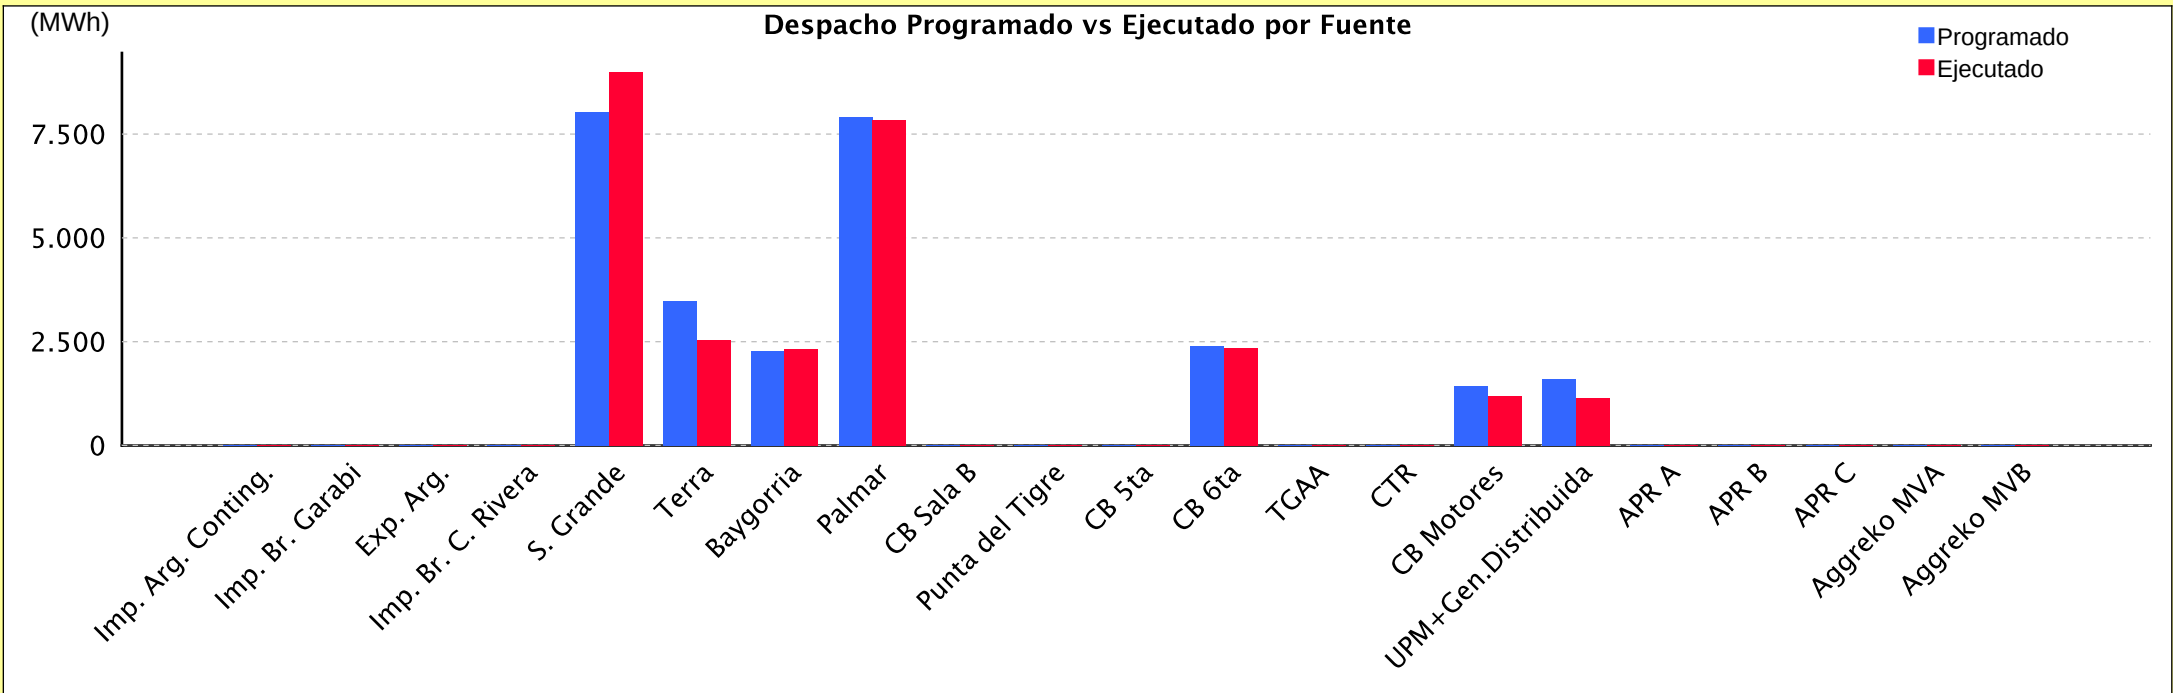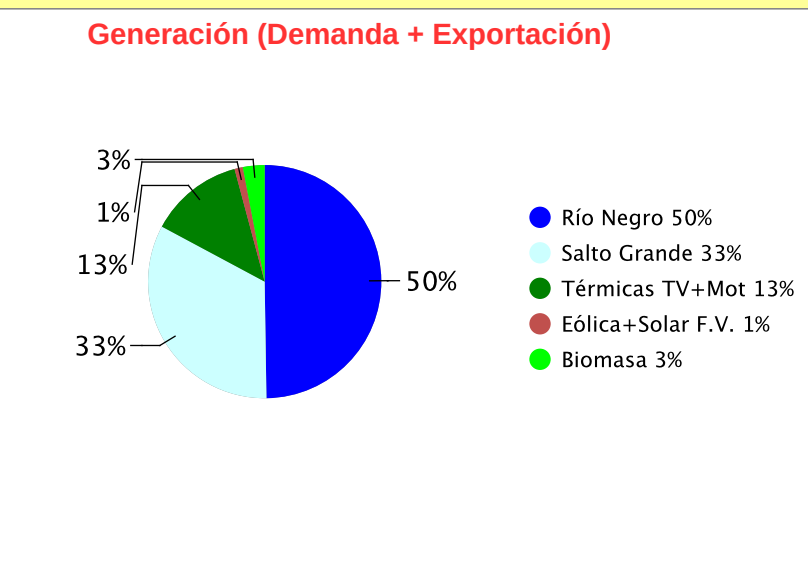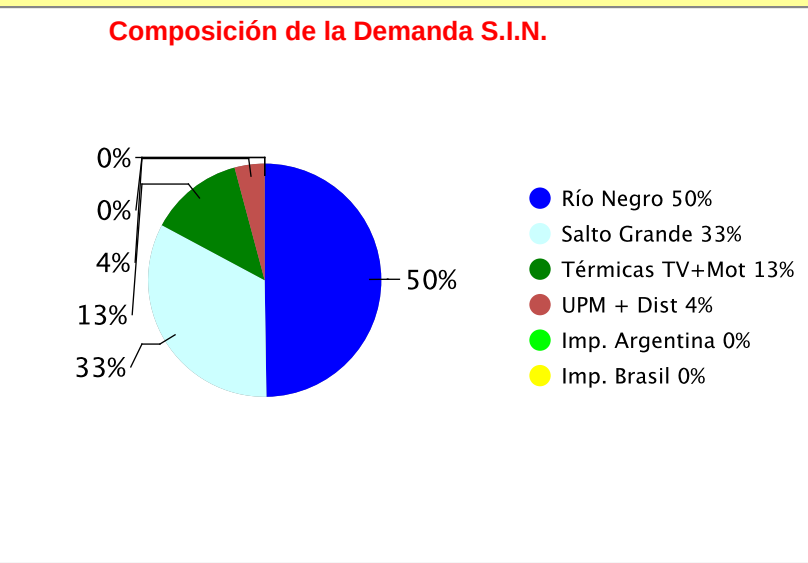



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

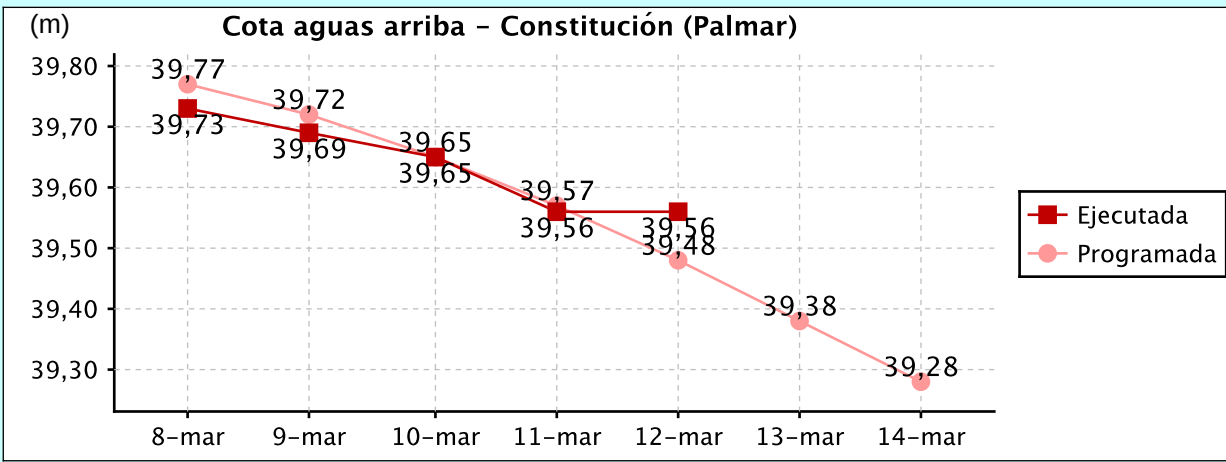
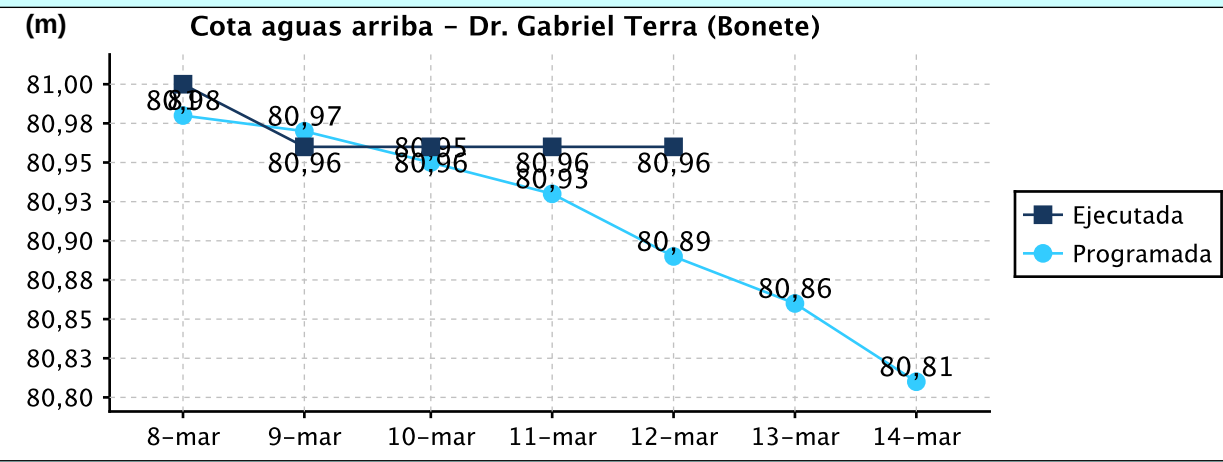


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,89	80,96
Baygorria	53,85	54,12
Palmar	39,48	39,56
SGU	32,81	32,79

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

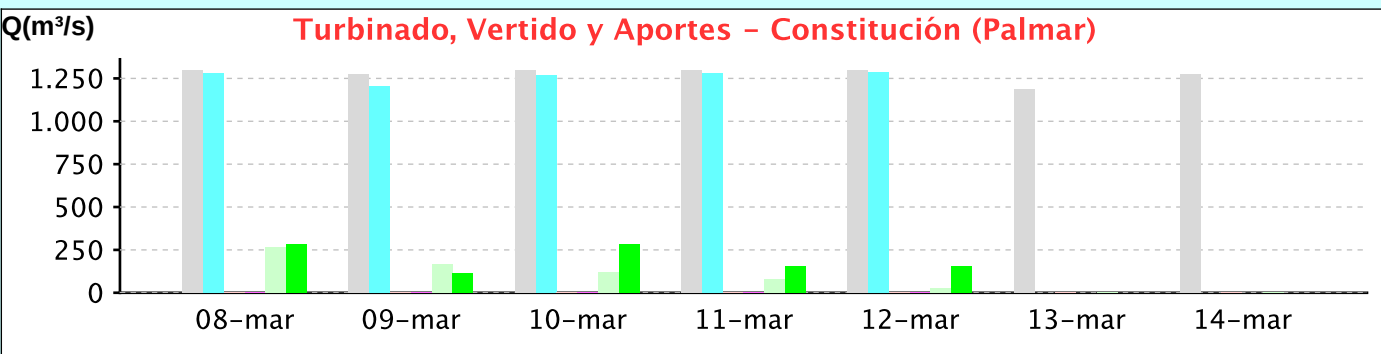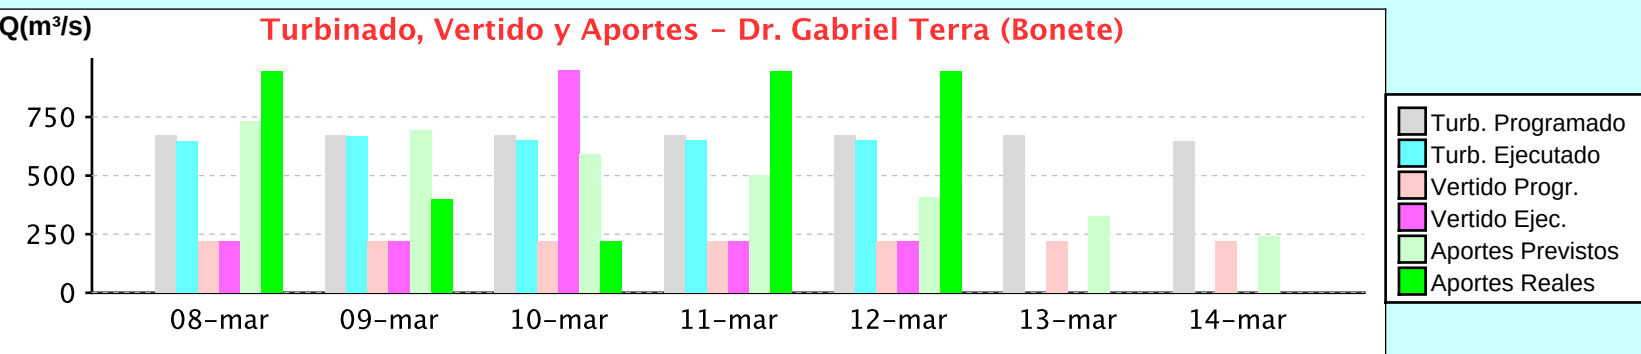

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

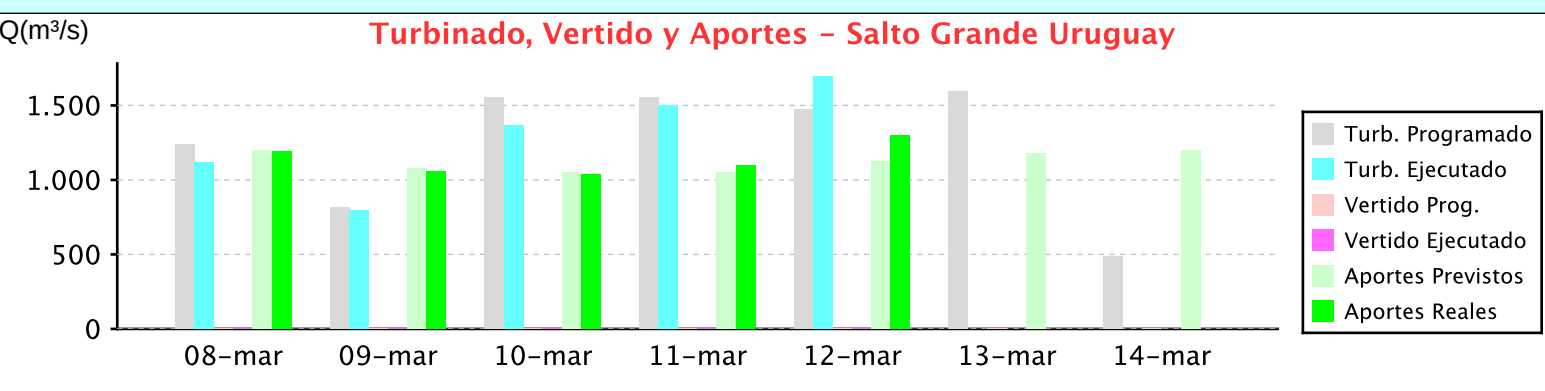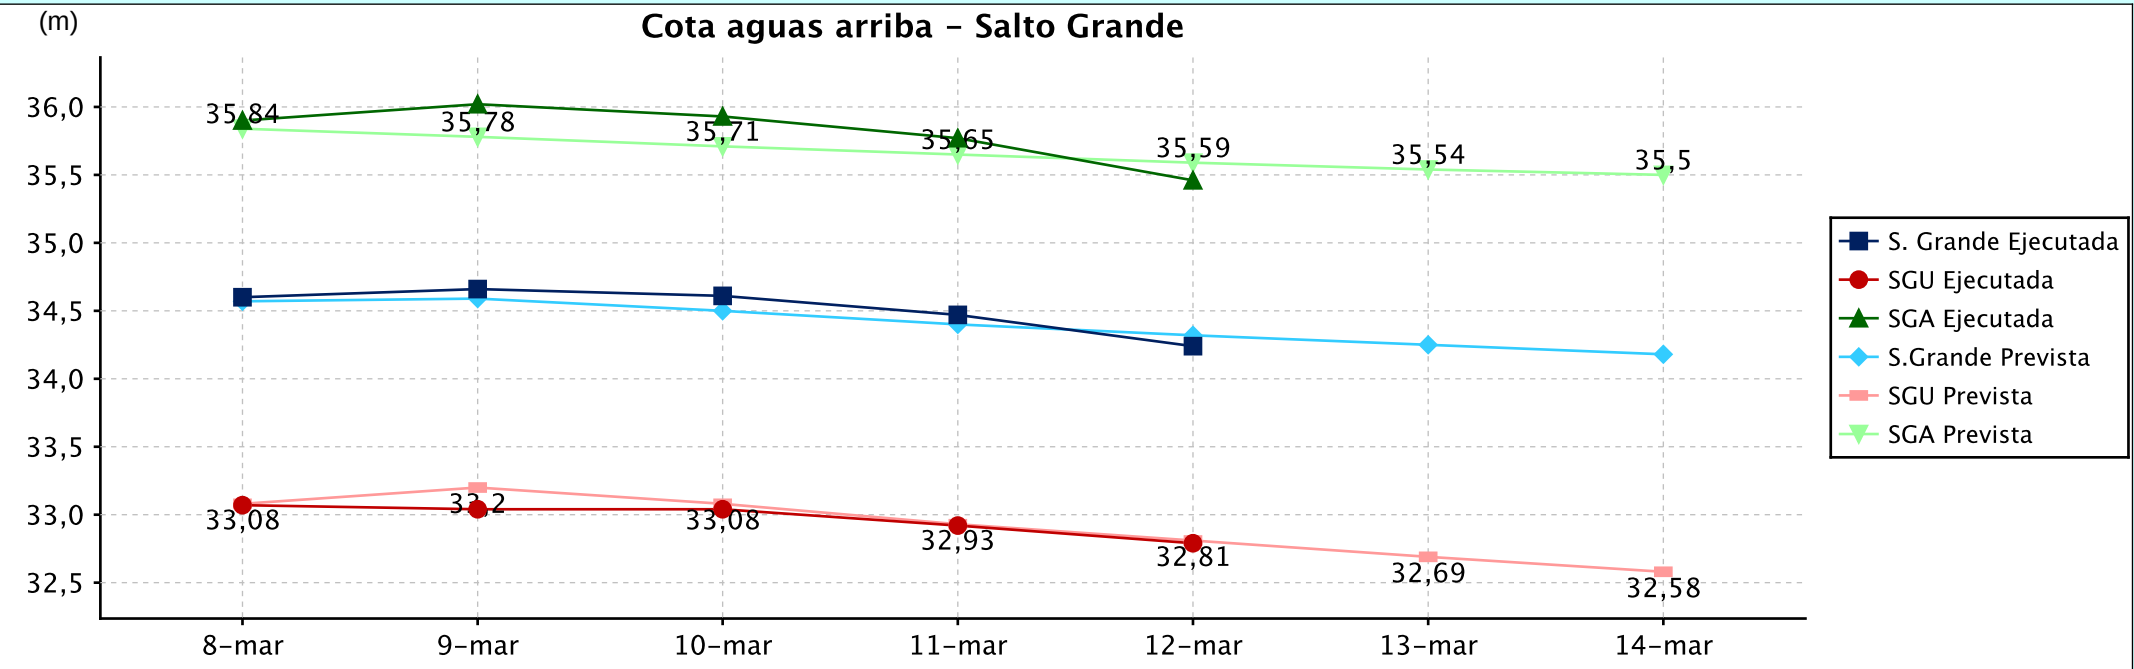

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,79
Cota Vista Arg	35,46
Cota real	34,24
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-56.152

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	671	650
Baygorria	802	810
Palmar	1.295	1.283
SGU	1.473	1.697

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	406	946
Baygorria	0	11
Palmar	28	152
SGU	1.125	1.298

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	218
Baygorria	130	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
