



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 14 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.705
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.271
Motores	1.438
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.367
C. Baygorria	2.252
C. Palmar	7.868
C. Salto Grande	8.571
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.763
TOTAL Generación	27.472

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.472
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.820
Diferencia (MWh)	-348
Ejecutada - Programada	-1,25 %

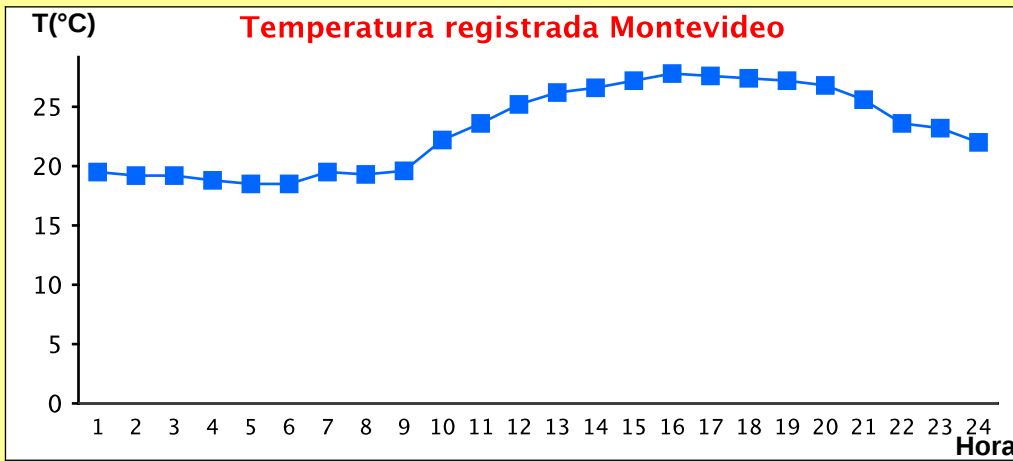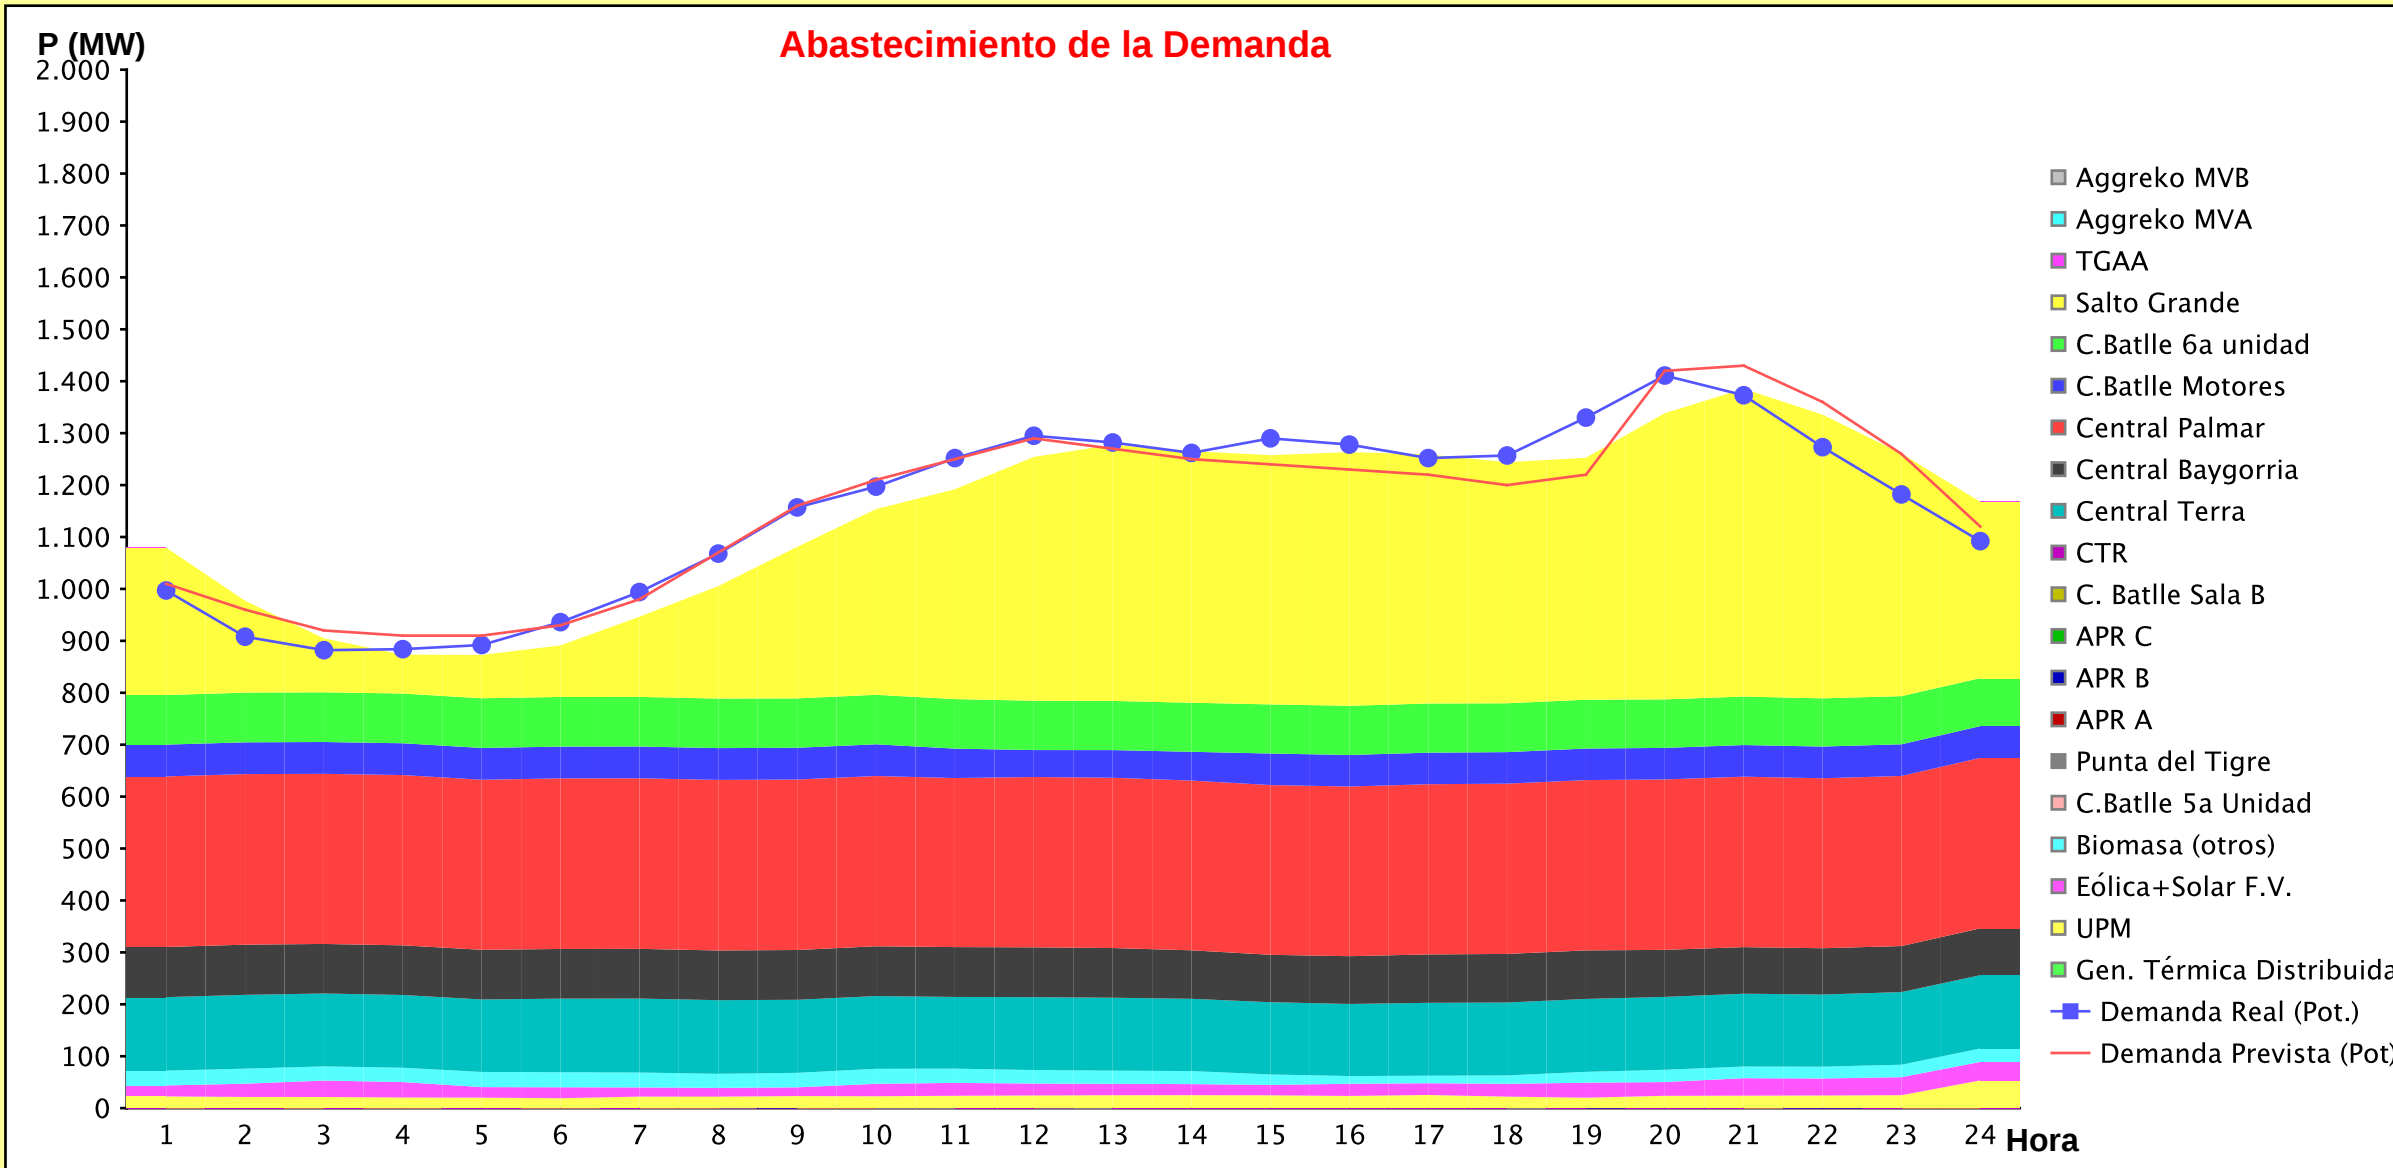



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1377 Hora 15:21
Potencia mínima:	882 Hora 03:44
Pico noche:	1458 Hora 19:56

Generación Media (MW)	
Eólica	24,9
Biomasa	55,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

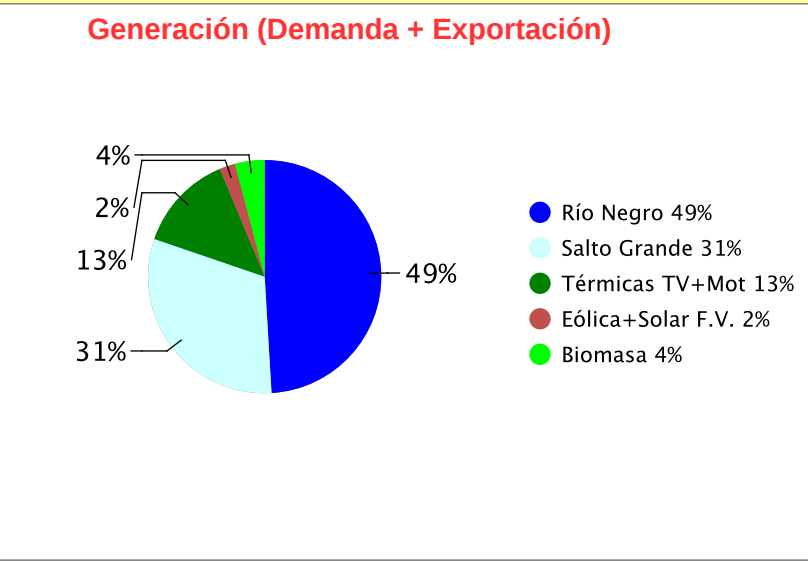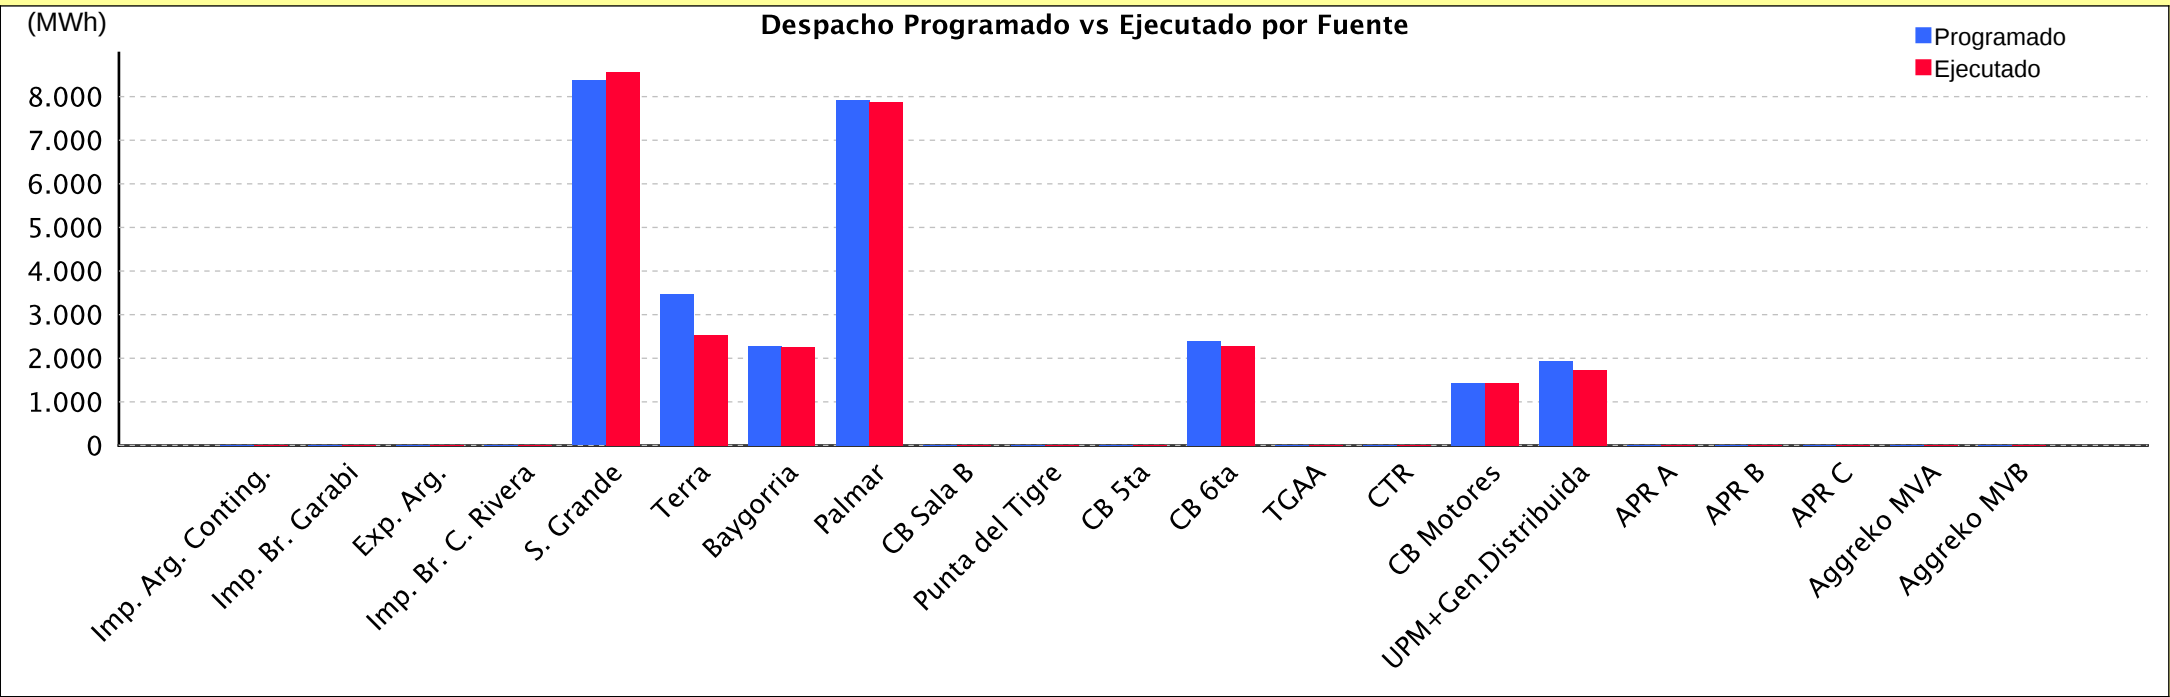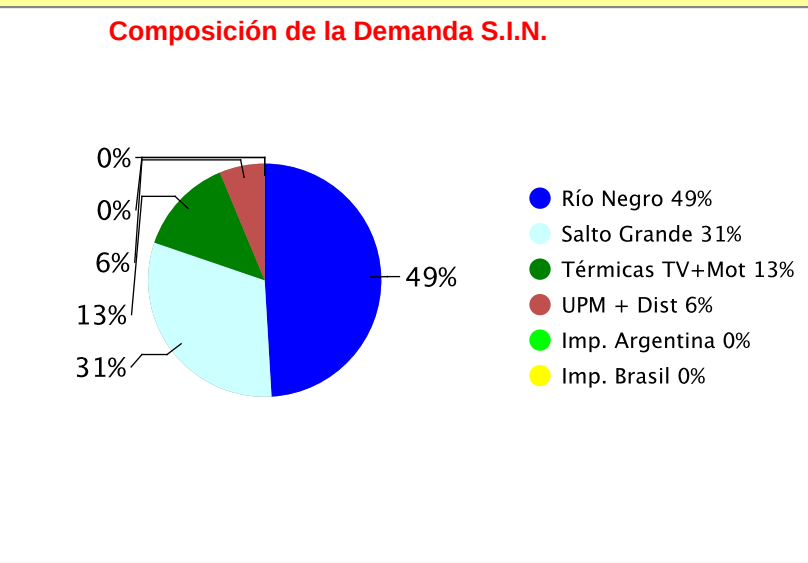



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

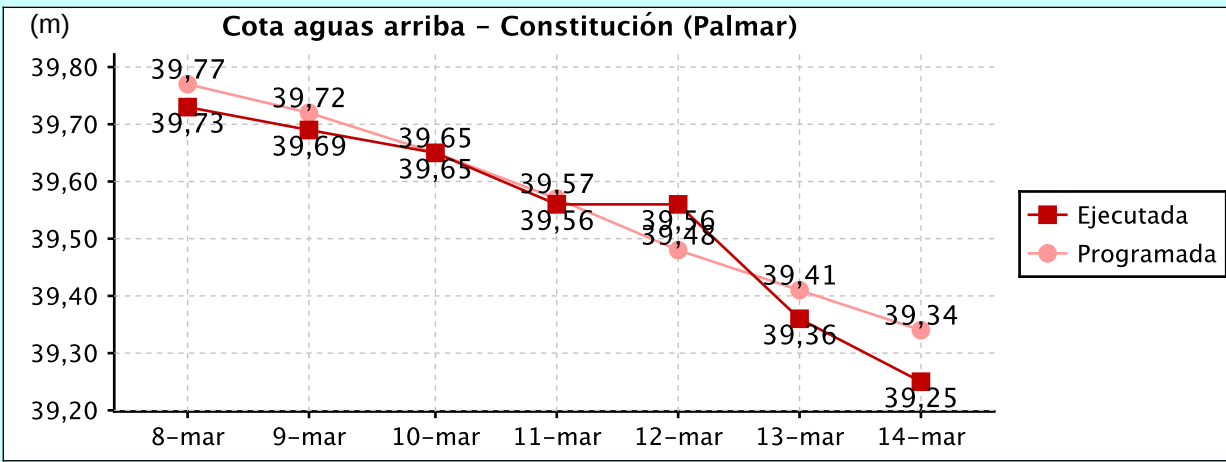
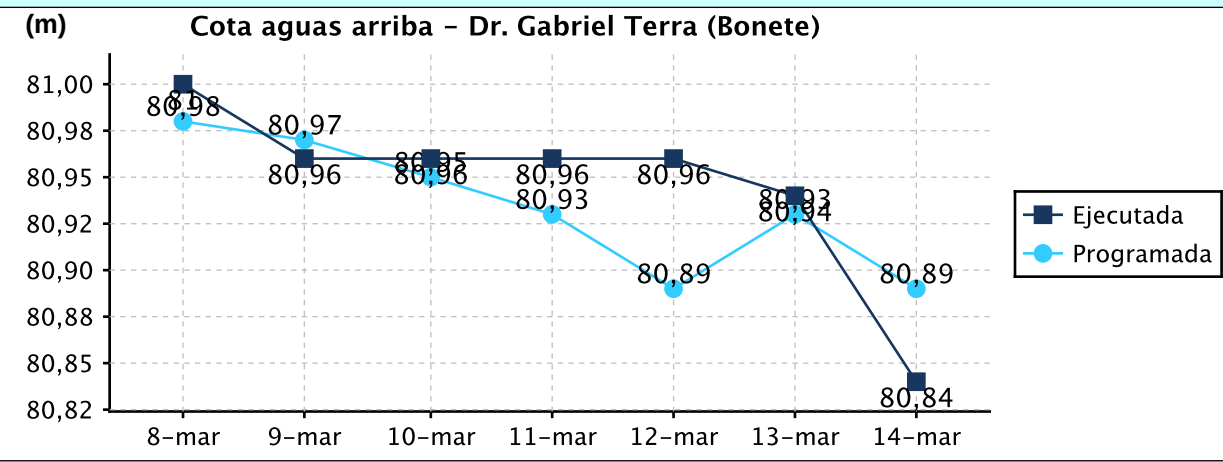


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,89	80,84
Baygorria	54,12	54,07
Palmar	39,34	39,25
SGU	32,69	32,46

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

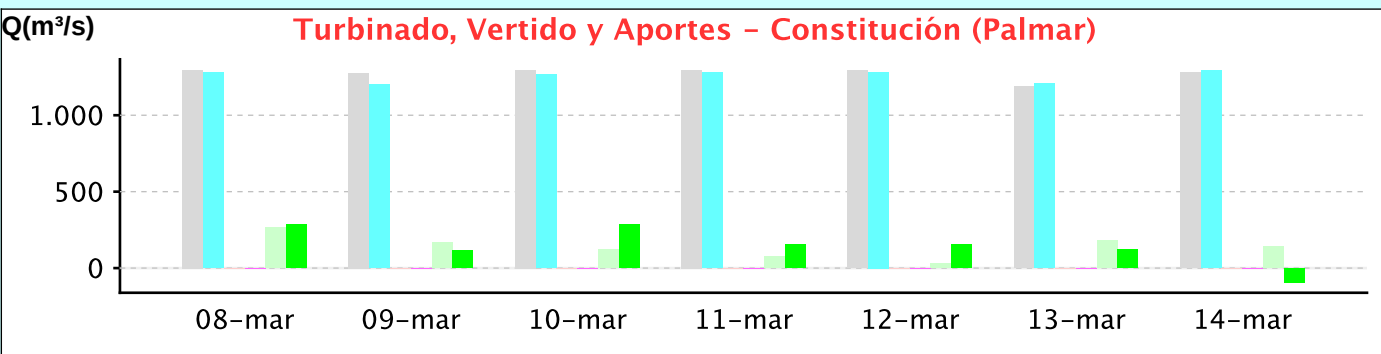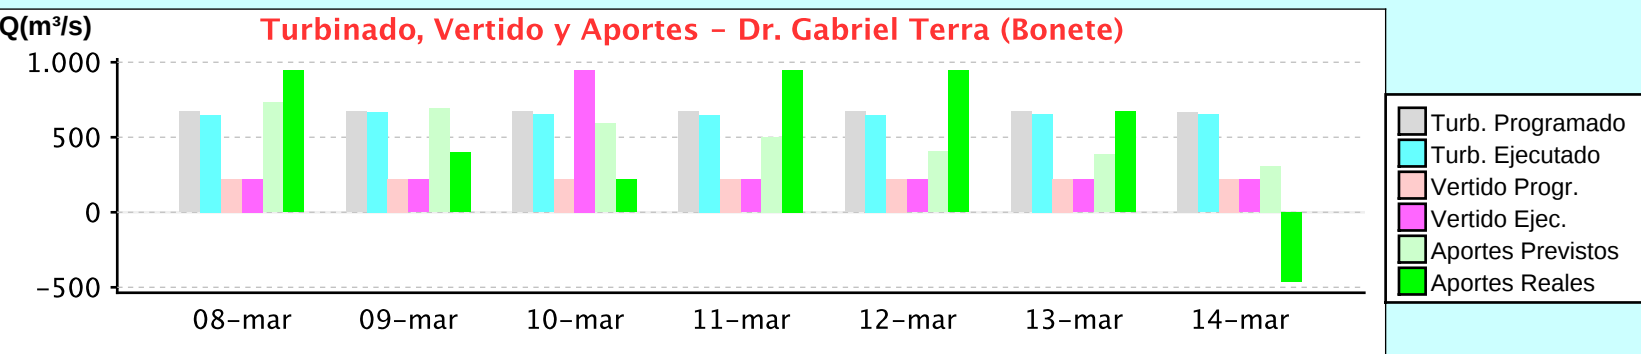

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

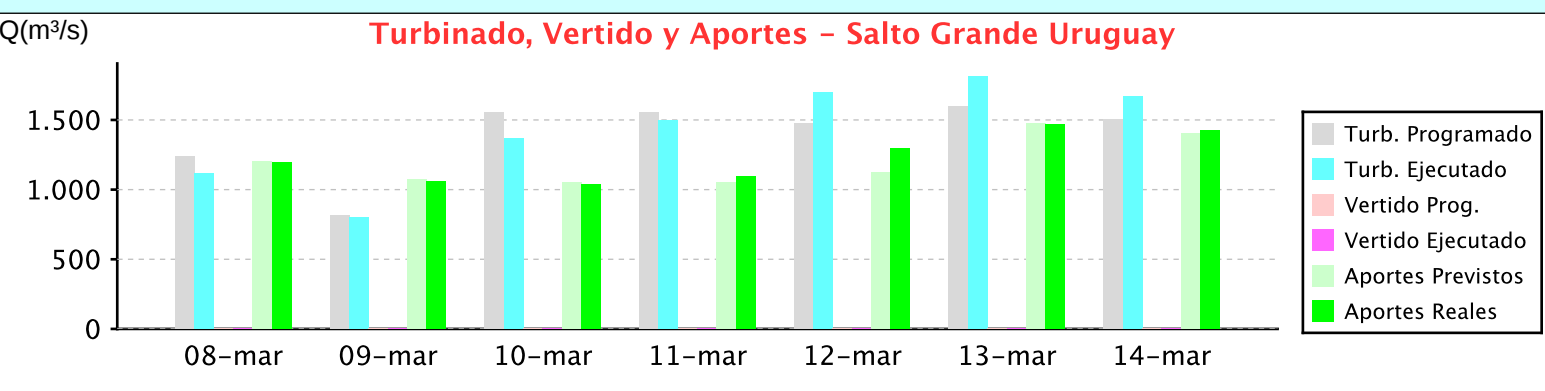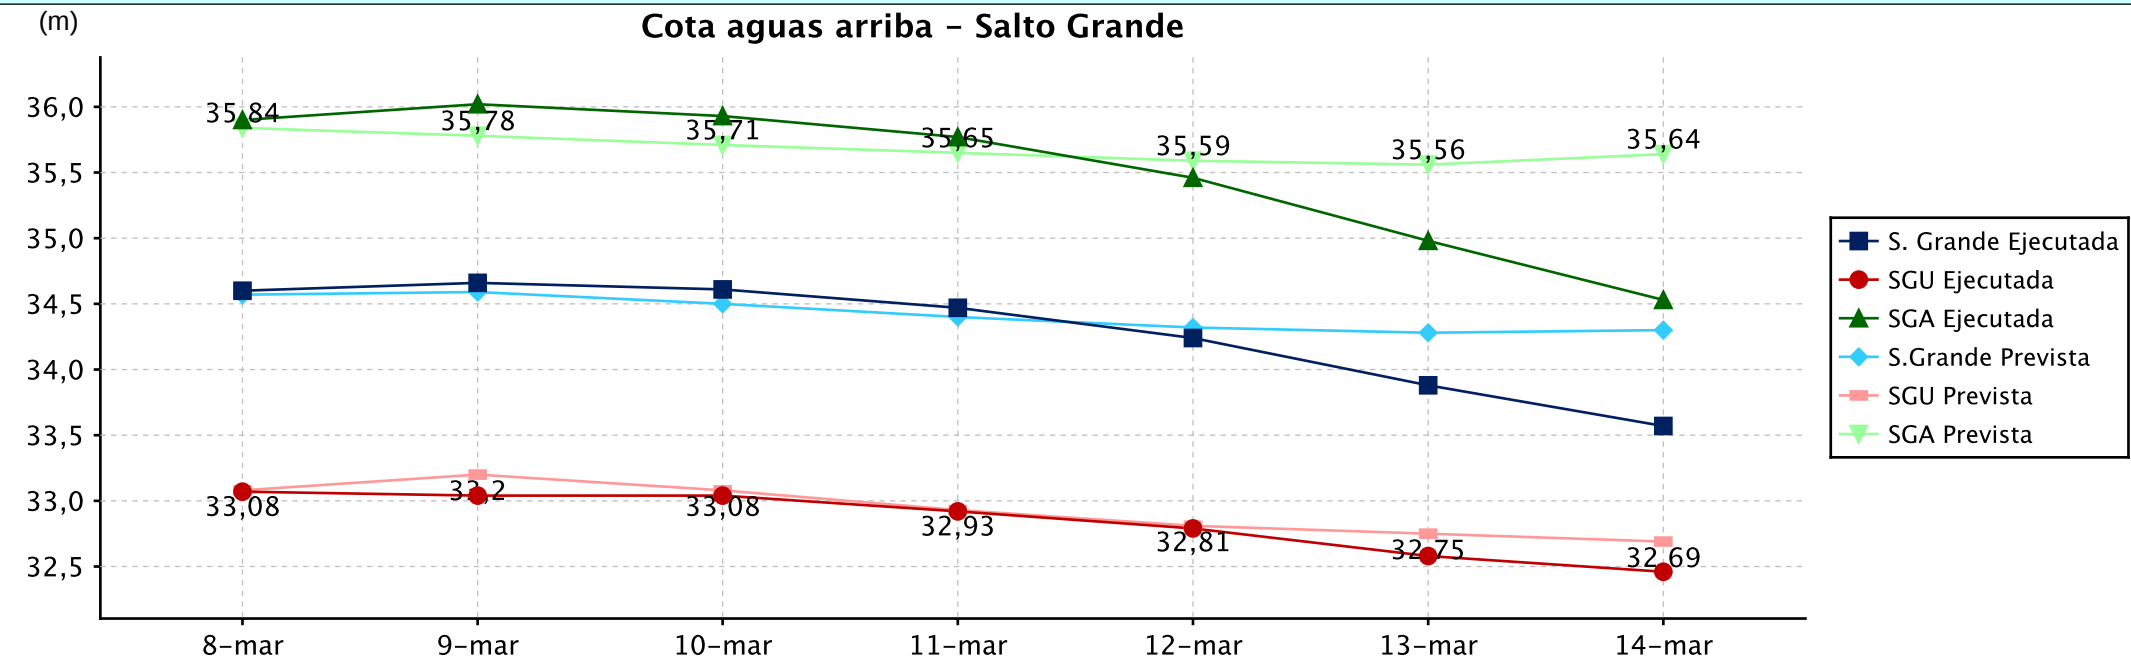

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,46
Cota Vista Arg	34,53
Cota real	33,57
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-39.825

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	651
Baygorria	772	781
Palmar	1.278	1.295
SGU	1.504	1.665

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	307	-466
Baygorria	0	12
Palmar	139	-92
SGU	1.400	1.422

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	217
Baygorria	130	273
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
