




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 19 de marzo de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	48
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	52
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.777
C. Baygorria	2.163
C. Palmar	7.878
C. Salto Grande	12.140
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.131
TOTAL Generación	26.081

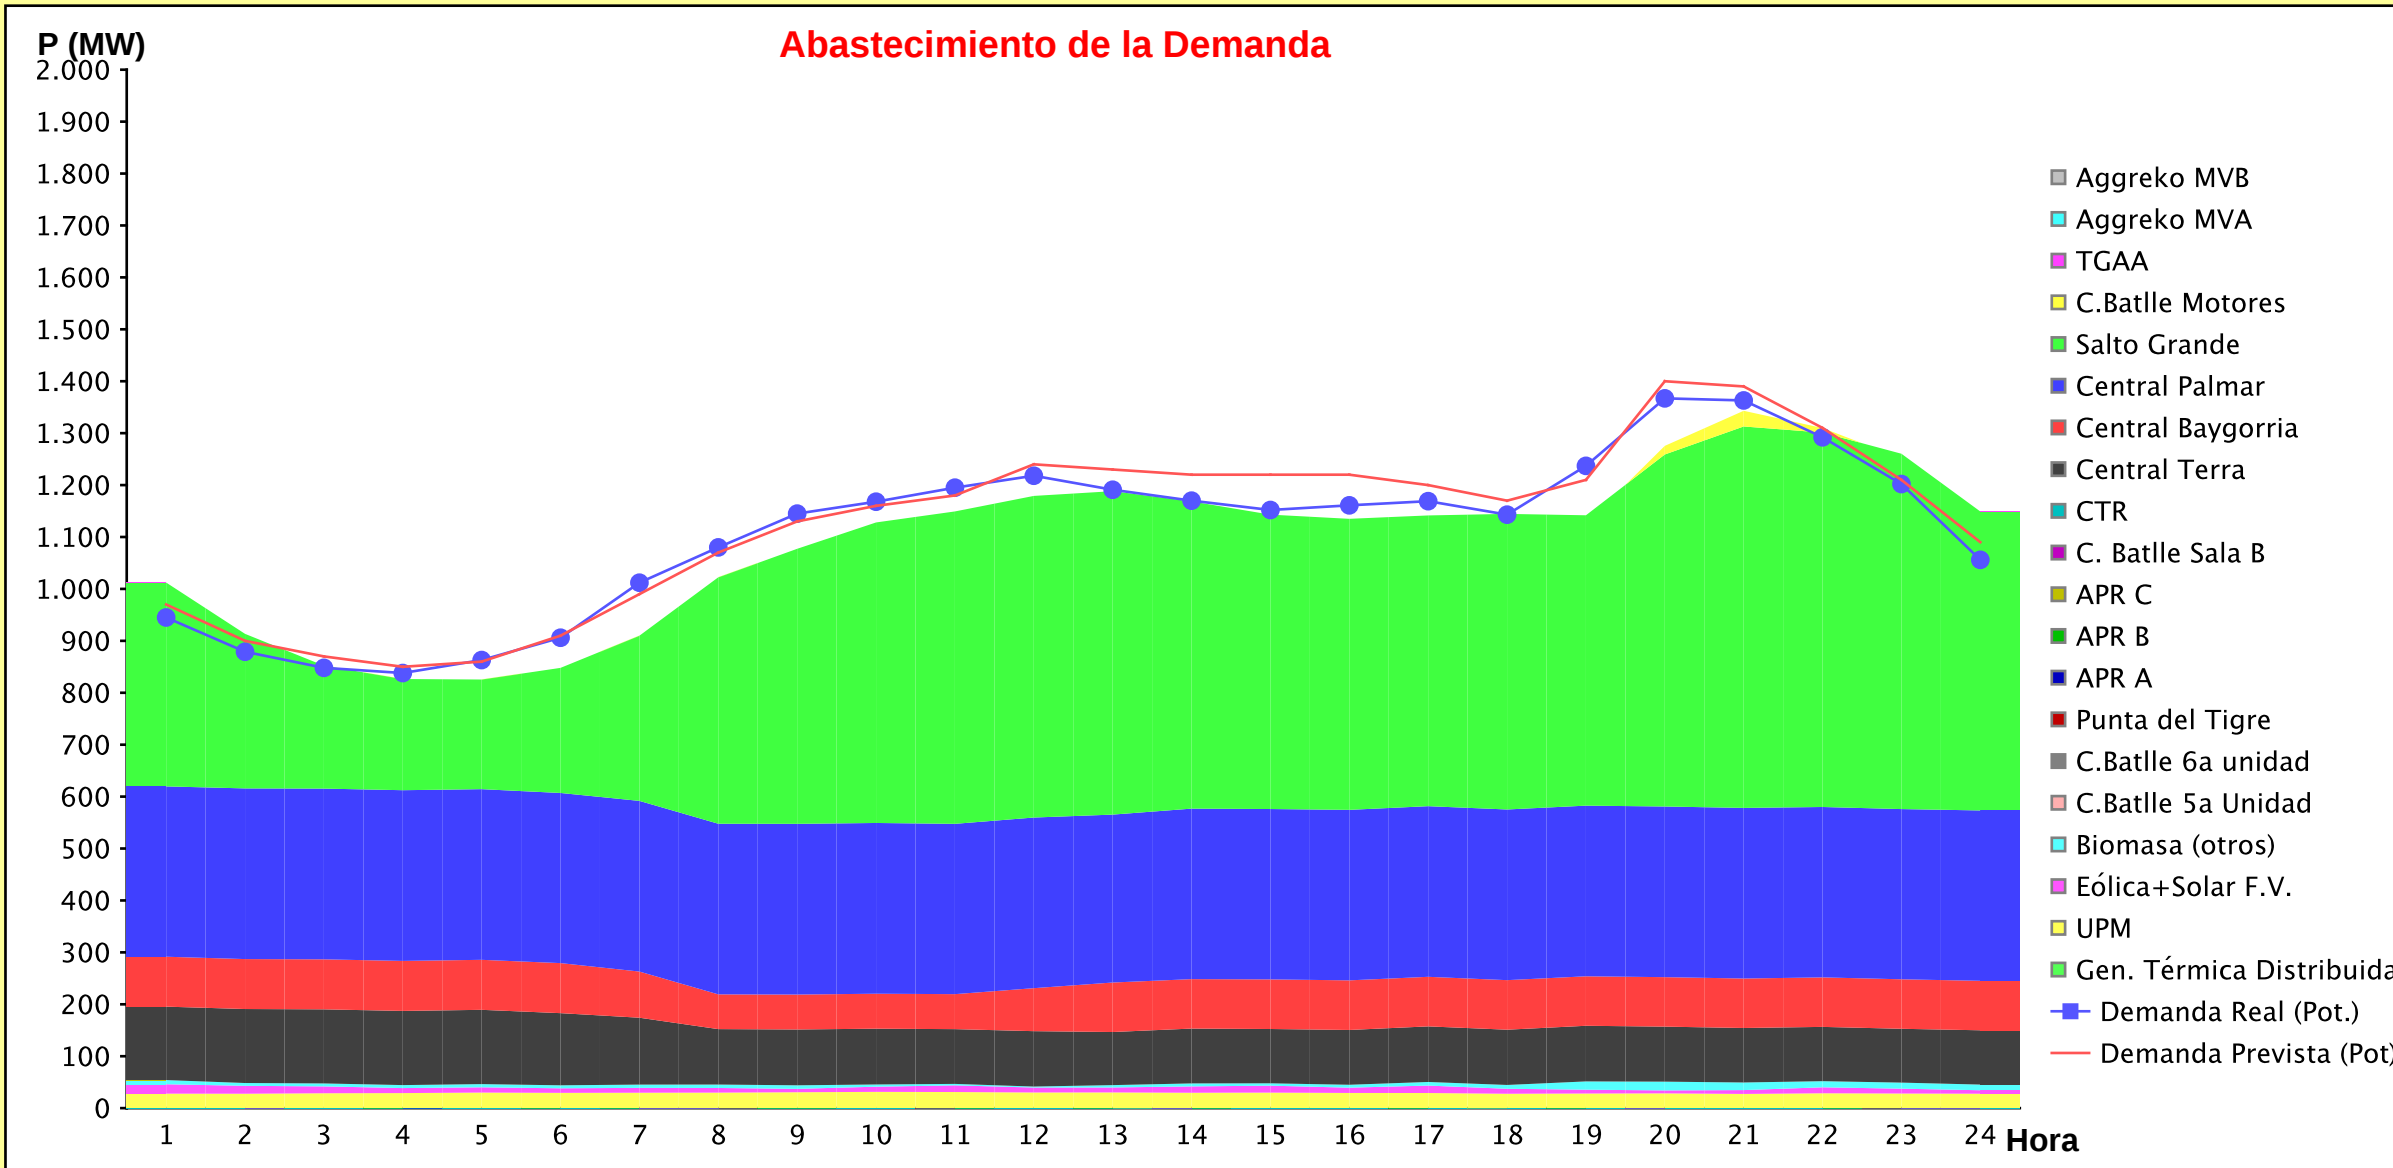

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.081
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.000
Diferencia (MWh)	-919
Ejecutada - Programada	-3,40 %

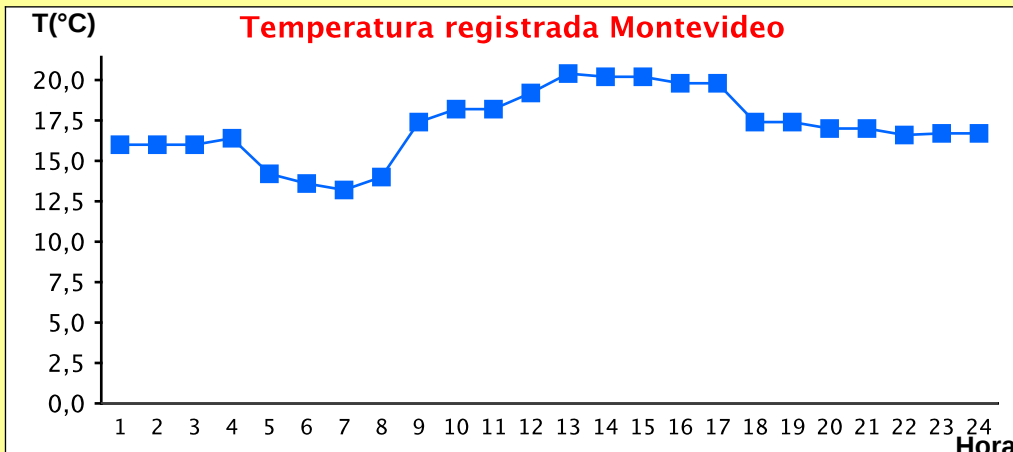



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1257,05 Hora 11:51
Potencia mínima:	843,64 Hora 03:41
Pico noche:	1393,4 Hora 20:48

Generación Media (MW)	
Eólica	10,6
Biomasa	44,9
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

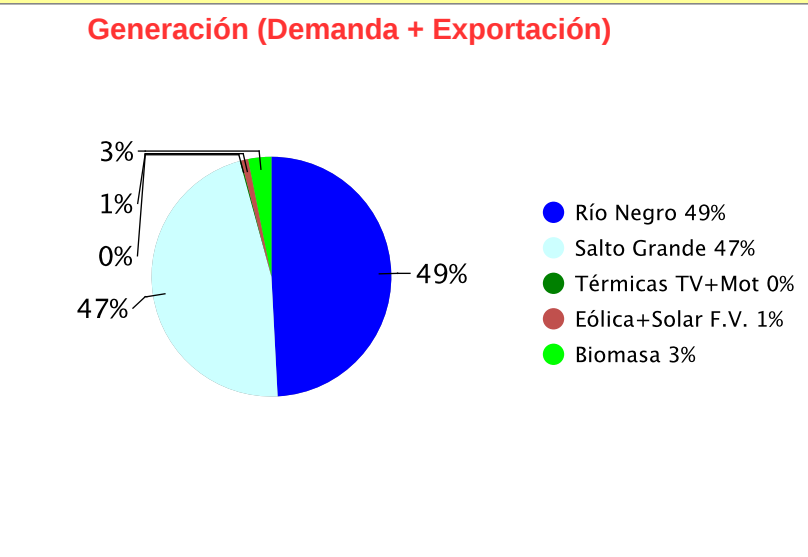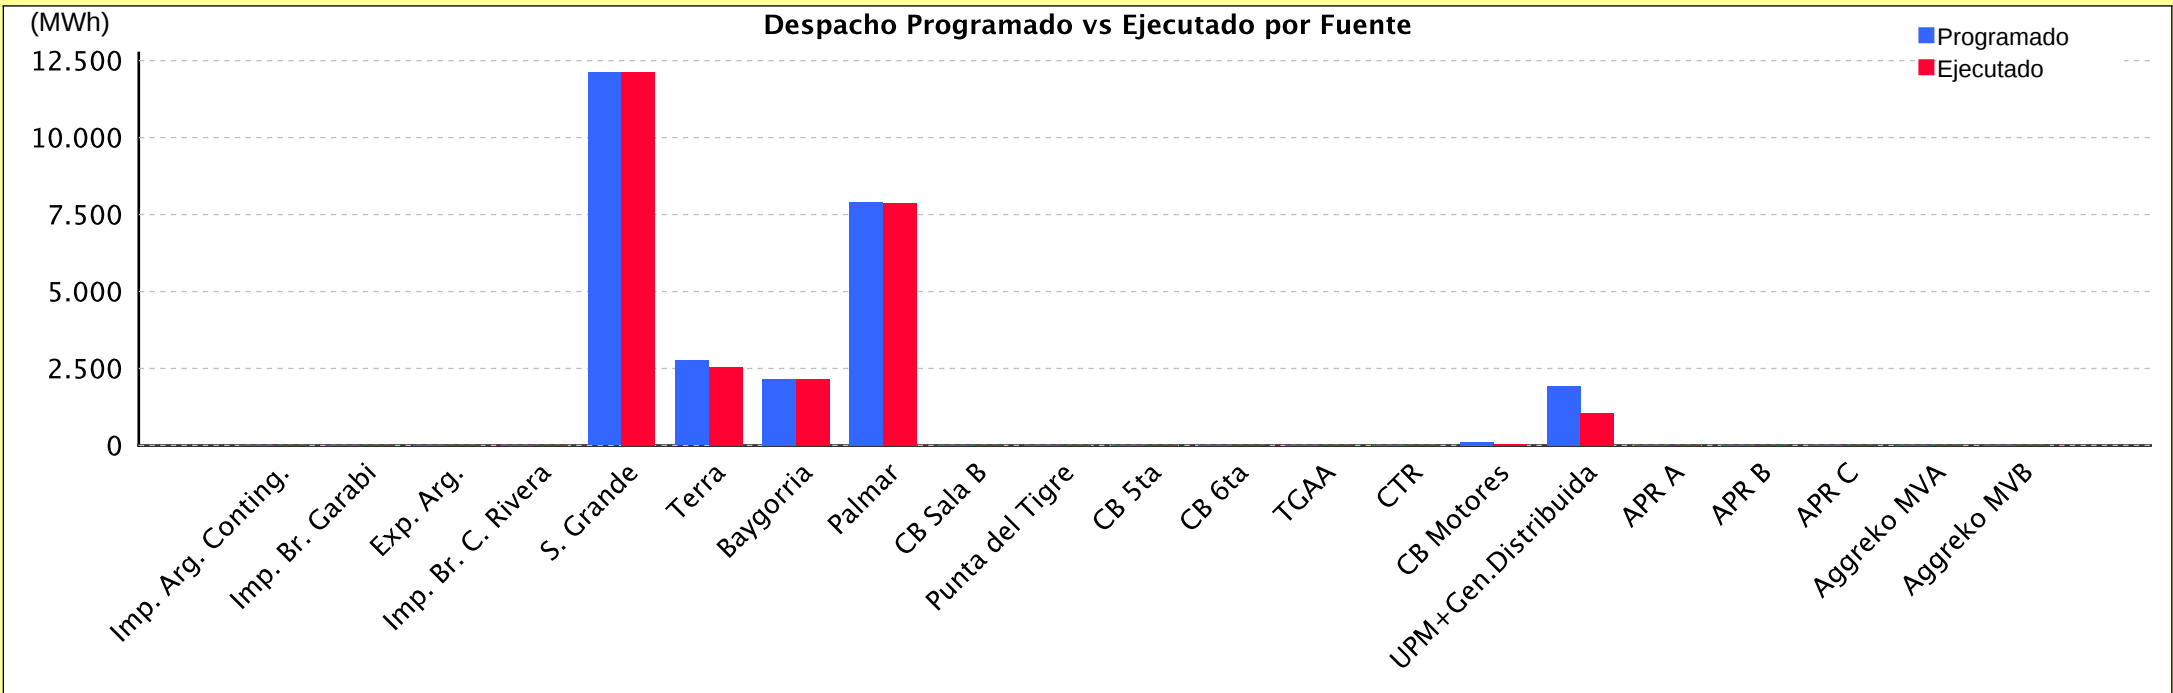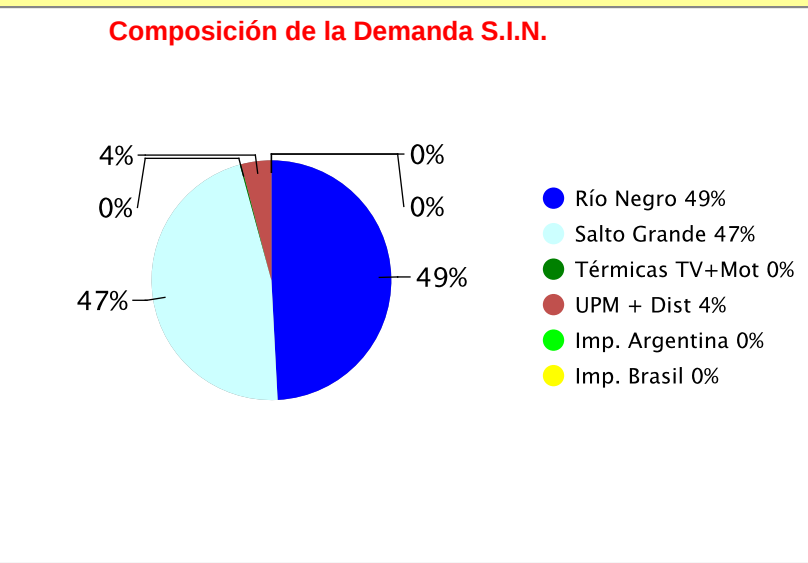



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

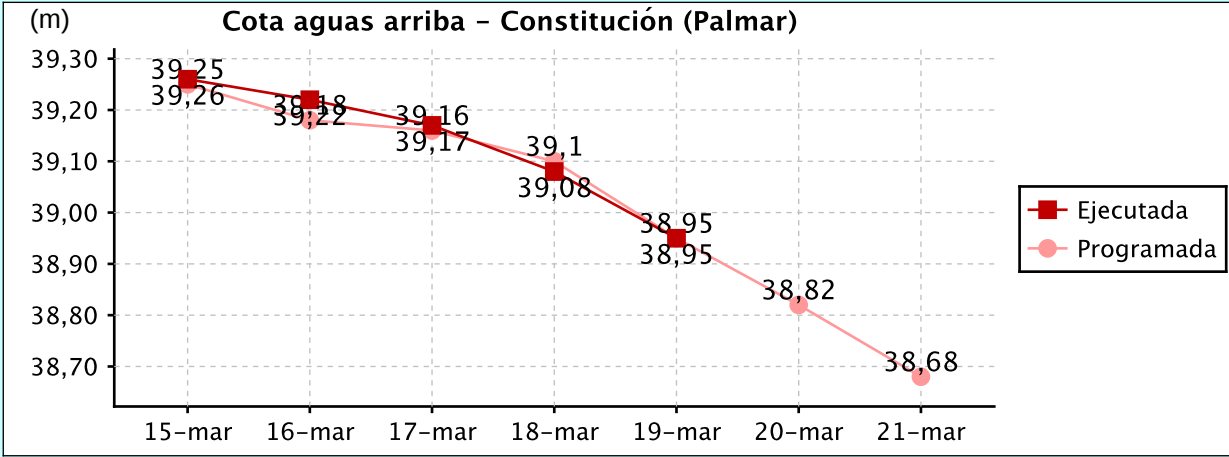
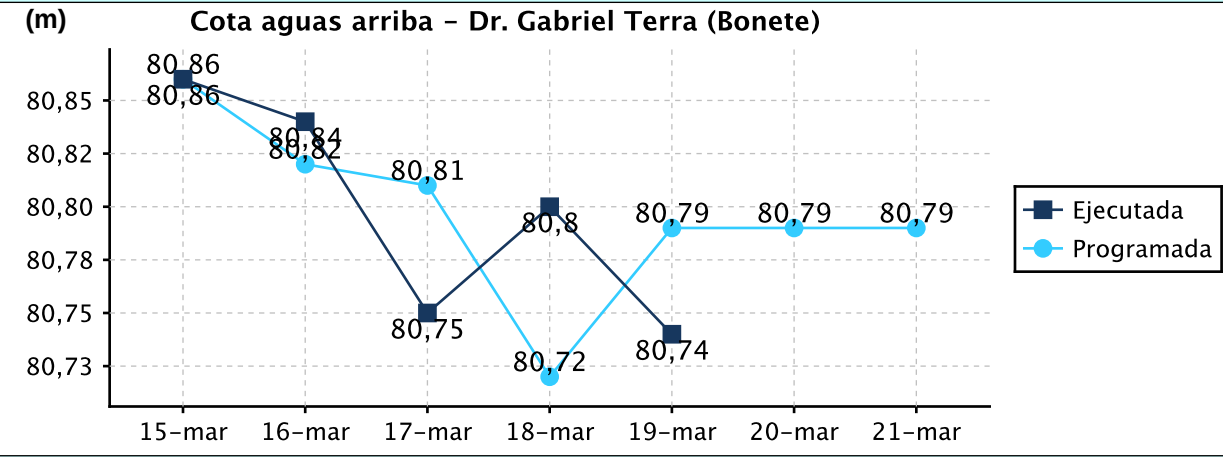


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,79	80,74
Baygorria	54,21	54,21
Palmar	38,95	38,95
SGU	32,99	33,01

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

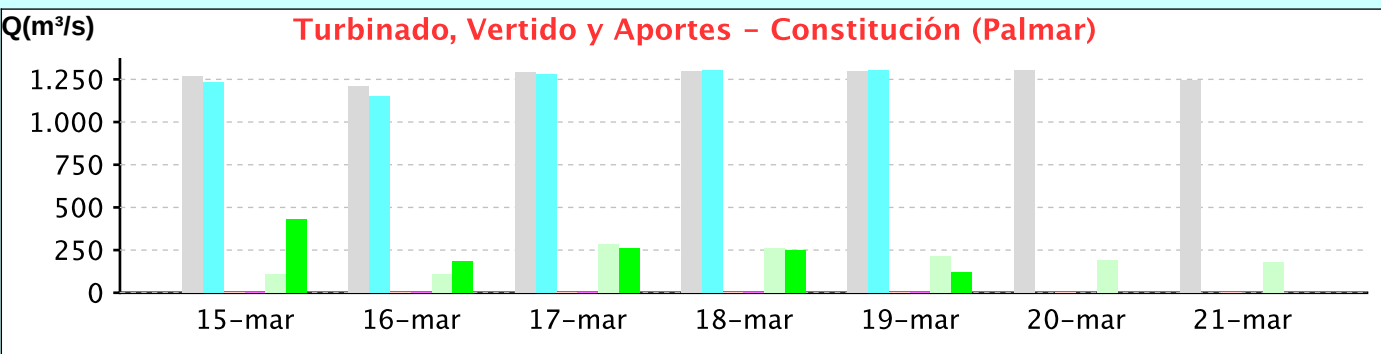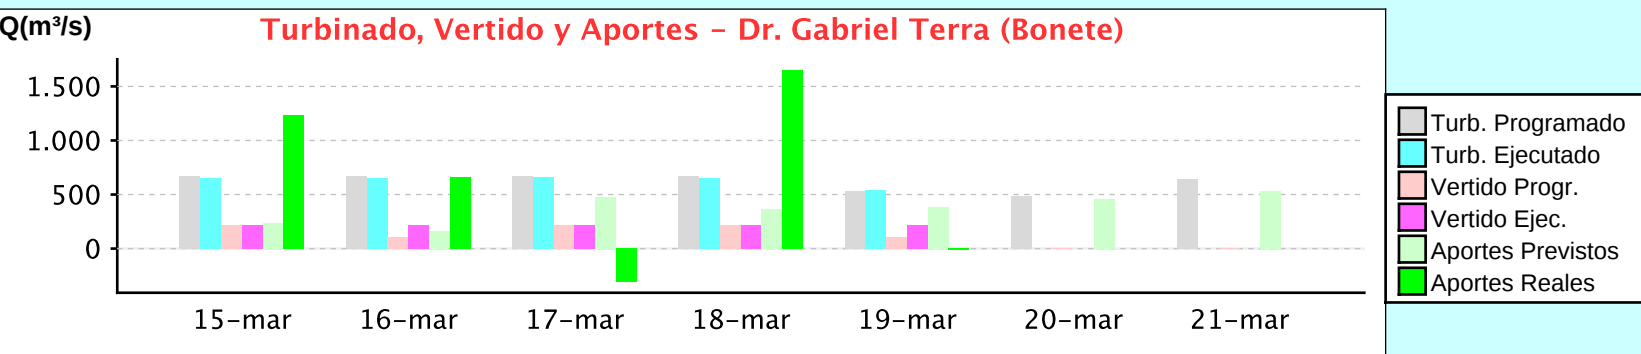

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

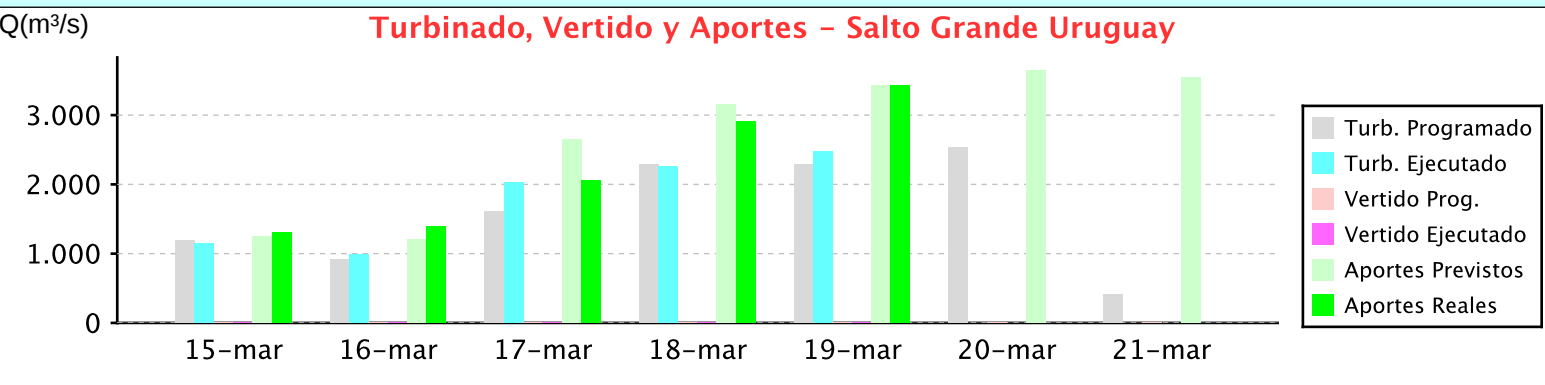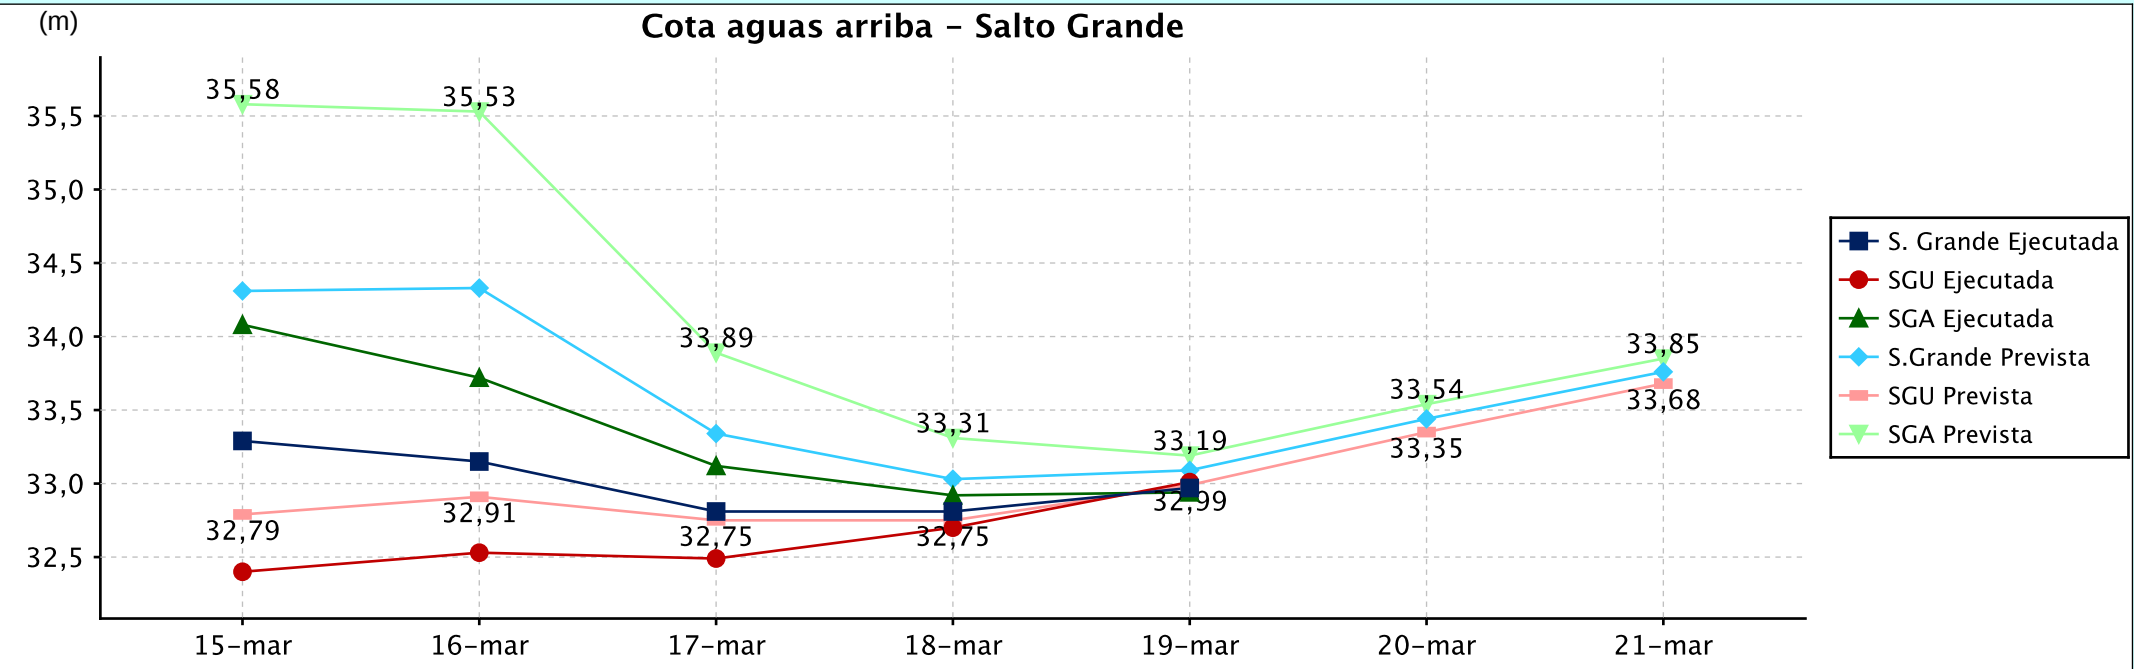

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,01
Cota Vista Arg	32,94
Cota real	32,97
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
	1.201

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	534	539
Baygorria	737	719
Palmar	1.295	1.302
SGU	2.290	2.470

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	388	-16
Baygorria	3	7
Palmar	213	117
SGU	3.425	3.428

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	110	213
Baygorria	0	86
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
