



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 20 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	90
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	94
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	34
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.536
C. Baygorria	2.195
C. Palmar	7.878
C. Salto Grande	12.626
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	971
TOTAL Generación	26.284

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.284
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.890
Diferencia (MWh)	-606
Ejecutada - Programada	-2,25 %

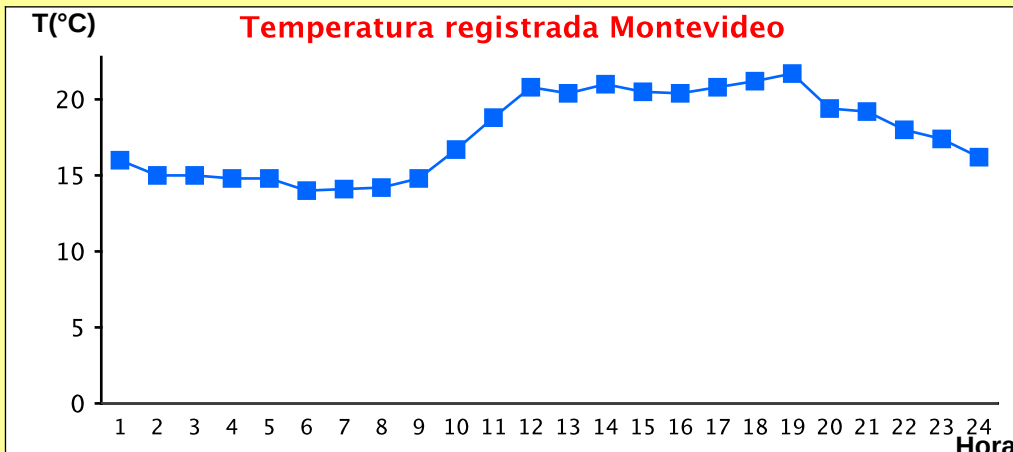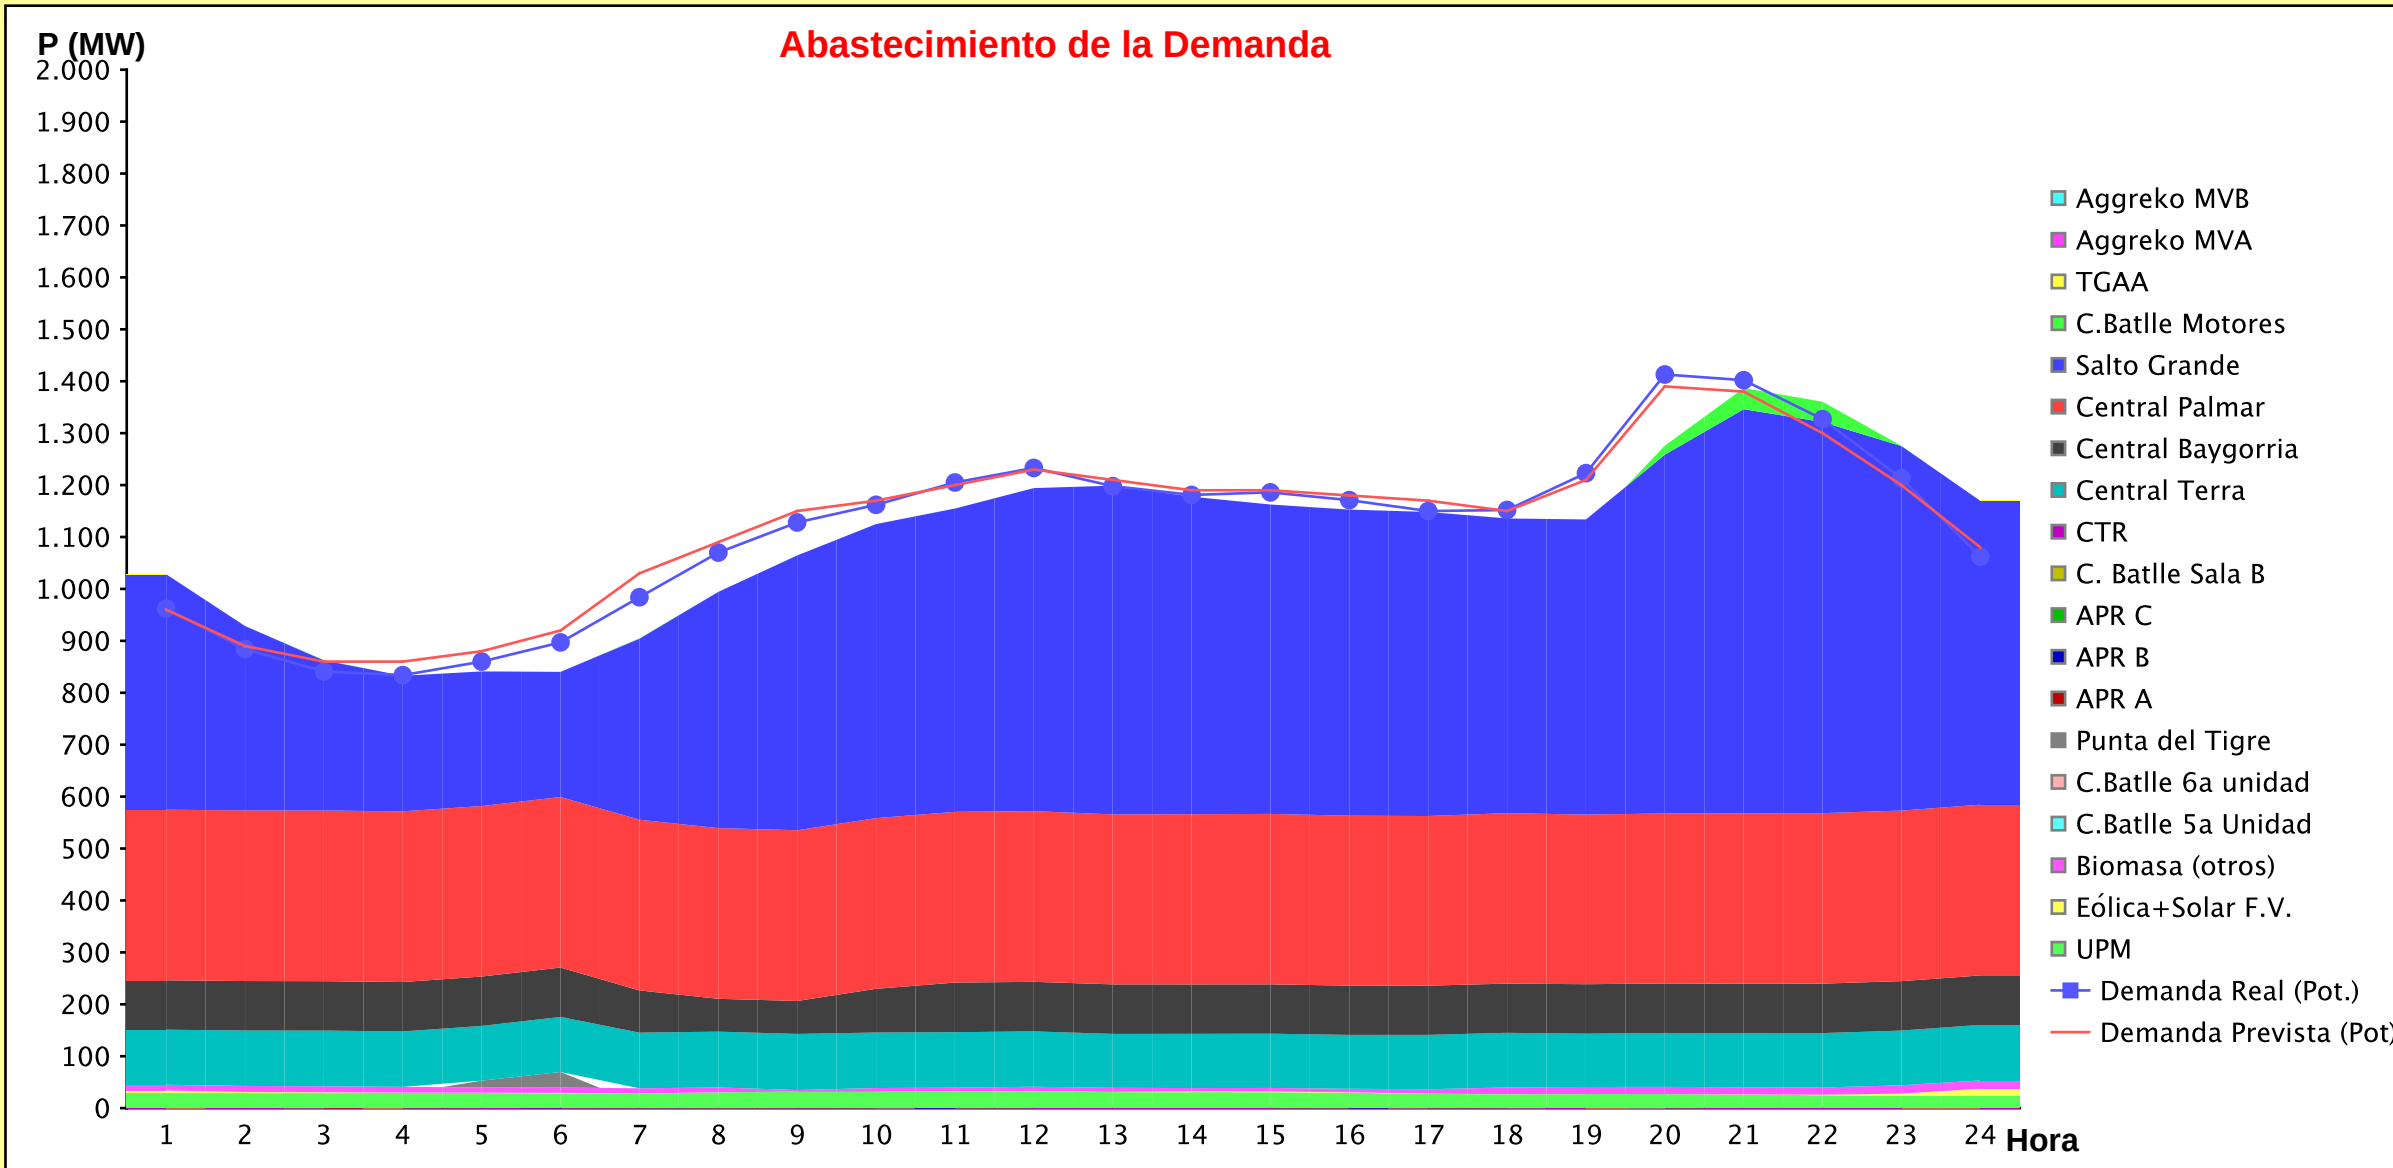



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1244,8 Hora 11:53
Potencia mínima:	840,45 Hora 03:58
Pico noche:	1422,98 Hora 20:28

Generación Media (MW)	
Eólica	1,5
Biomasa	47,5
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

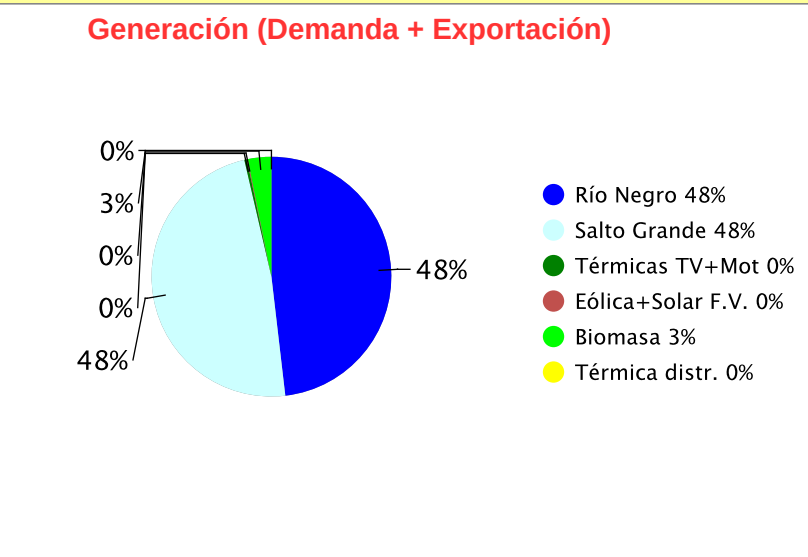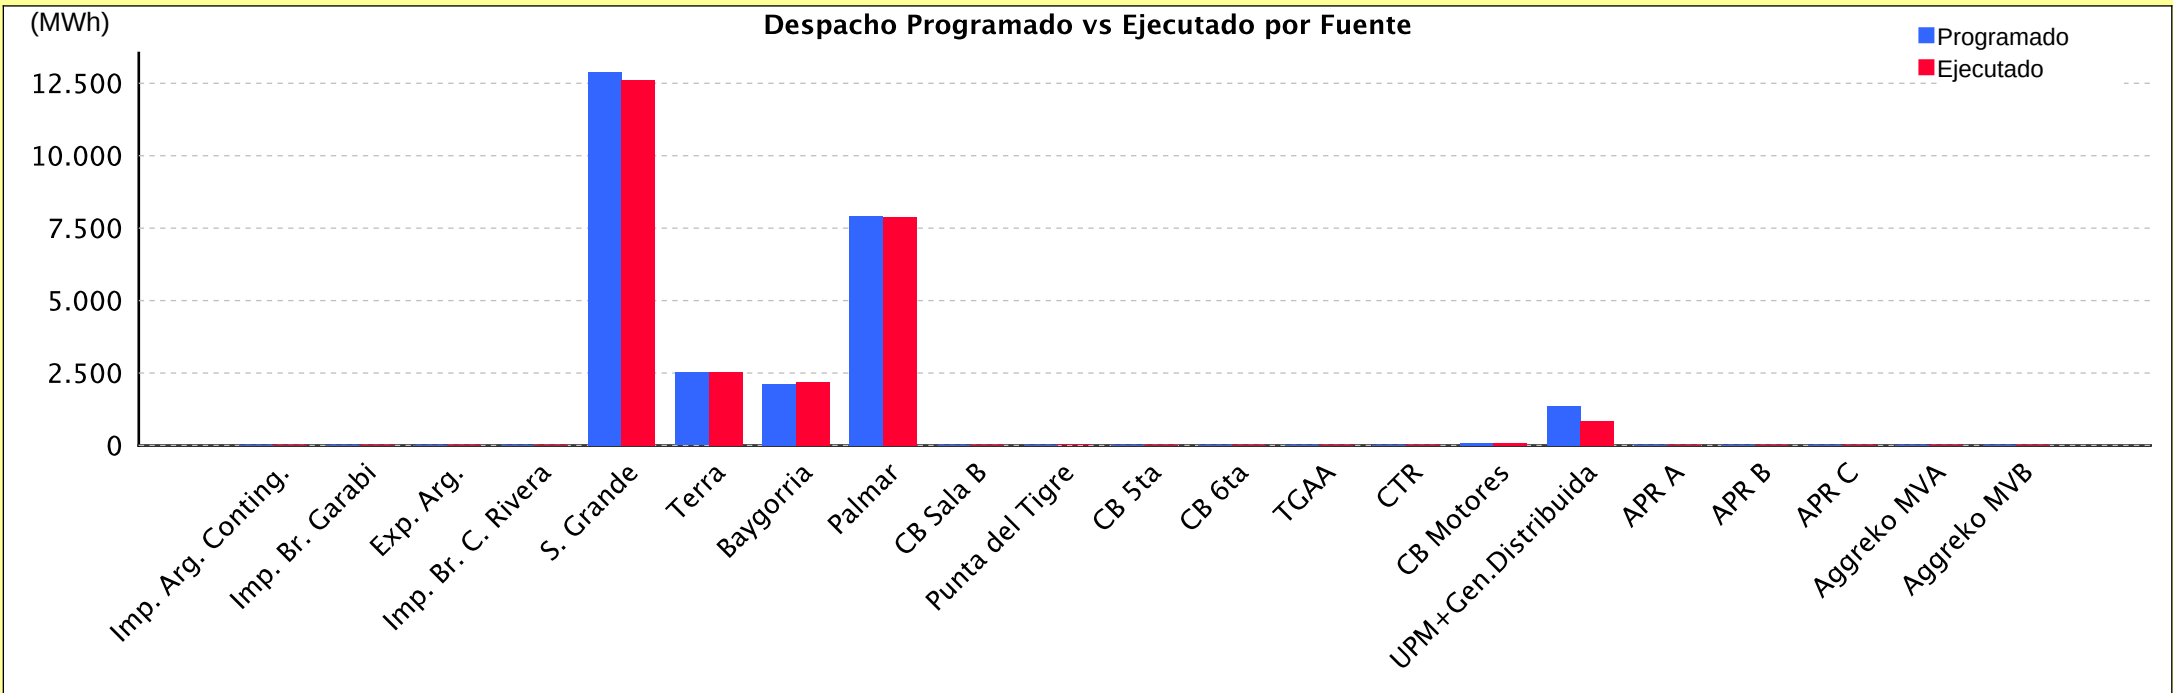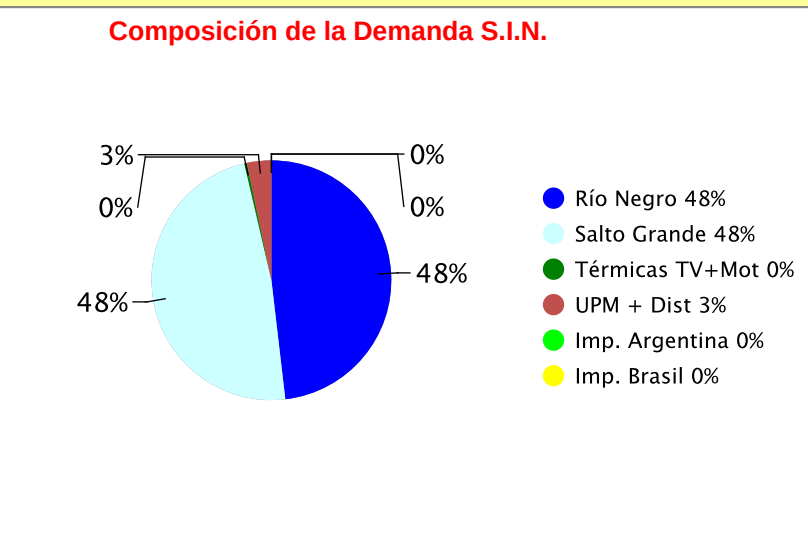



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

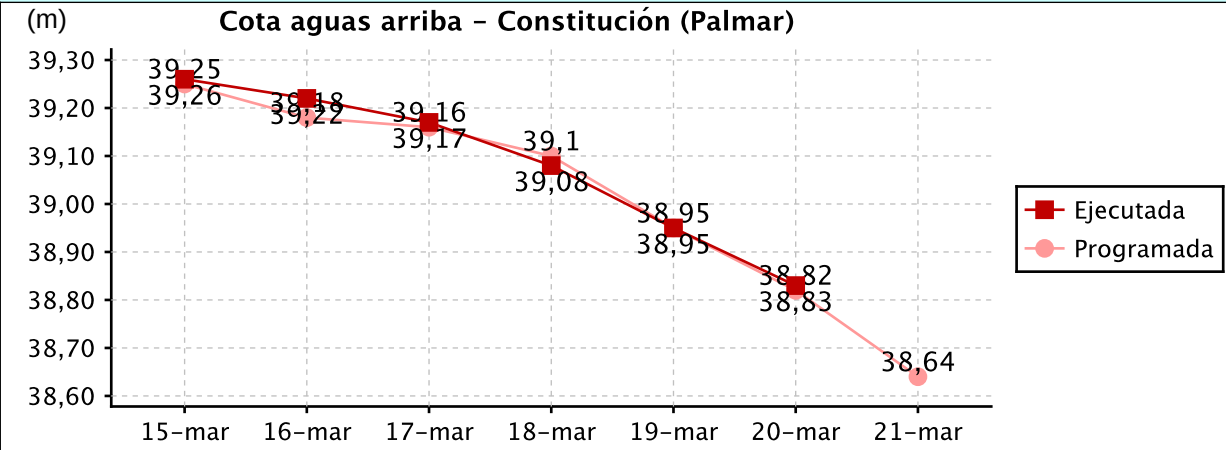
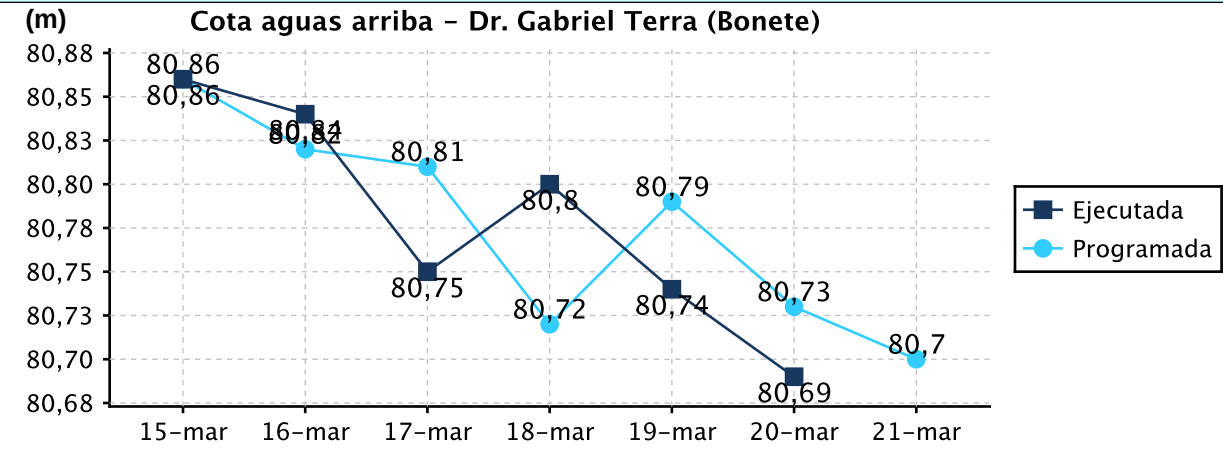


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,73	80,69
Baygorria	54,16	54,07
Palmar	38,82	38,83
SGU	33,36	33,39

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

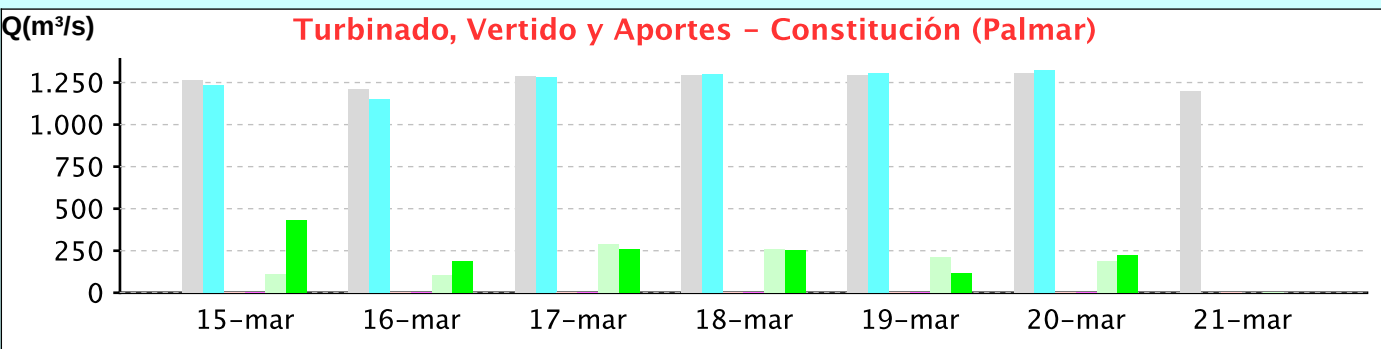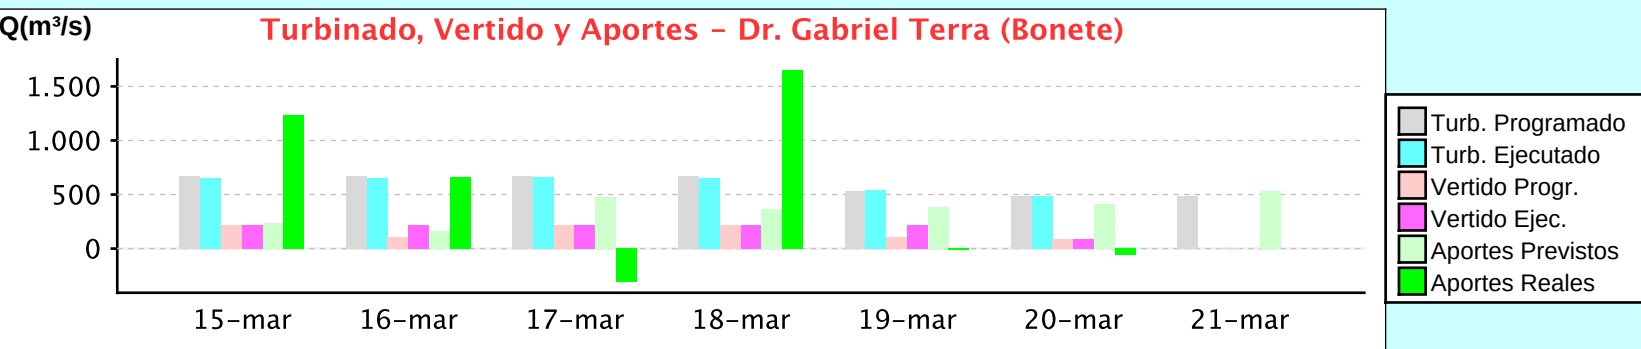

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

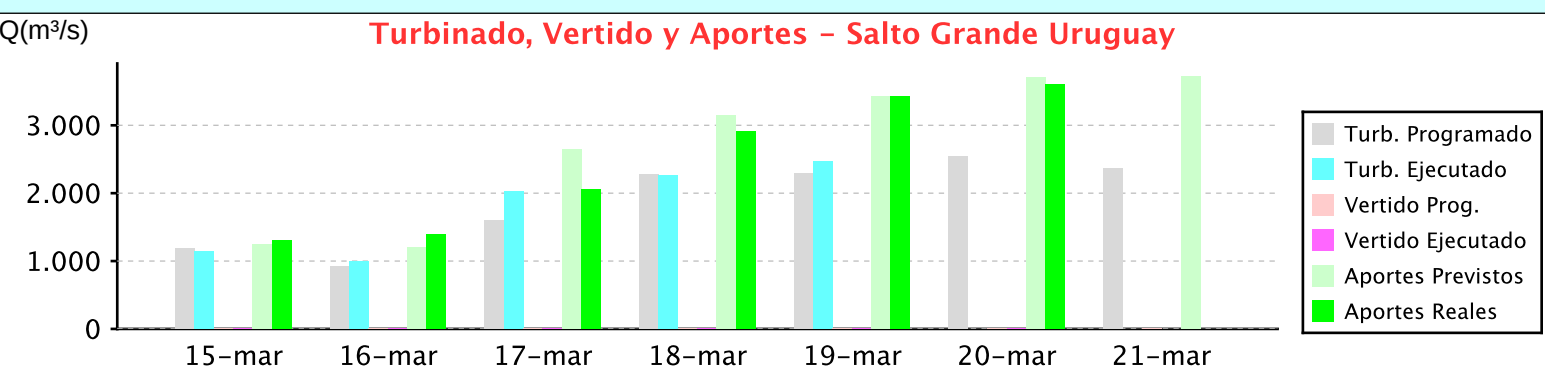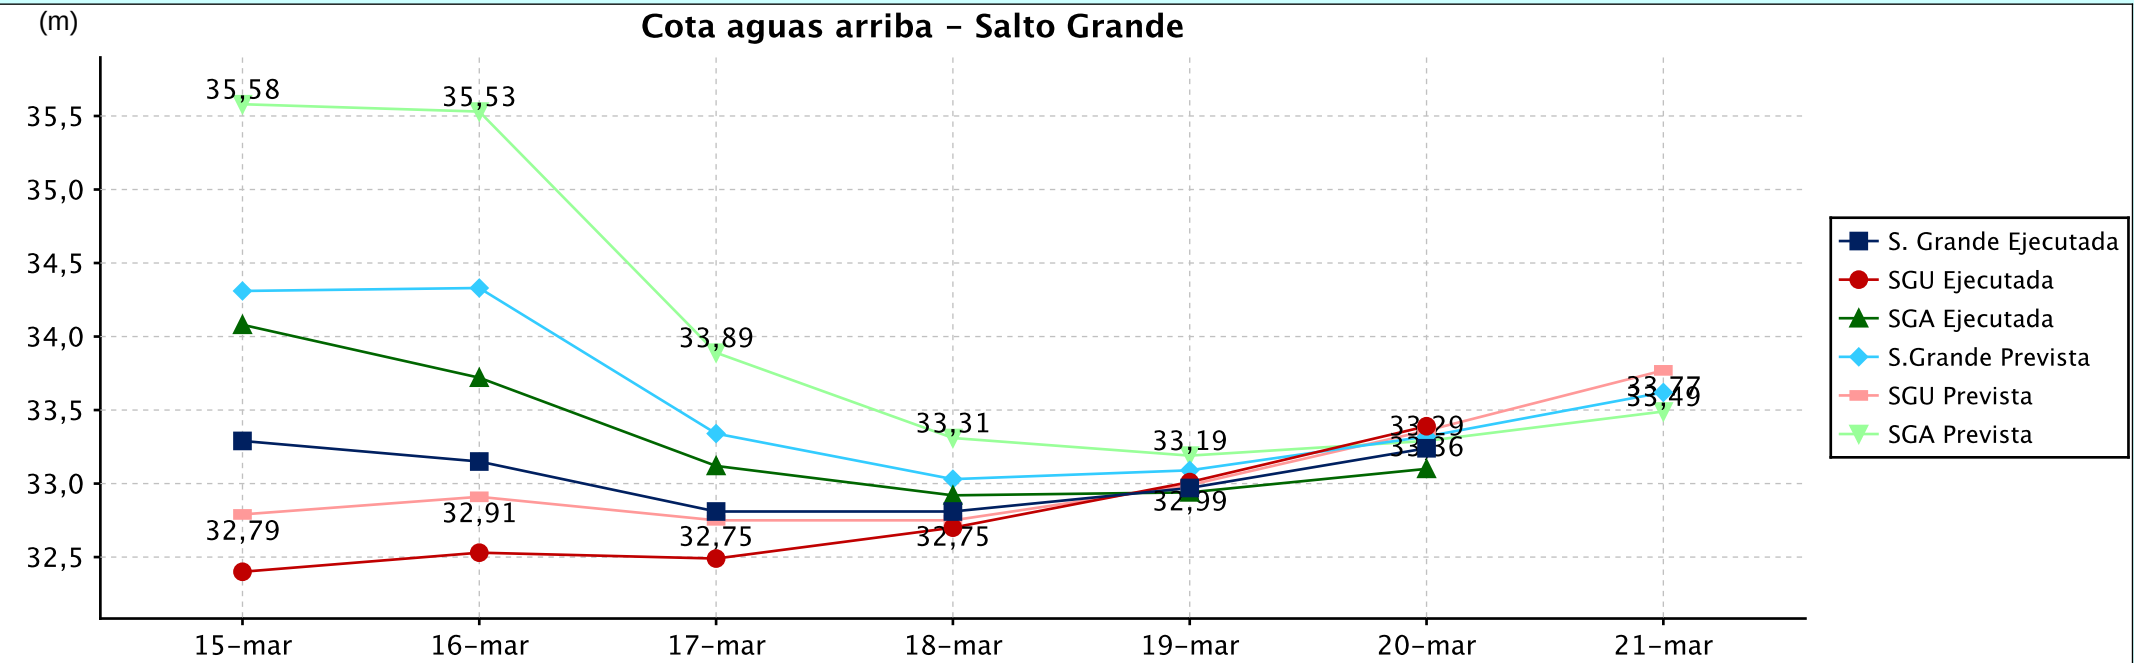

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,39
Cota Vista Arg	33,10
Cota real	33,24
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	5.392

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	488	484
Baygorria	723	729
Palmar	1.302	1.322
SGU	2.541	

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	407	-58
Baygorria	0	32
Palmar	188	221
SGU	3.700	3.606

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	90	89
Baygorria	0	39
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Durante las horas 5 y 6 se despachó PTA 6 por pruebas.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

21/03/2014 15:48
