




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 21 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	122
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.541
C. Baygorria	2.280
C. Palmar	7.430
C. Salto Grande	12.016
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.789
TOTAL Generación	26.118

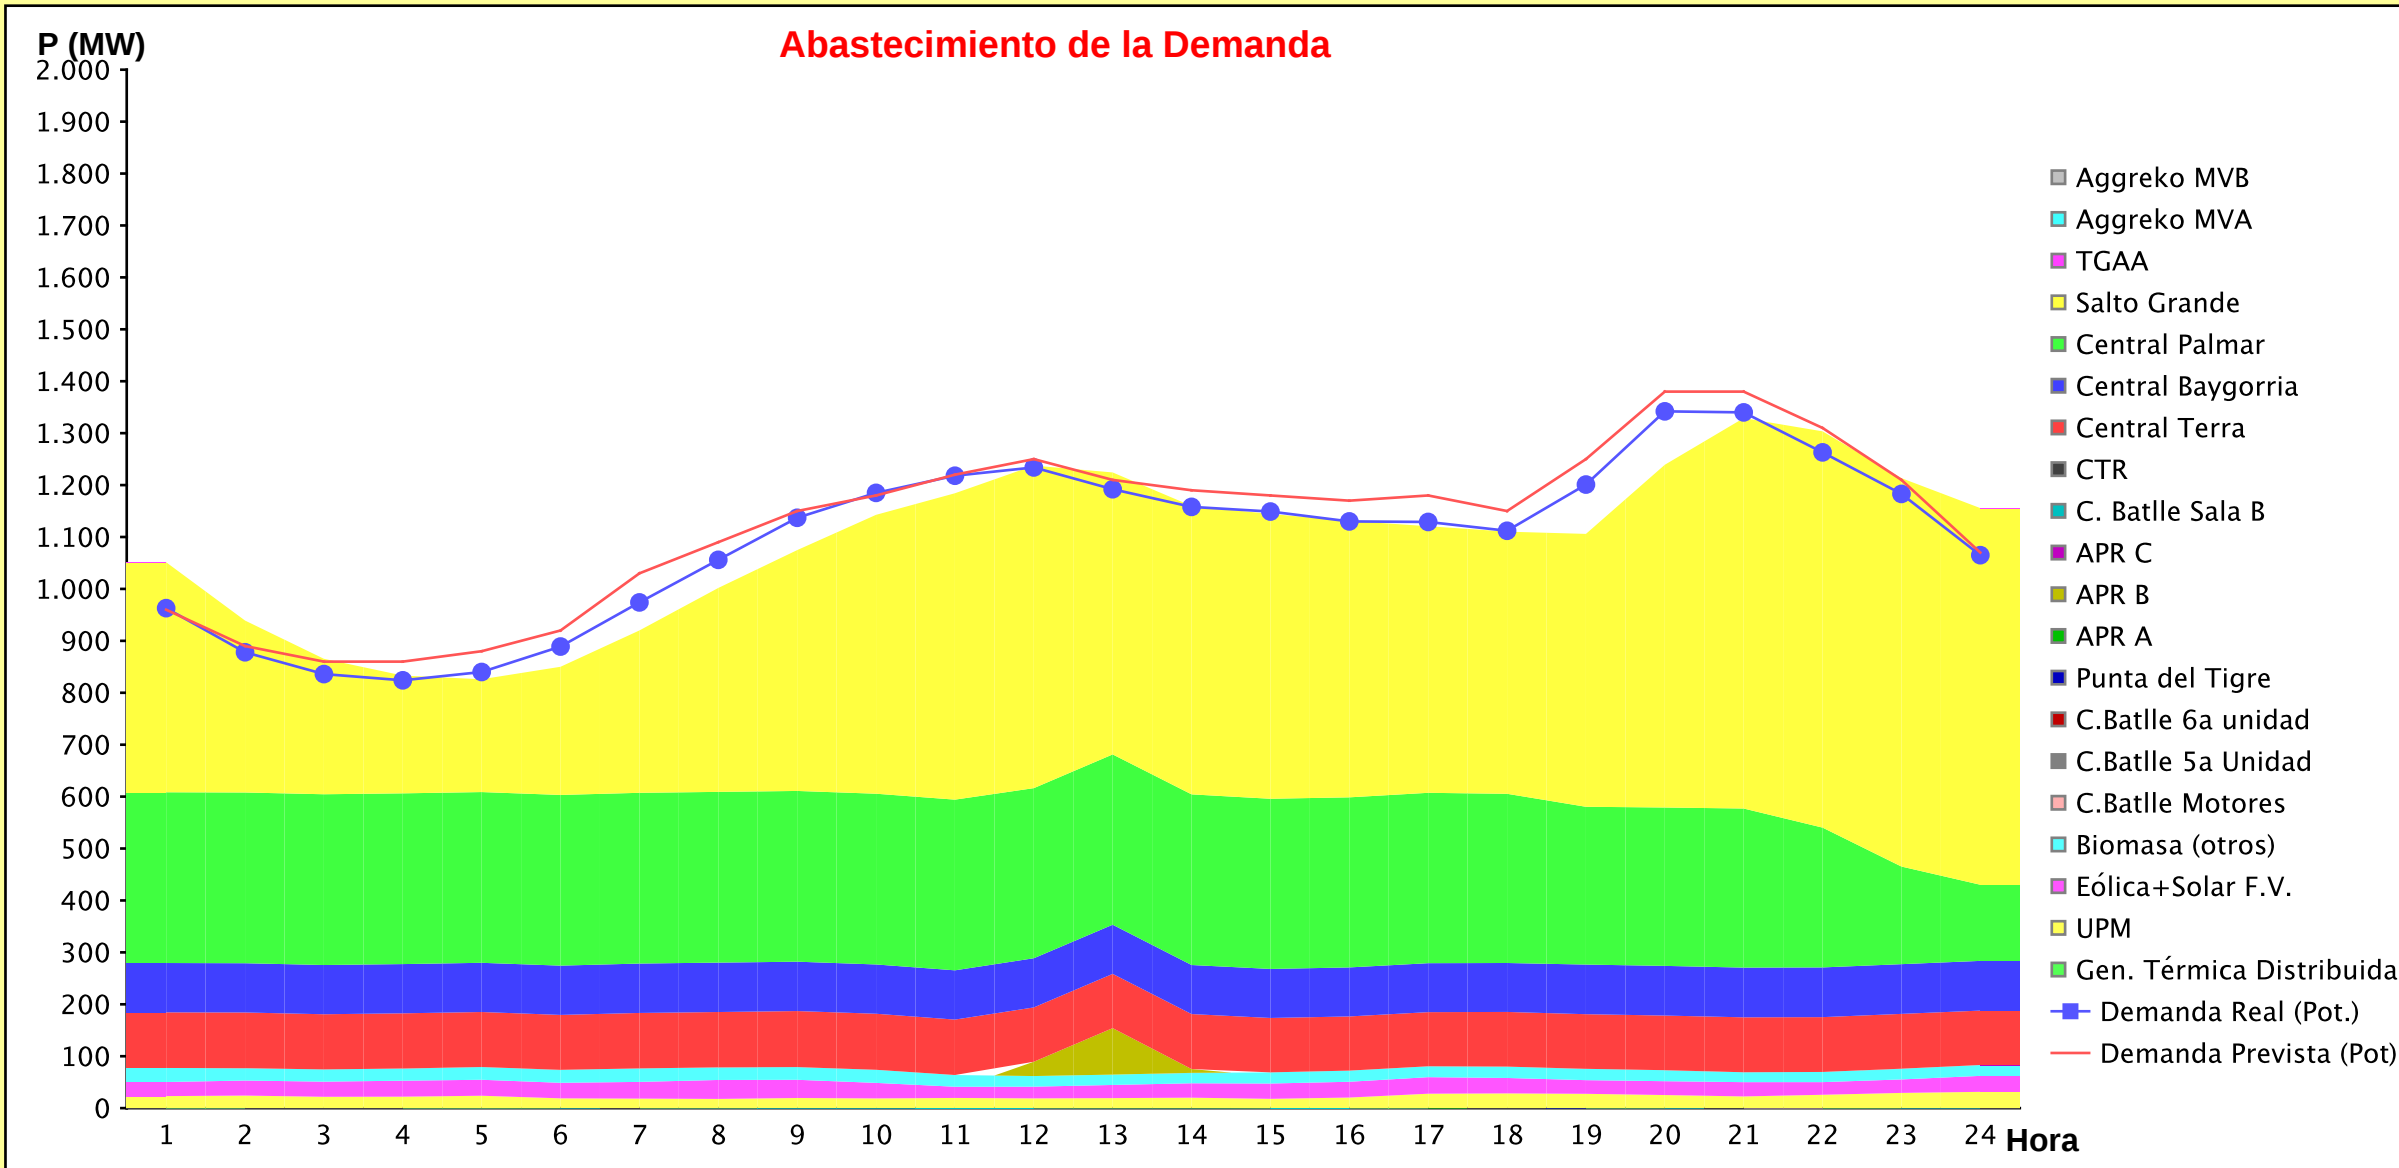




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.118
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	26.970
Diferencia (MWh)	-852
Ejecutada - Programada	-3,16 %

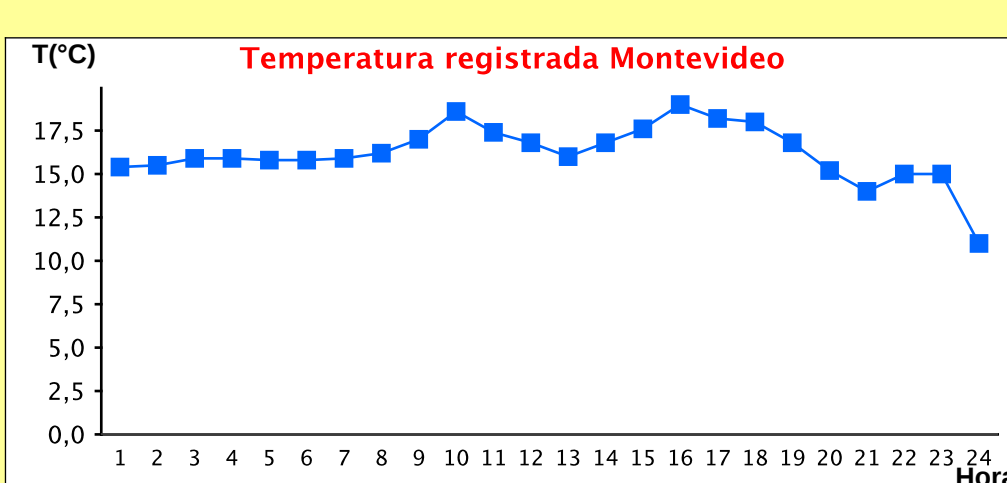



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1268,86 Hora 11:48
Potencia mínima:	840,55 Hora 03:50
Pico noche:	1379,46 Hora 20:18

Generación Media (MW)	
Eólica	28,7
Biomasa	52,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

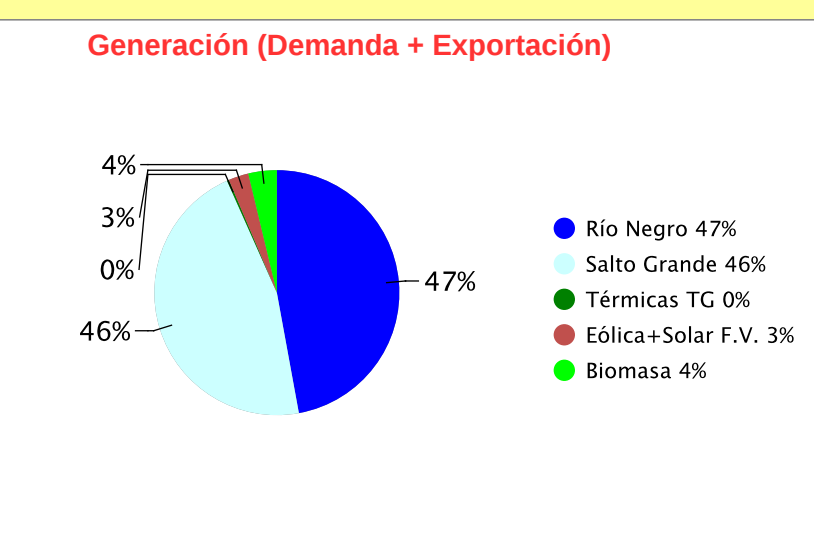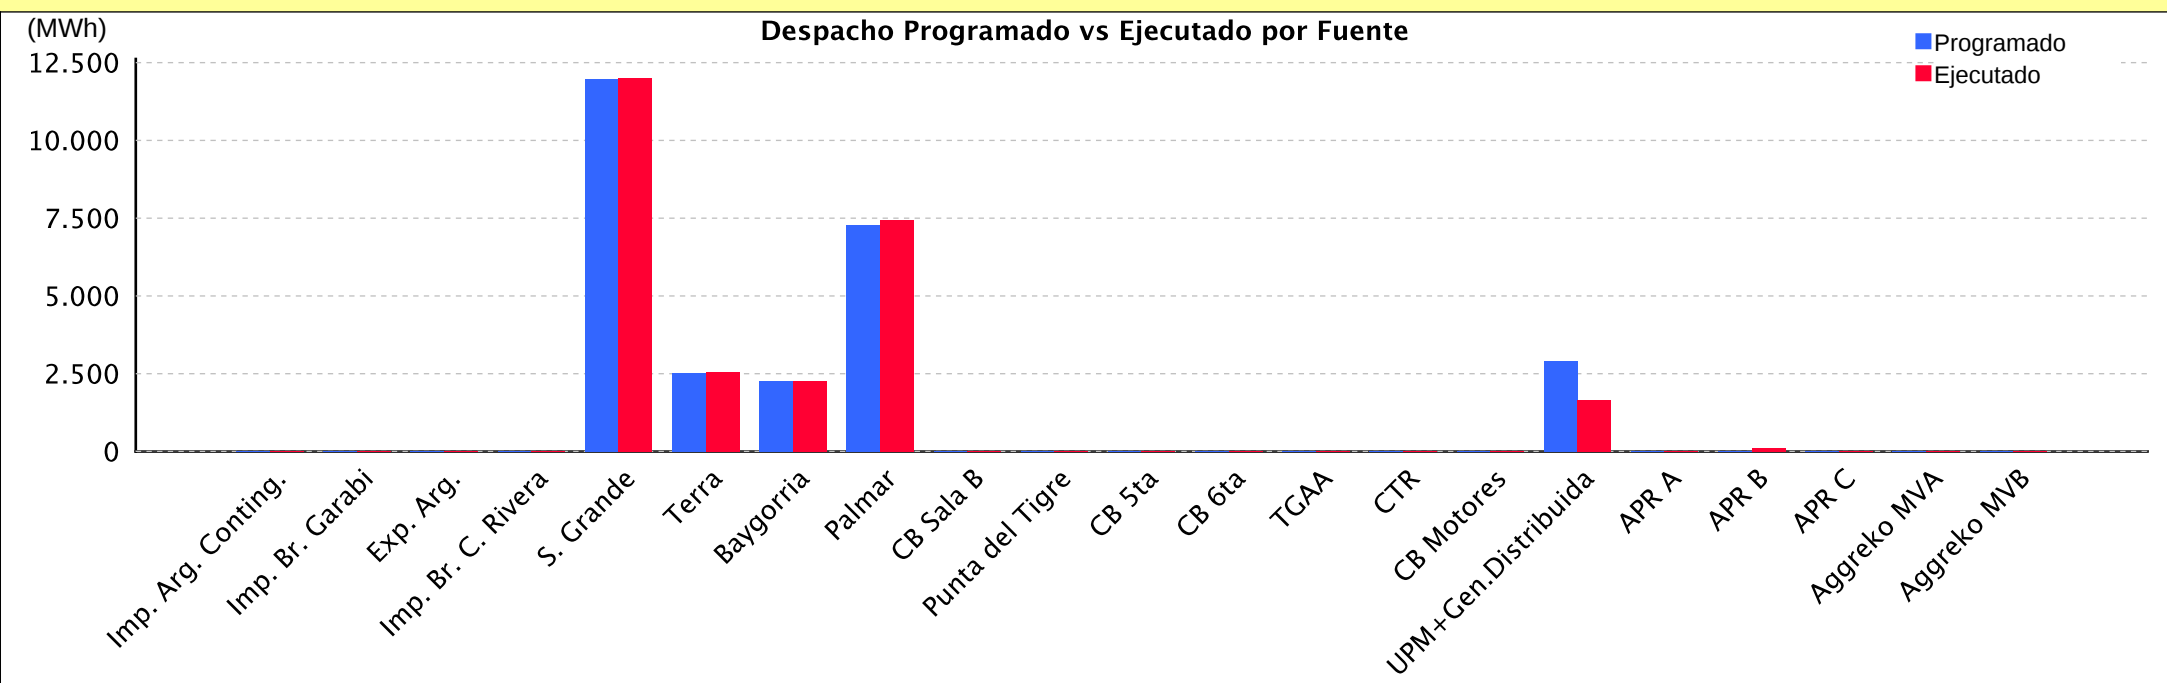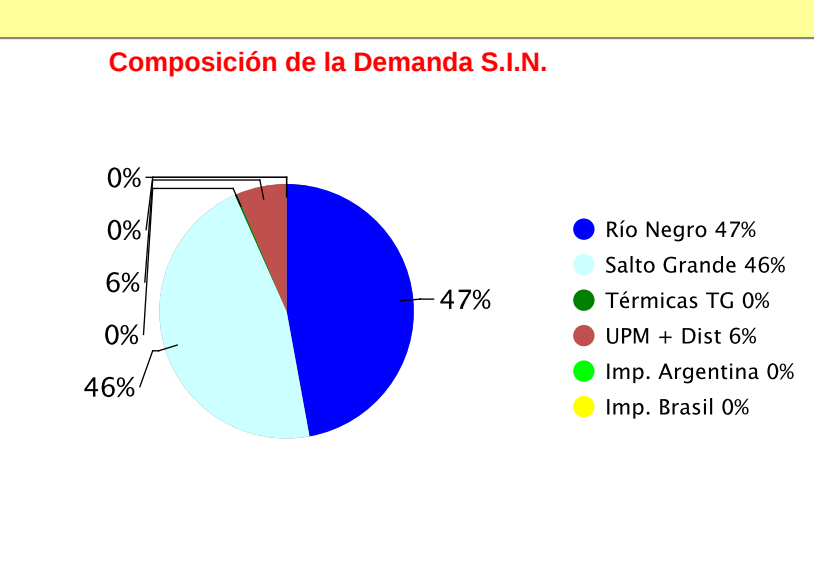



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

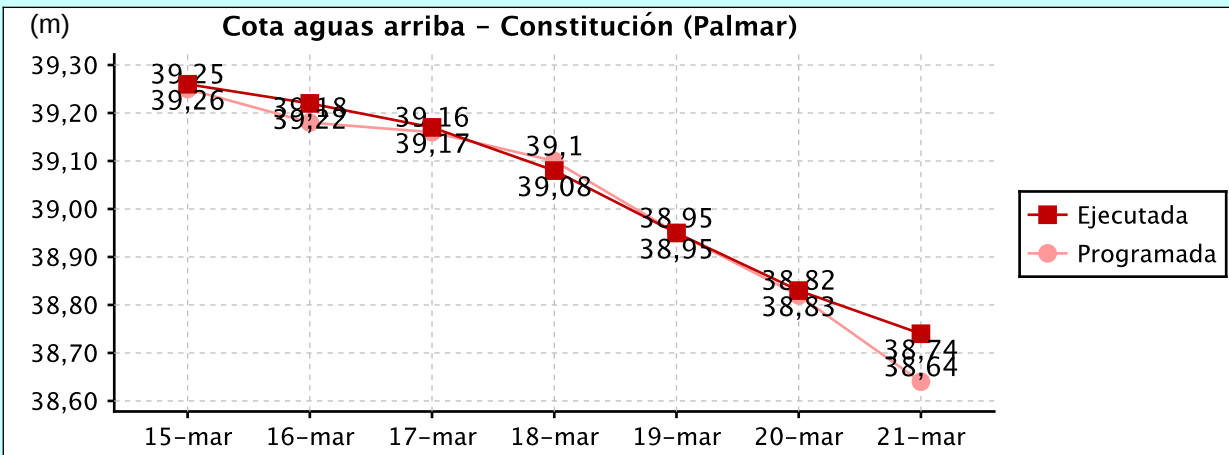
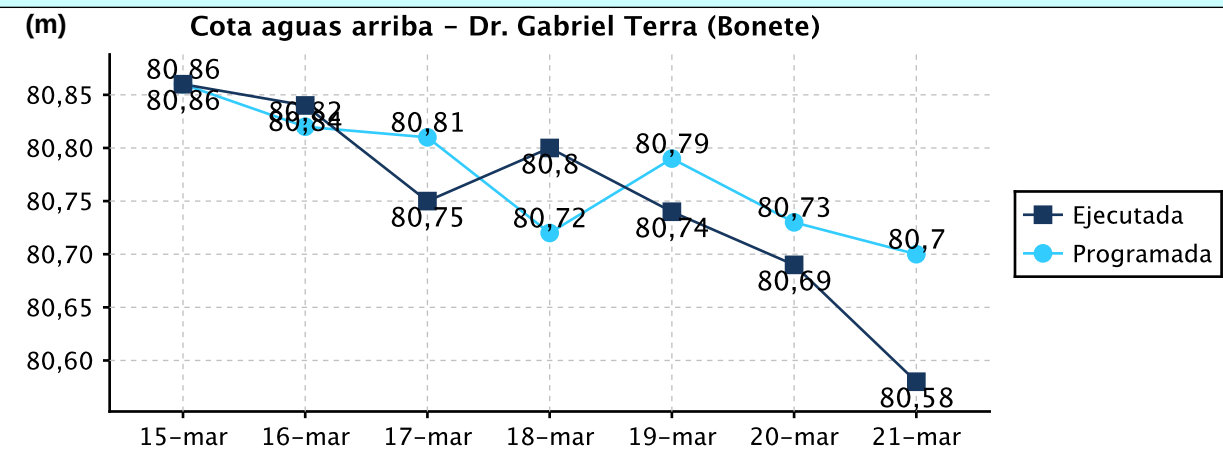


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,70	80,58
Baygorria	53,95	53,83
Palmar	38,64	38,74
SGU	33,77	33,69

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

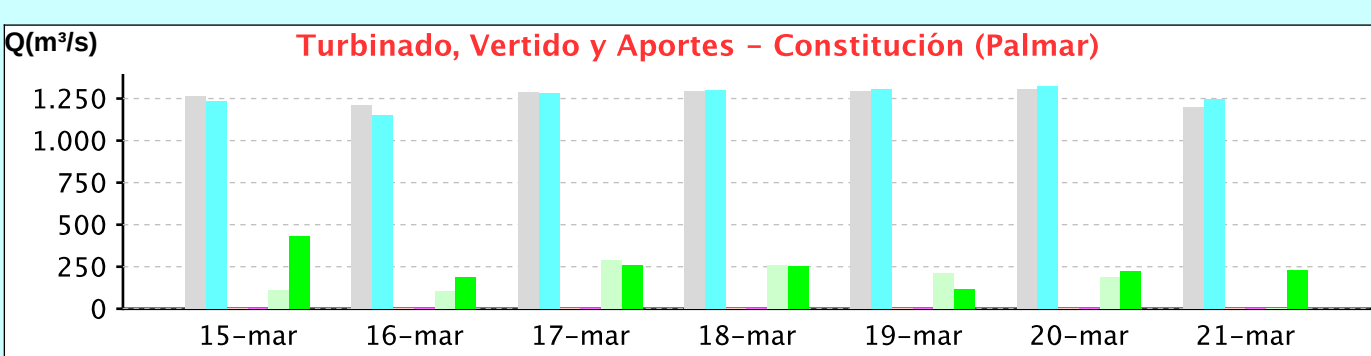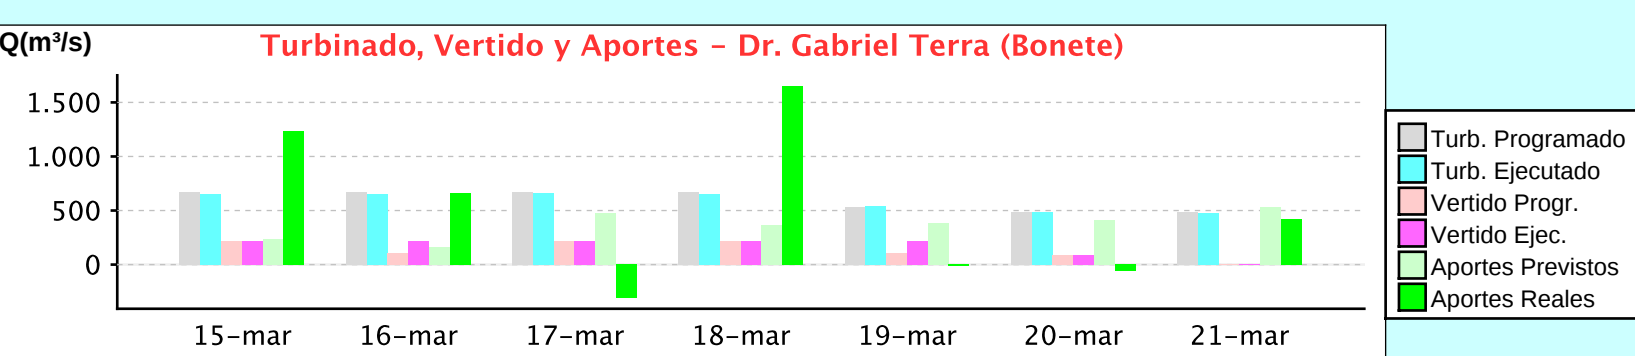

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

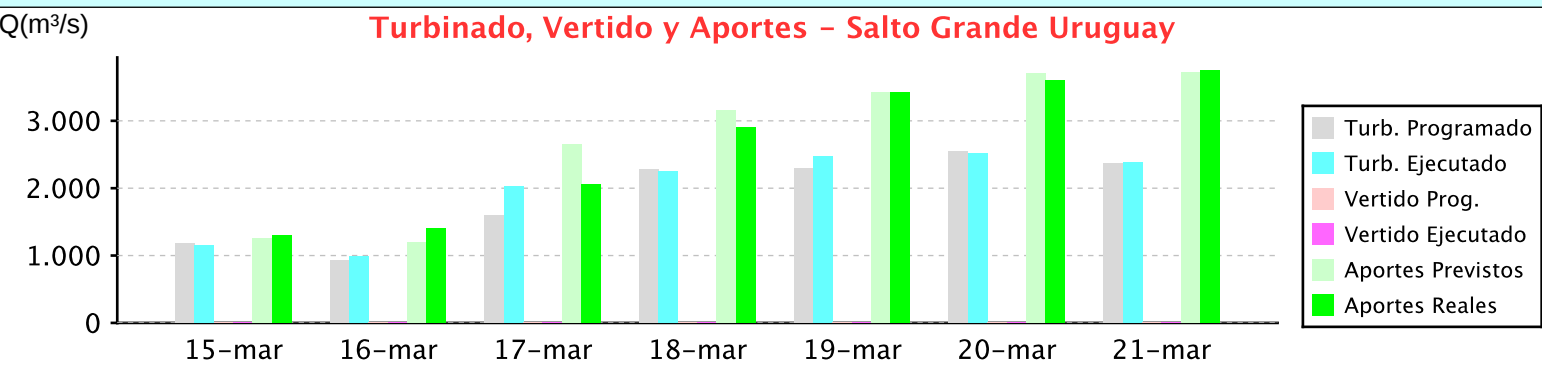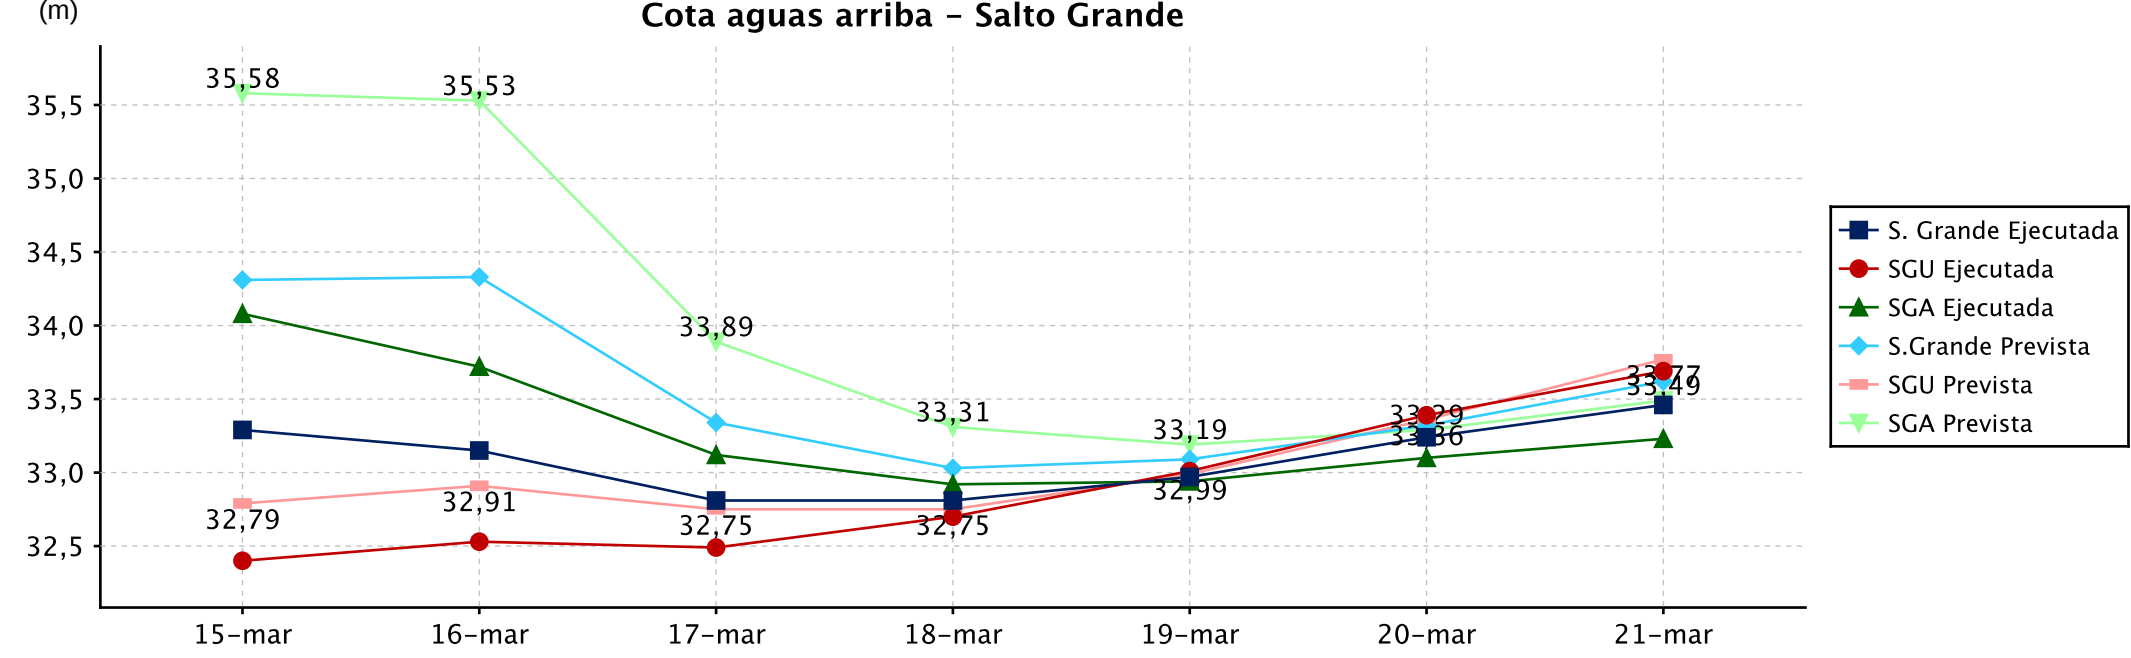

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,69
Cota Vista Arg	33,23
Cota real	33,46

Dif. Energ. (U-A)	8.948
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	488	480
Baygorria	774	761
Palmar	1.196	1.245
SGU	2.363	2.382

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	535	417
Baygorria	0	3
Palmar	3	231
SGU	3.725	3.753

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se generó con APR B por pruebas.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

25/03/2014 16:32
