



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 22 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	-2
APR A	-1
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.565
C. Baygorria	2.269
C. Palmar	1.138
C. Salto Grande	16.428
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.737
TOTAL Generación	24.080

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.080
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.450
Diferencia (MWh)	-1.370
Ejecutada - Programada	-5,38 %

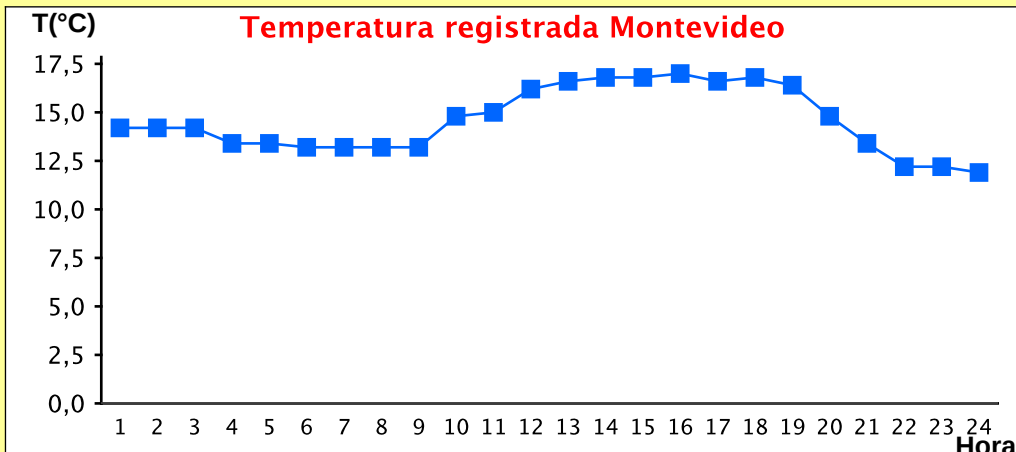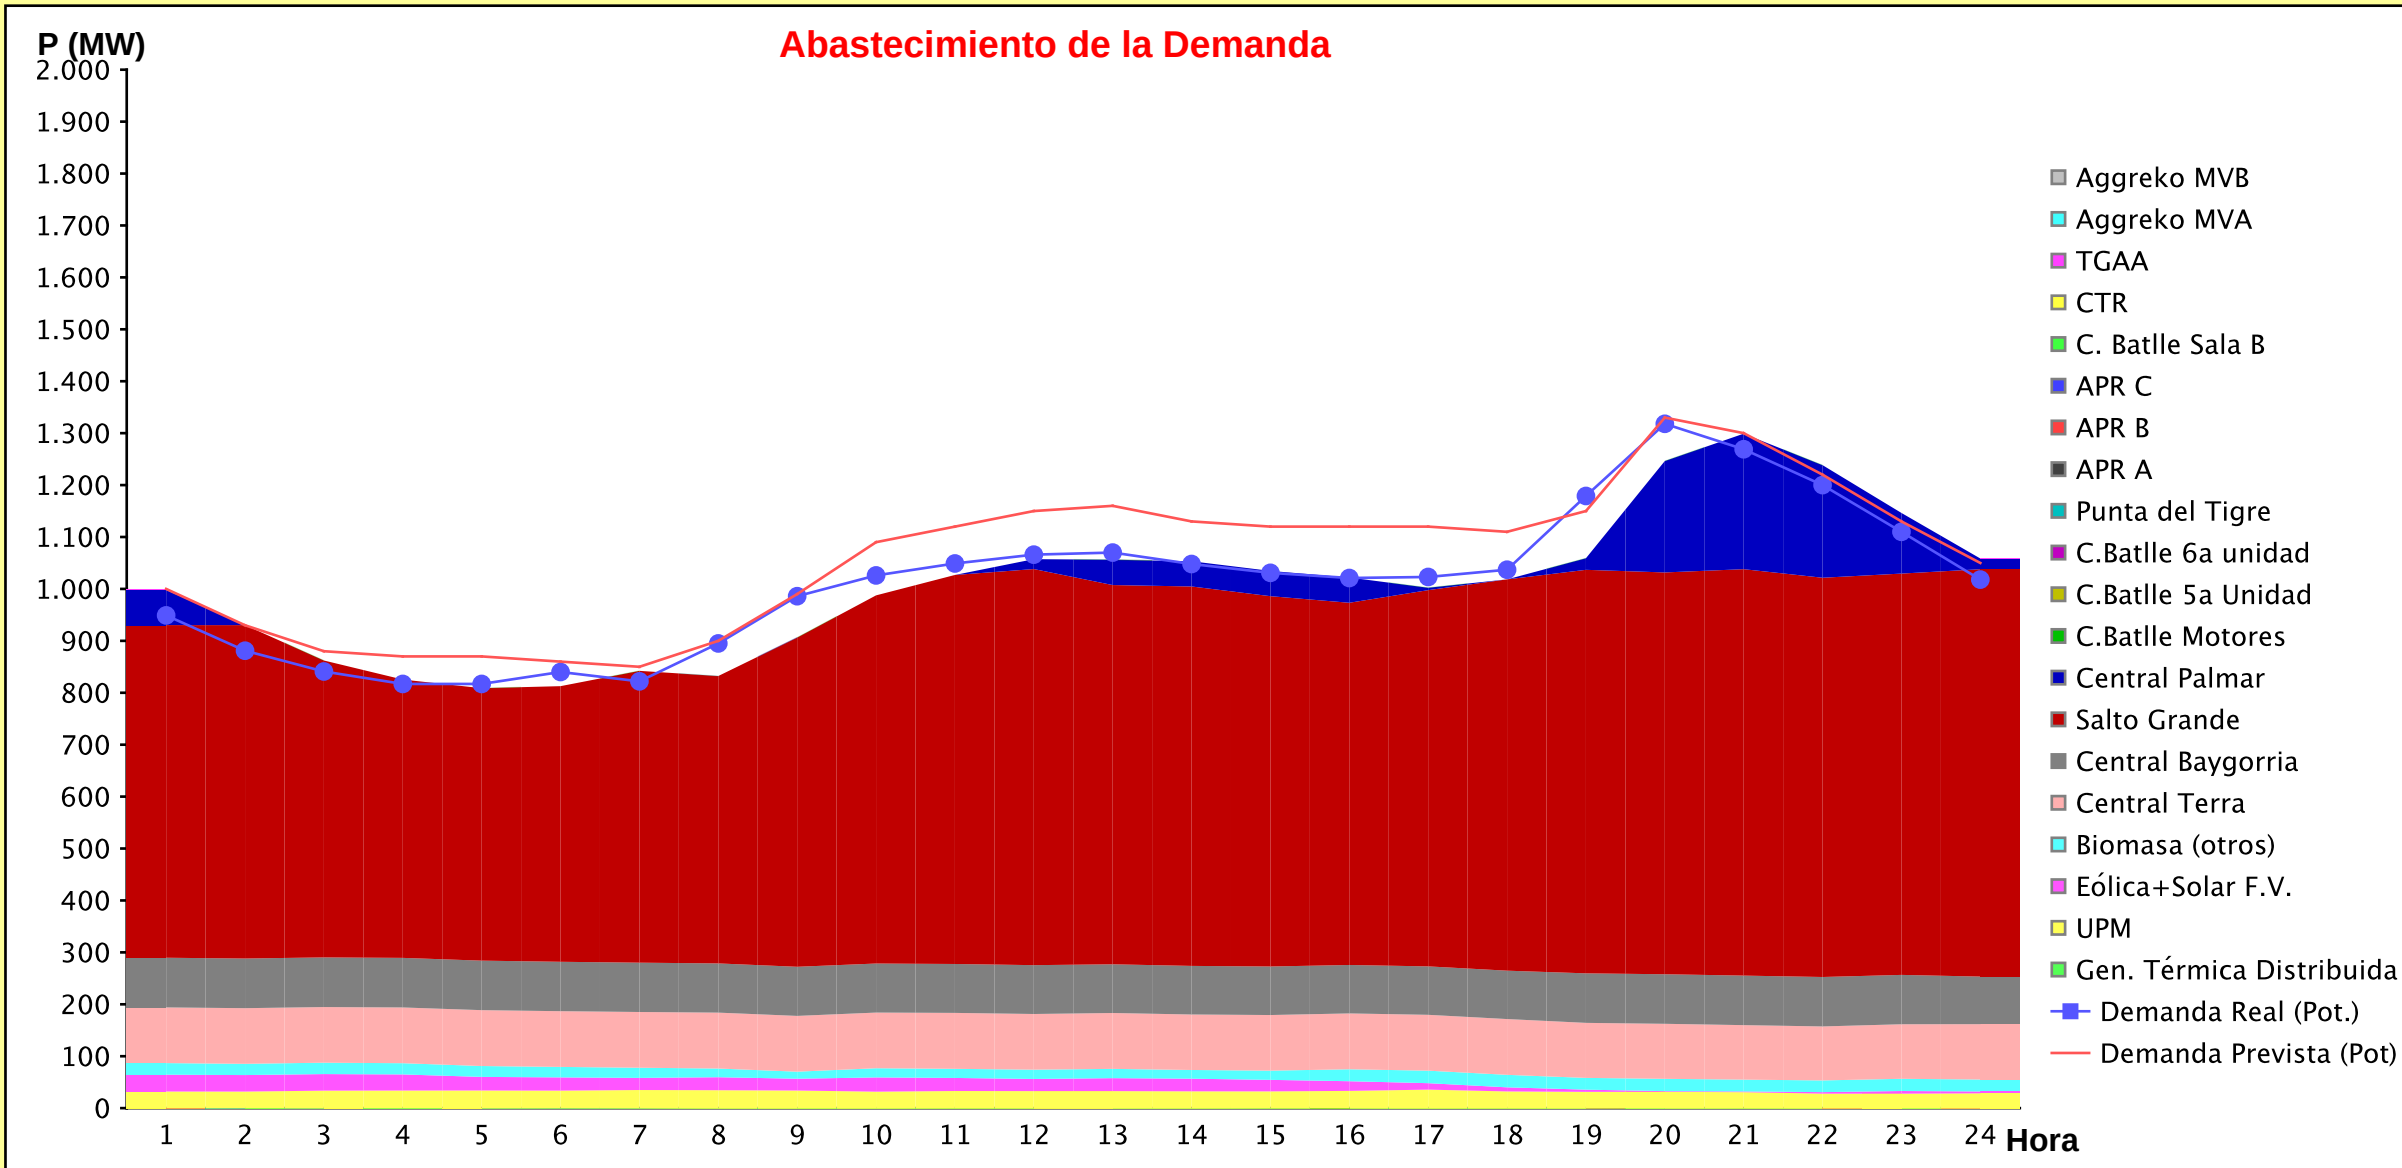



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1110,73 Hora 12:58
Potencia mínima:	835,49 Hora 04:23
Pico noche:	1336,3 Hora 20:05

Generación Media (MW)	
Eólica	18,9
Biomasa	59,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

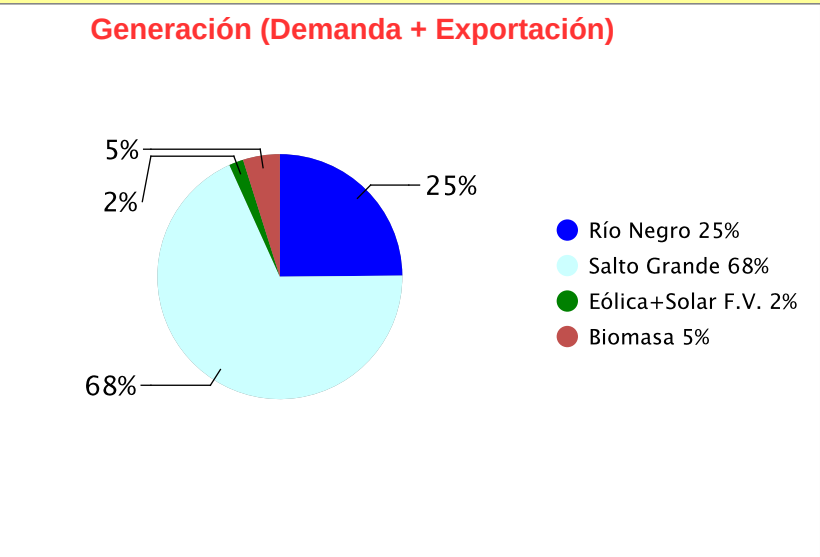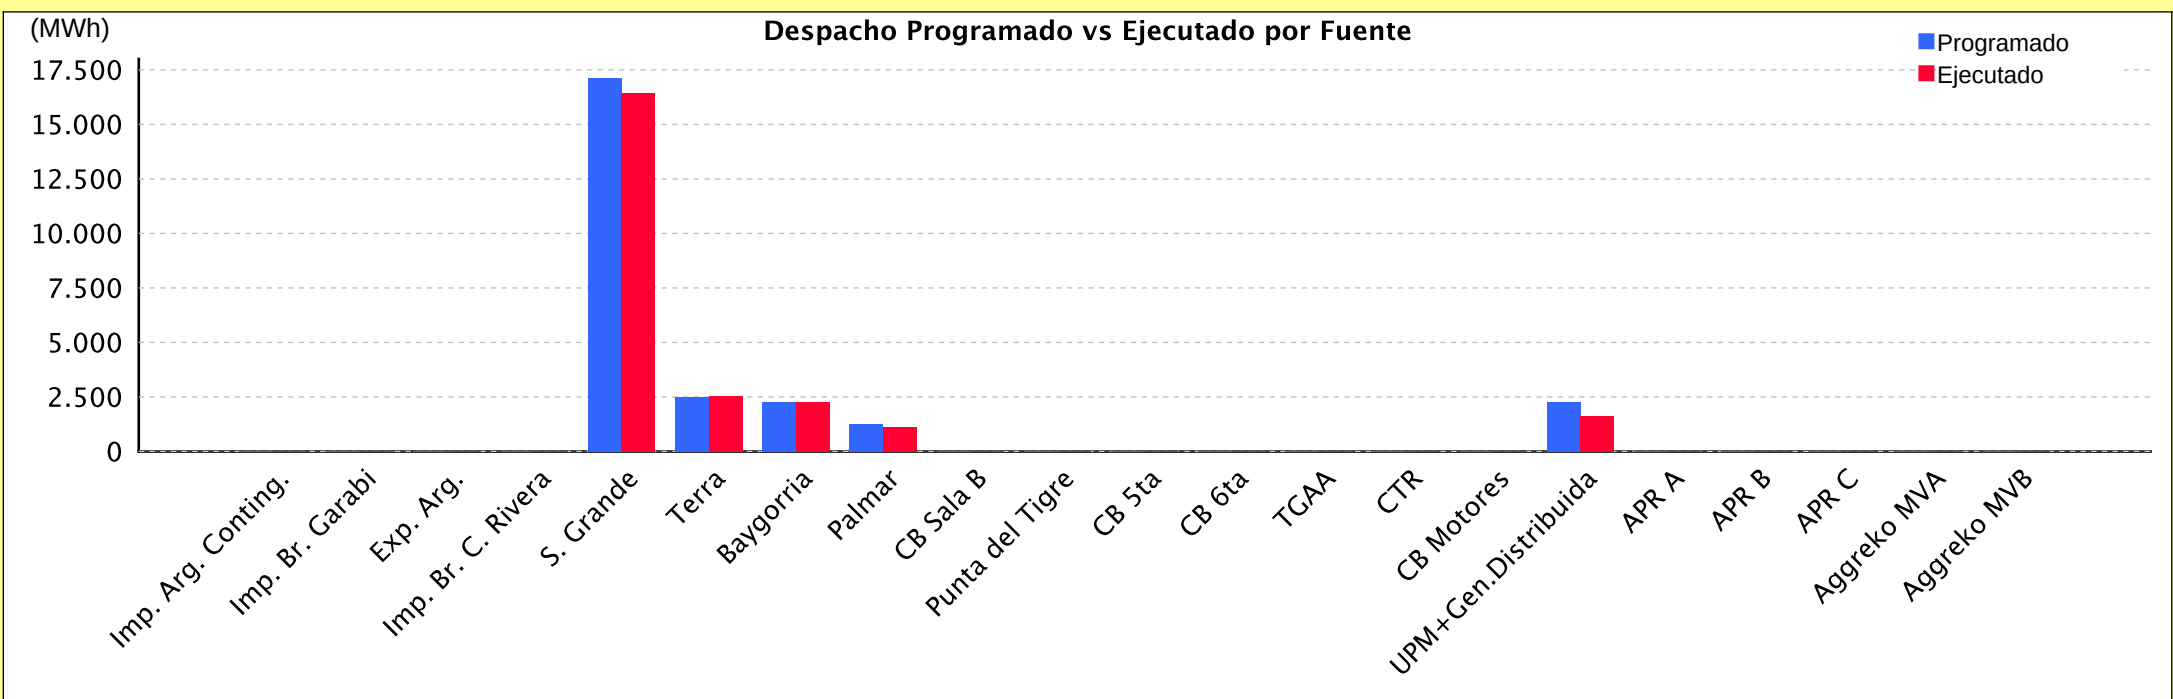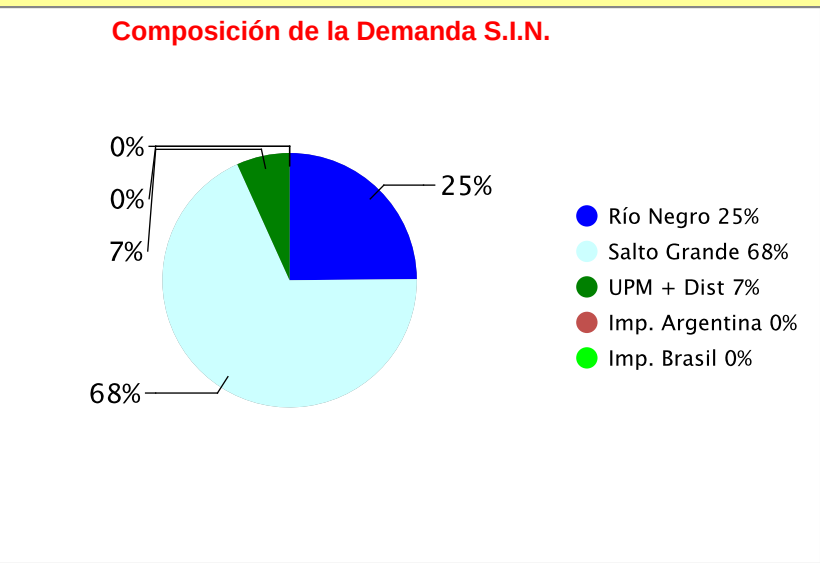



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

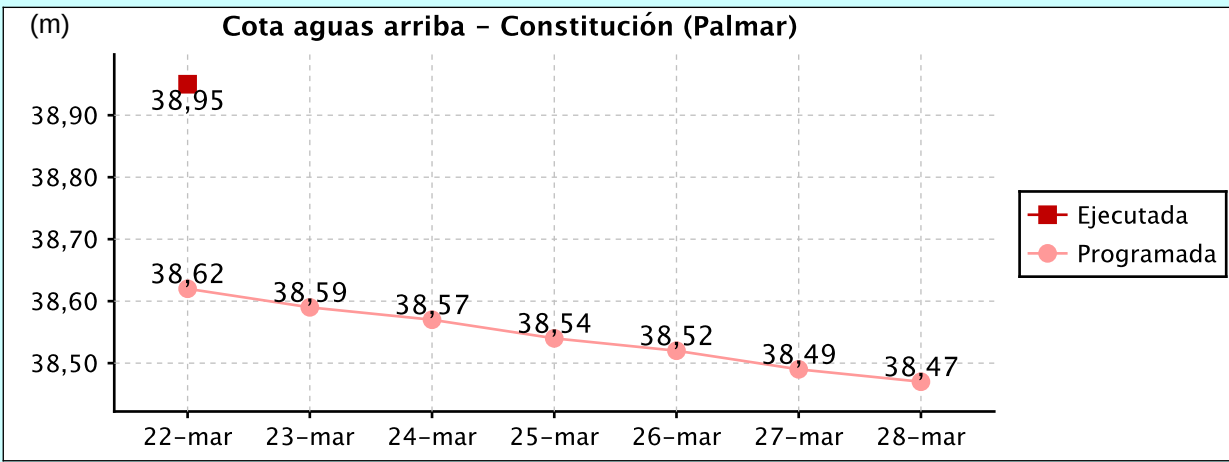
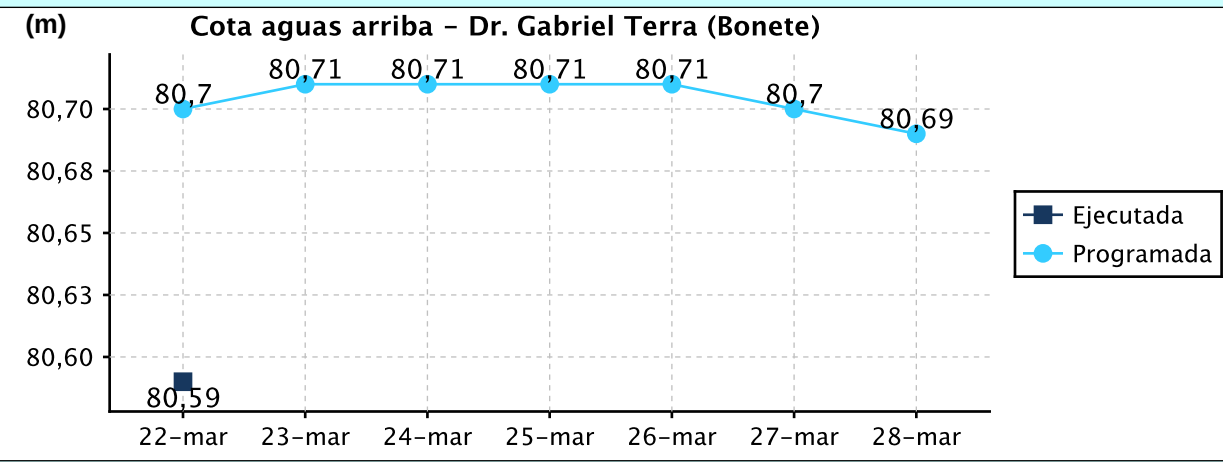


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,70	80,59
Baygorria	53,94	53,59
Palmar	38,62	38,95
SGU	33,91	33,98

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

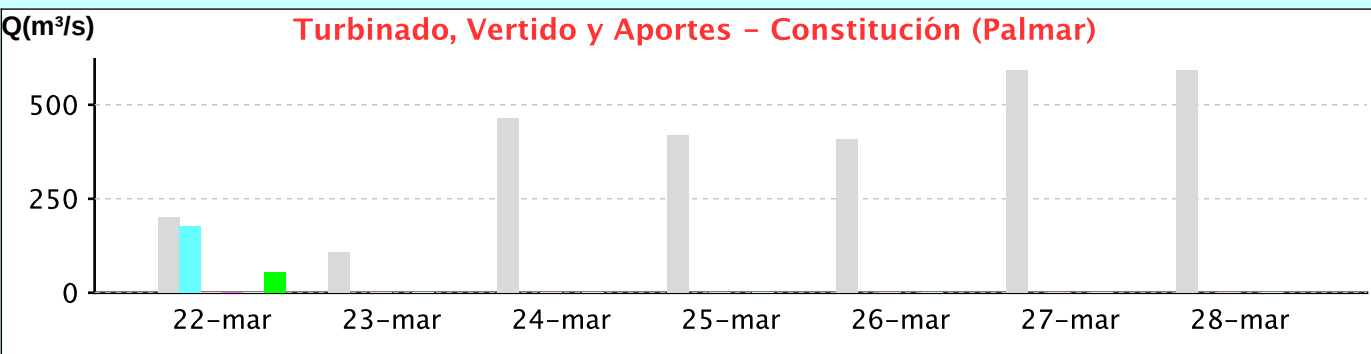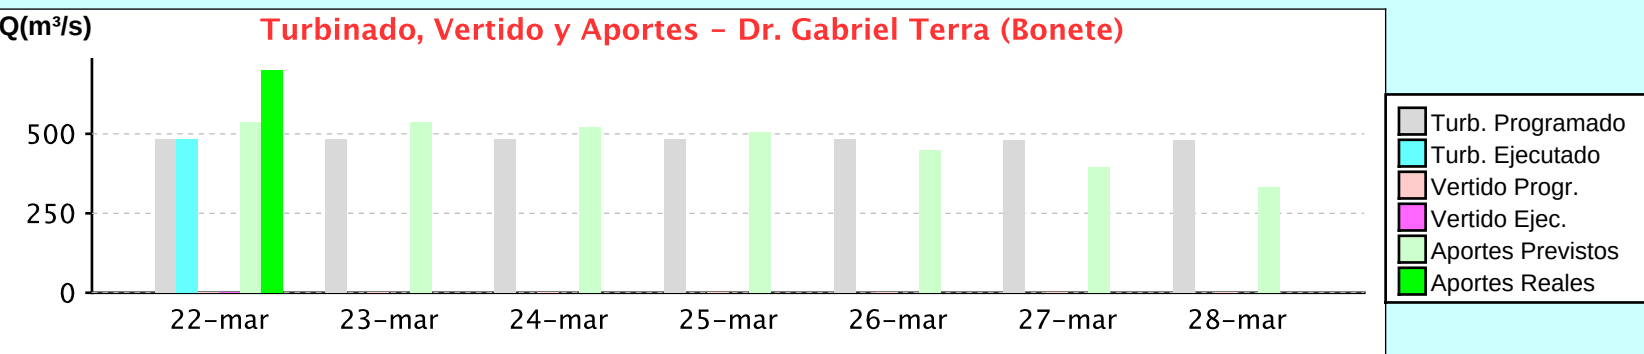

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

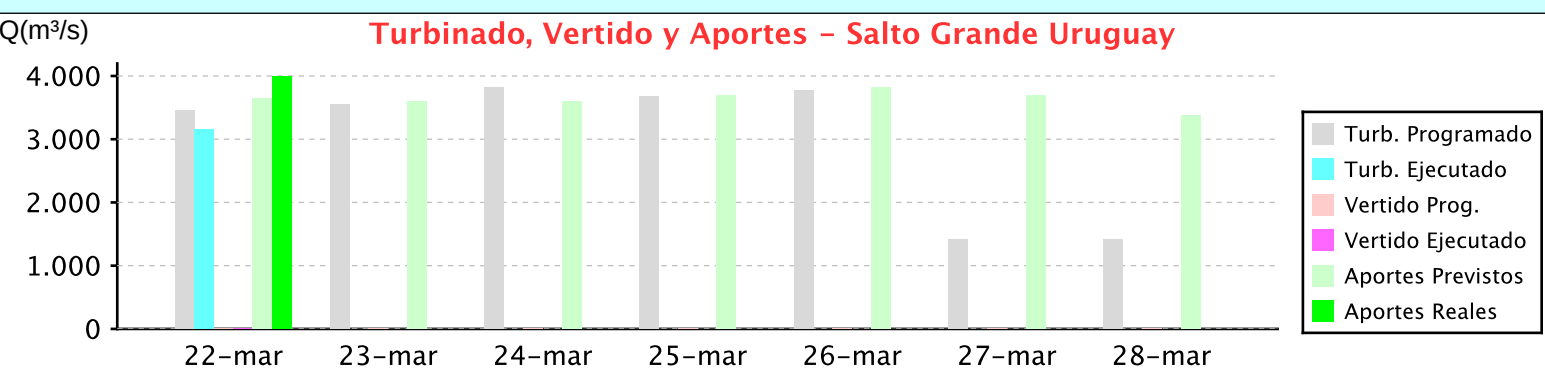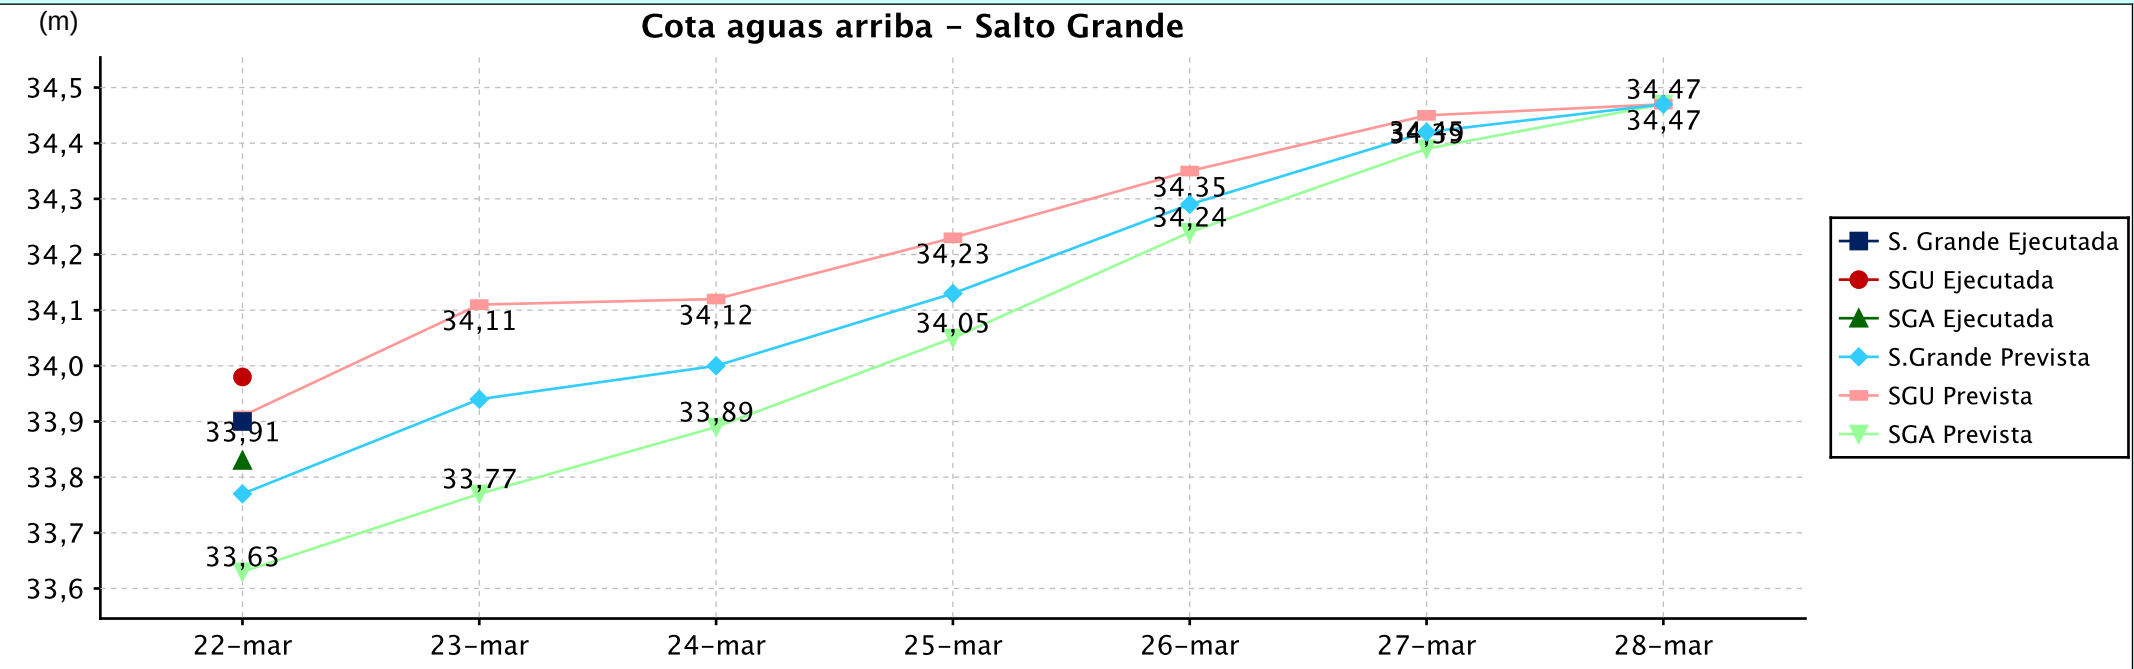

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,98
Cota Vista Arg	33,83
Cota real	33,90

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	3.200
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	484	484
Baygorria	776	783
Palmar	201	177
SGU	3.450	3.149

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	536	700
Baygorria	0	32
Palmar	0	54
SGU	3.650	3.998

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
