



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 25 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	80
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	84
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	0
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.539
C. Baygorria	1.203
C. Palmar	3.064
C. Salto Grande	18.874
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.250
TOTAL Generación	26.962

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.962
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.760
Diferencia (MWh)	202
Ejecutada - Programada	0,75 %

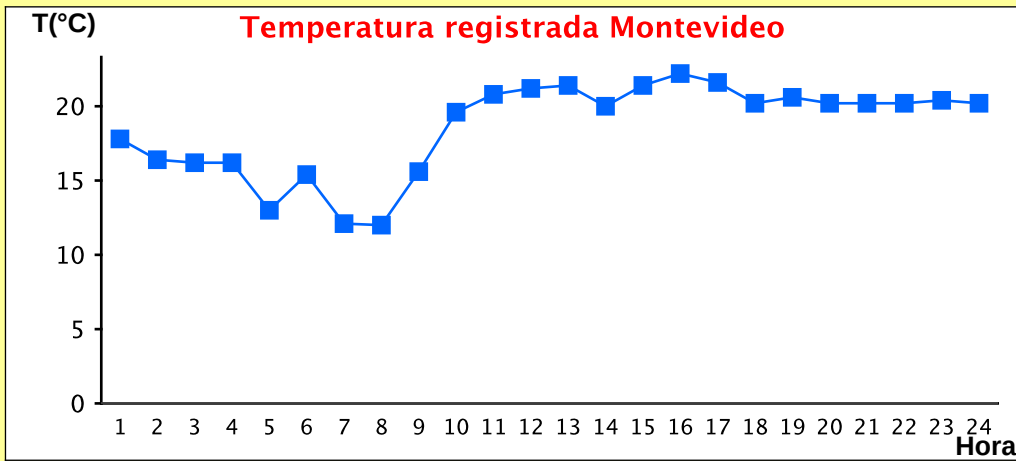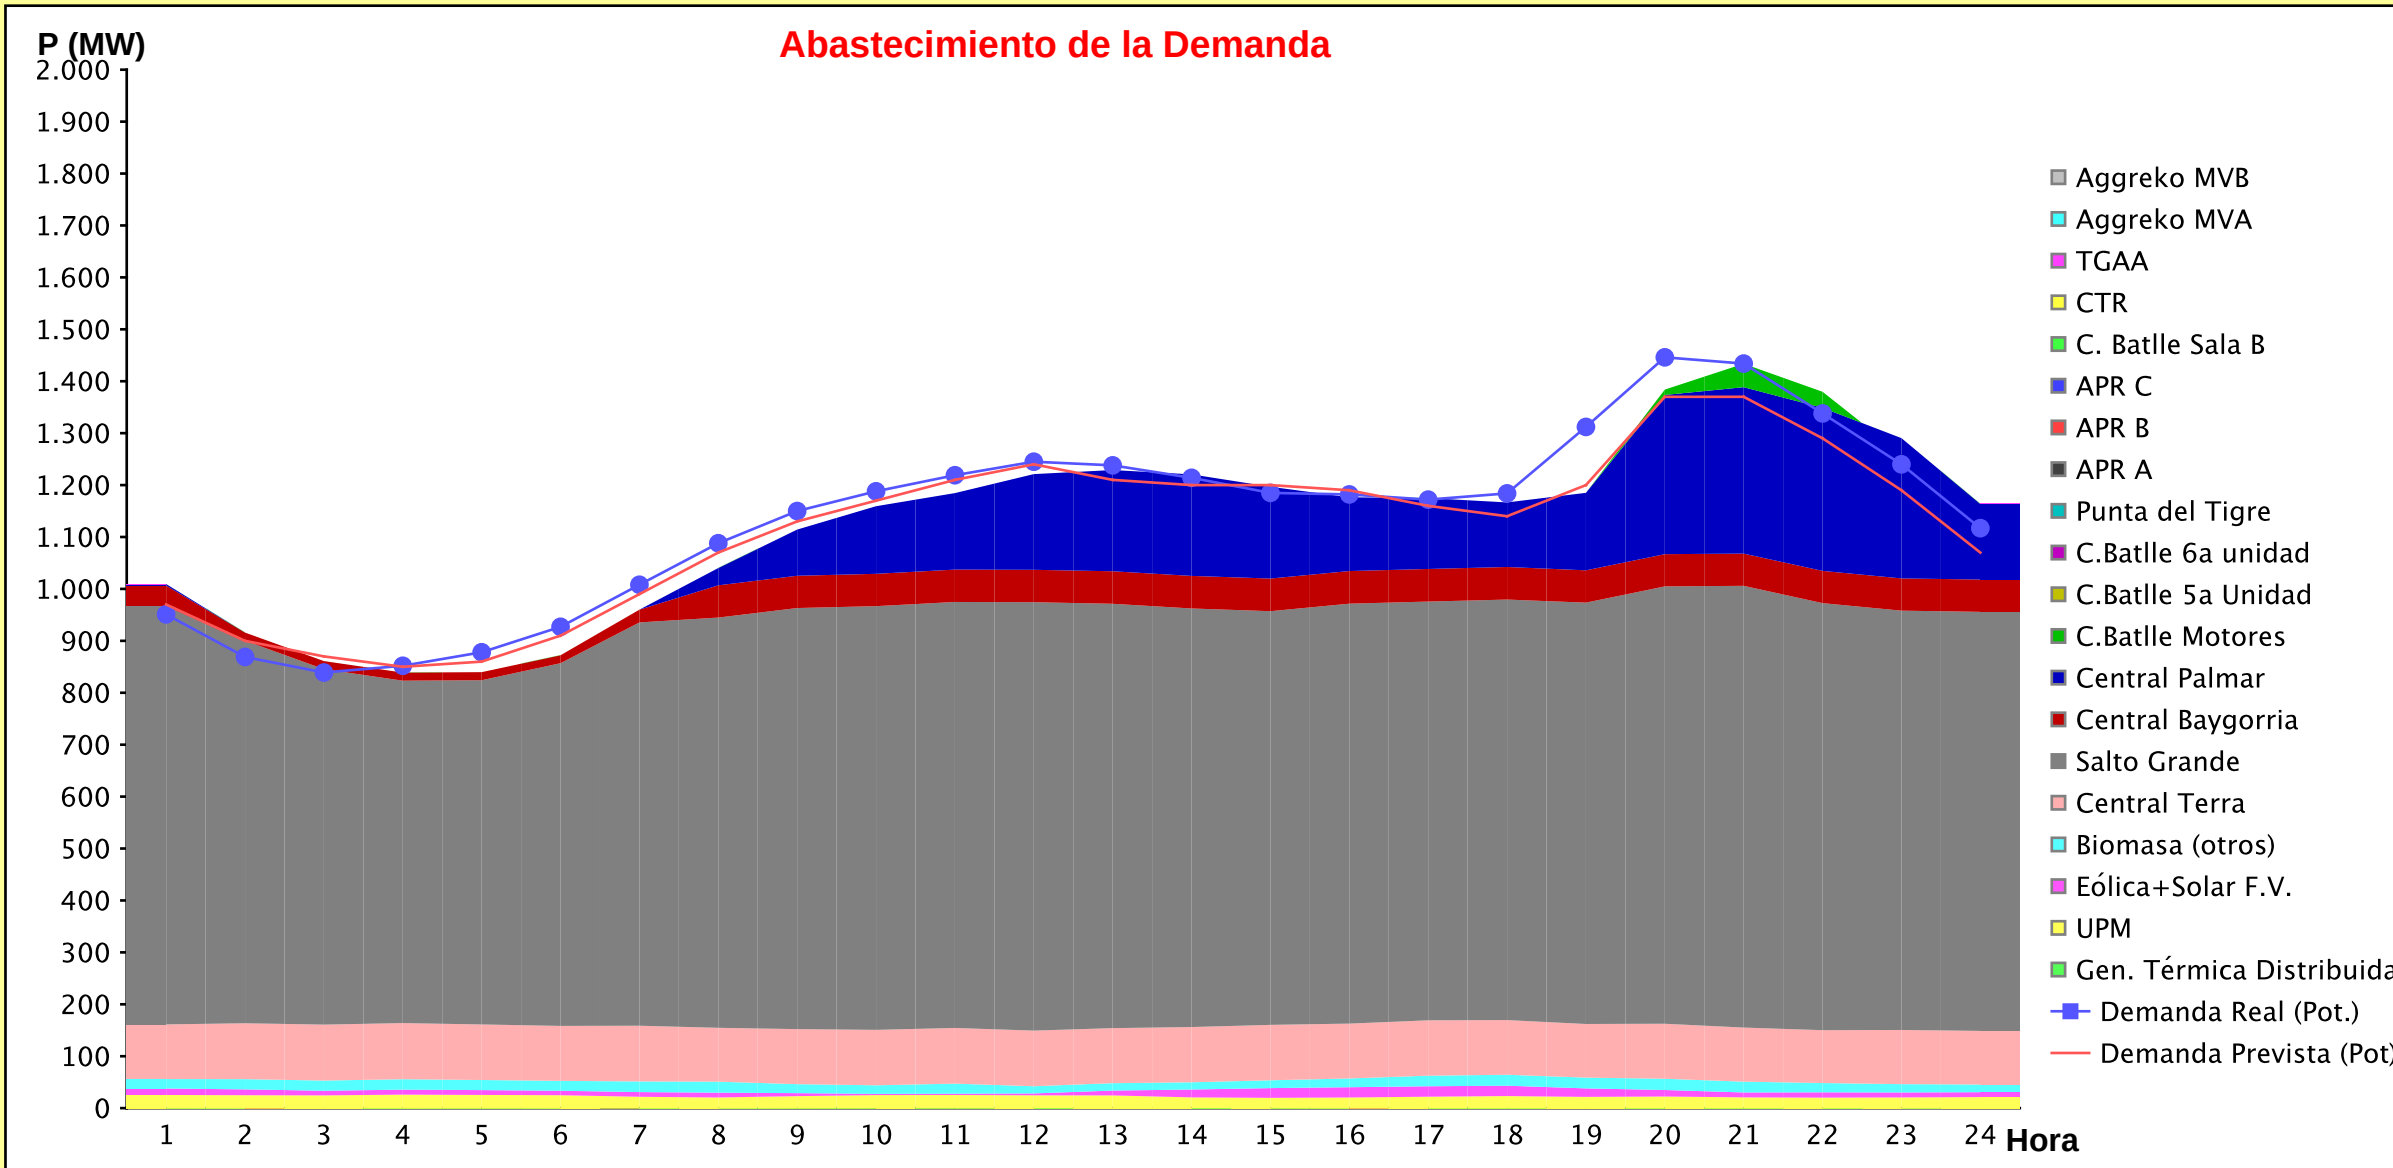



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1296,31 Hora 12:02
Potencia mínima:	840,74 Hora 03:33
Pico noche:	1467,23 Hora 19:48

Generación Media (MW)	
Eólica	11,1
Biomasa	49,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

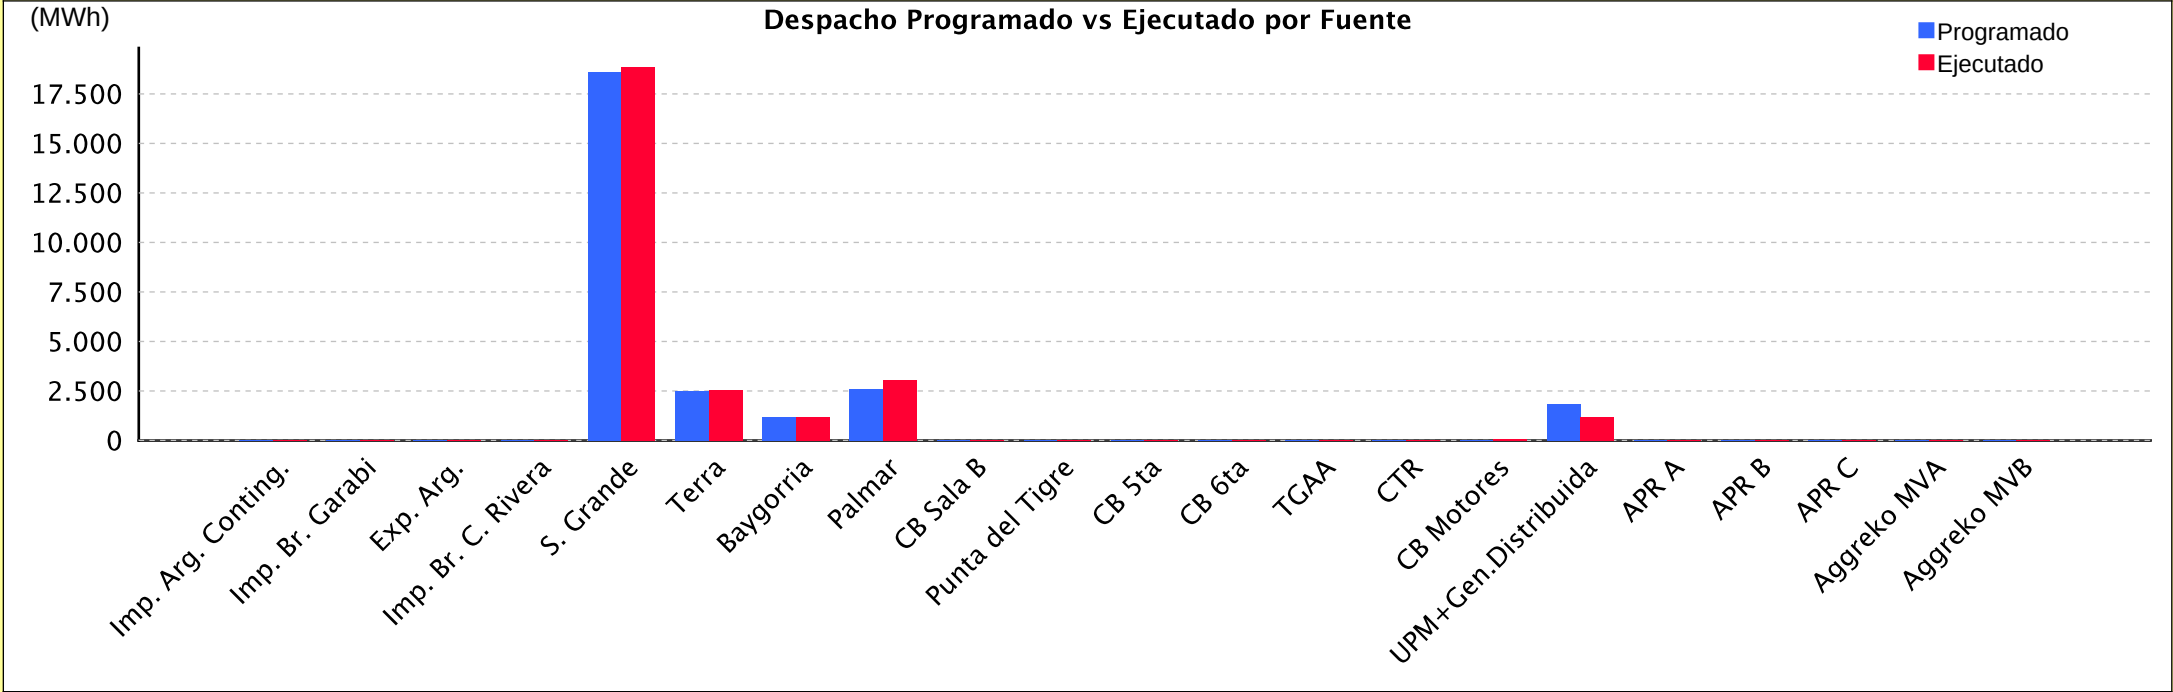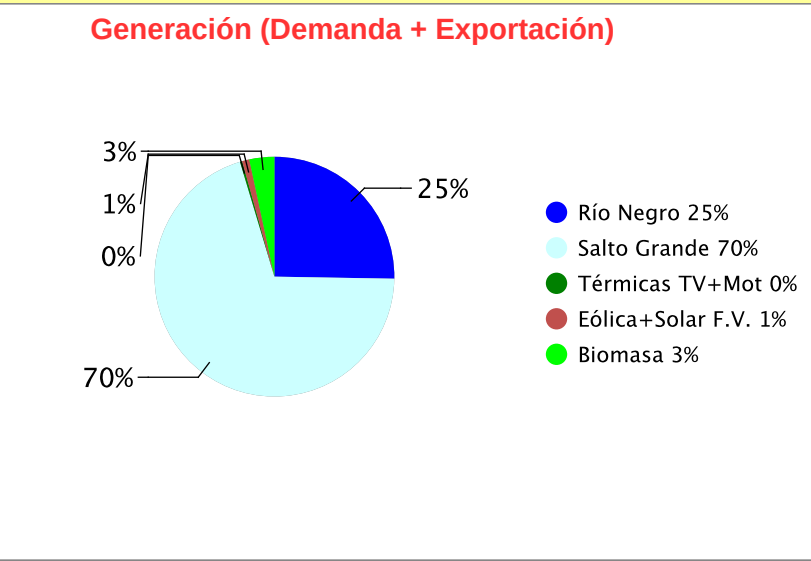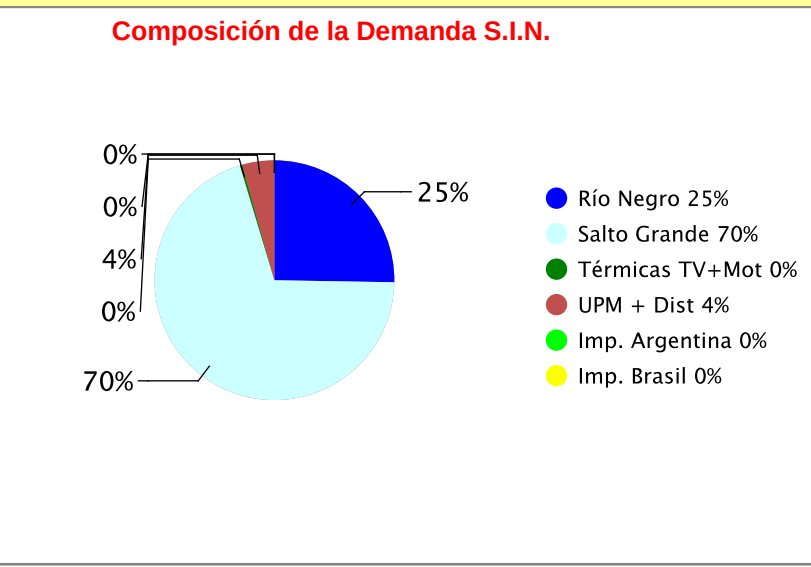



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

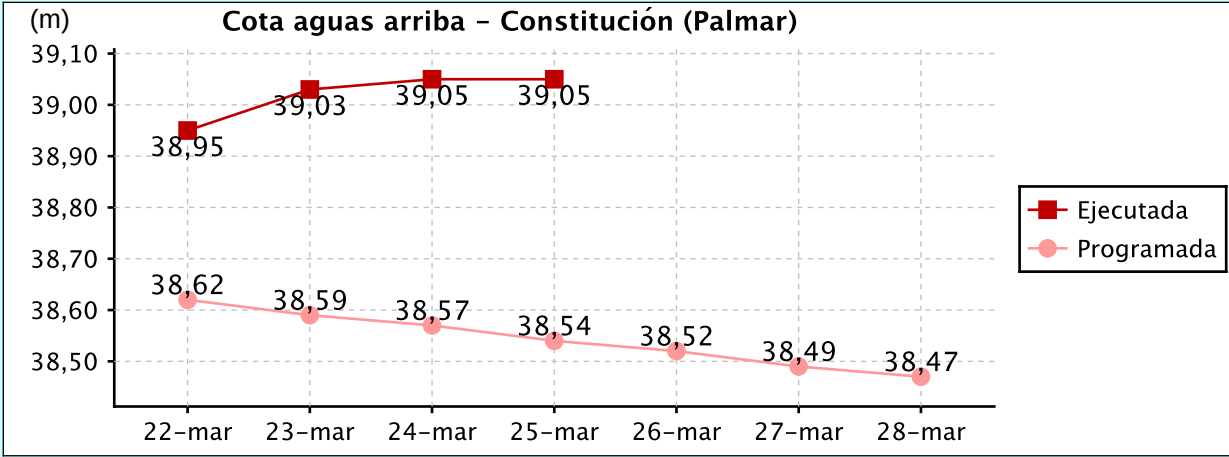
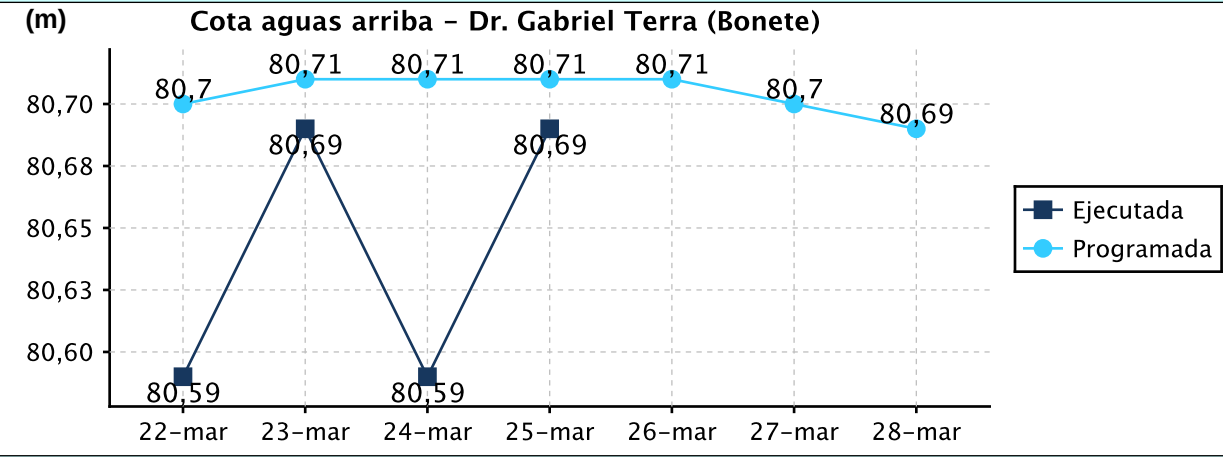


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,71	80,69
Baygorria	53,86	53,92
Palmar	38,54	39,05
SGU	34,23	34,62

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

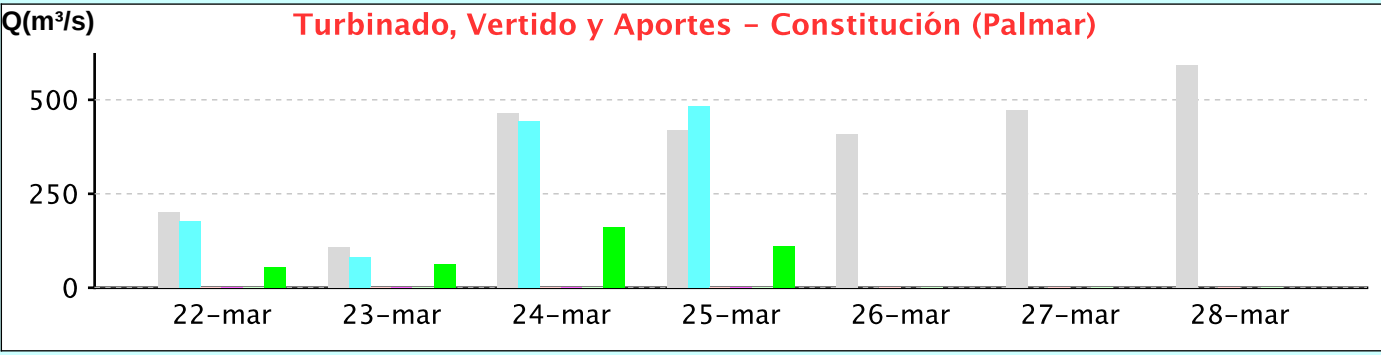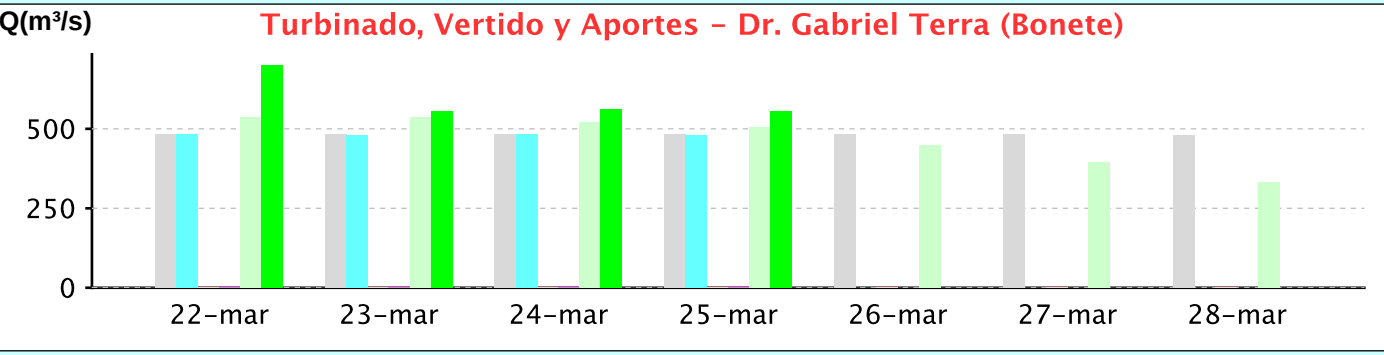

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

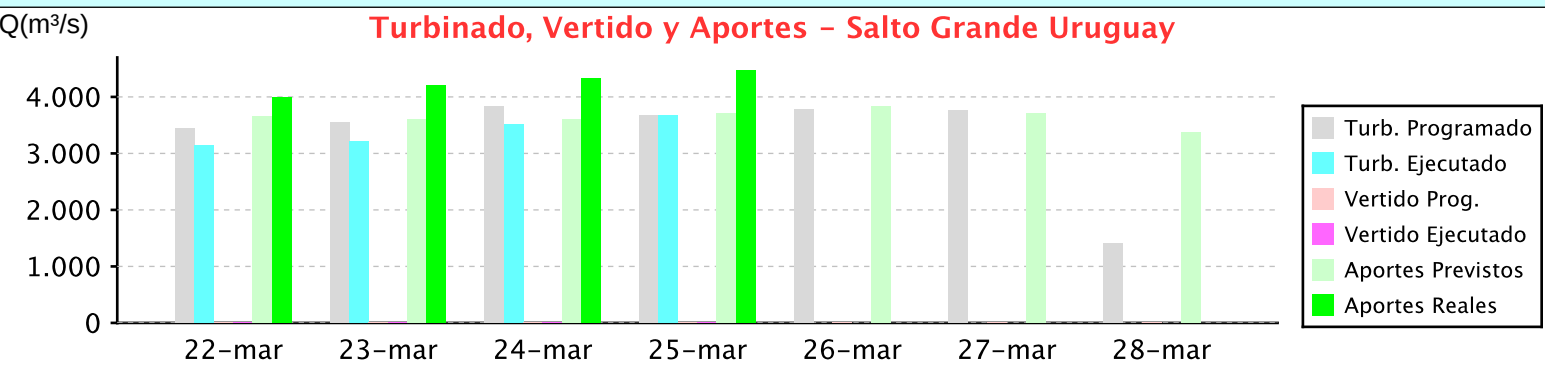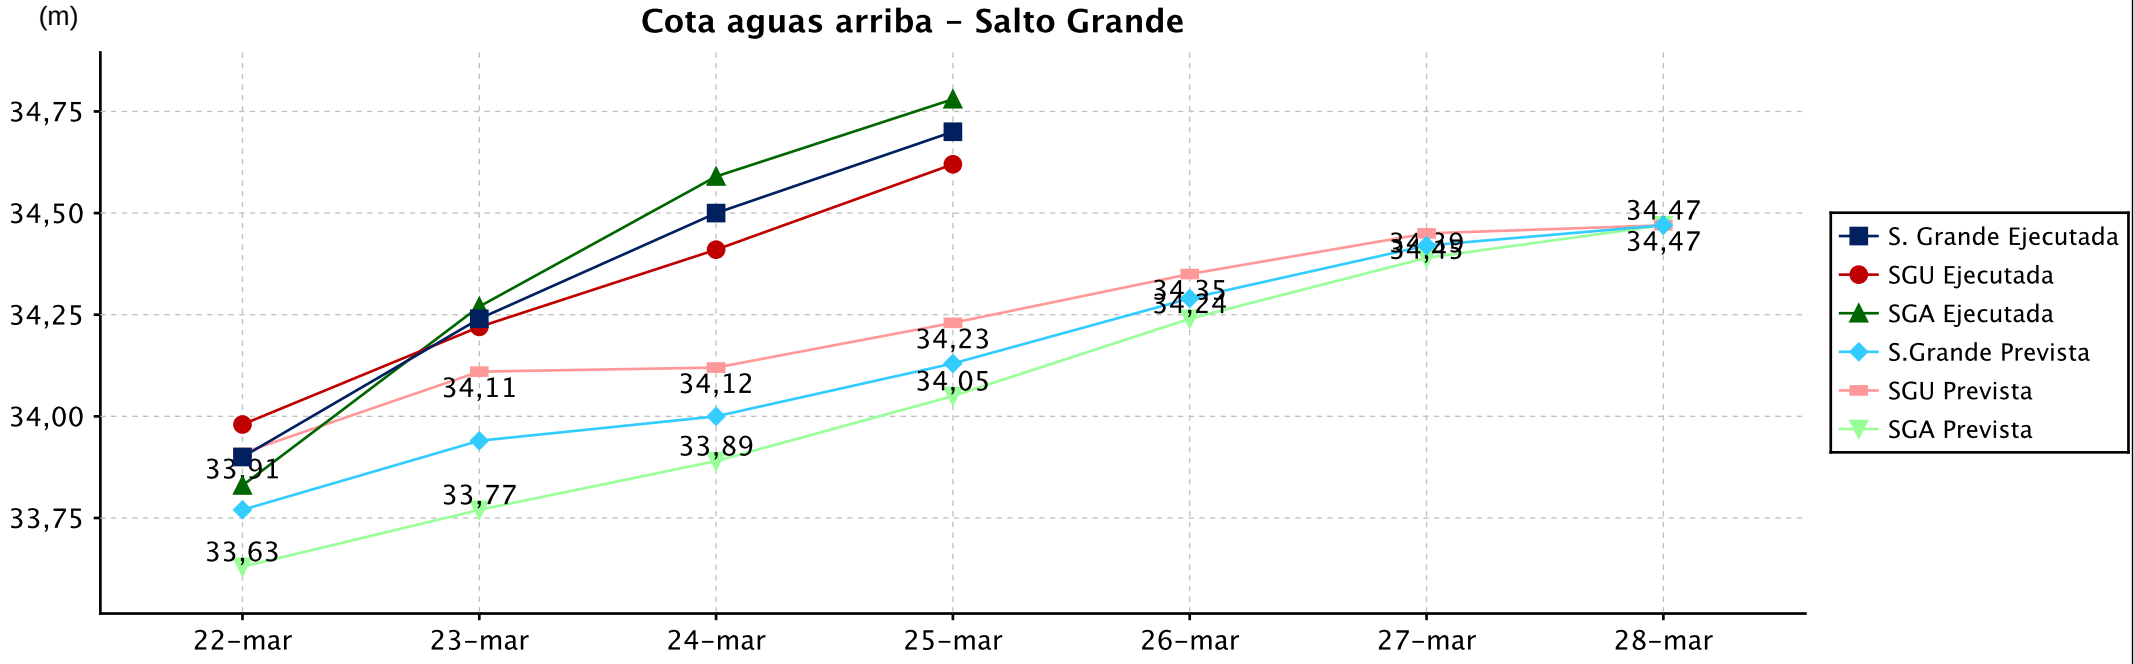

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,62
Cota Vista Arg	34,78
Cota real	34,70

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-3.620
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	484	479
Baygorria	405	398
Palmar	418	483
SGU	3.674	3.668

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	504	556
Baygorria	0	-1
Palmar	0	110
SGU	3.700	4.474

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
