



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 26 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	54
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	58
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	0
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.555
C. Baygorria	1.240
C. Palmar	3.150
C. Salto Grande	18.960
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.326
TOTAL Generación	27.238

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.238
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.450
Diferencia (MWh)	-212
Ejecutada - Programada	-0,77 %

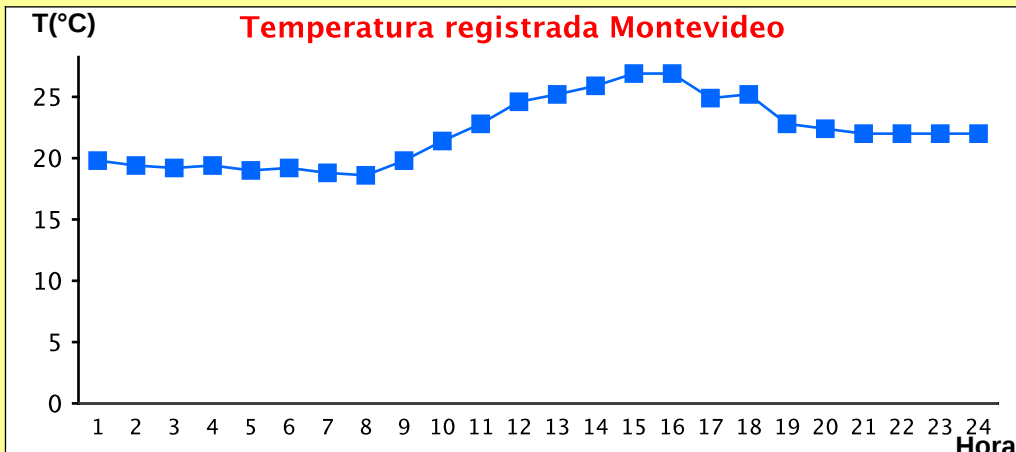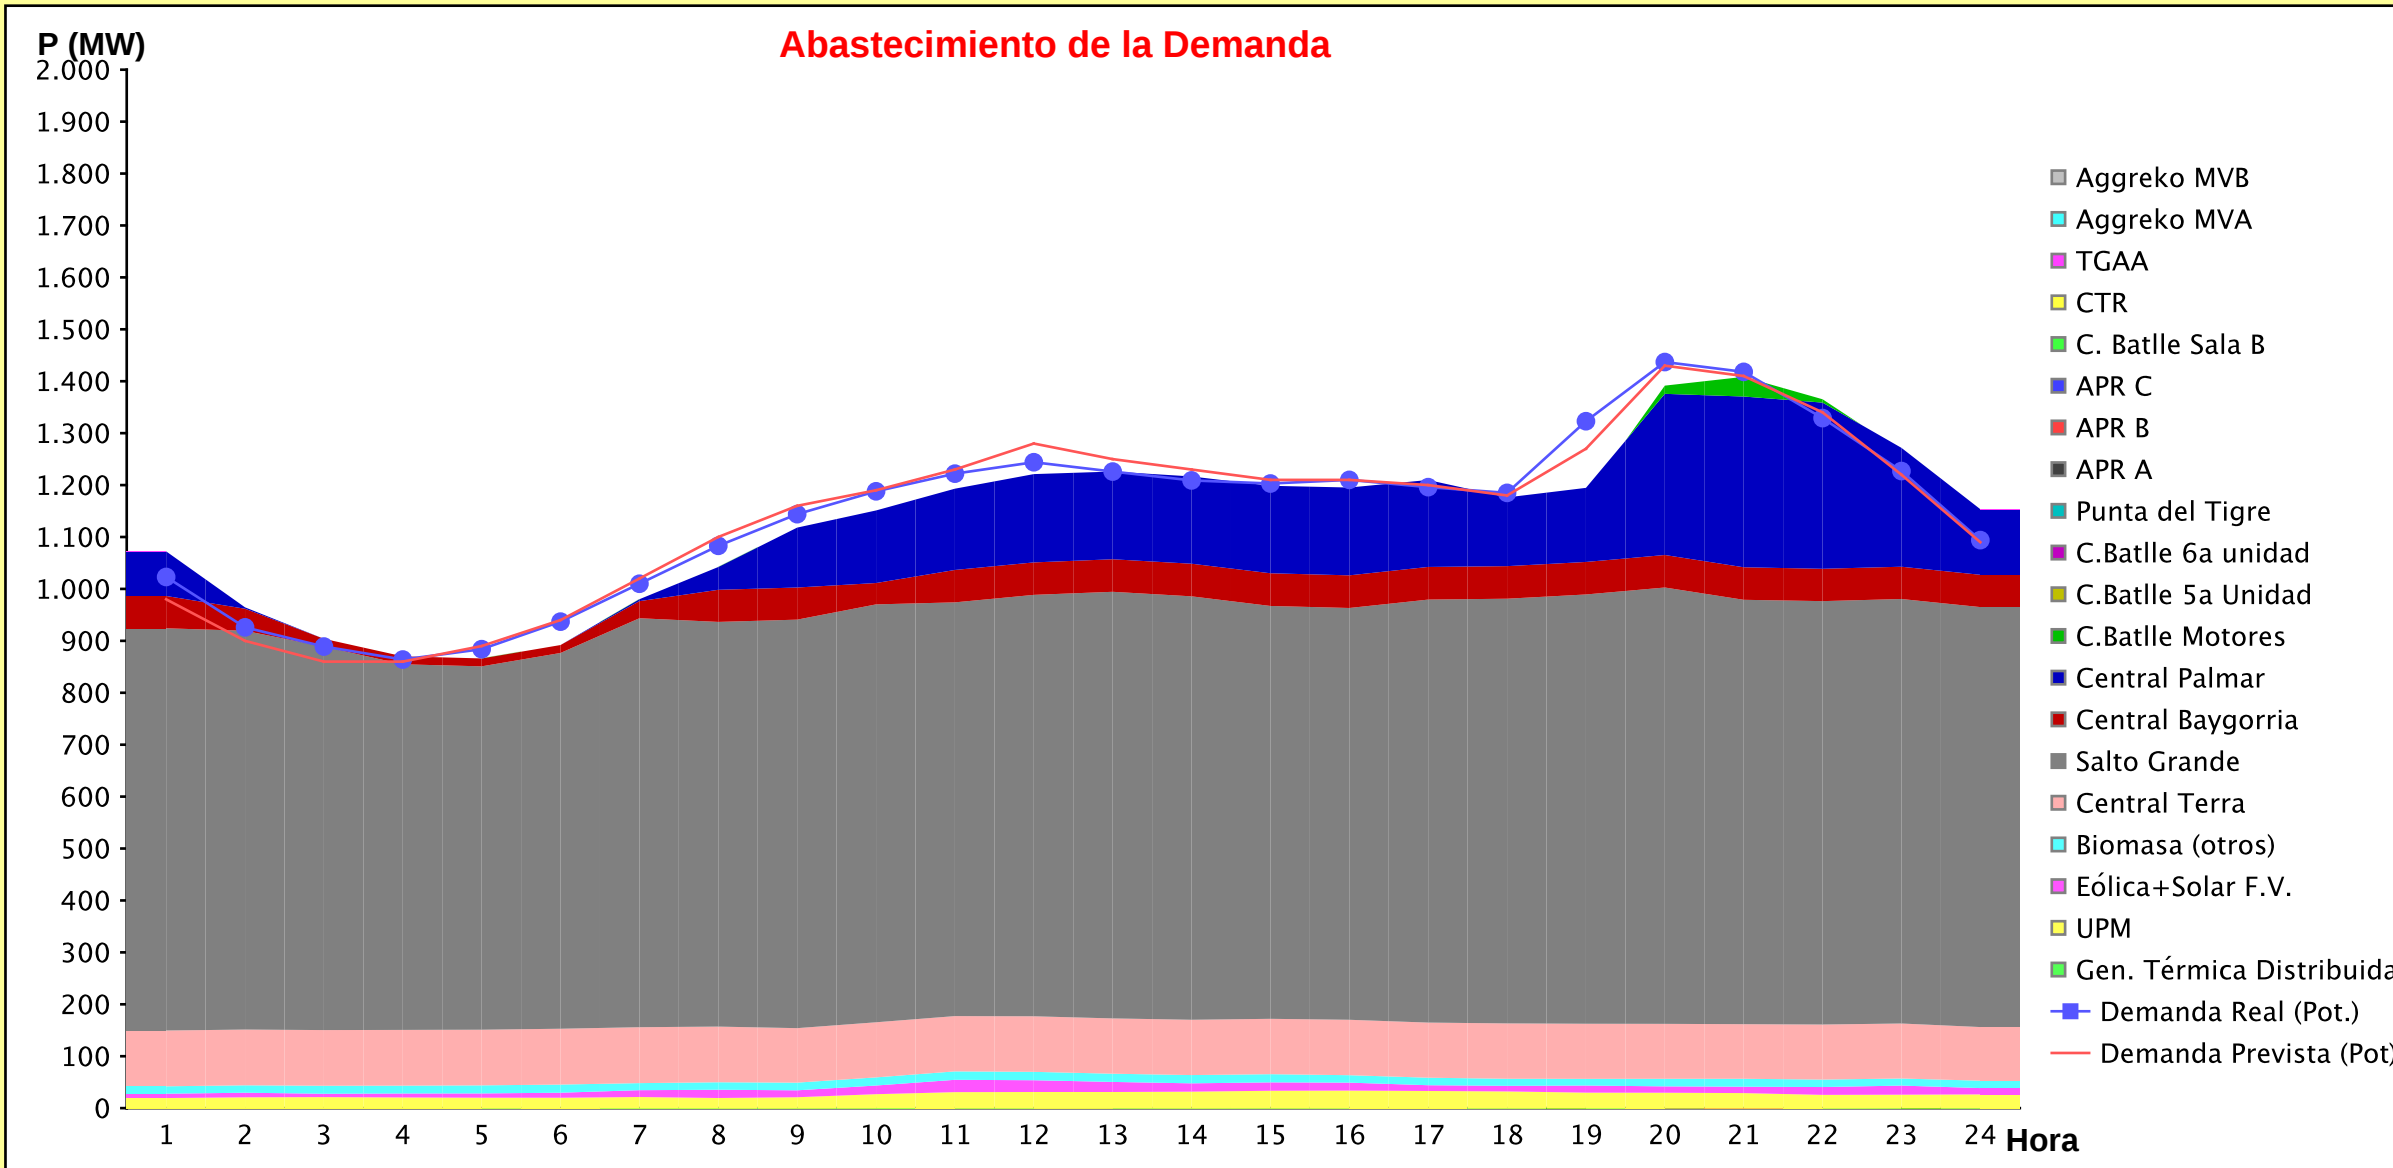



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1302,44 Hora 11:39
Potencia mínima:	872,17 Hora 03:59
Pico noche:	1464,6 Hora 19:54

Generación Media (MW)	
Eólica	14,1
Biomasa	50,1
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

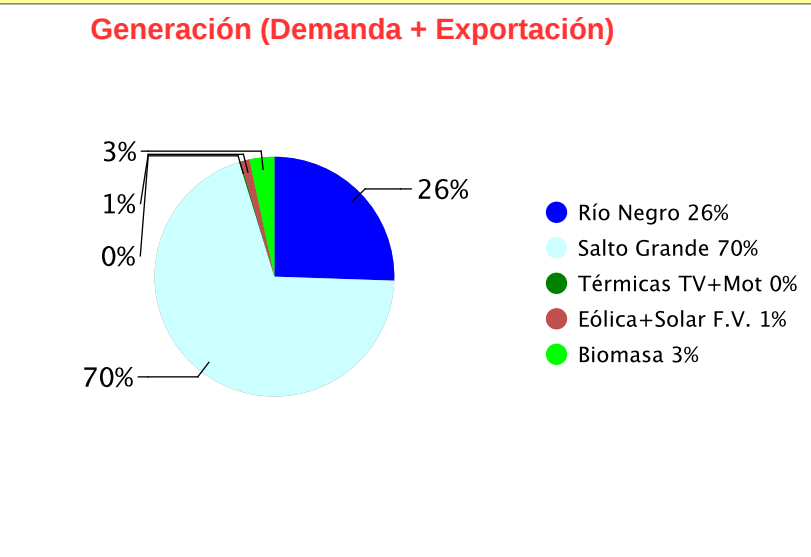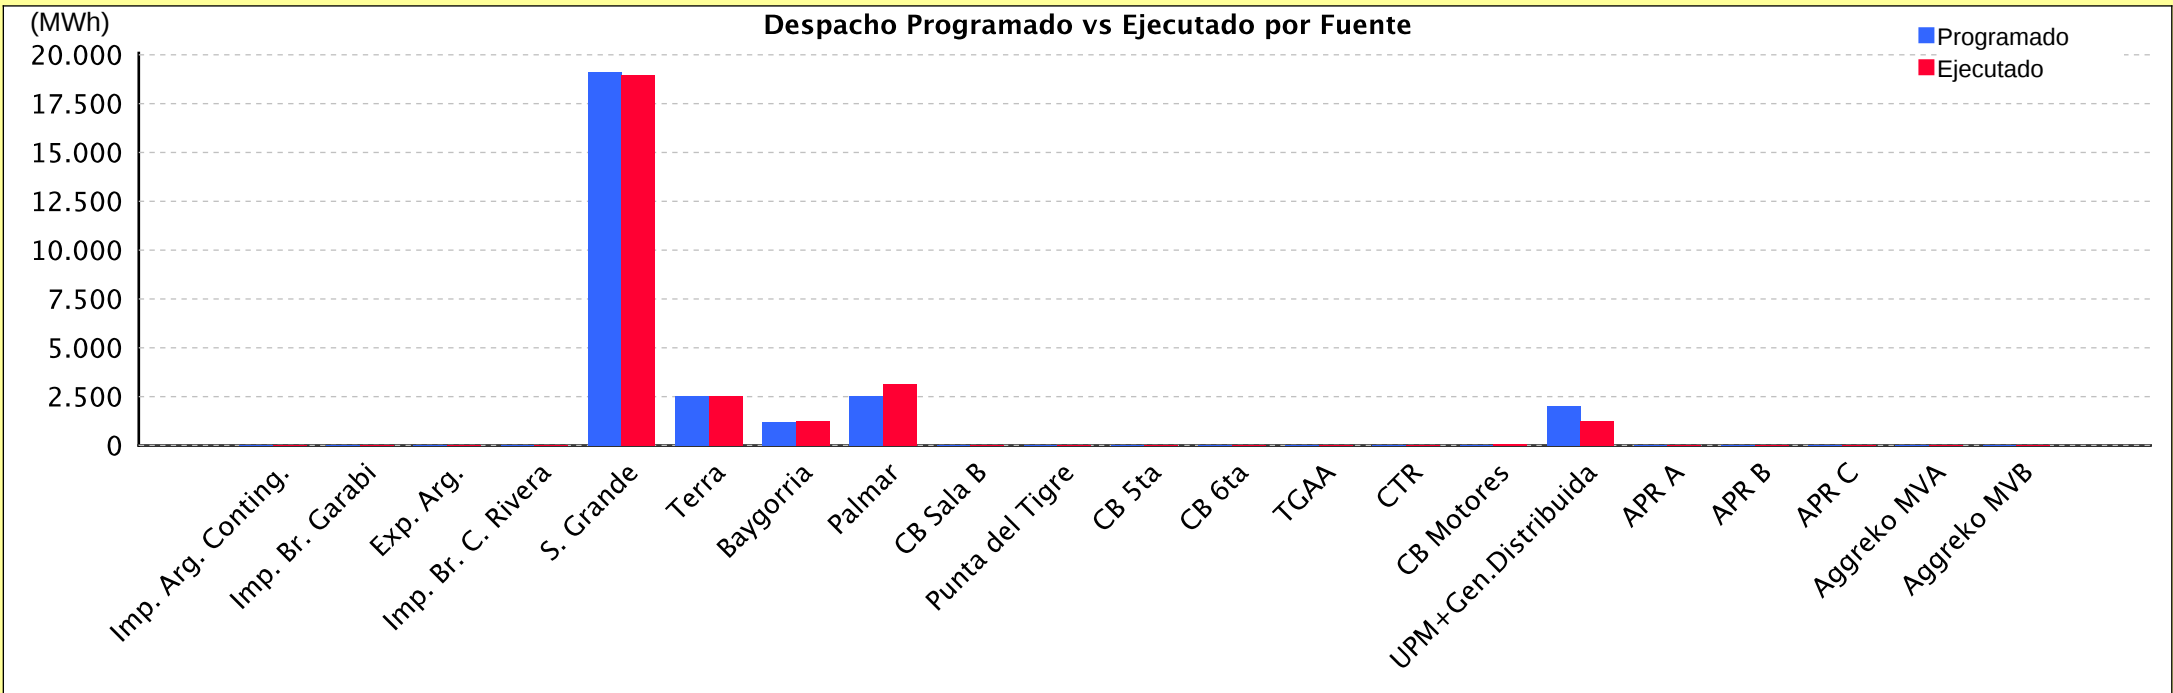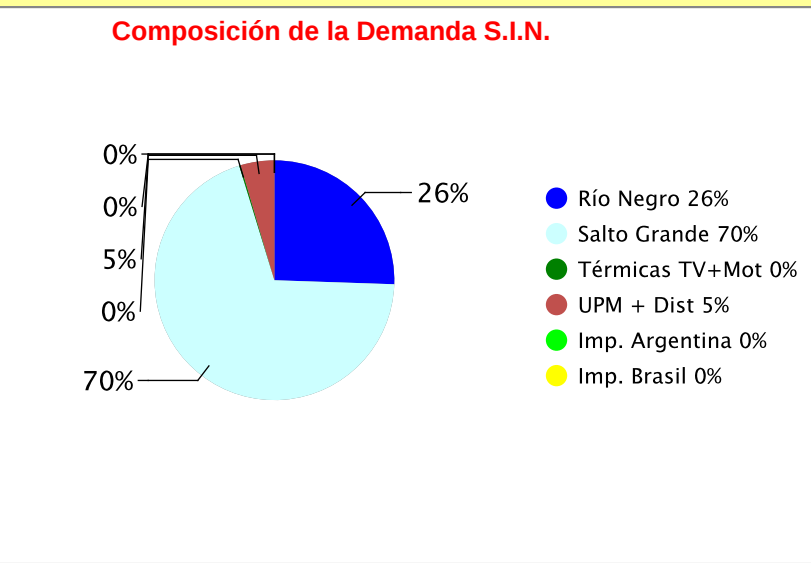



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

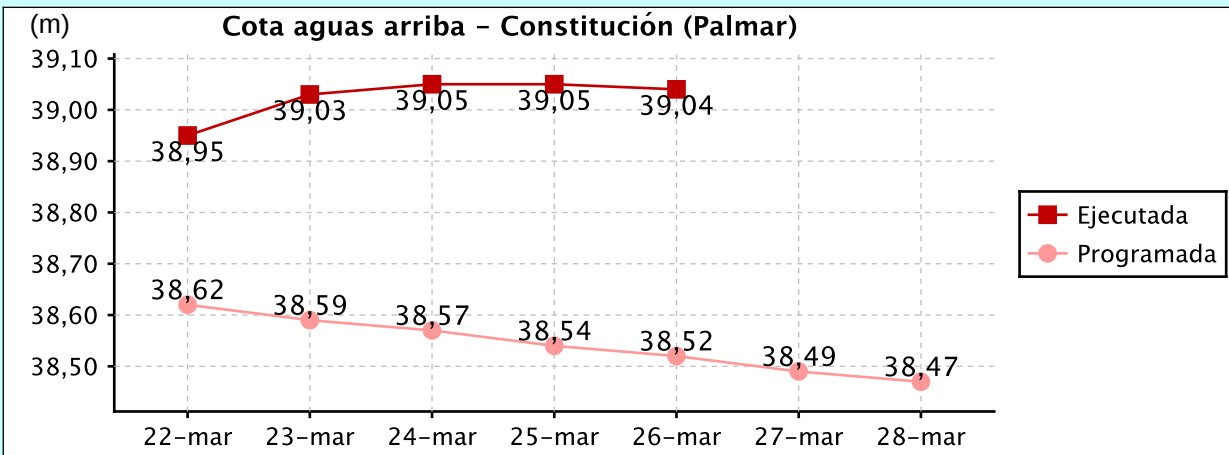
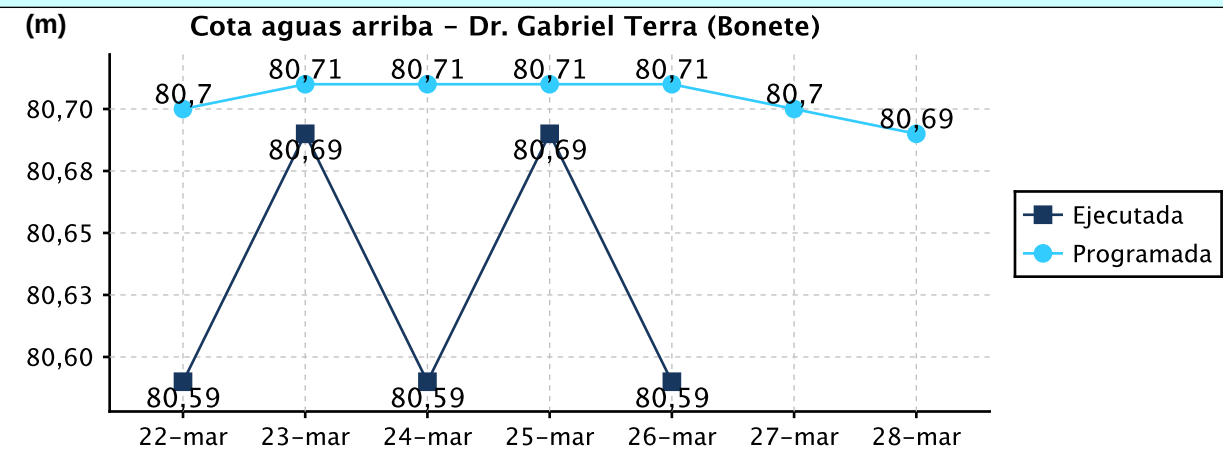


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,71	80,59
Baygorria	53,84	54
Palmar	38,52	39,04
SGU	34,35	34,84

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

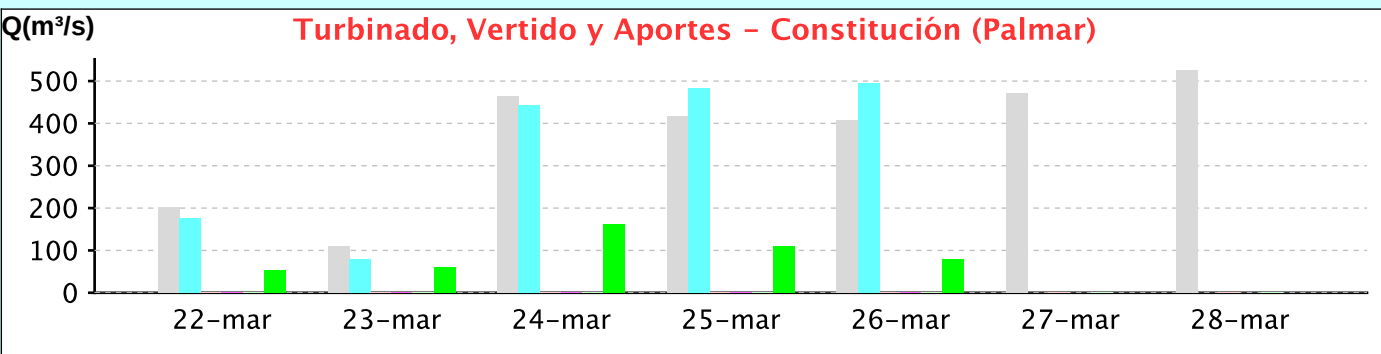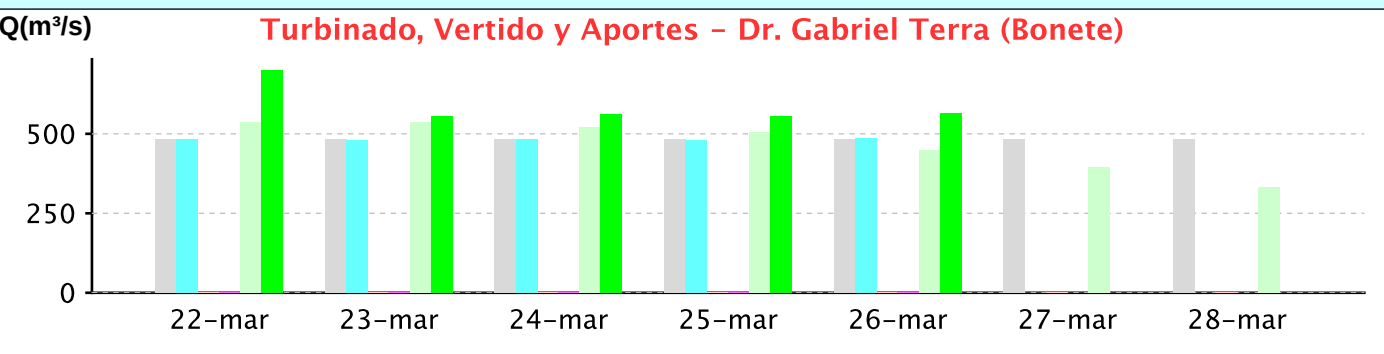

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

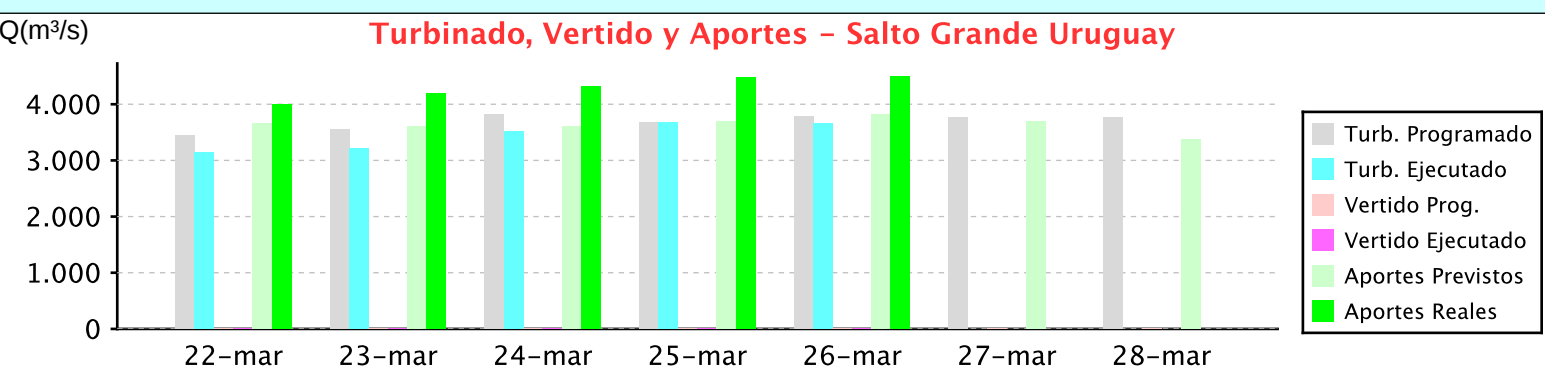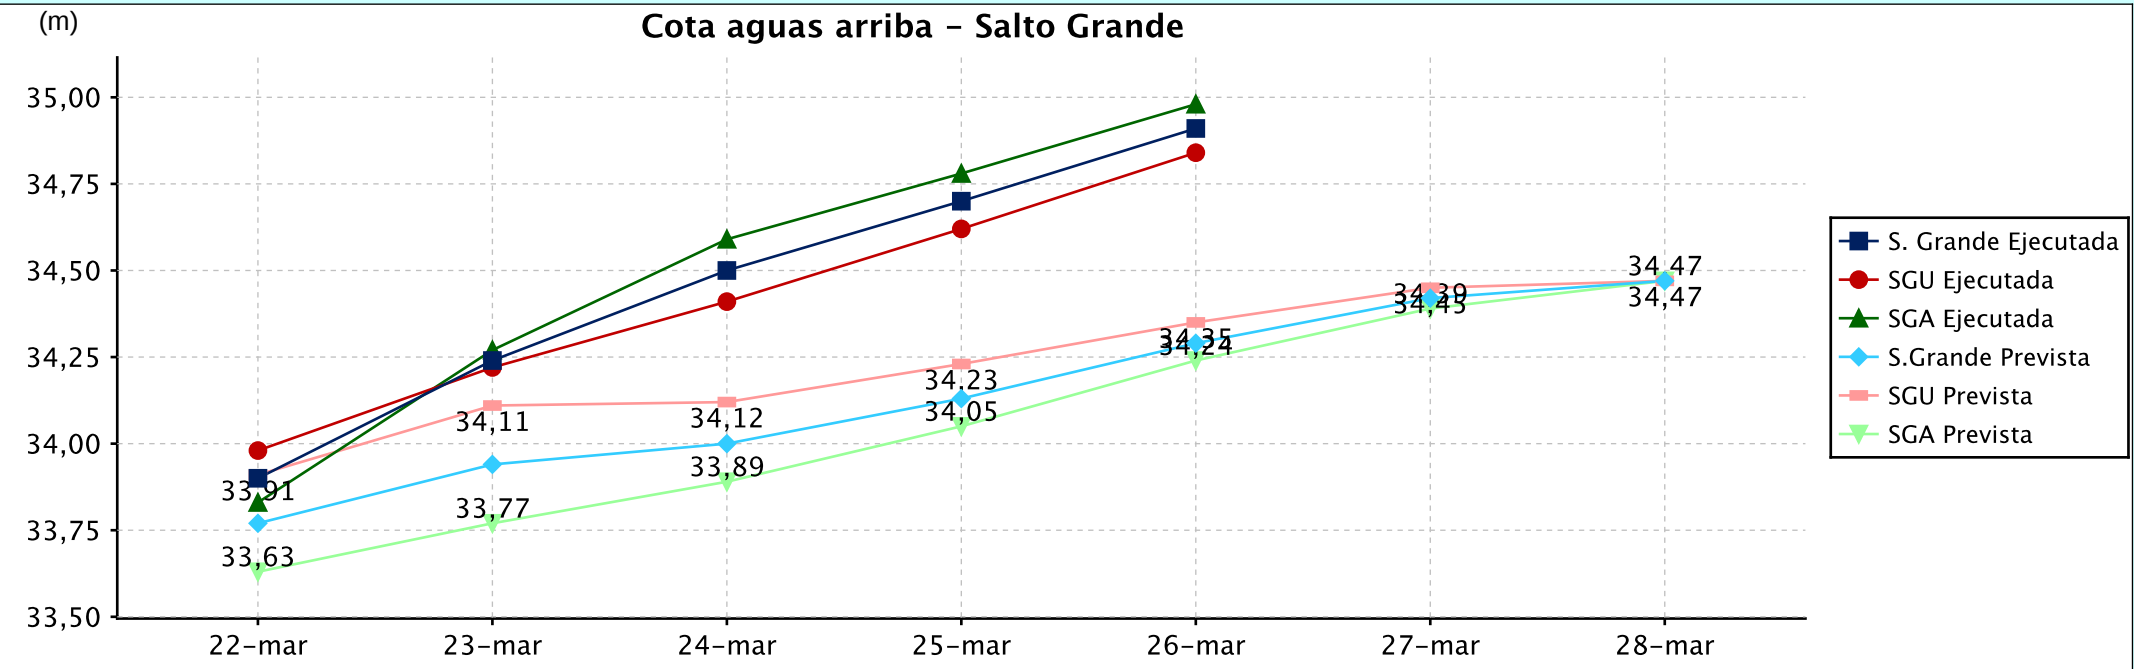

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,84
Cota Vista Arg	34,98
Cota real	34,91

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-3.330
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	484	487
Baygorria	415	408
Palmar	408	496
SGU	3.778	3.655

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	450	564
Baygorria	0	24
Palmar	0	79
SGU	3.825	4.501

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
