



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 27 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	130
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	134
Central La Tablada	-29
Central P. del Tigre	0
APR A	47
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.543
C. Baygorria	1.492
C. Palmar	3.535
C. Salto Grande	18.796
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.063
TOTAL Generación	27.574

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.574
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.870
Diferencia (MWh)	-296
Ejecutada - Programada	-1,06 %

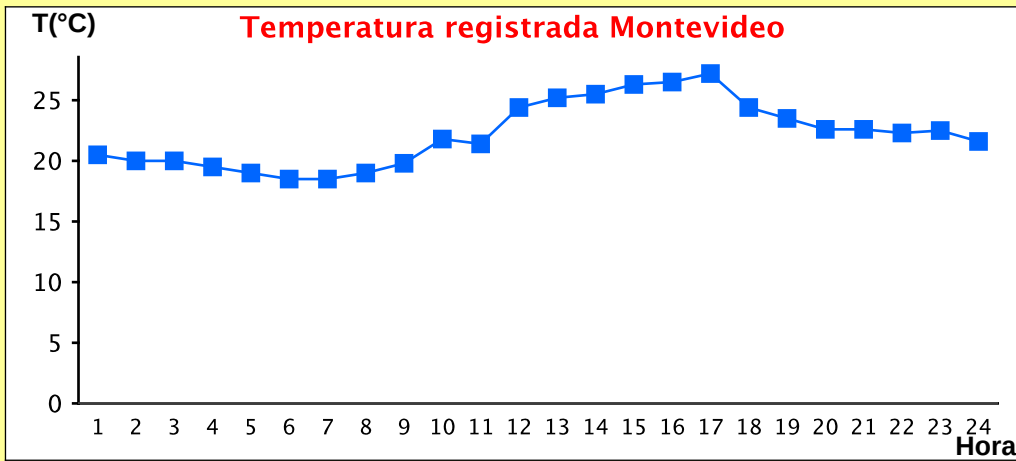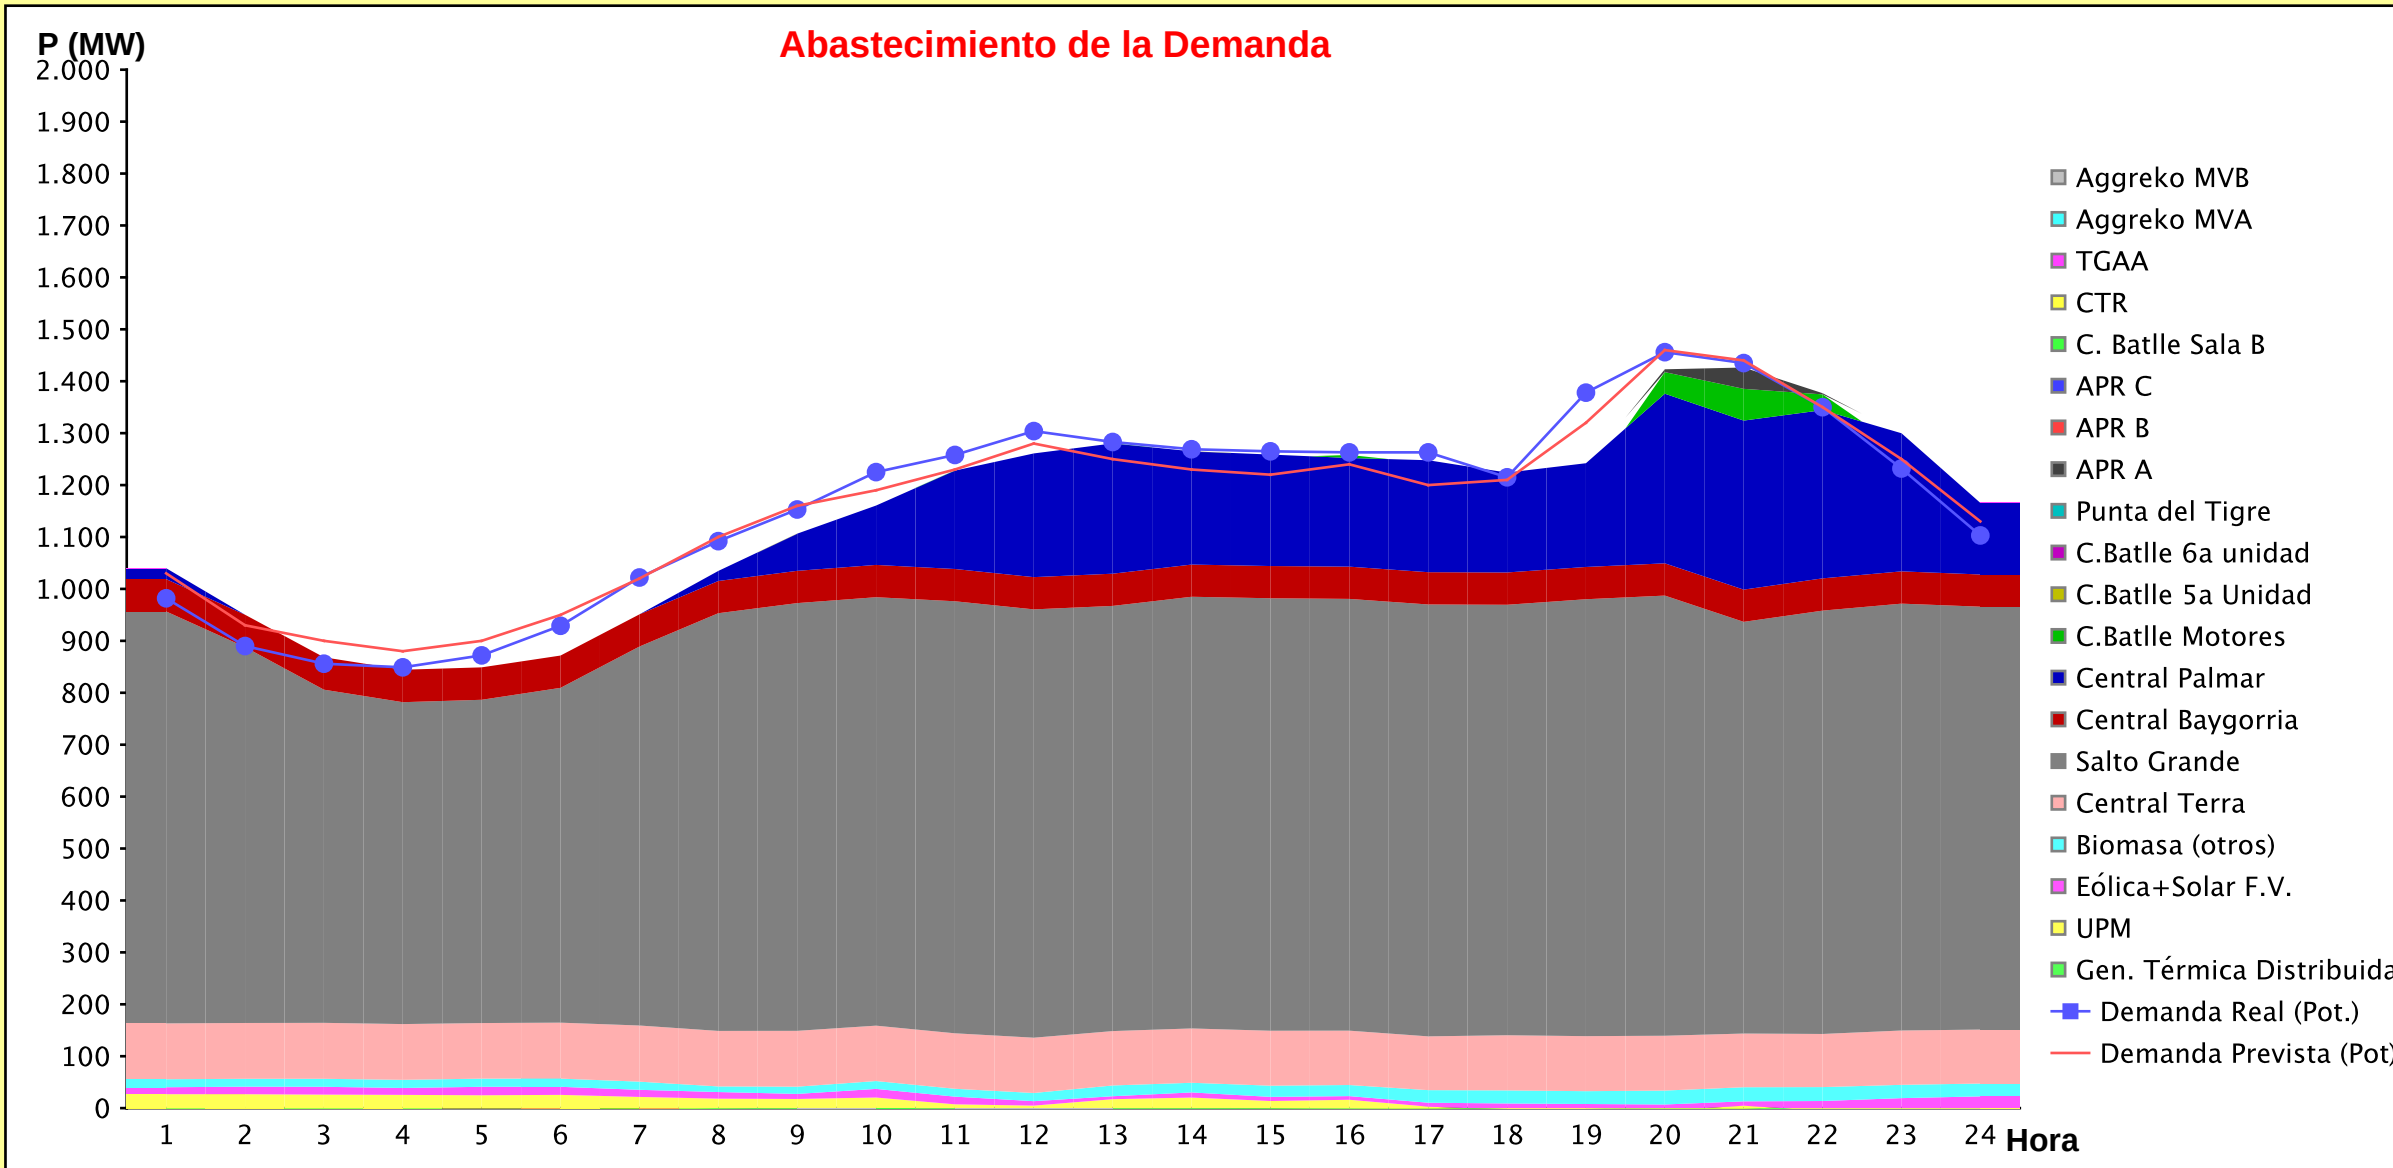



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1320,76 Hora 11:43
Potencia mínima:	878,48 Hora 03:51
Pico noche:	1487,01 Hora 19:52

Generación Media (MW)	
Eólica	12,5
Biomasa	40,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

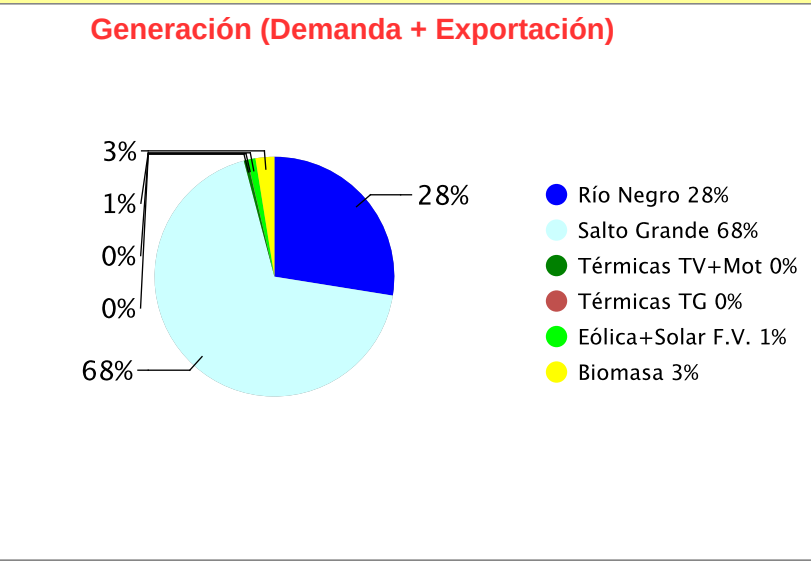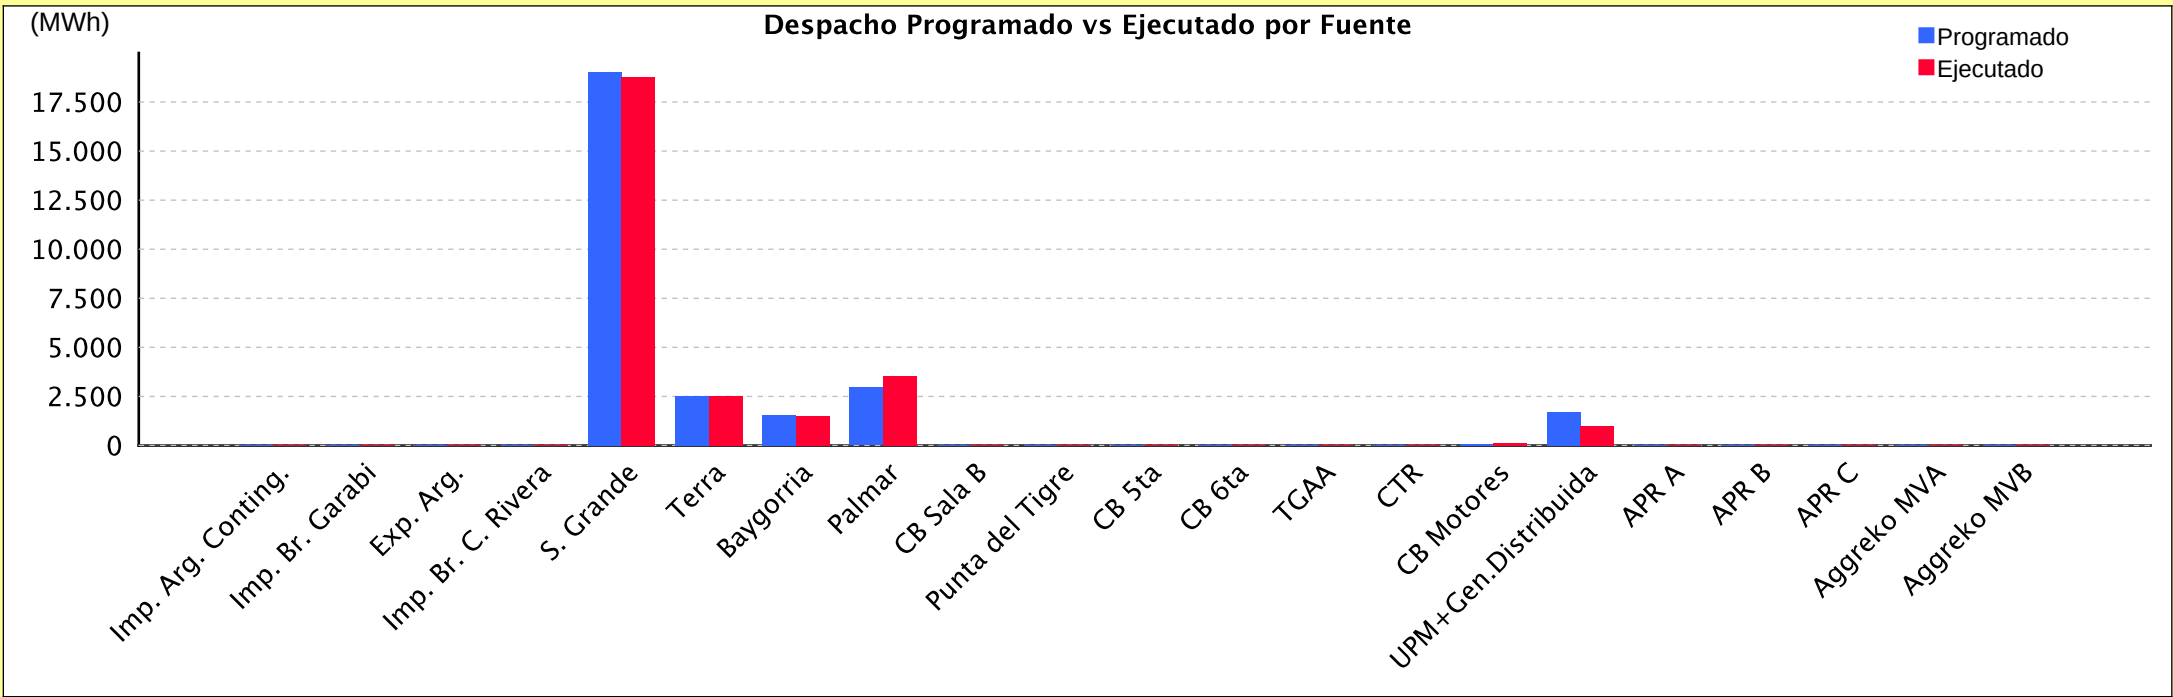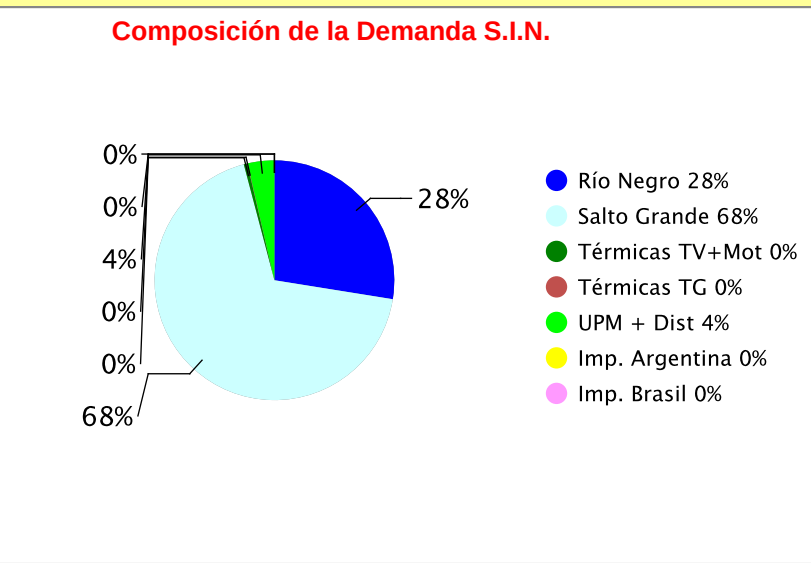



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

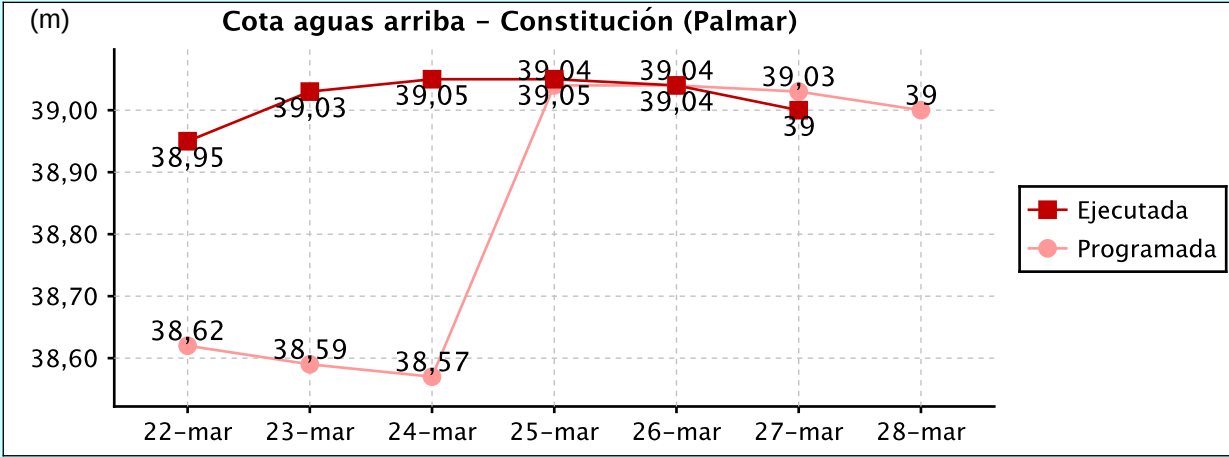
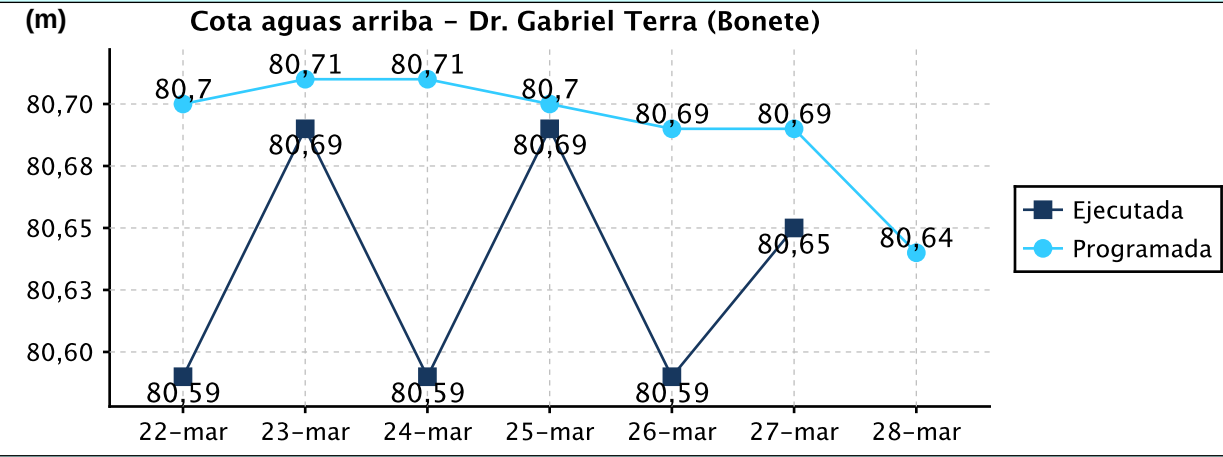


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,69	80,65
Baygorria	54,09	53,98
Palmar	39,03	39
SGU	34,94	34,92

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

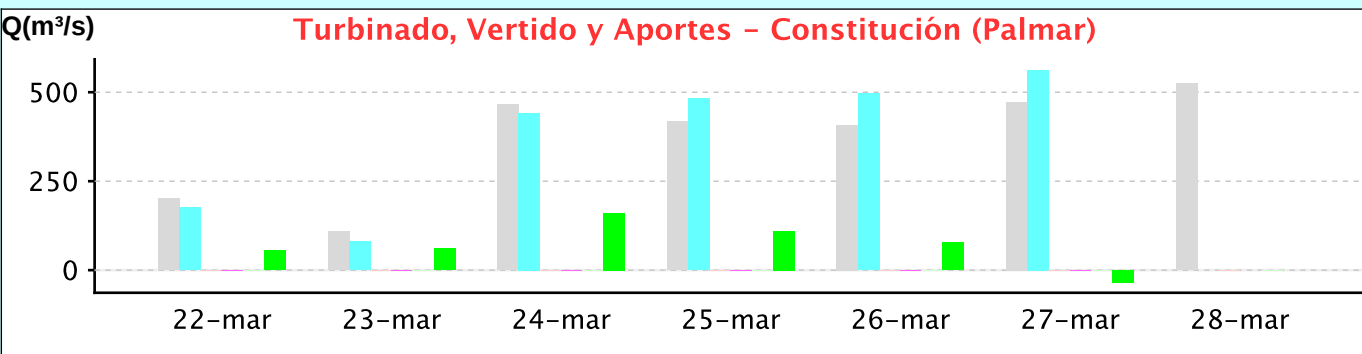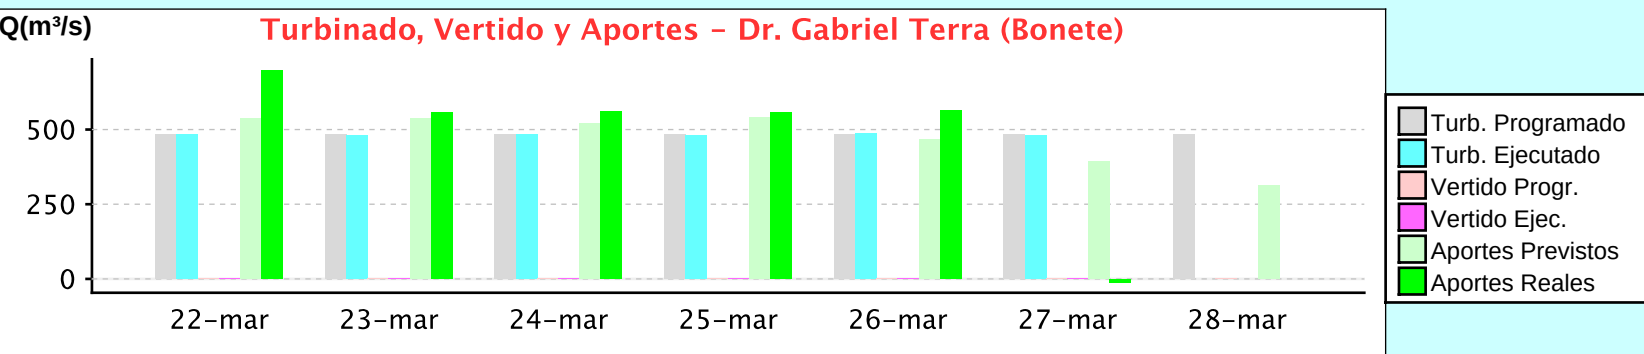

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

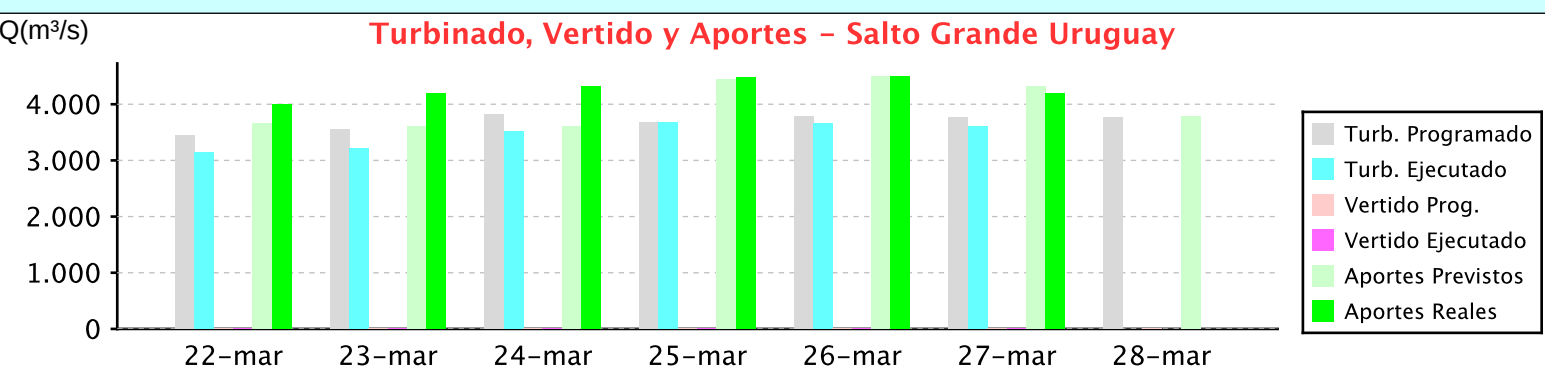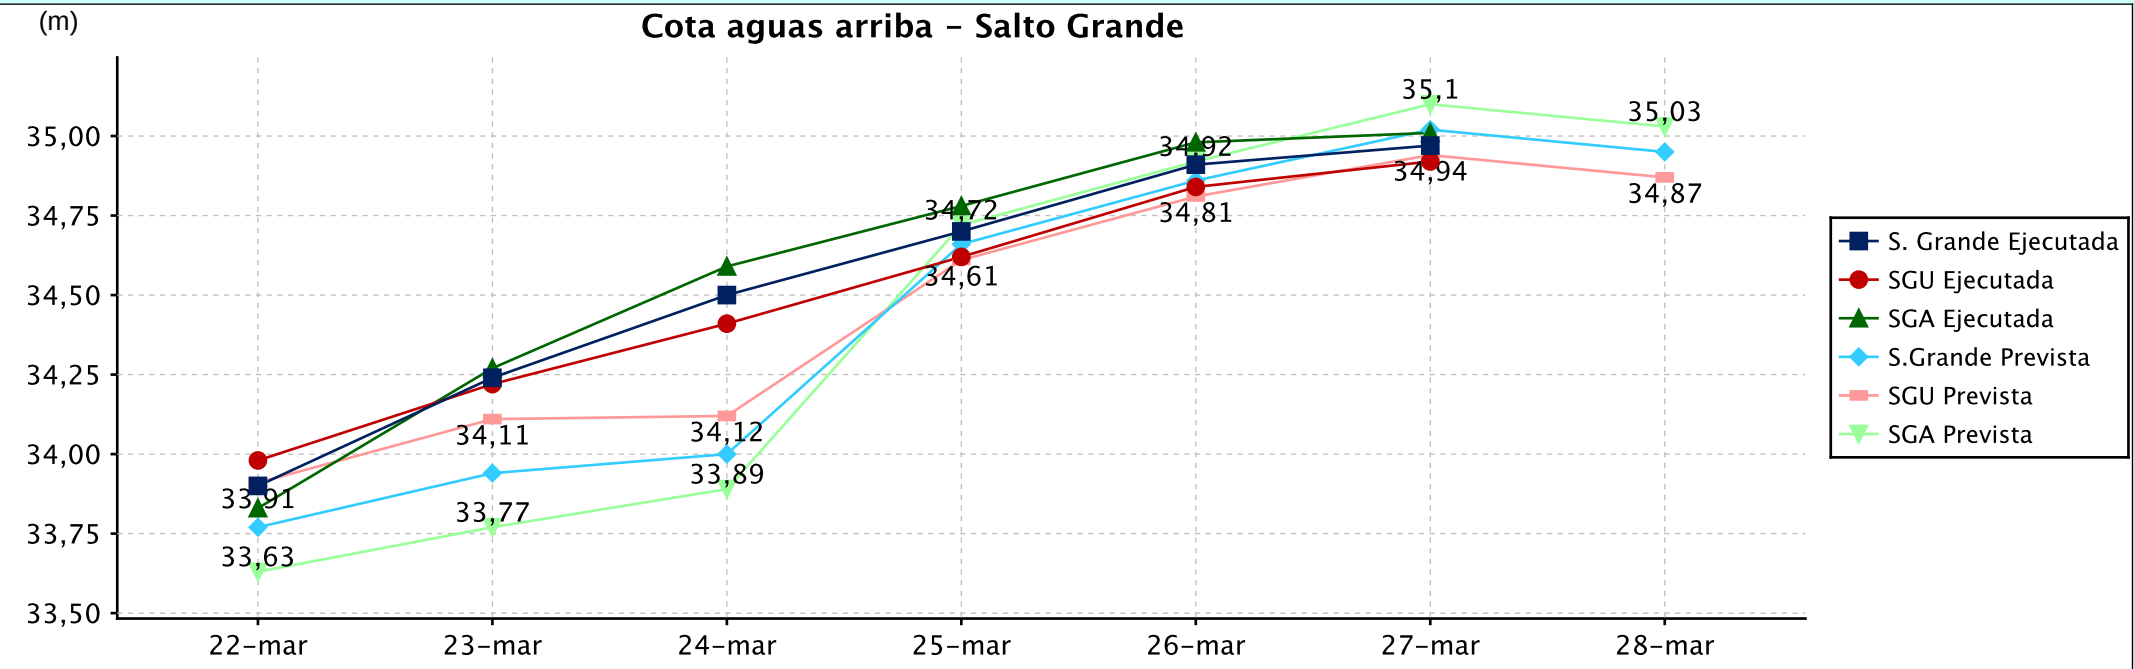

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,92
Cota Vista Arg	35,01
Cota real	34,97

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-2.045
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	484	480
Baygorria	531	494
Palmar	472	563
SGU	3.760	3.608

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	394	-11
Baygorria	0	2
Palmar	0	-34
SGU	4.325	4.194

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
