




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 28 de marzo de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	105
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	109
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	0
APR A	27
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.552
C. Baygorria	1.186
C. Palmar	4.009
C. Salto Grande	19.395
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	697
TOTAL Generación	27.926

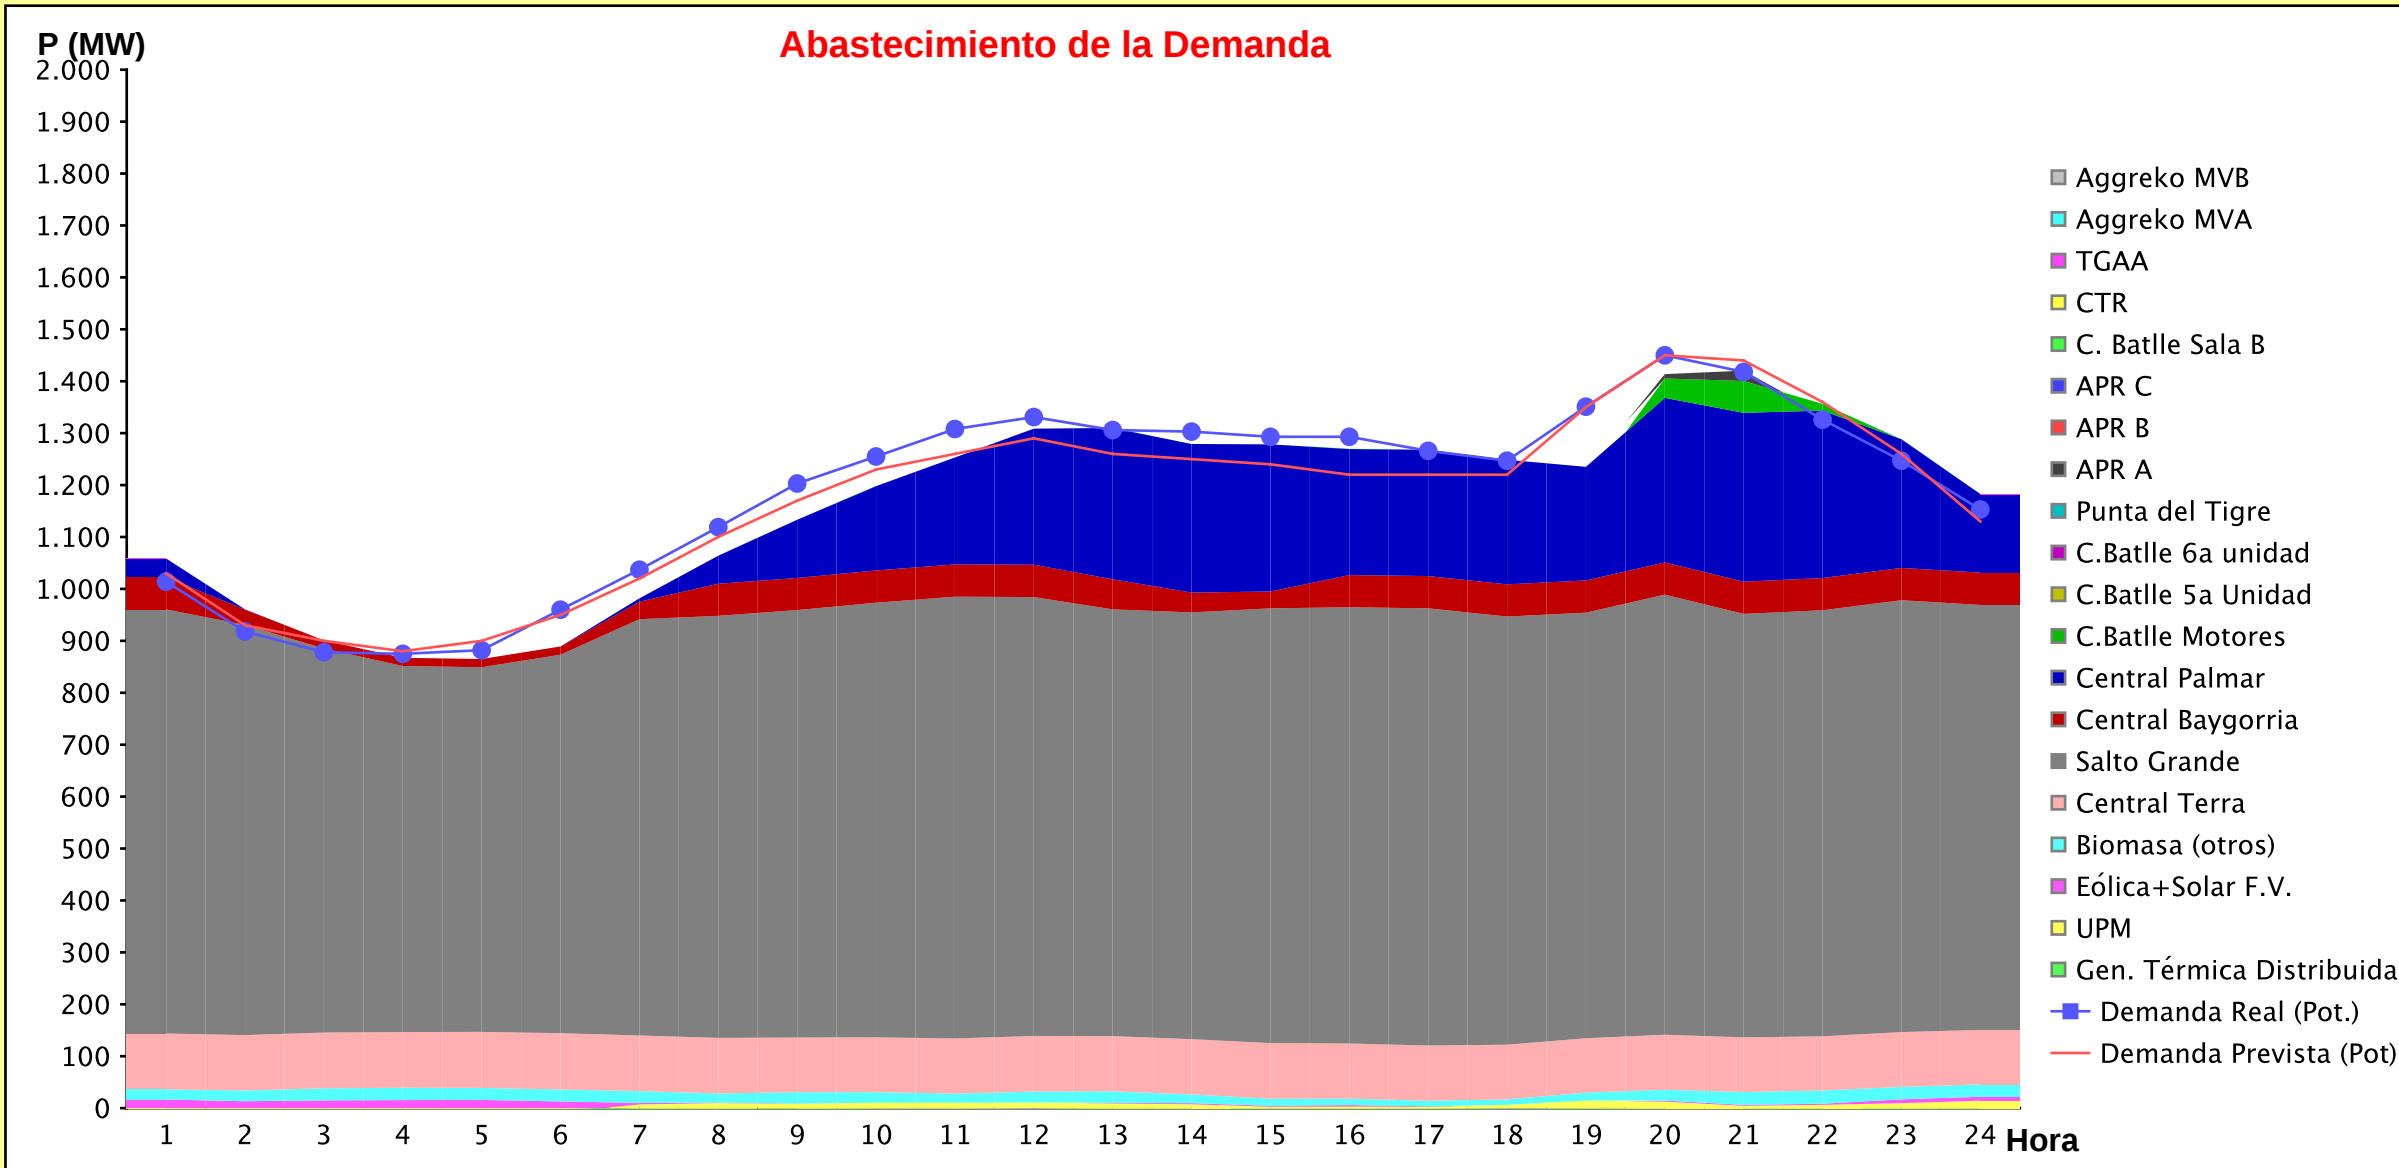

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.926
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.060
Diferencia (MWh)	-134
Ejecutada - Programada	-0,48 %

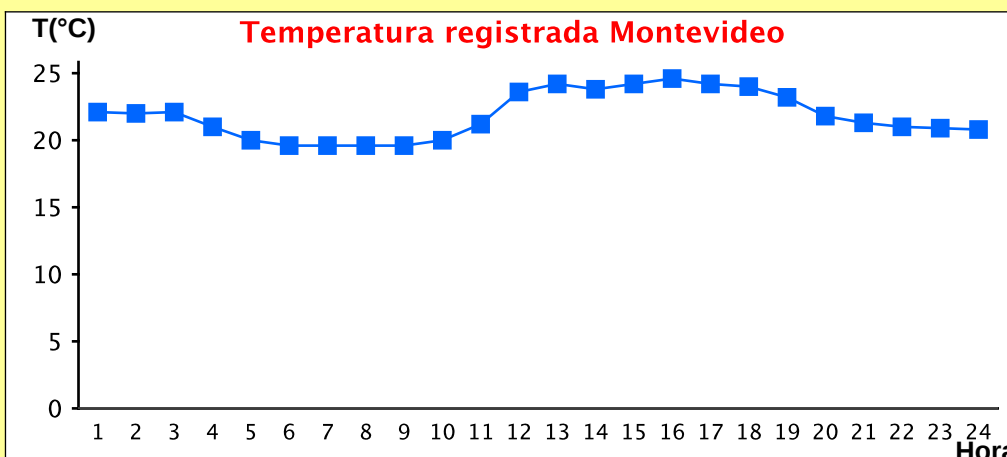



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1344,96 Hora 11:43
Potencia mínima:	878,73 Hora 03:57
Pico noche:	1459,83 Hora 19:56

Generación Media (MW)	
Eólica	5,9
Biomasa	35,2
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

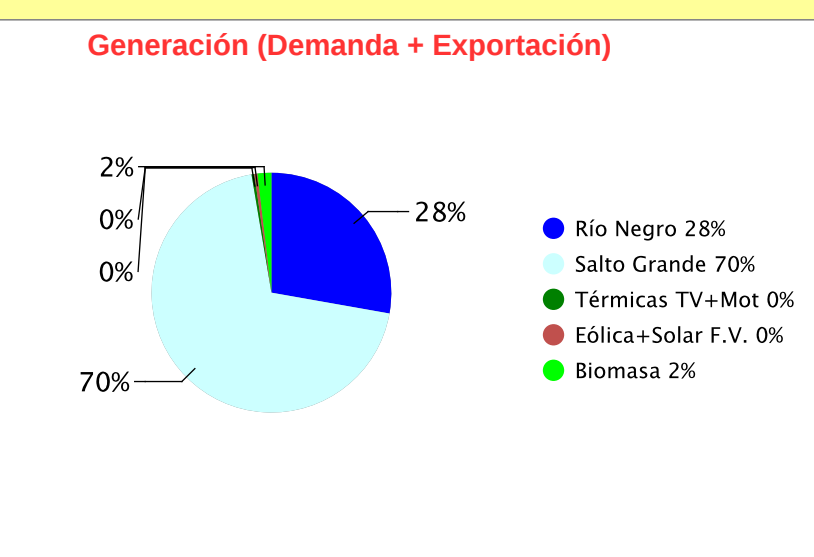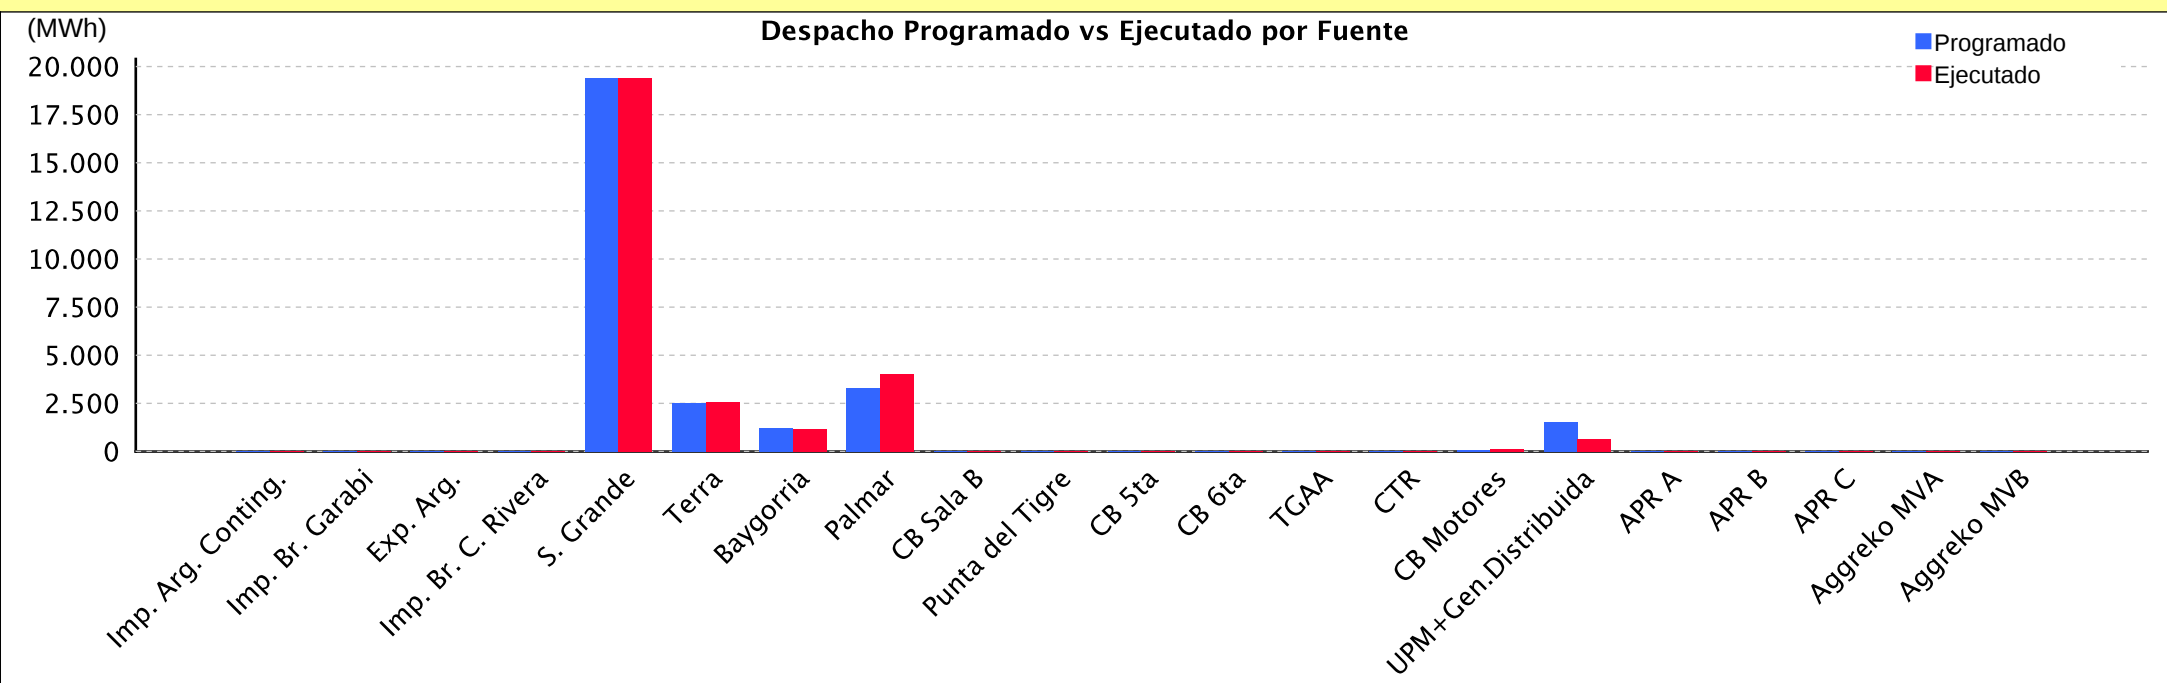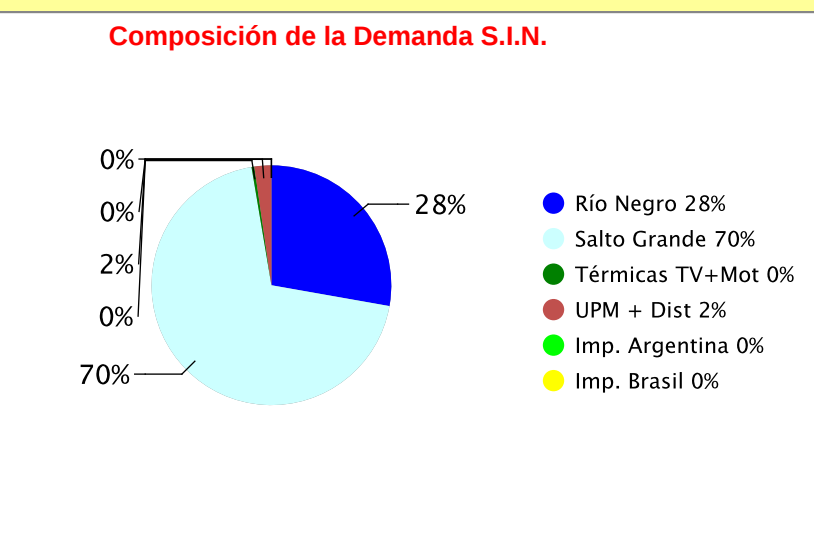



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

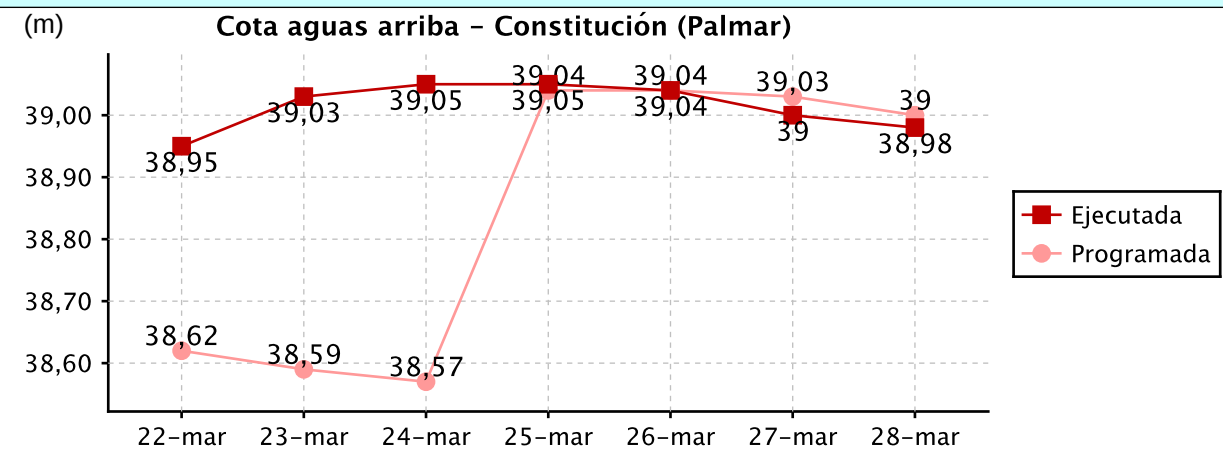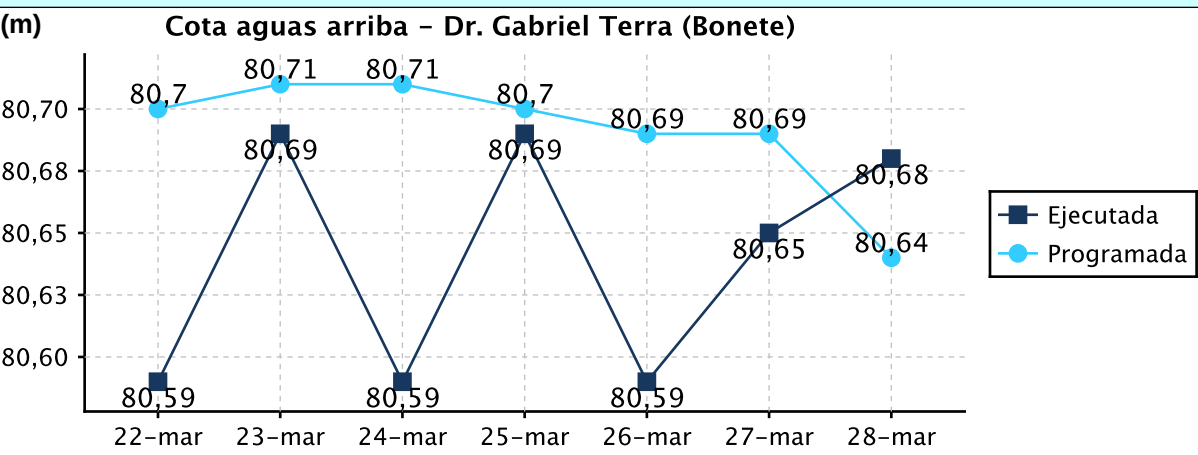


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,64	80,68
Baygorria	54,05	54,08
Palmar	39,00	38,98
SGU	34,87	34,95

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

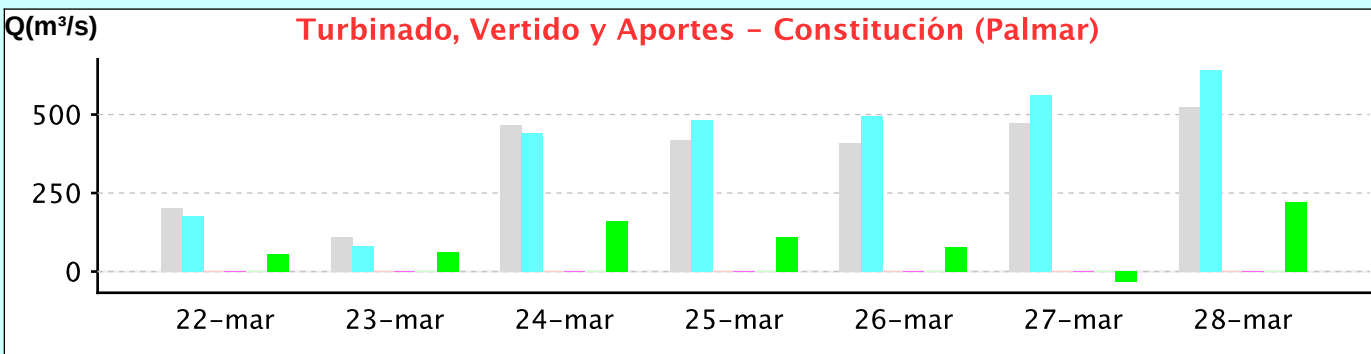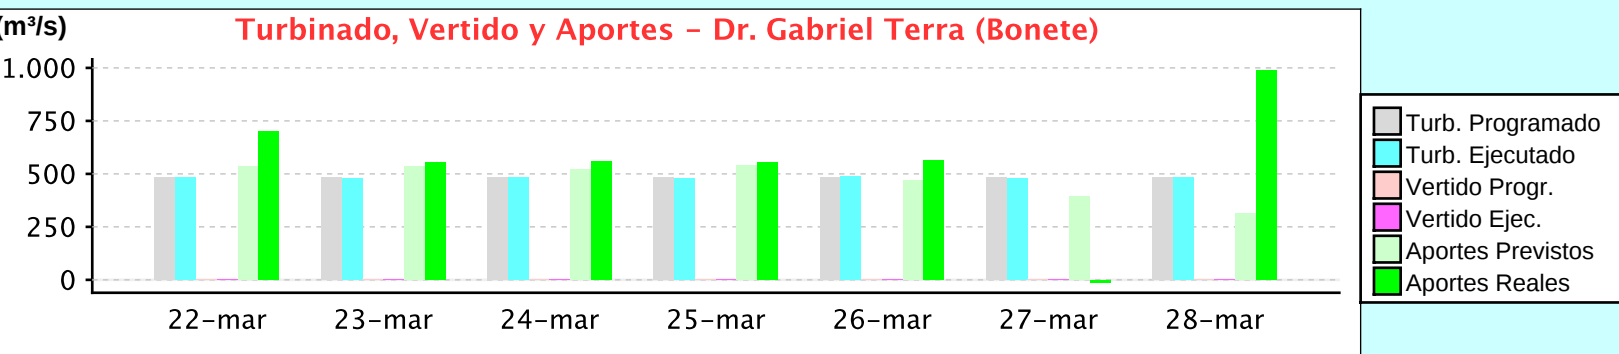


Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

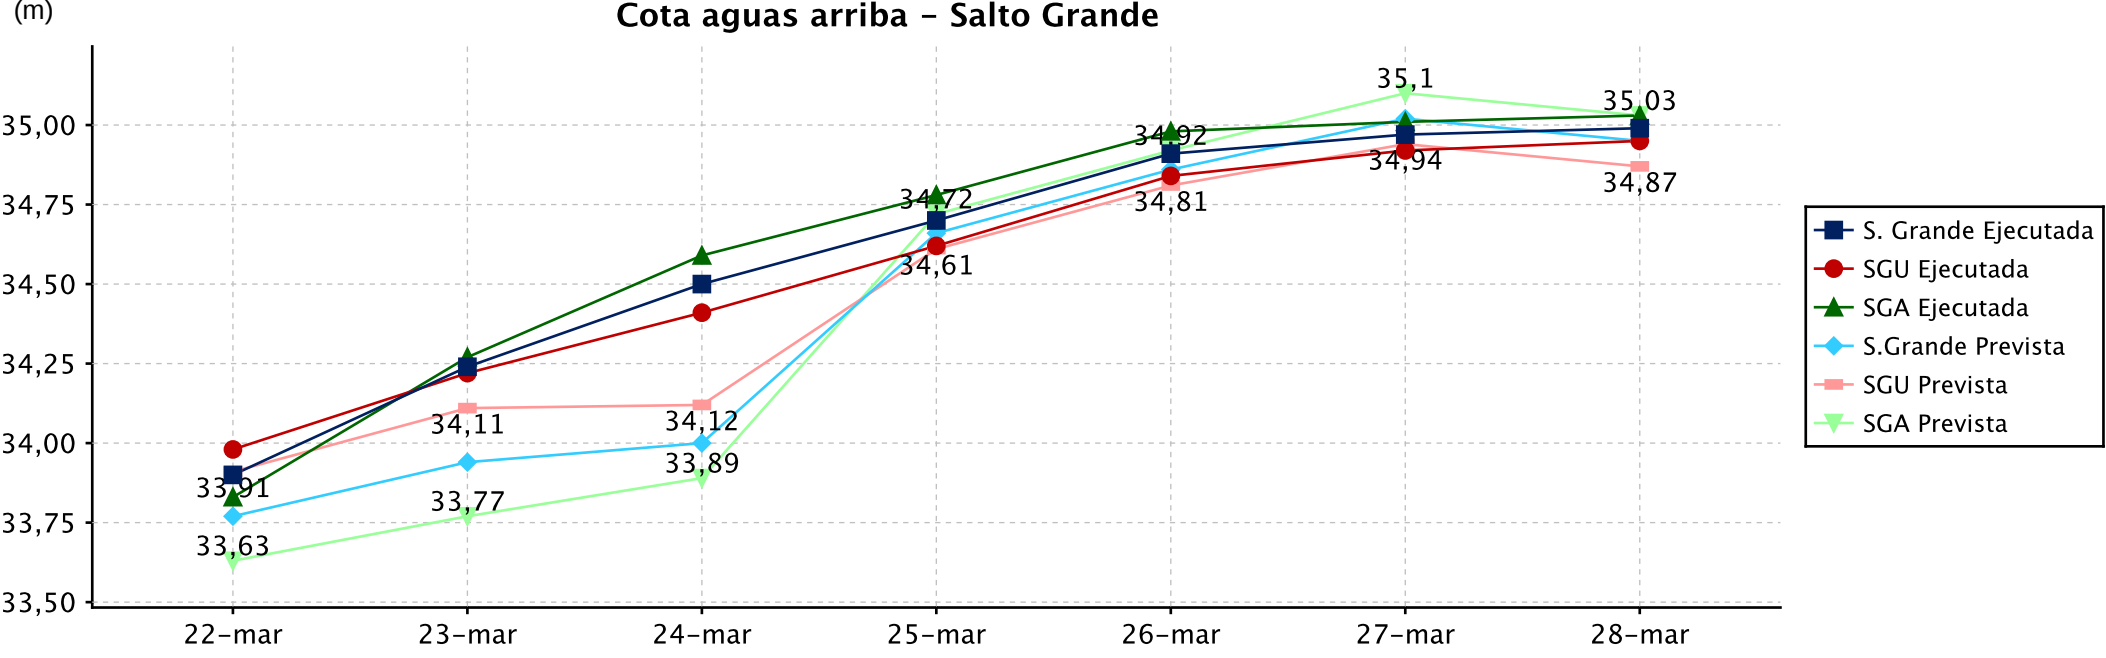

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	484	486
Baygorria	408	387
Palmar	525	642
SGU	3.762	3.721

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	314	990
Baygorria	0	40
Palmar	0	222
SGU	3.775	3.754

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

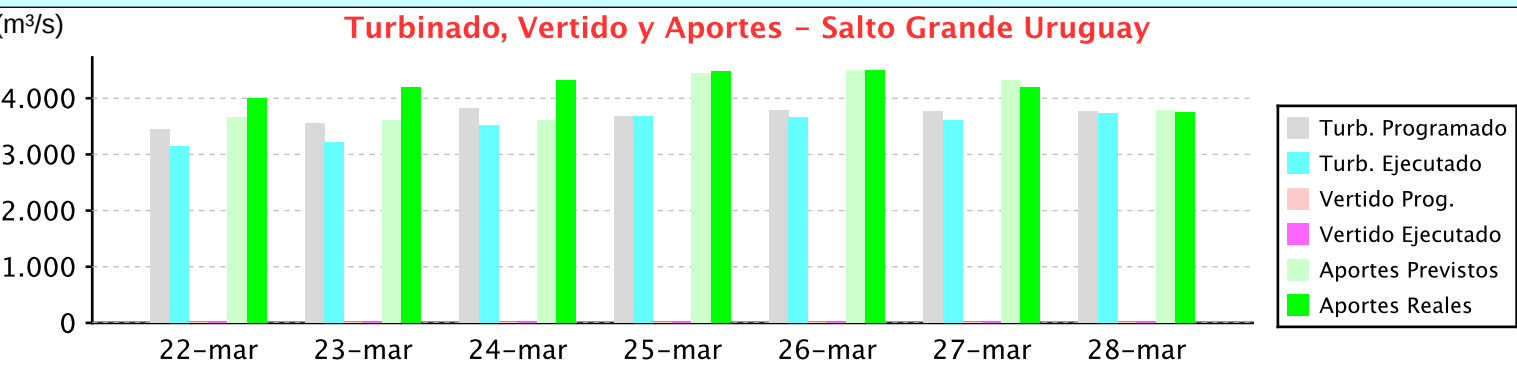

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,95
Cota Vista Arg	35,03
Cota real	34,99

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-1.974
---------------------------------	--------

OBSERVACIONES
