




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 29 de marzo de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	3
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	7
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	0
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.553
C. Baygorria	1.493
C. Palmar	2.252
C. Salto Grande	18.701
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.254
TOTAL Generación	26.210

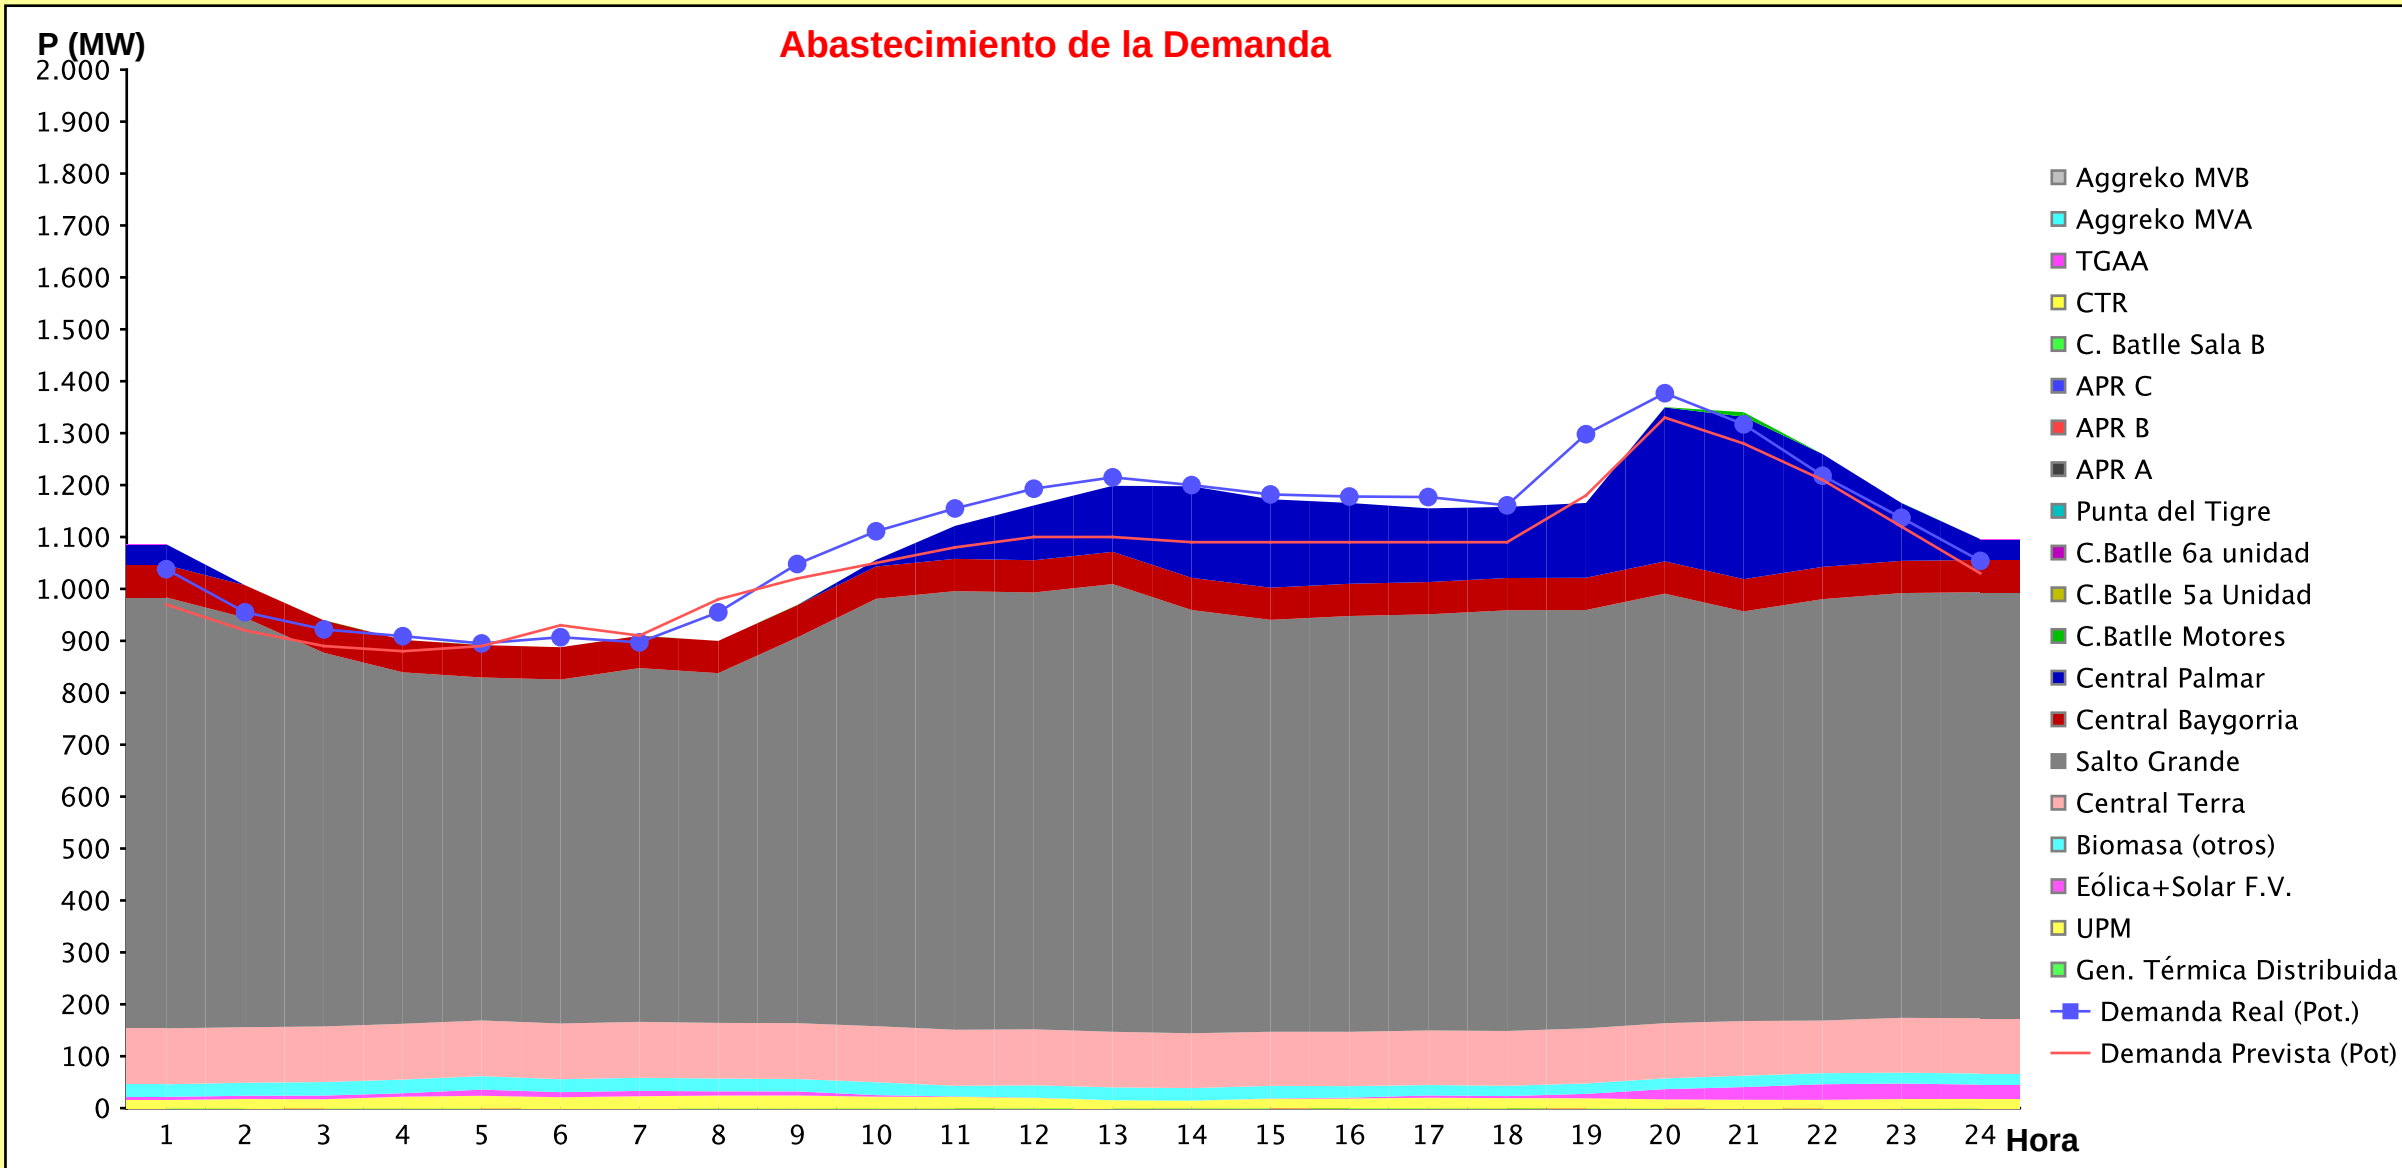

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.210
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.320
Diferencia (MWh)	890
Ejecutada - Programada	3,52 %

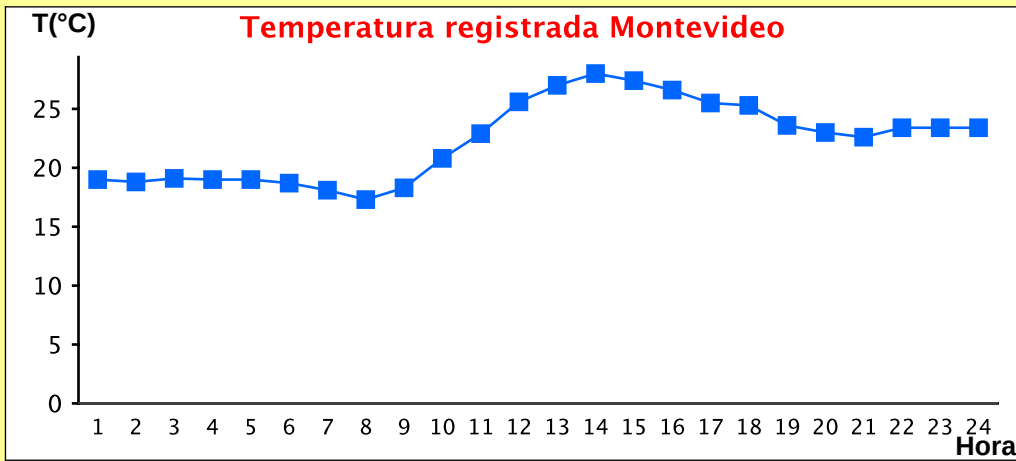



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1227,25 Hora 12:43
Potencia mínima:	889,85 Hora 04:43
Pico noche:	1416,85 Hora 19:44

Generación Media (MW)	
Eólica	10,1
Biomasa	50,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

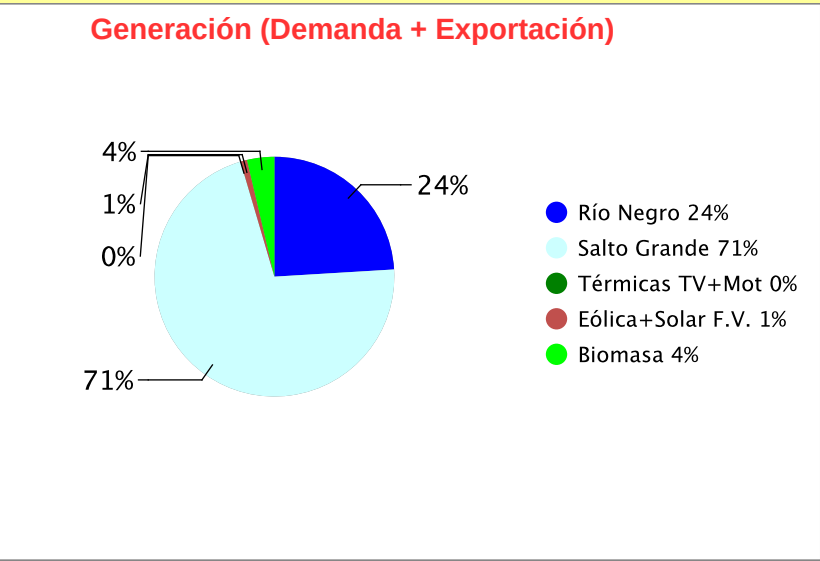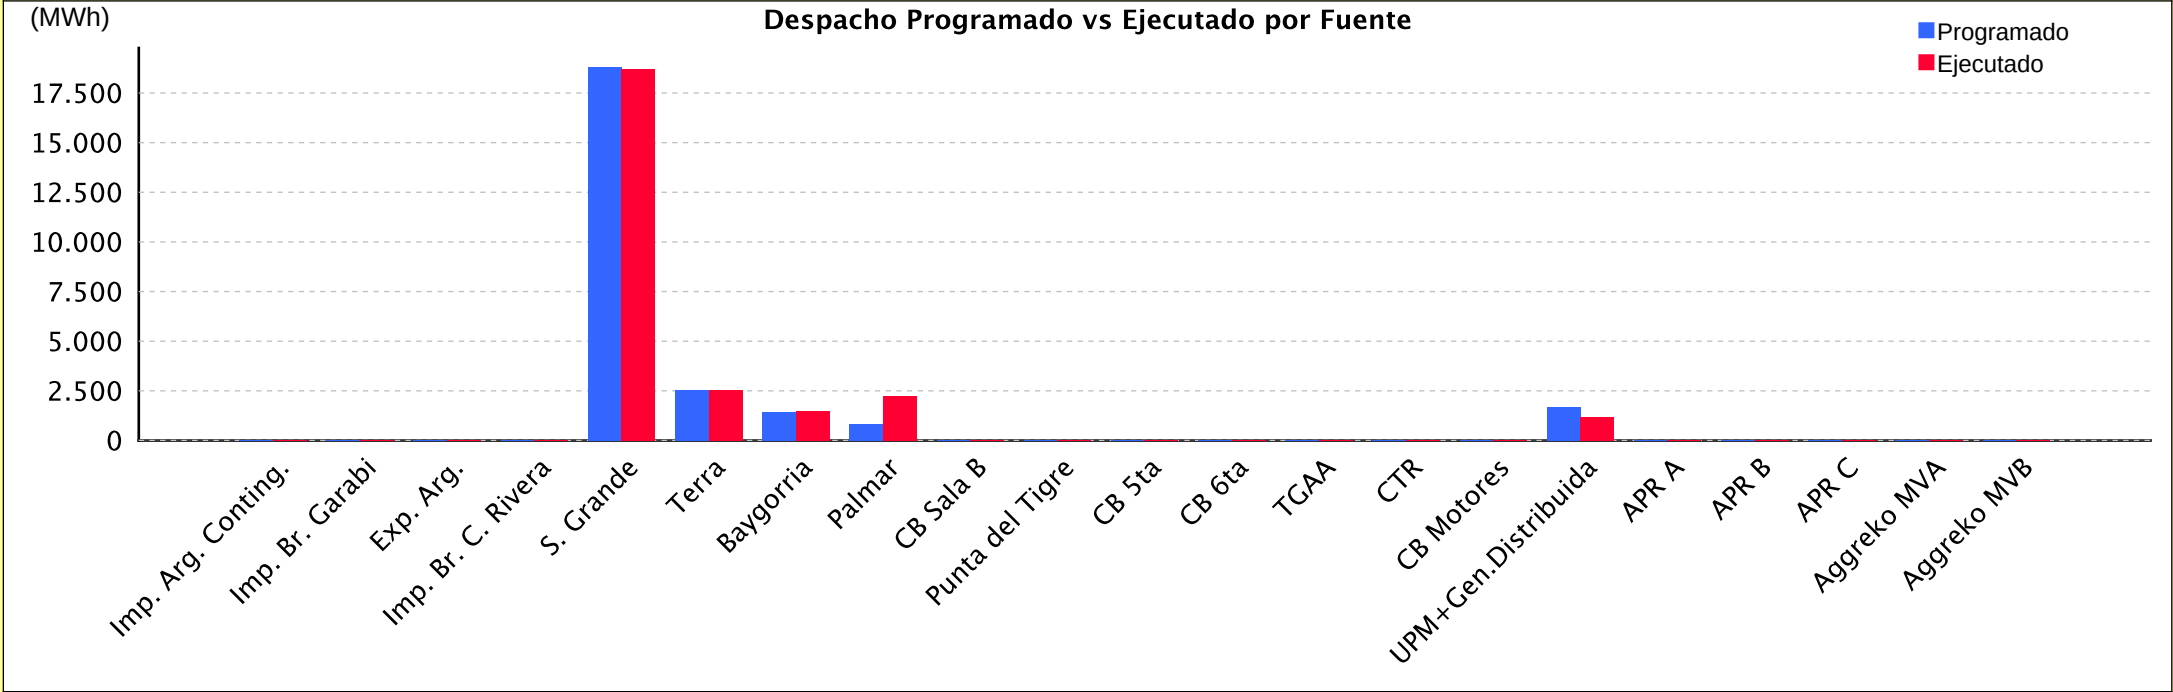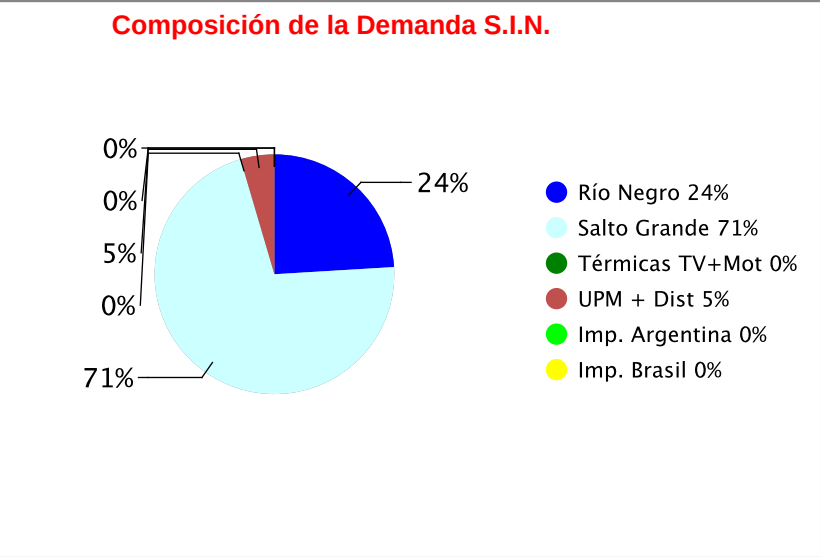



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

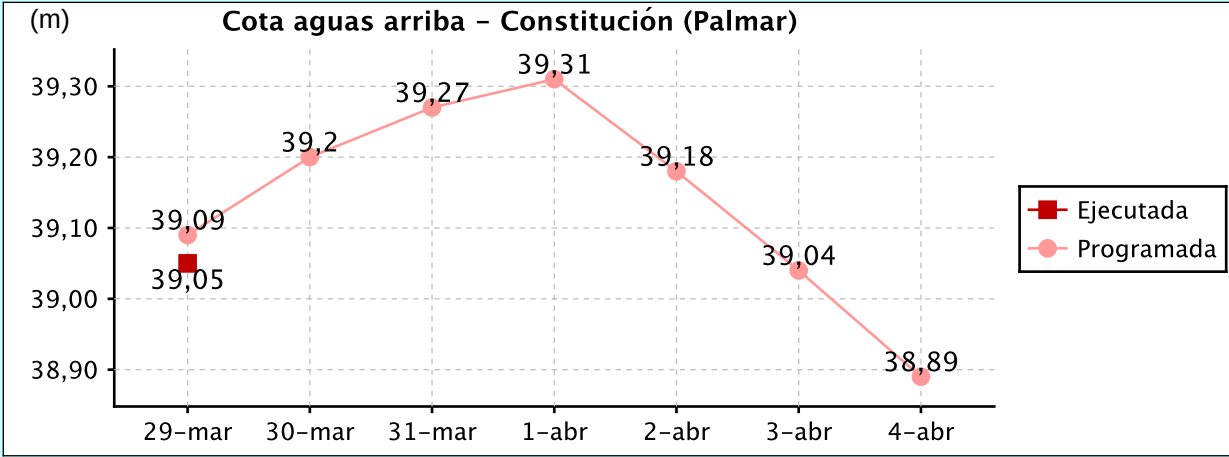
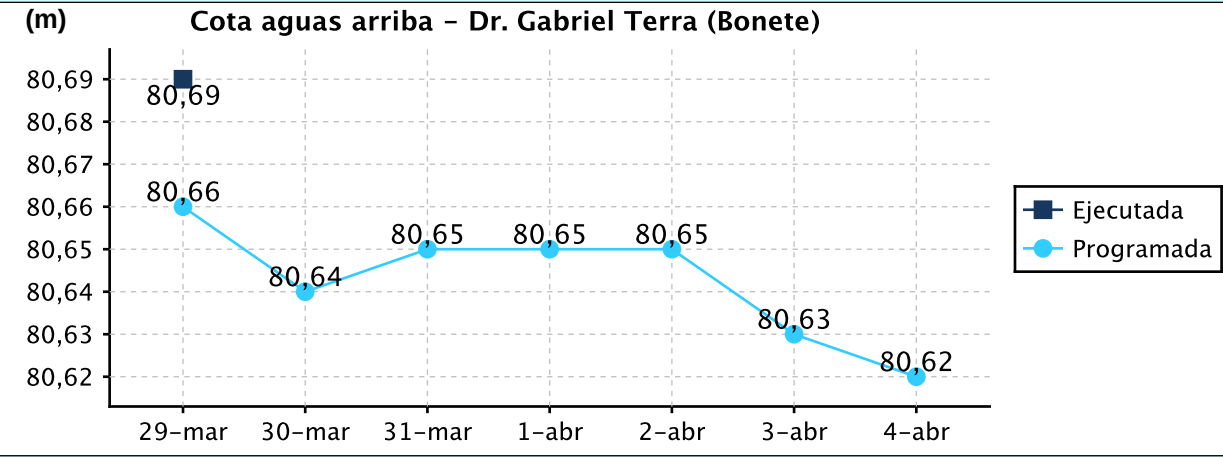


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,66	80,69
Baygorria	54,14	54,09
Palmar	39,09	39,05
SGU	35,11	34,92

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

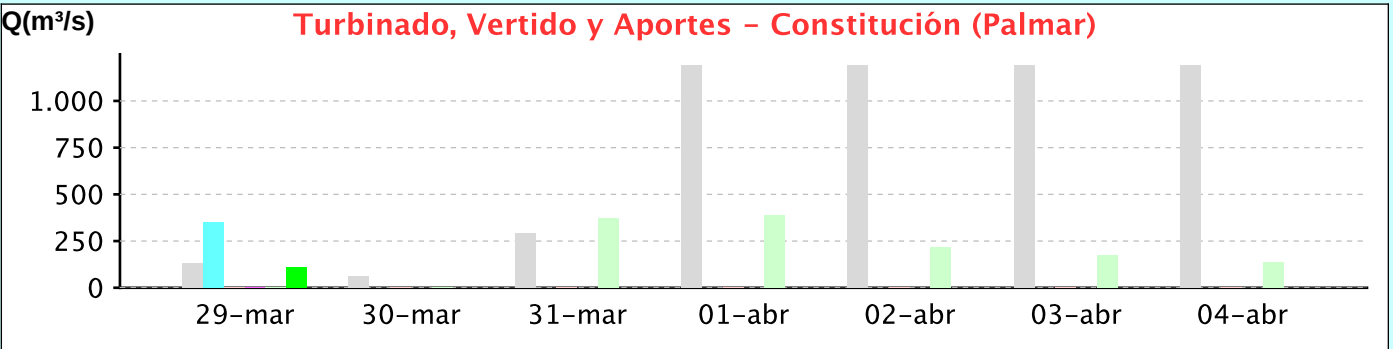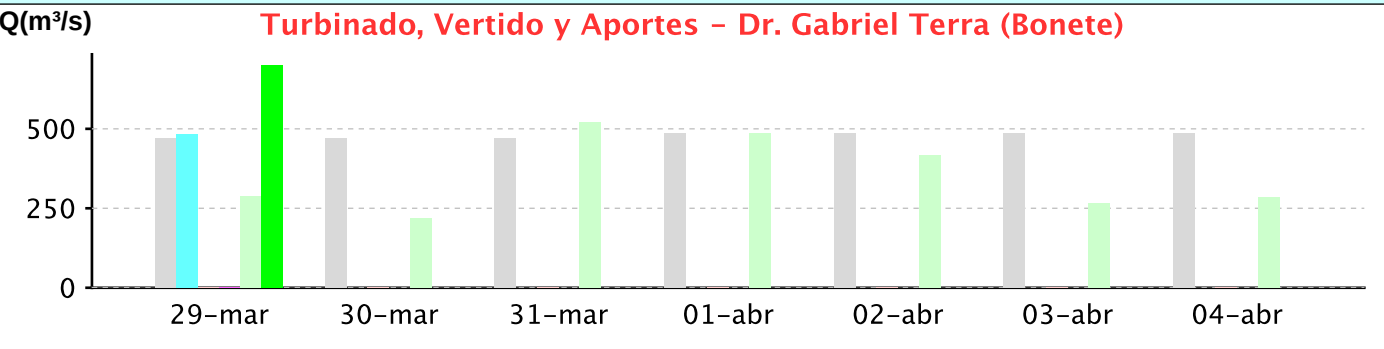

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

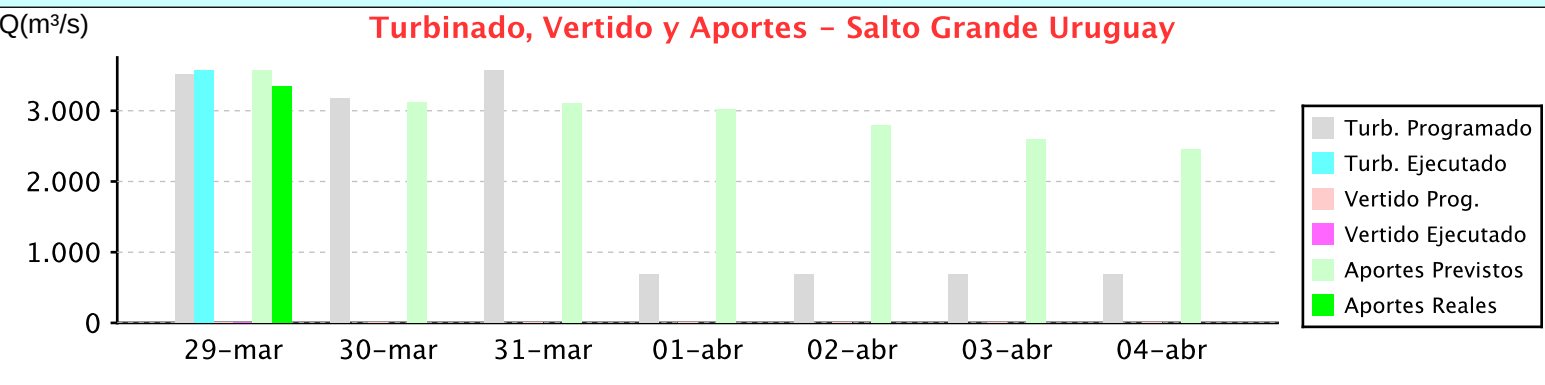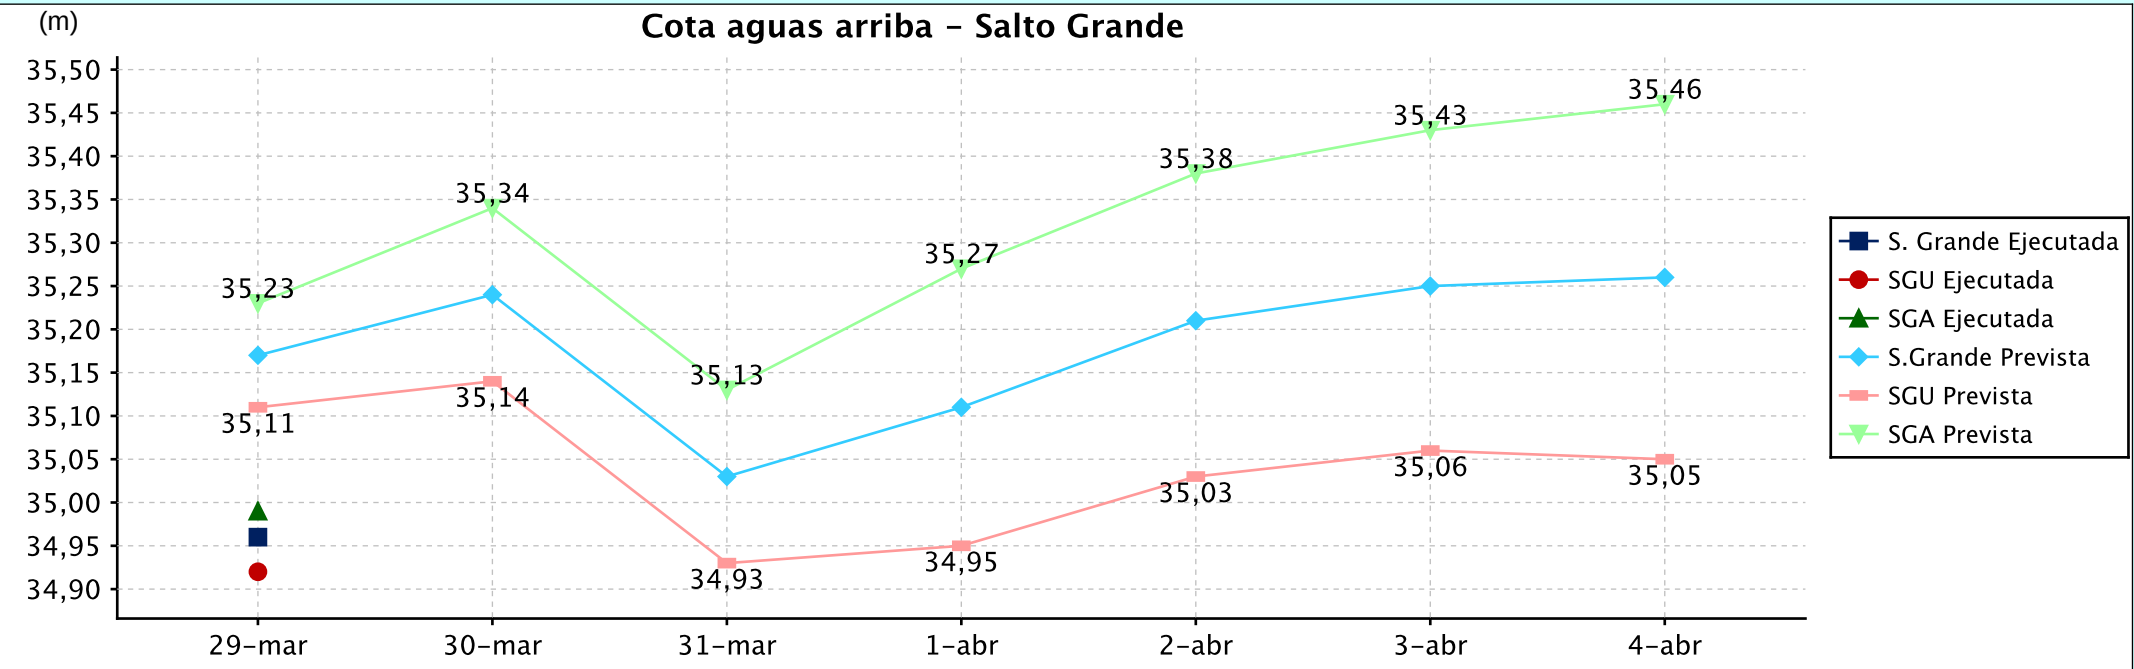

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,92
Cota Vista Arg	34,99
Cota real	34,96
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-1.590

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	470	484
Baygorria	490	486
Palmar	132	351
SGU	3.514	3.564

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	289	699
Baygorria	0	24
Palmar	0	110
SGU	3.575	3.350

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
