




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 30 de marzo de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	0
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.549
C. Baygorria	1.488
C. Palmar	544
C. Salto Grande	16.881
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.732
TOTAL Generación	23.140

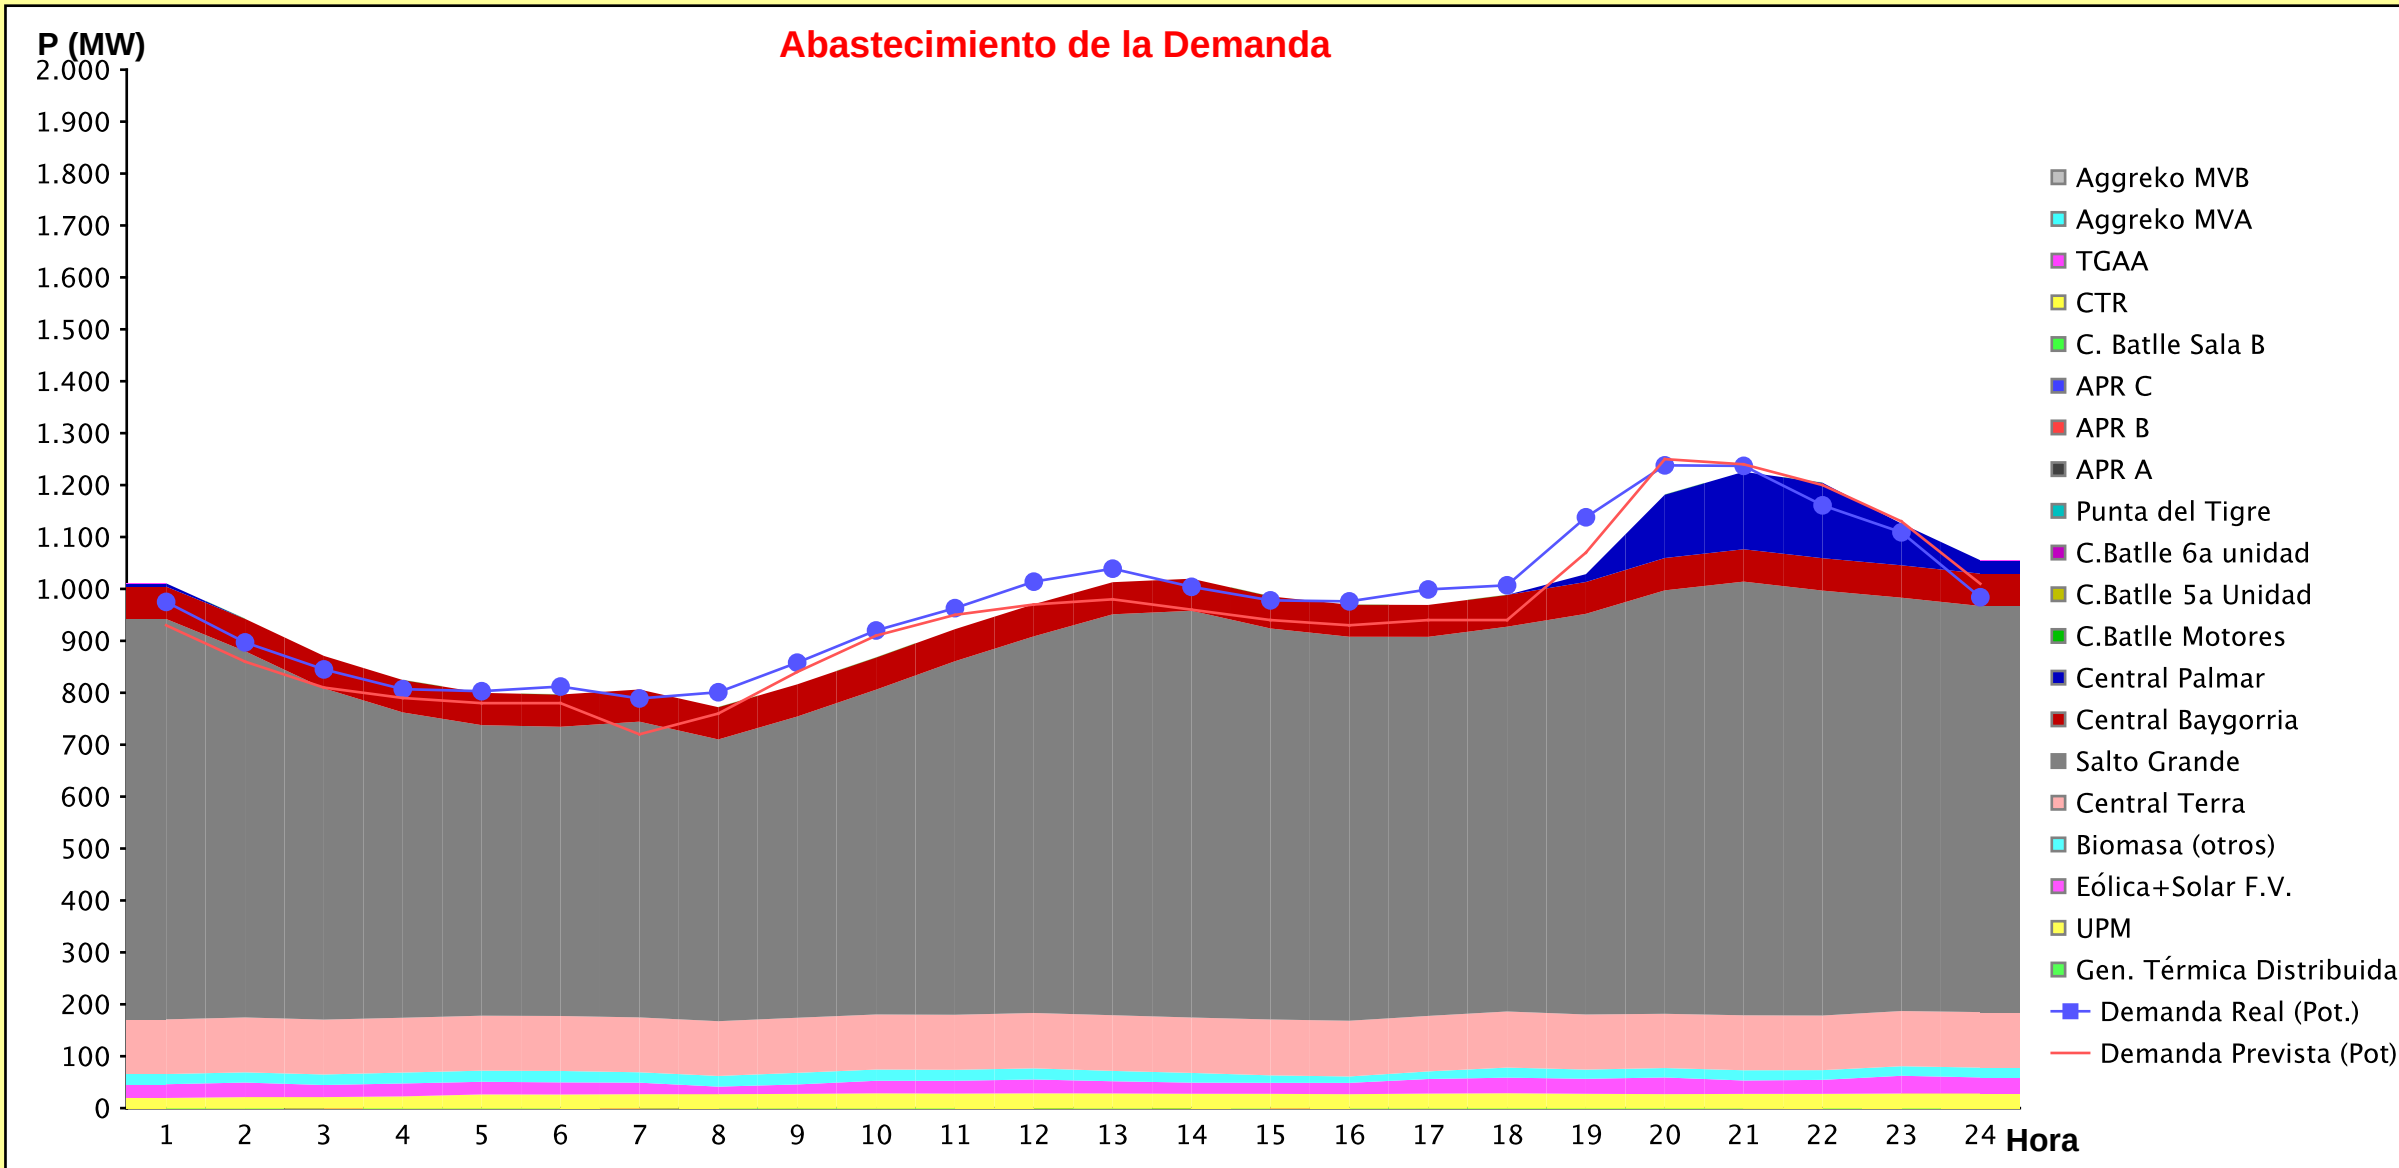

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.140
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	22.690
Diferencia (MWh)	450
Ejecutada - Programada	1,98 %

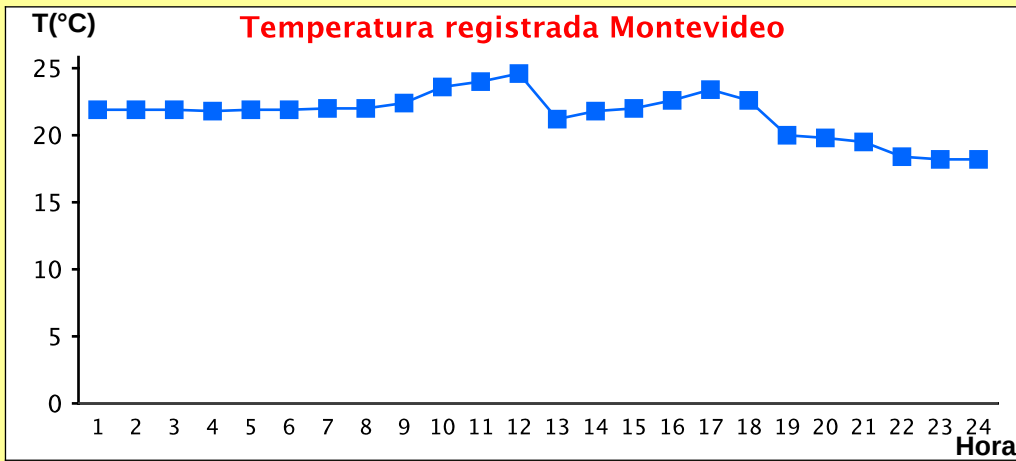



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1073,44 Hora 12:47
Potencia mínima:	798,33 Hora 07:24
Pico noche:	1272,68 Hora 20:00

Generación Media (MW)	
Eólica	25,4
Biomasa	53,0
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

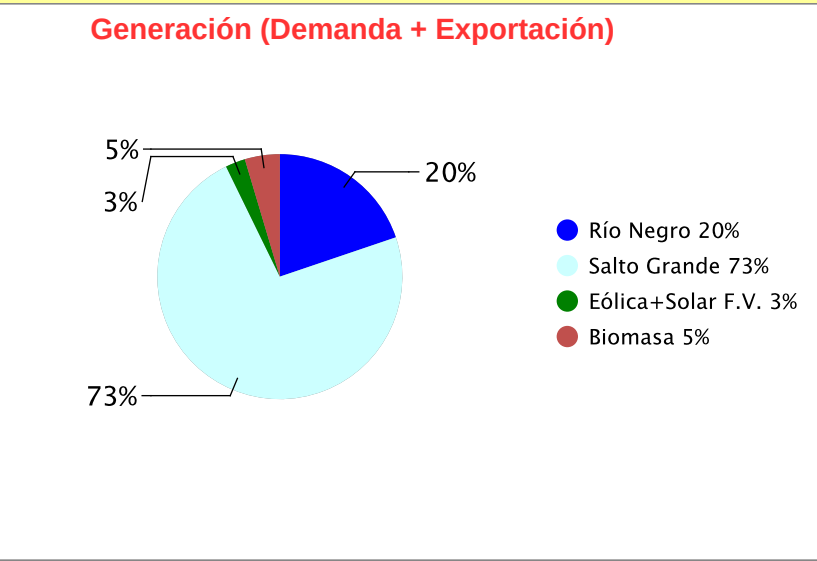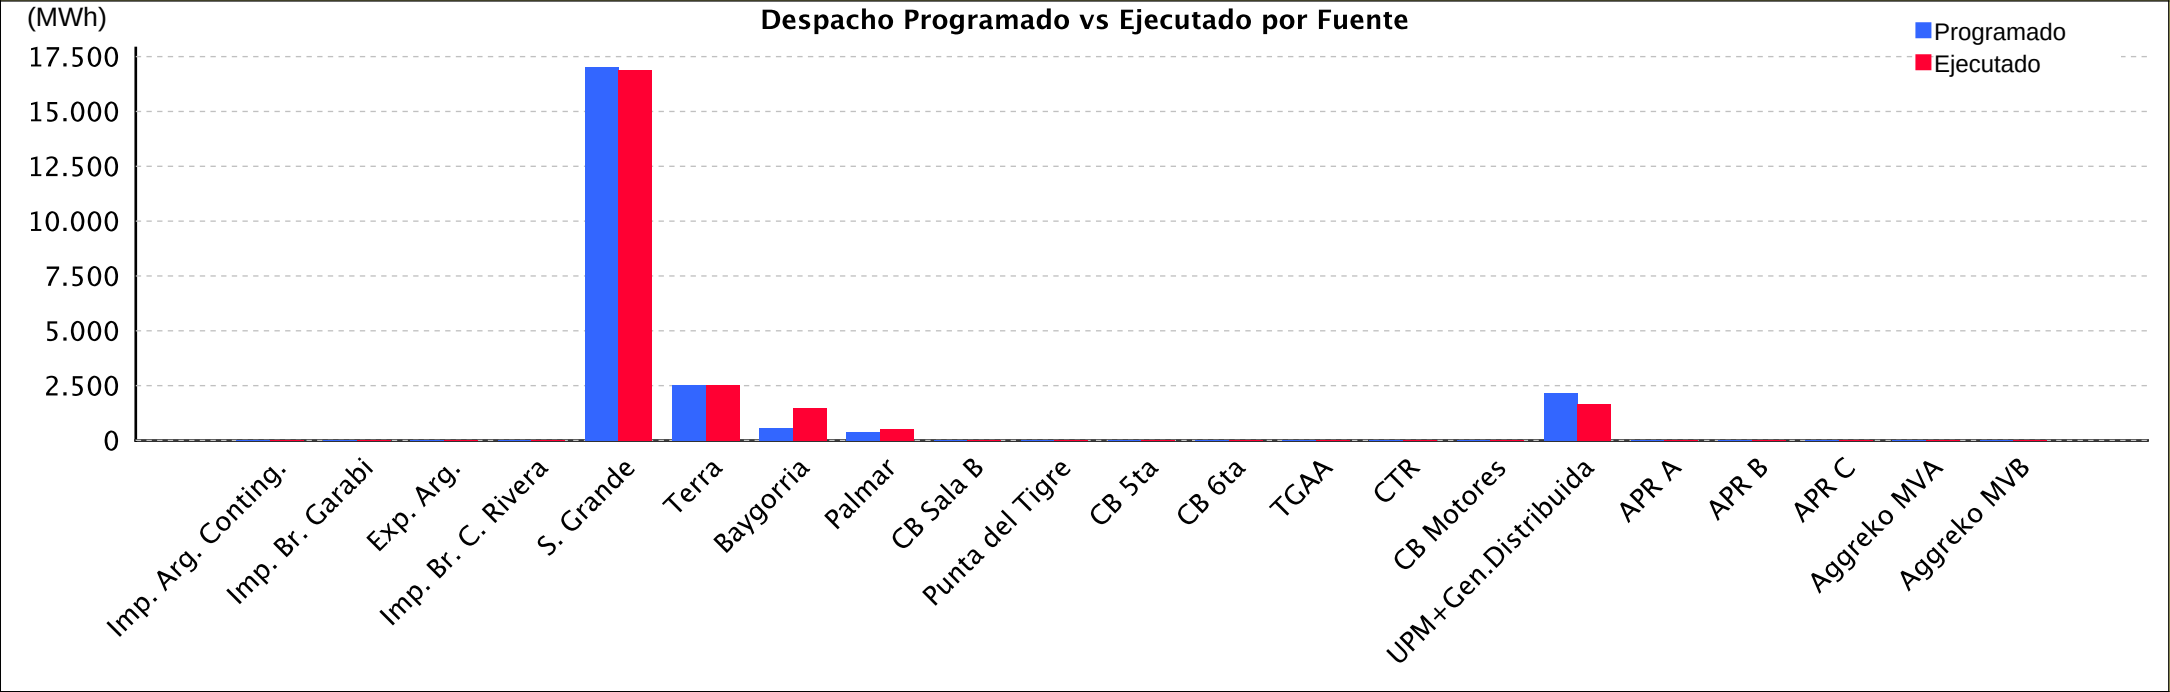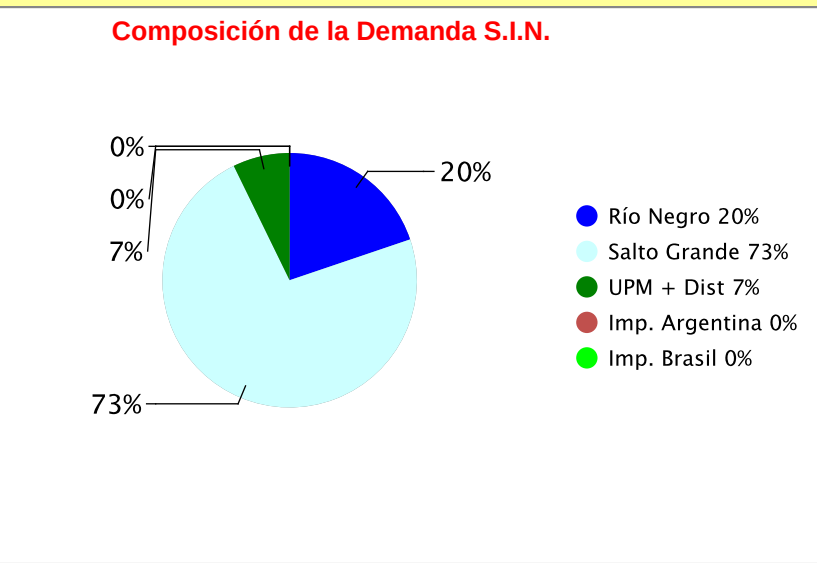



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

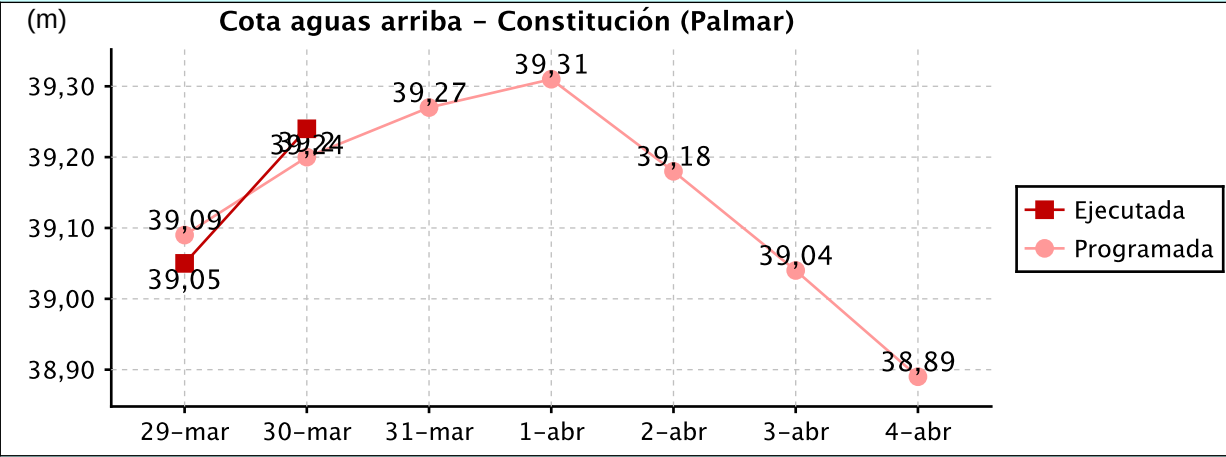
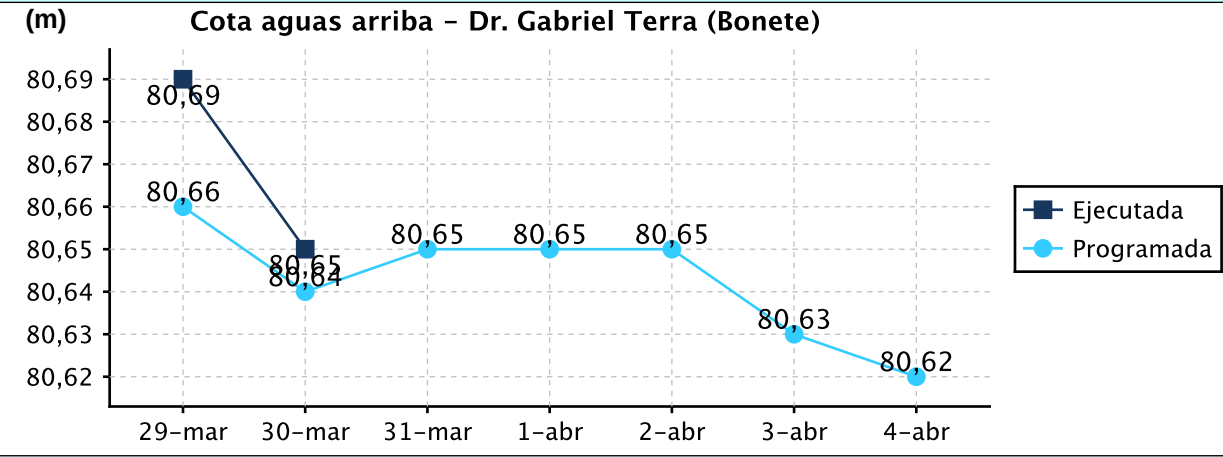


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,64	80,65
Baygorria	54,10	54,09
Palmar	39,20	39,24
SGU	35,14	34,88

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

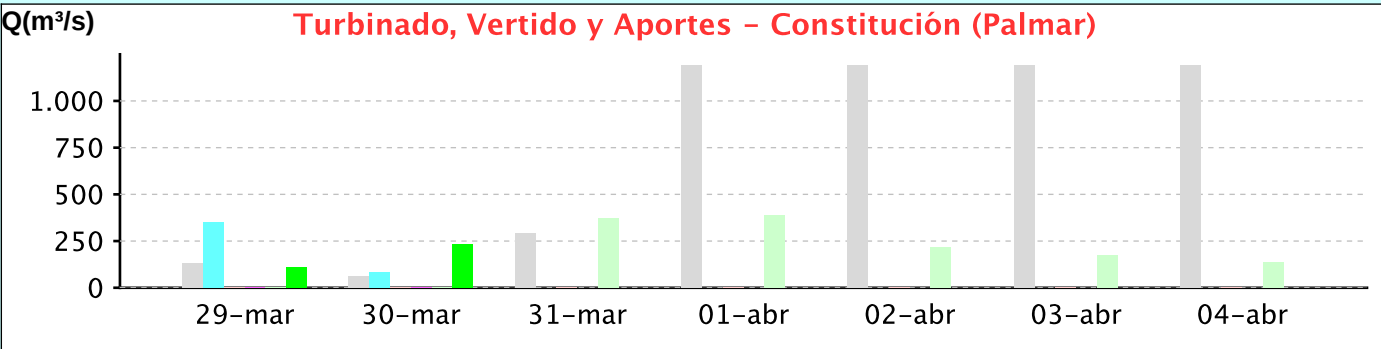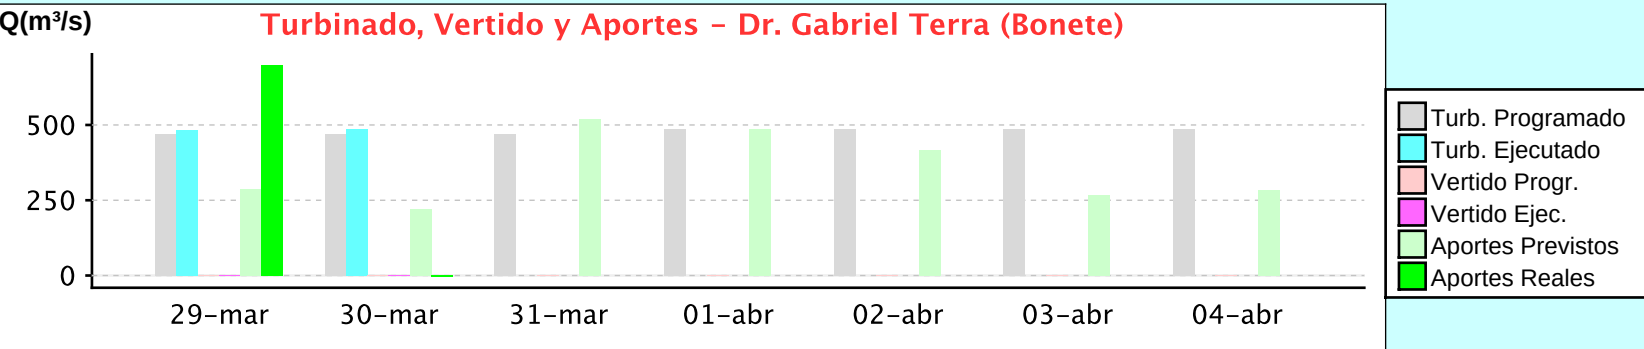

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

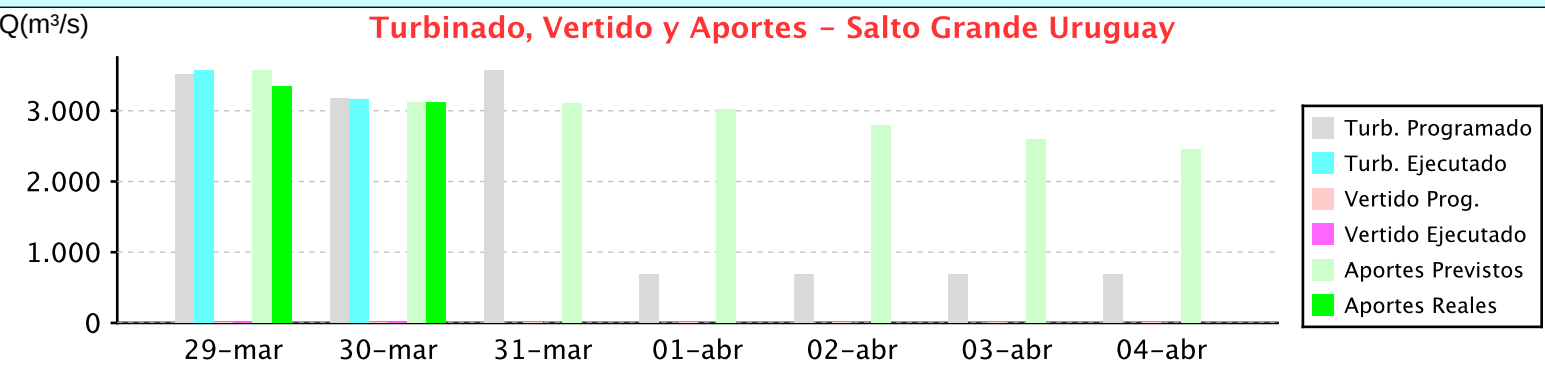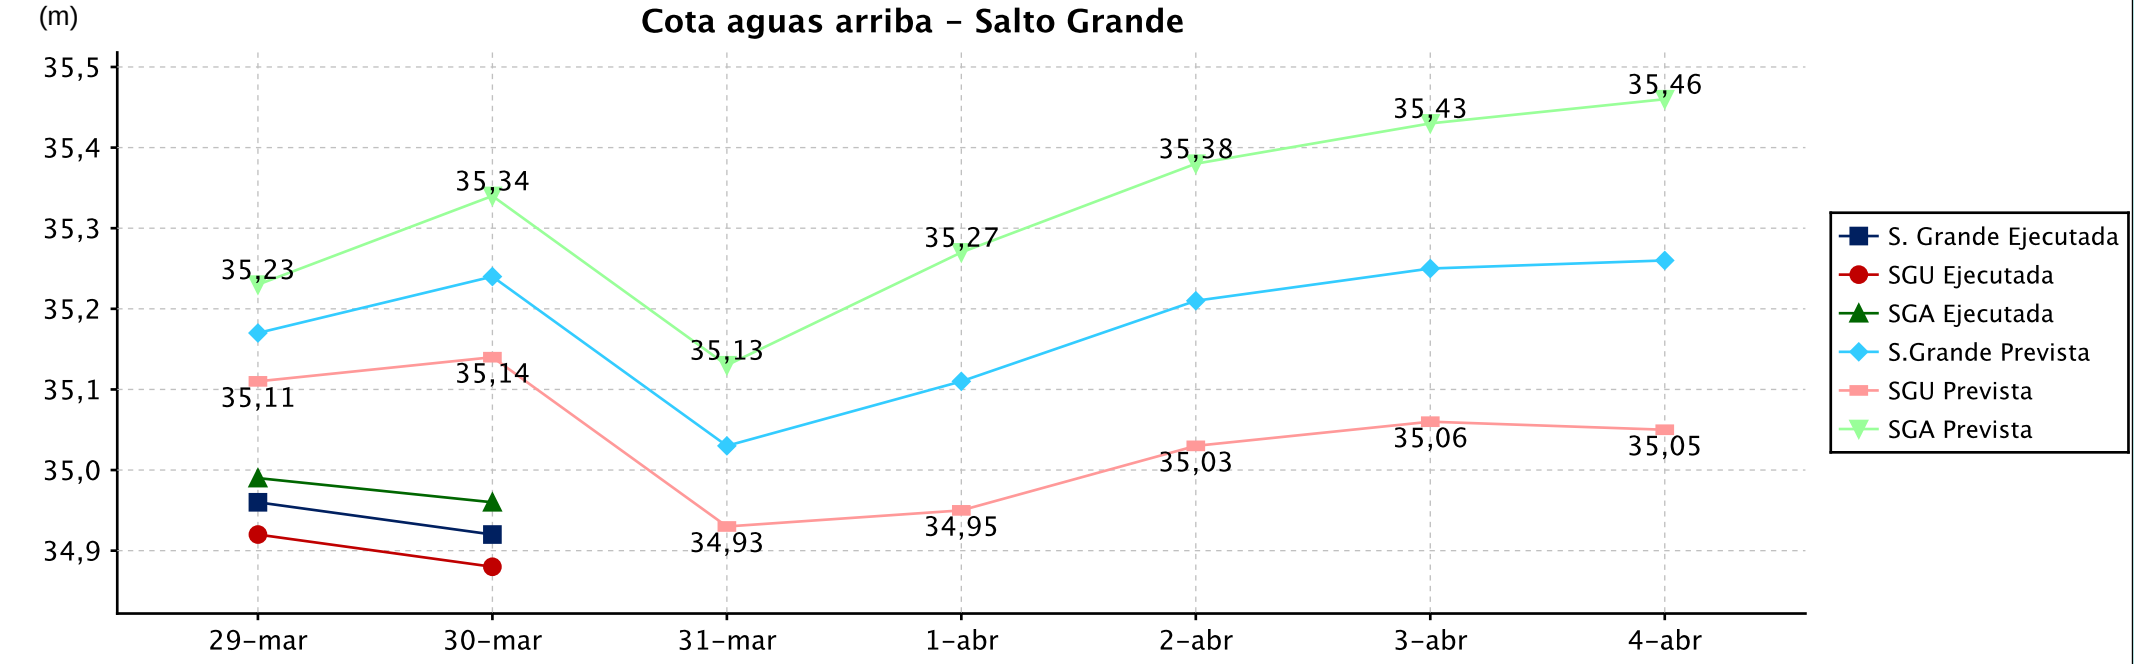

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,88
Cota Vista Arg	34,96
Cota real	34,92
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-1.921

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	470	485
Baygorria	201	489
Palmar	61	84
SGU	3.181	3.156

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	-5
Baygorria	0	16
Palmar	0	233
SGU	3.125	3.120

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
