




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 31 de marzo de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-5
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	0
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.540
C. Baygorria	1.490
C. Palmar	2.250
C. Salto Grande	18.275
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.624
TOTAL Generación	26.125

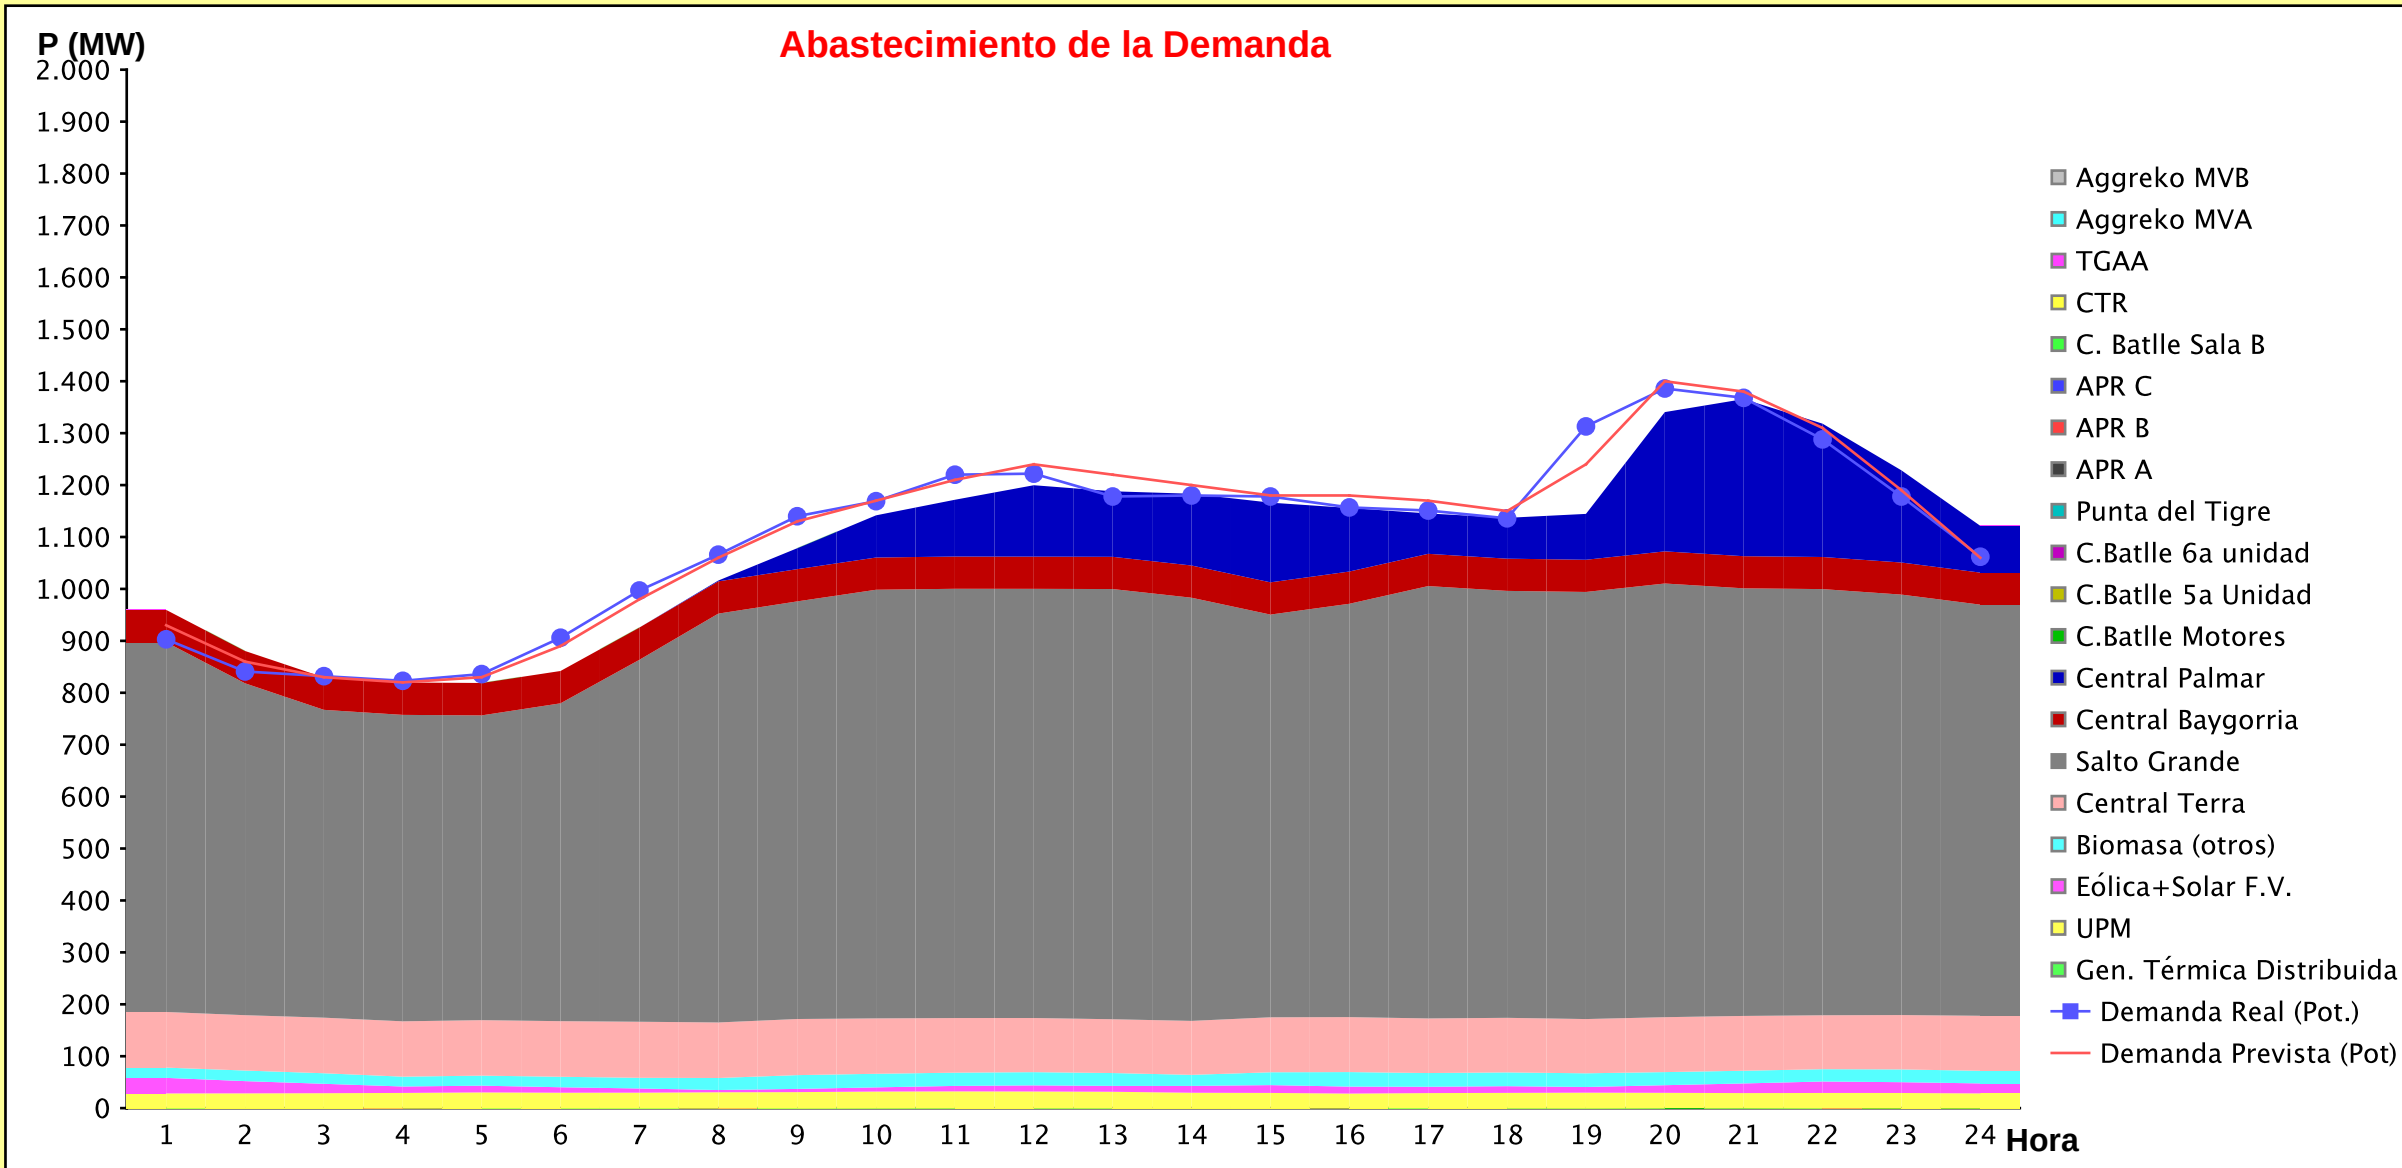

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.125
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.630
Diferencia (MWh)	-505
Ejecutada - Programada	-1,90 %

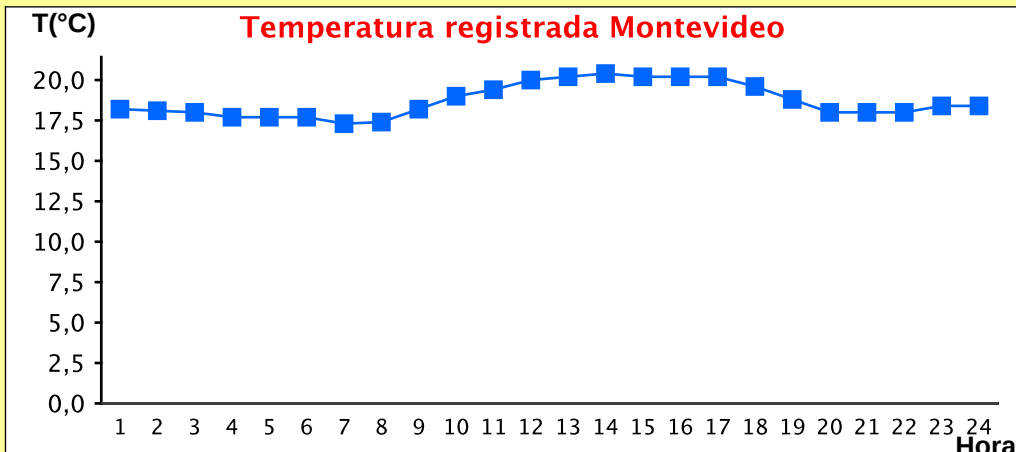



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1249,29 Hora 11:42
Potencia mínima:	829,13 Hora 04:13
Pico noche:	1409,04 Hora 20:50

Generación Media (MW)	
Eólica	14,6
Biomasa	59,0
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

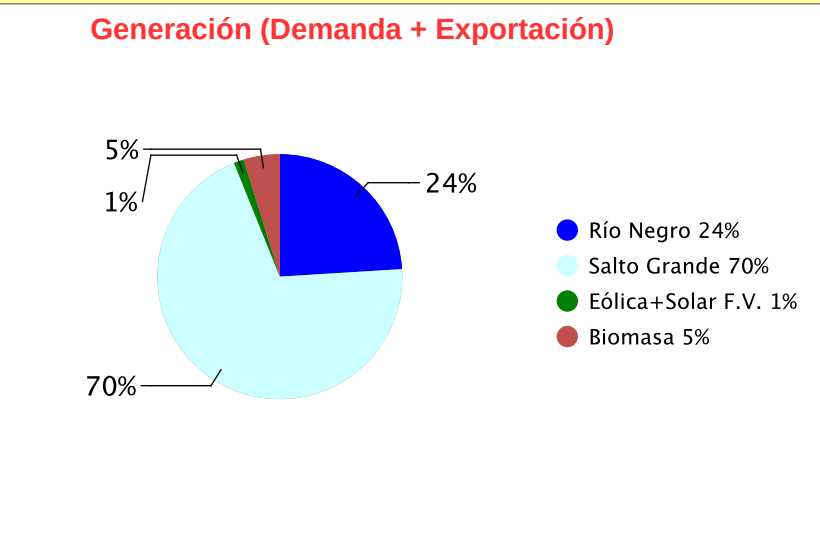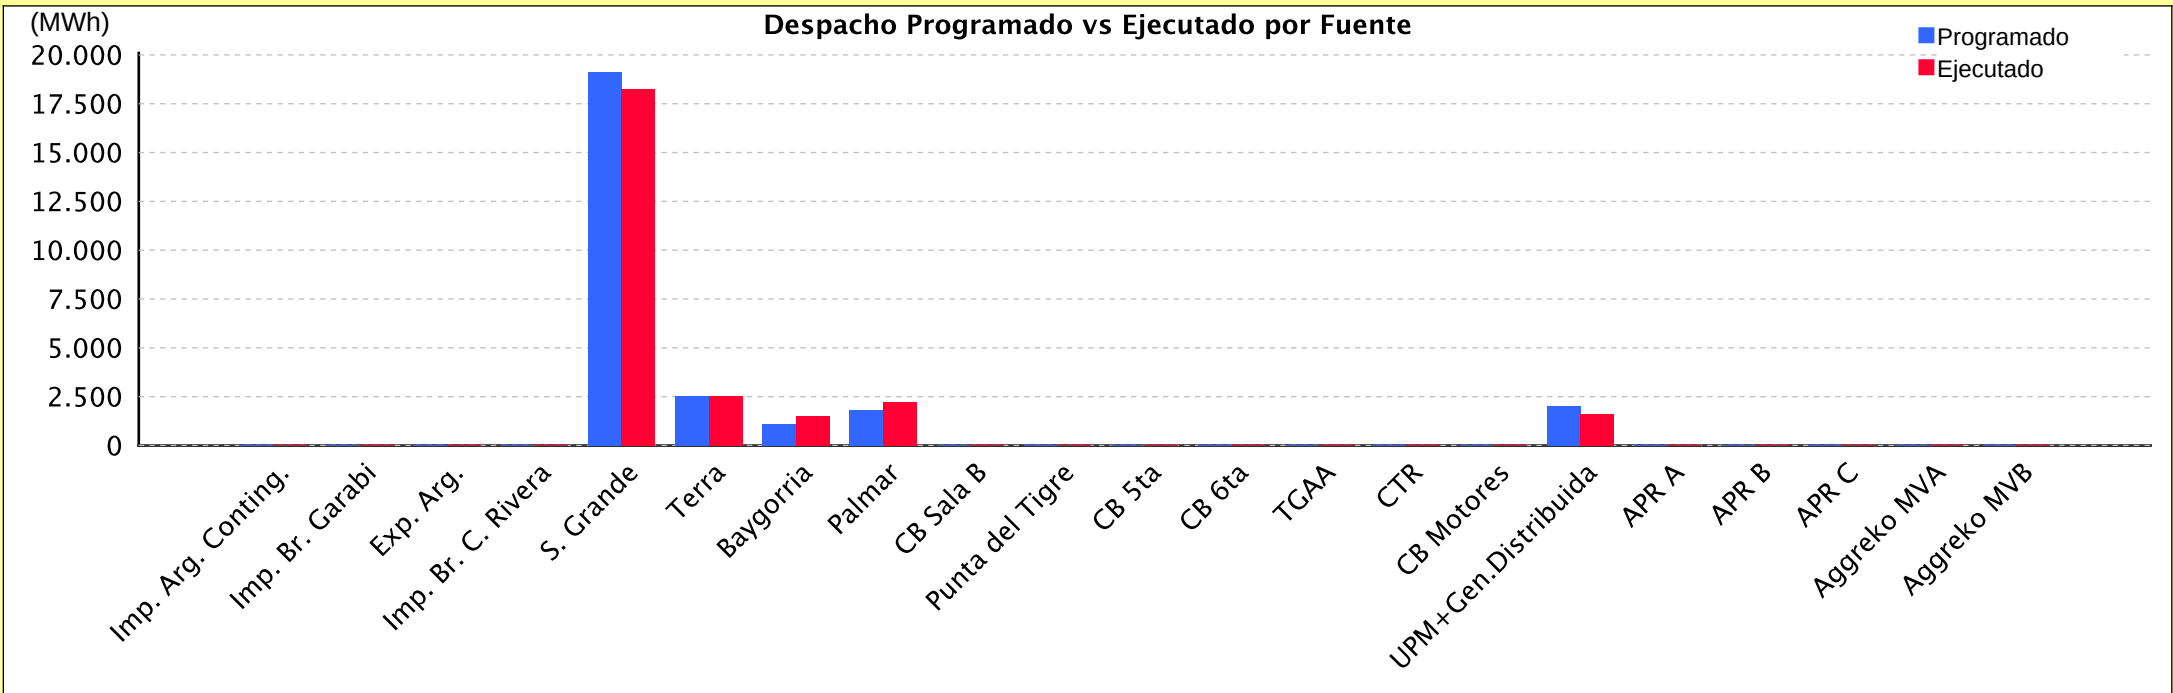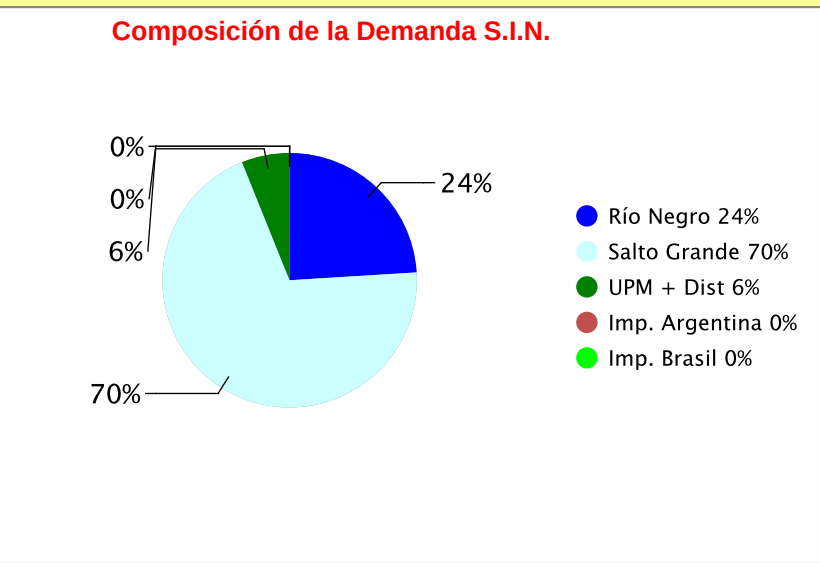



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

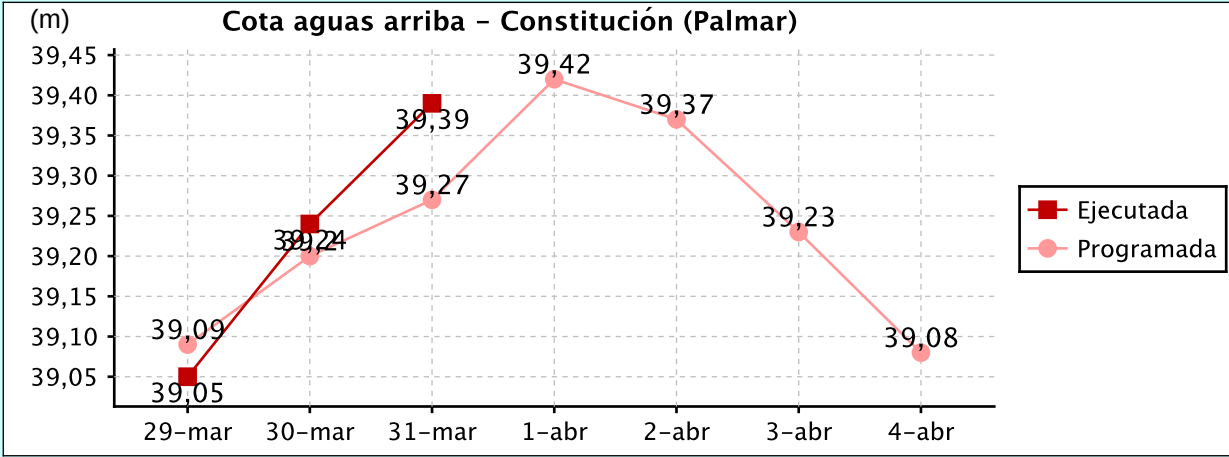
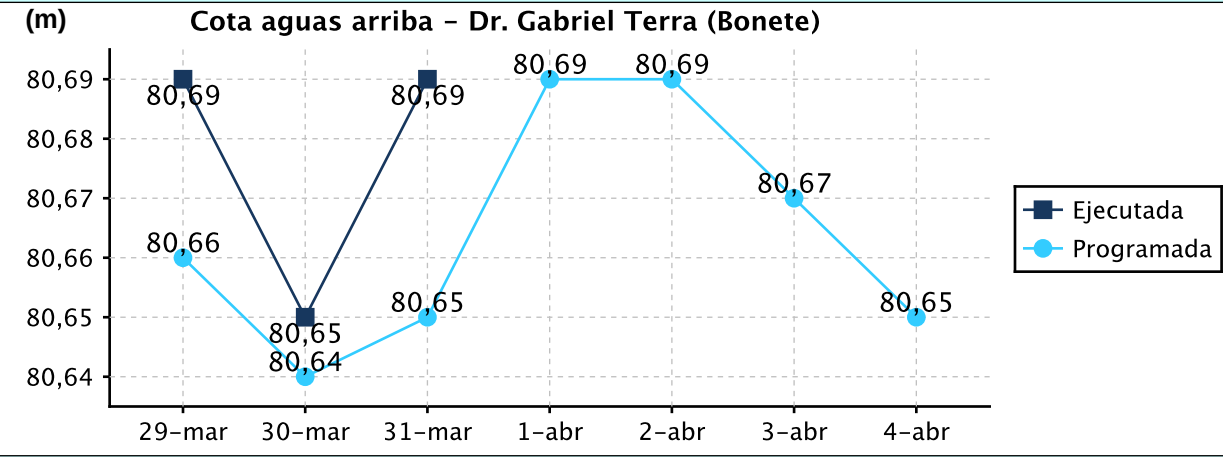


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,65	80,69
Baygorria	54,13	54,11
Palmar	39,27	39,39
SGU	34,93	34,84

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

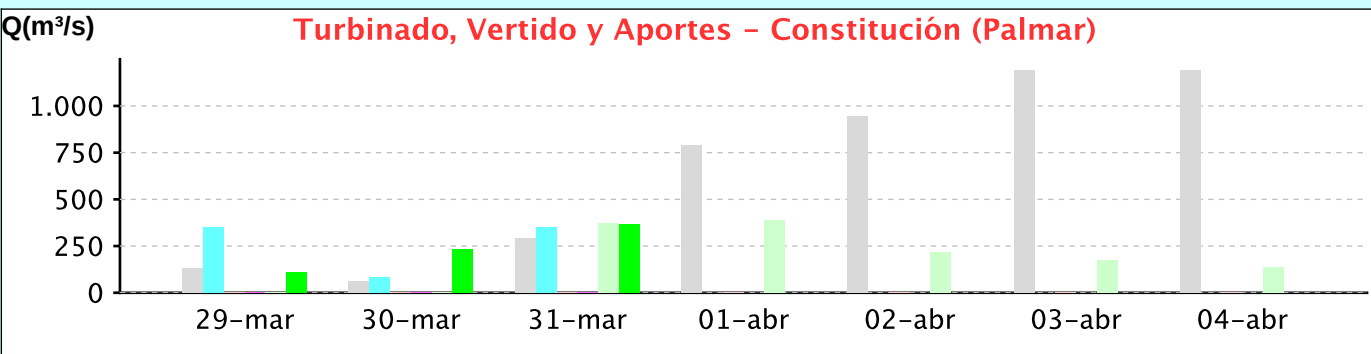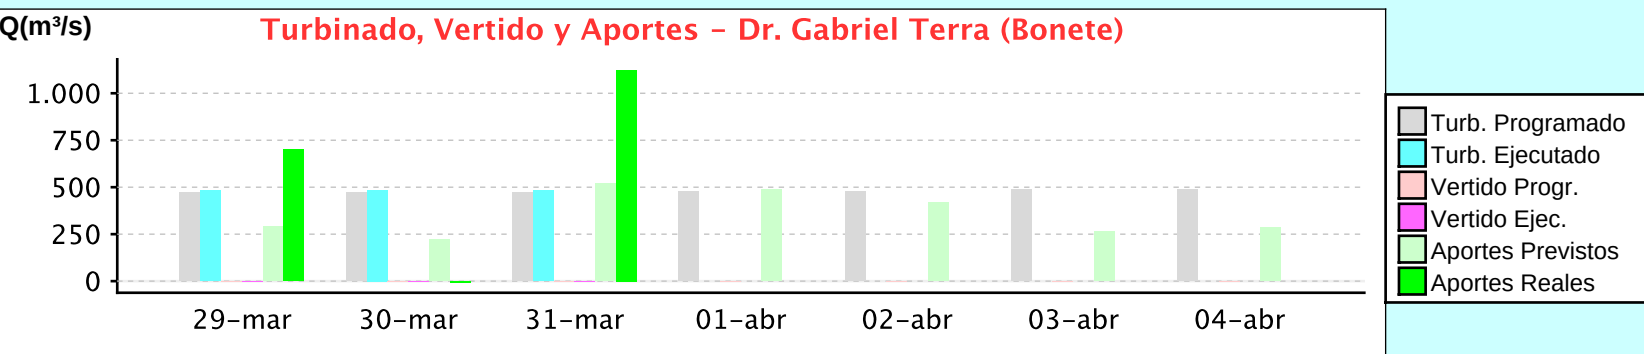

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

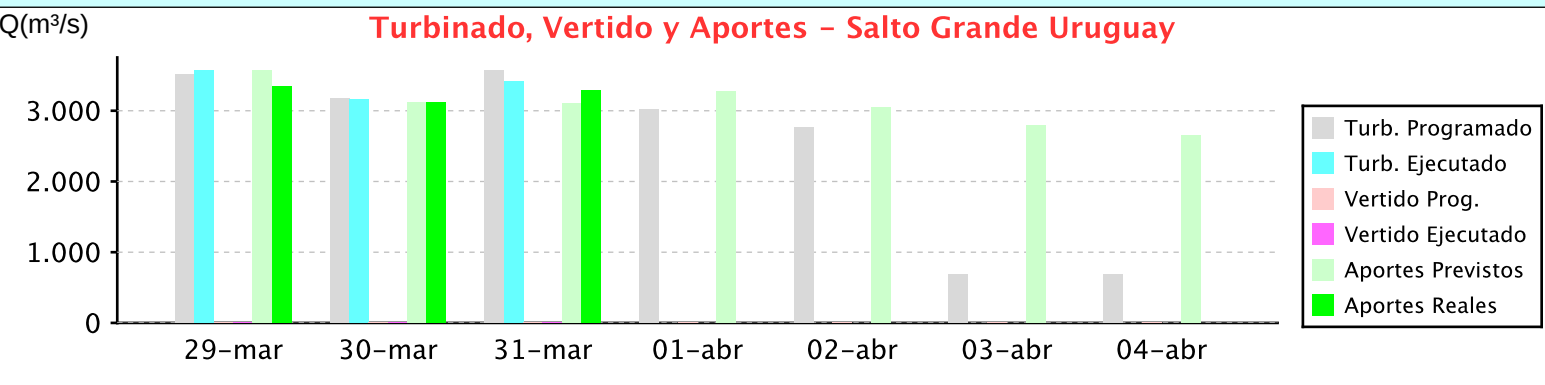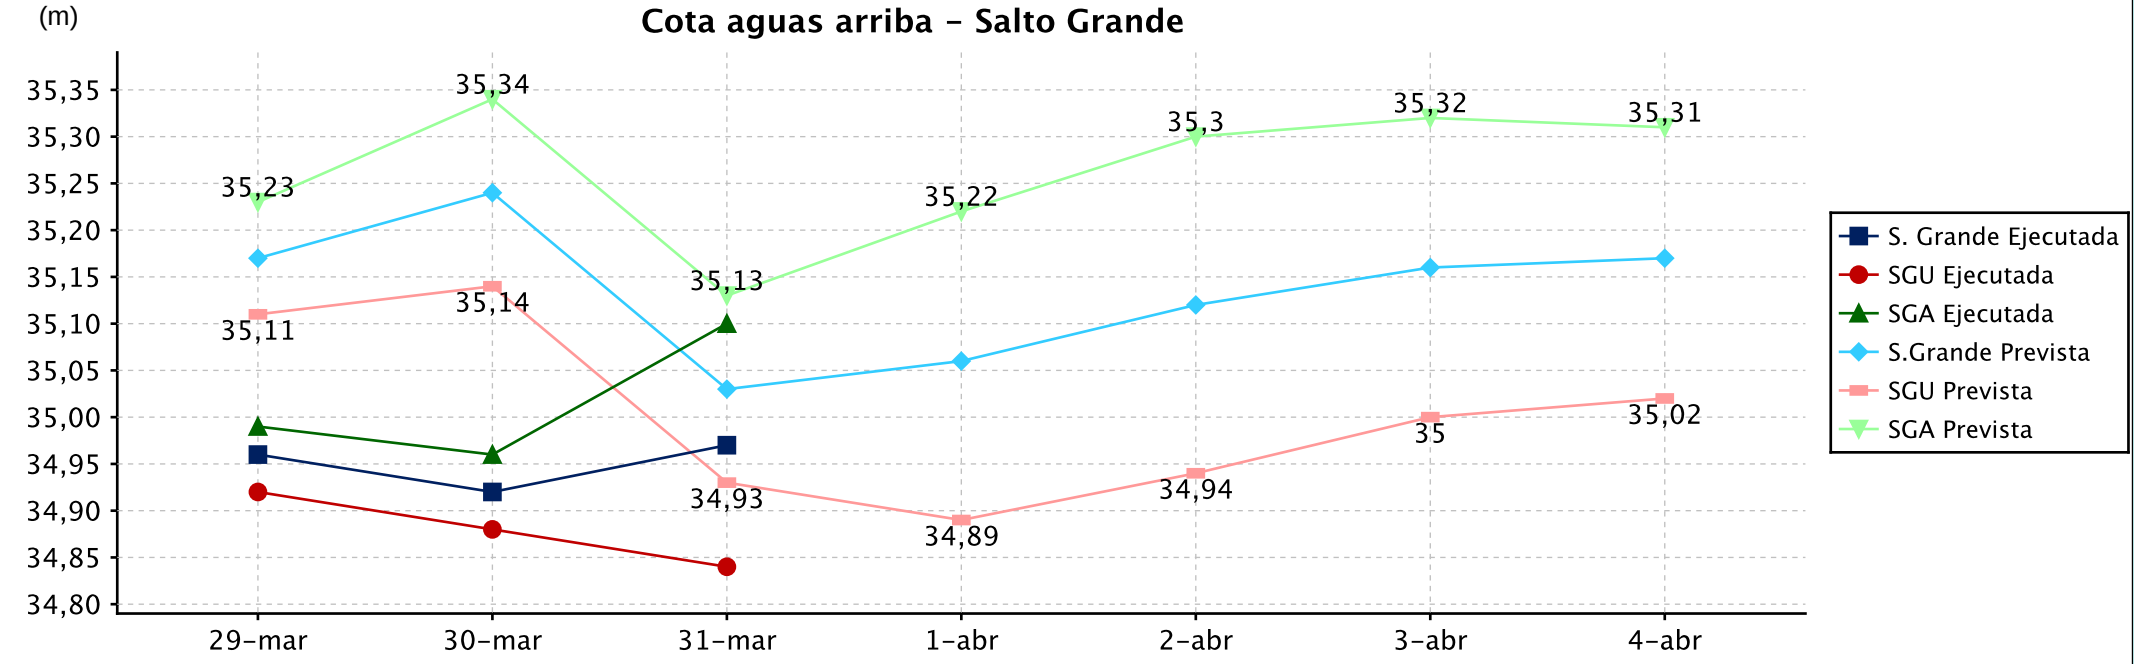

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,84
Cota Vista Arg	35,10
Cota real	34,97
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-5.959

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	470	481
Baygorria	374	496
Palmar	291	350
SGU	3.573	3.412

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	519	1.124
Baygorria	61	50
Palmar	370	366
SGU	3.100	3.283

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
