



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 01 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-10
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-6
Central La Tablada	-39
Central P. del Tigre	0
APR A	20
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.551
C. Baygorria	1.484
C. Palmar	5.102
C. Salto Grande	15.802
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.505
TOTAL Generación	26.412

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.412
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.710
Diferencia (MWh)	-1.298
Ejecutada - Programada	-4,69 %

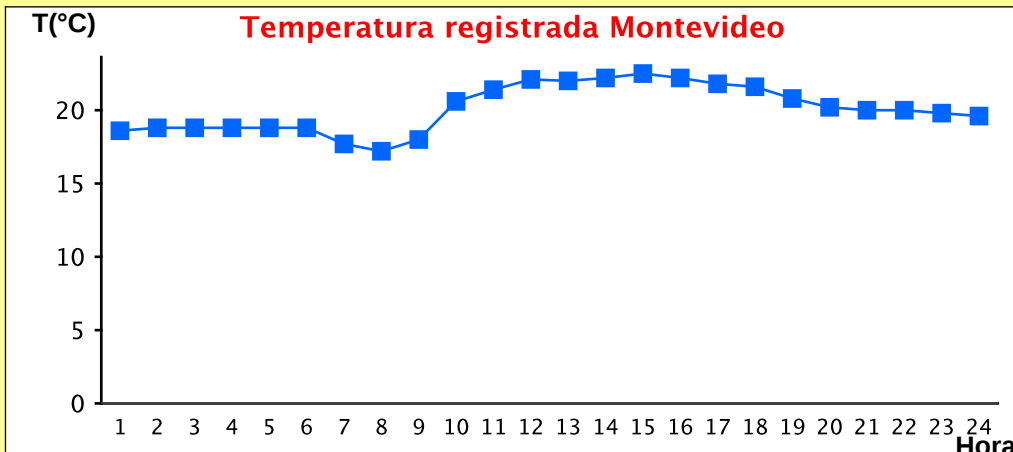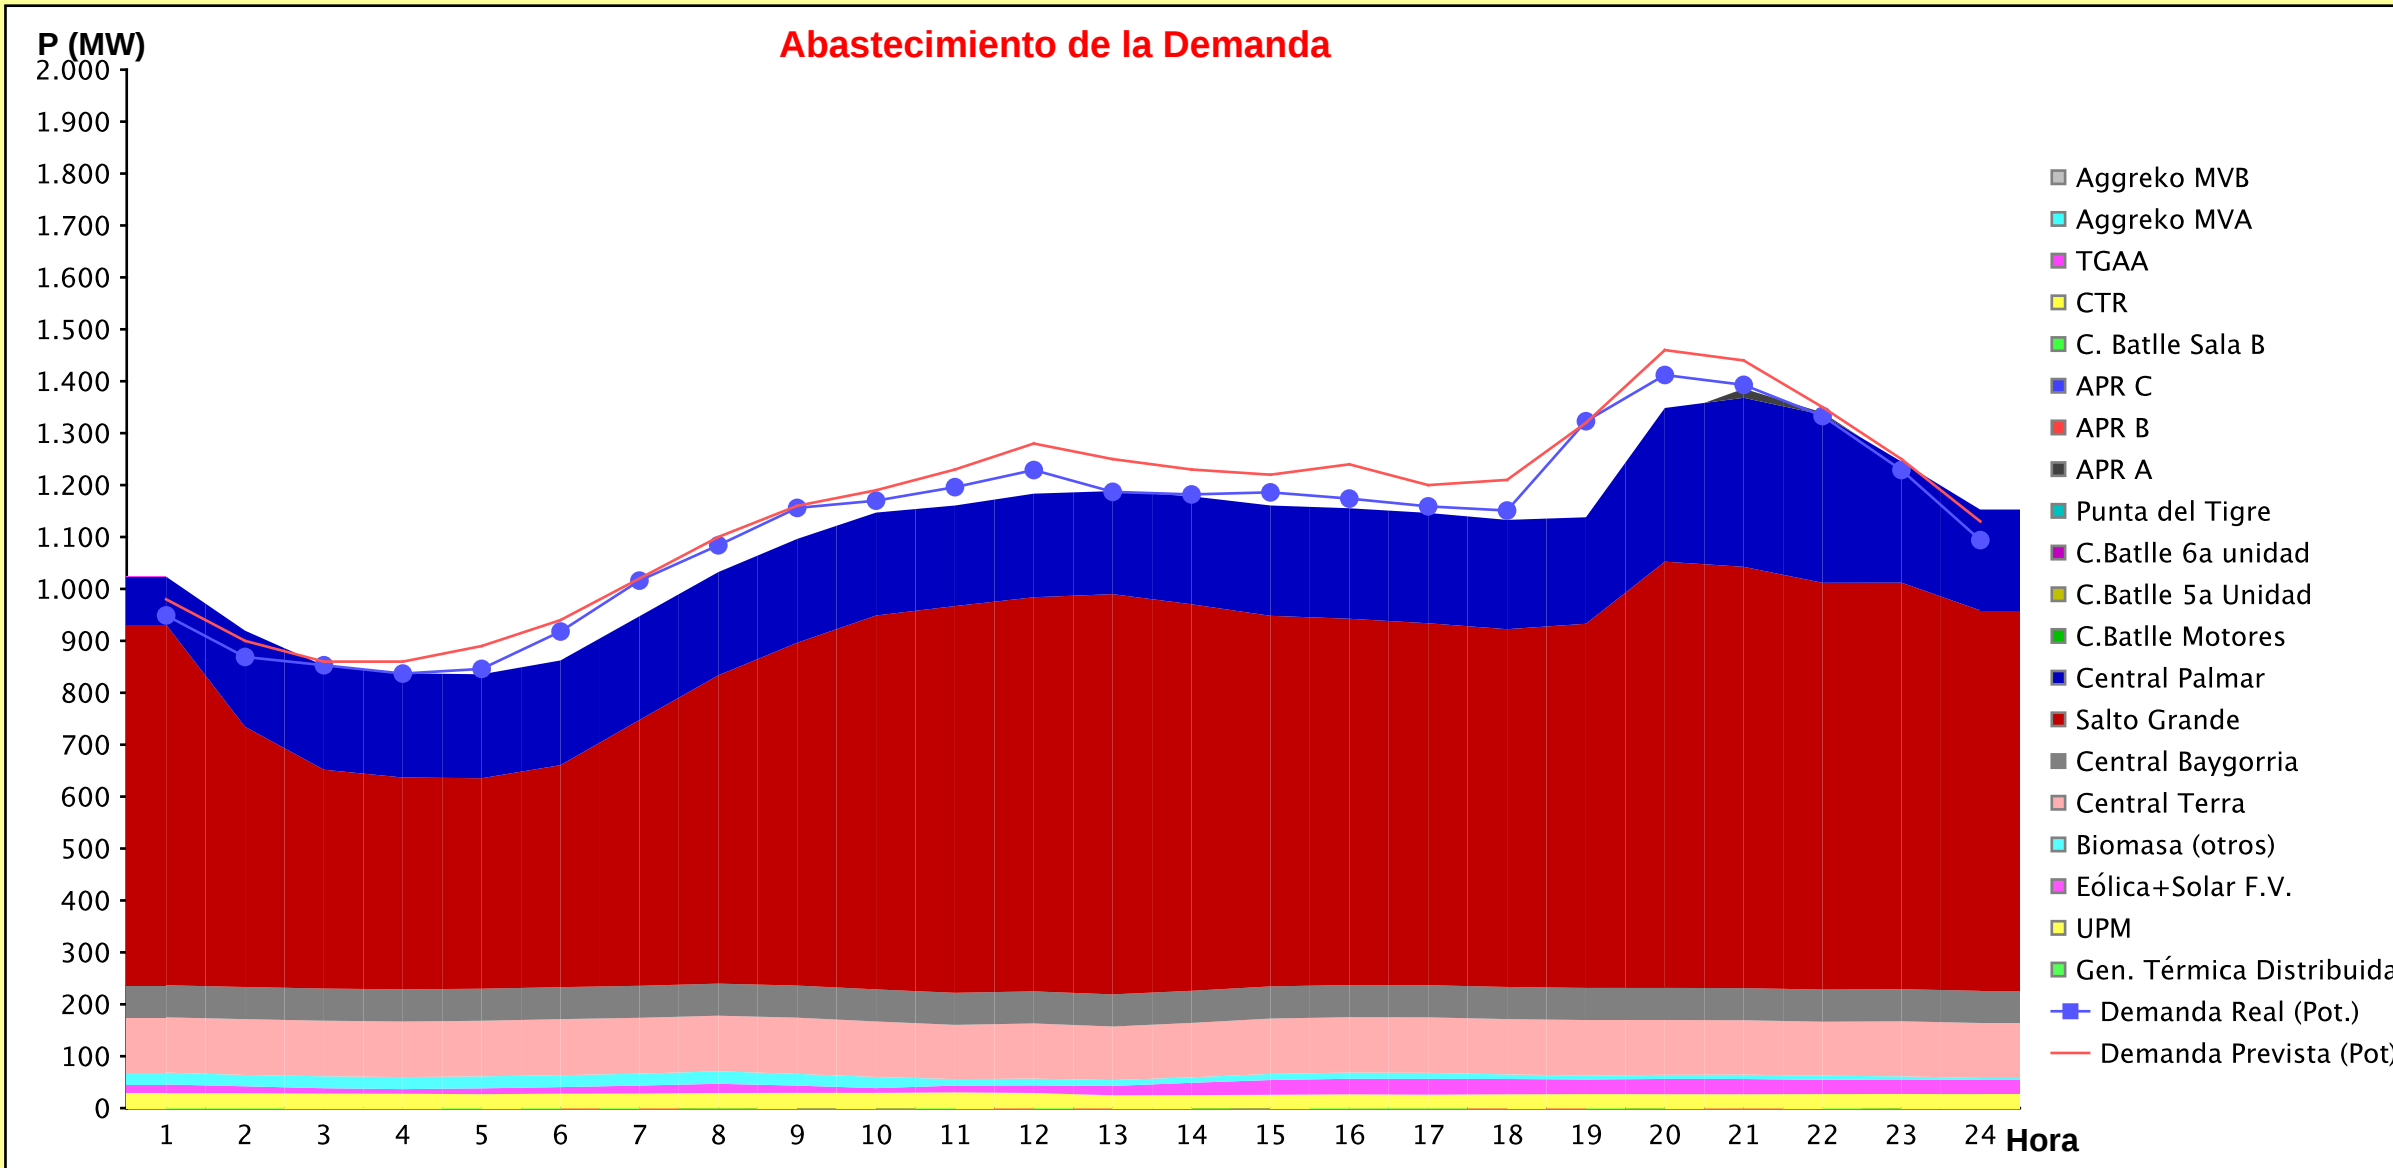



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1270,29 Hora 11:44
Potencia mínima:	849,25 Hora 03:57
Pico noche:	1454,46 Hora 19:51

Generación Media (MW)	
Eólica	20,5
Biomasa	54,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

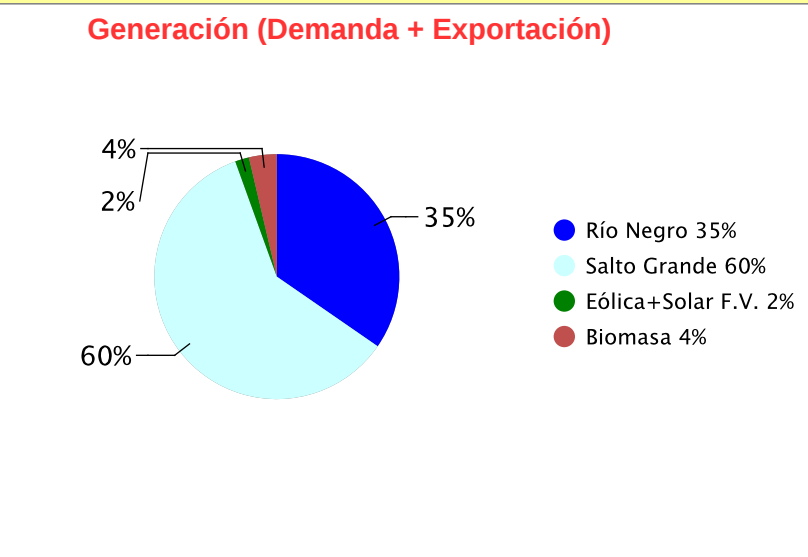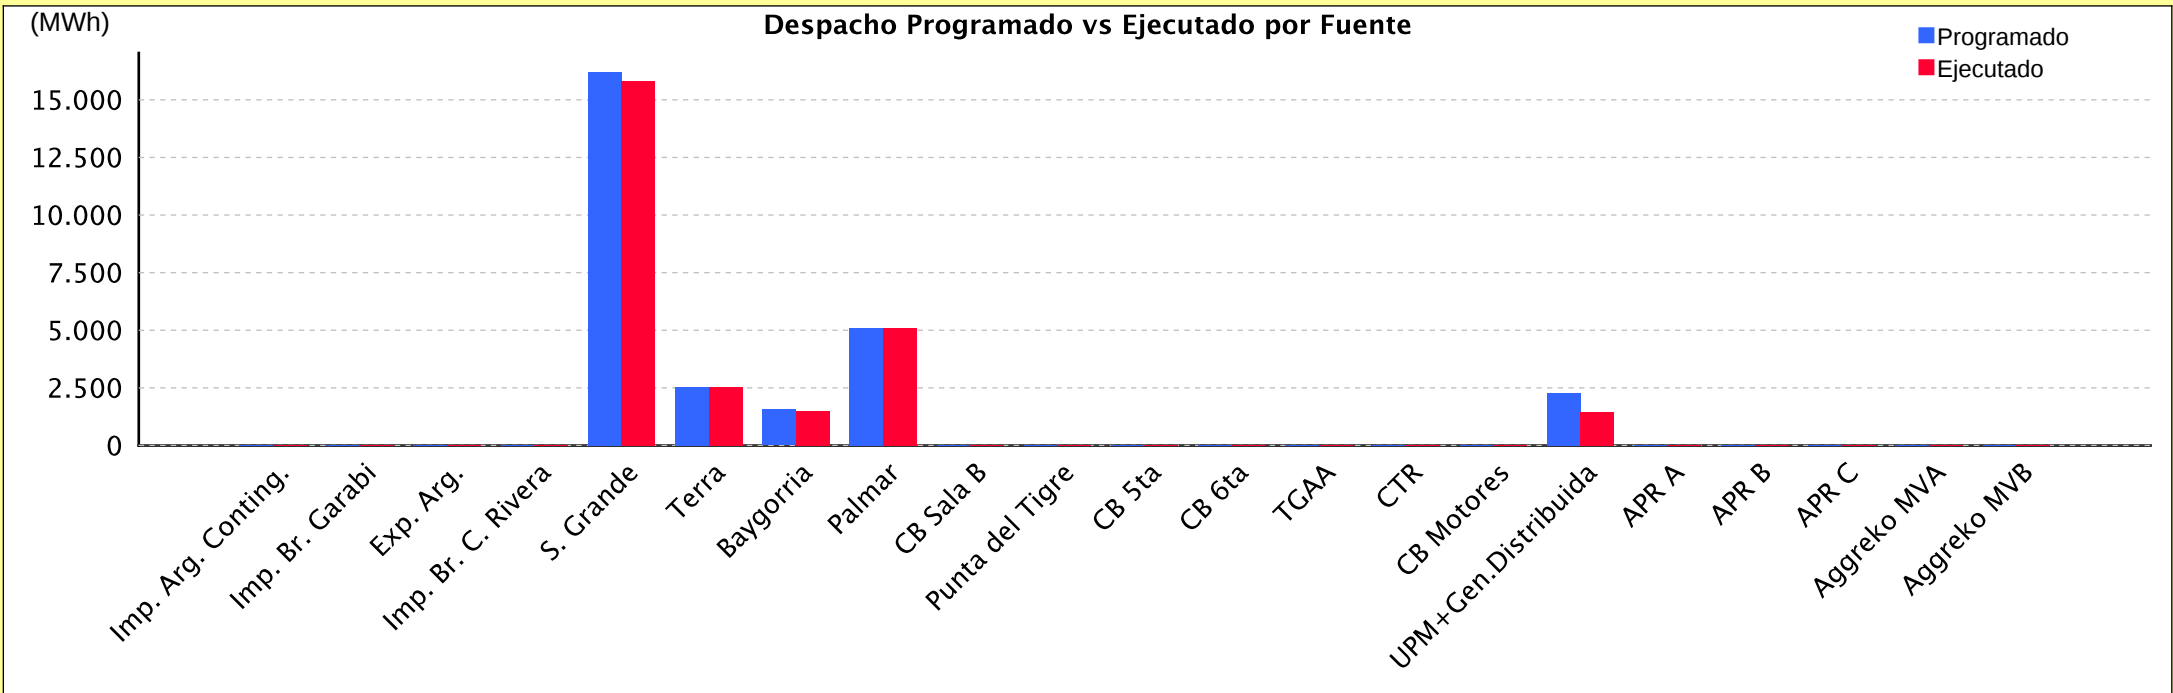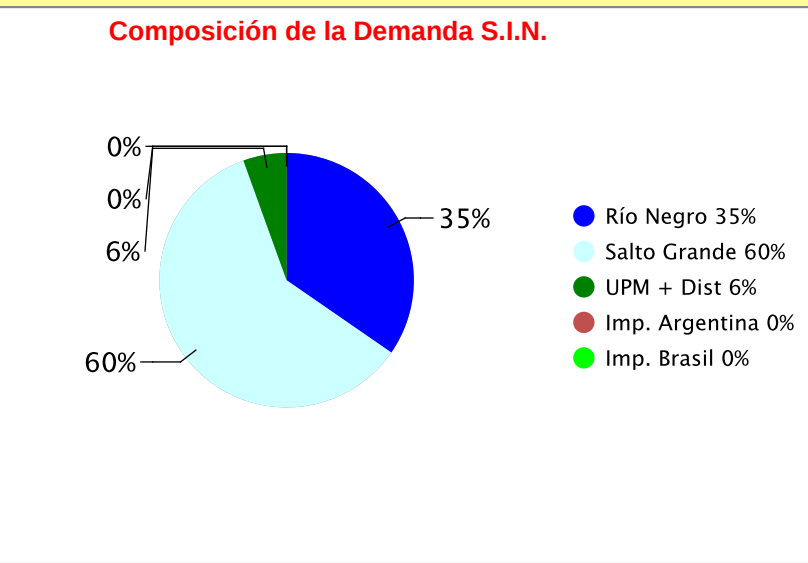



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

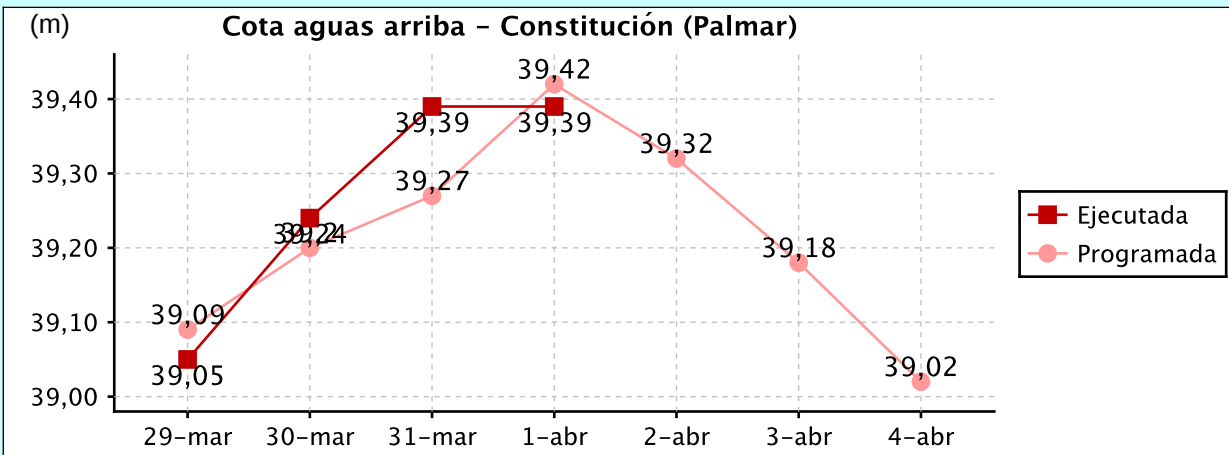
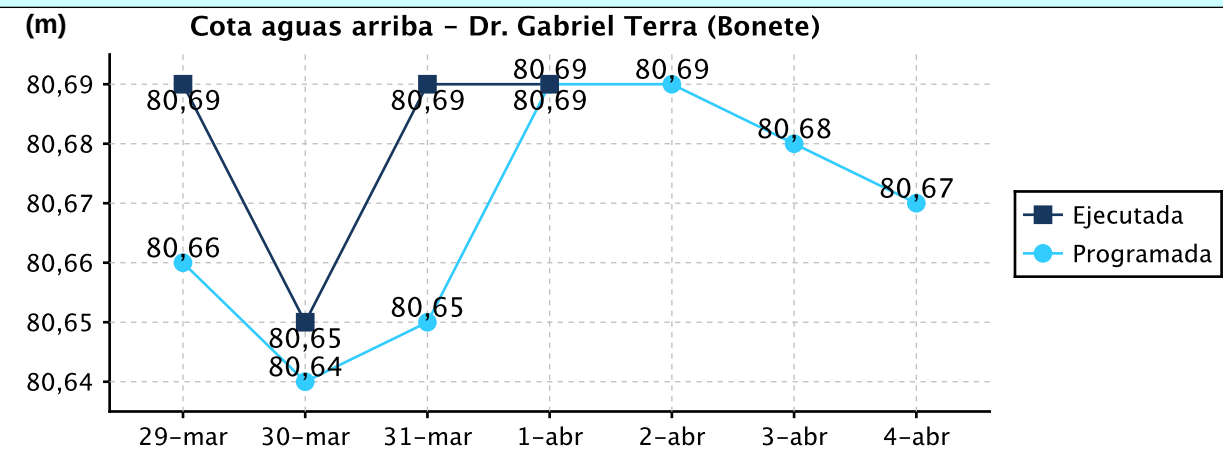


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,69	80,69
Baygorria	54,12	54,12
Palmar	39,42	39,39
SGU	34,89	34,89

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

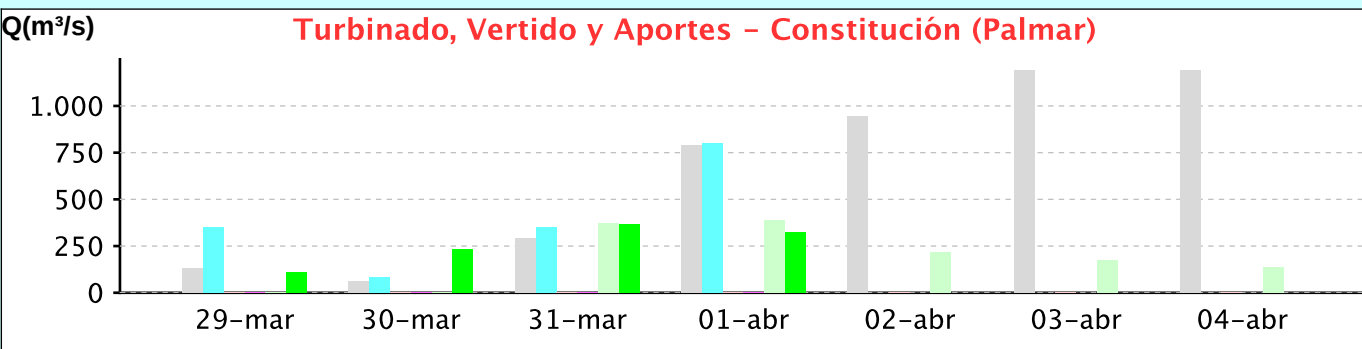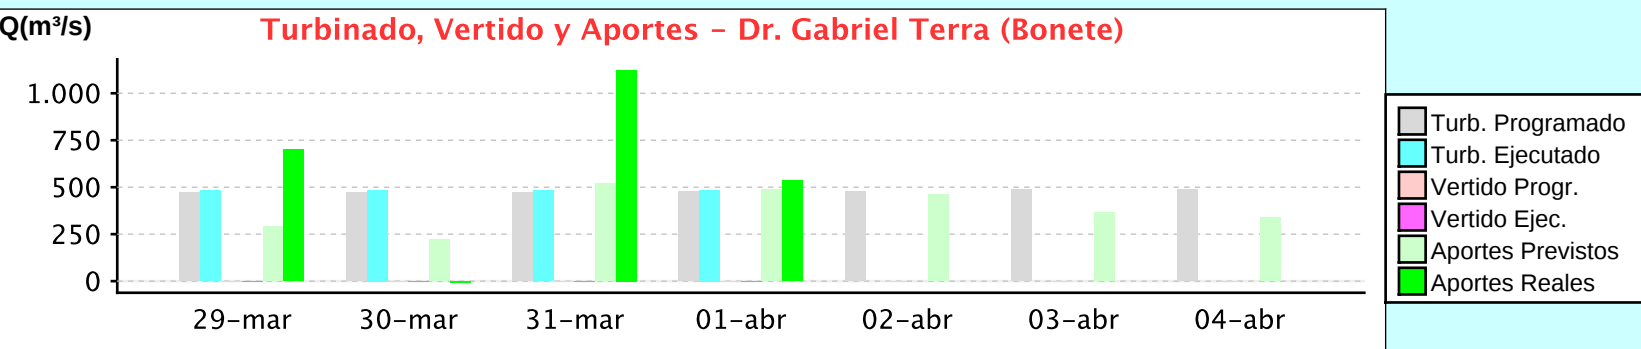

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

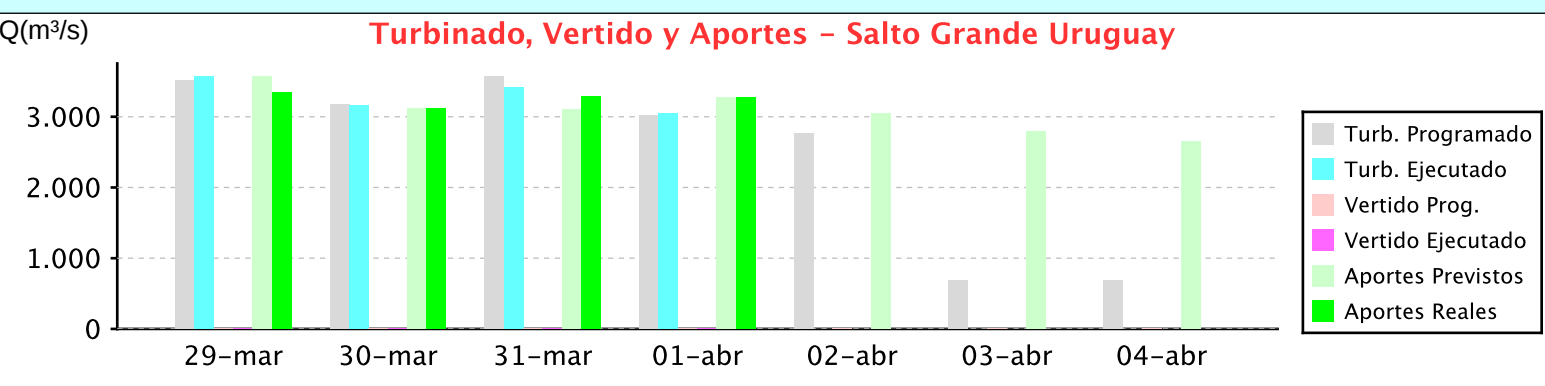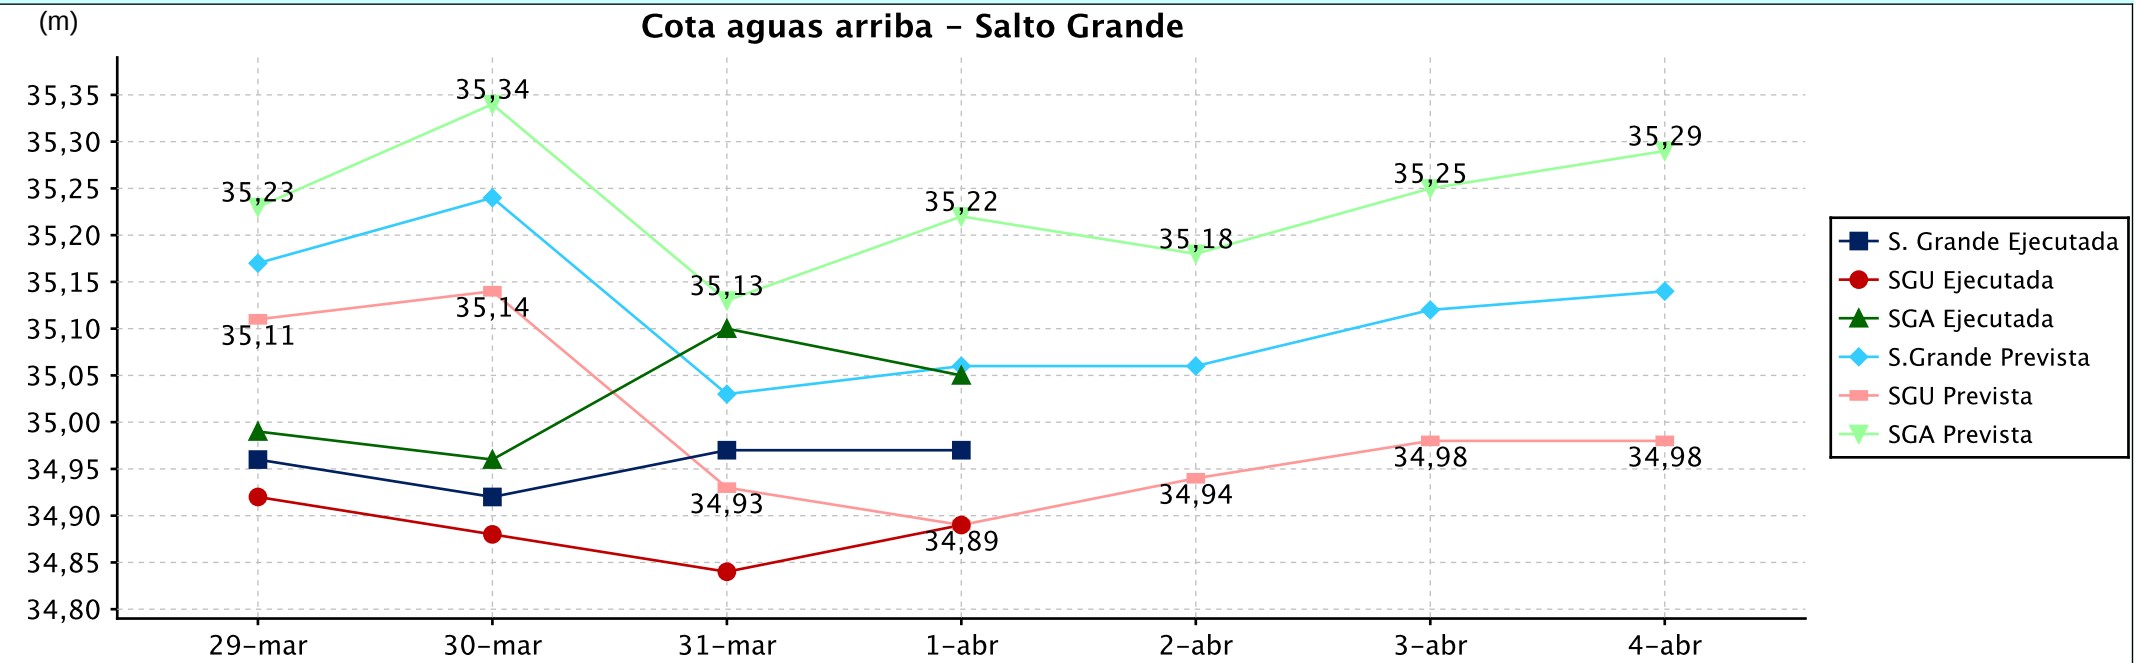

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,89
Cota Vista Arg	35,05
Cota real	34,97

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-3.856
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	478	485
Baygorria	510	497
Palmar	789	801
SGU	3.019	3.051

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	486	536
Baygorria	22	32
Palmar	388	324
SGU	3.275	3.275

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
