



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 03 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	0
APR A	142
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.542
C. Baygorria	1.498
C. Palmar	7.882
C. Salto Grande	14.703
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.324
TOTAL Generación	28.041

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.041
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.280
Diferencia (MWh)	-239
Ejecutada - Programada	-0,85 %

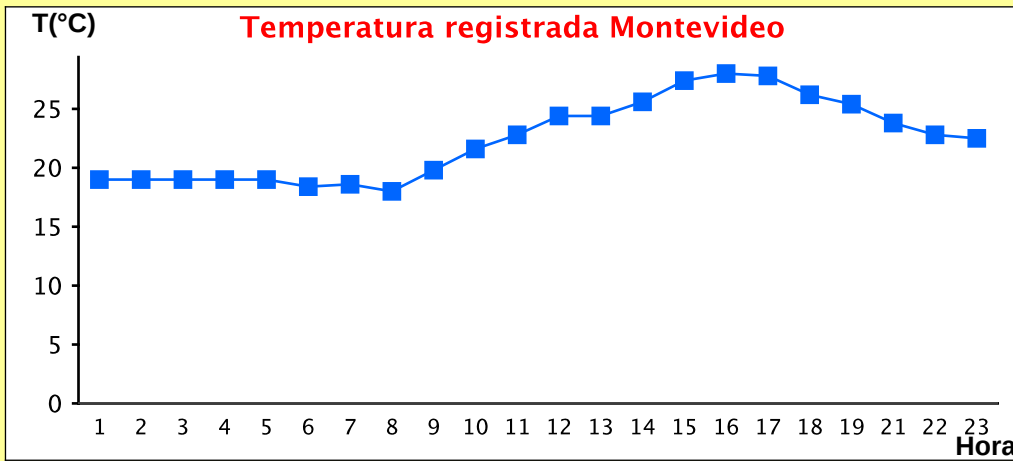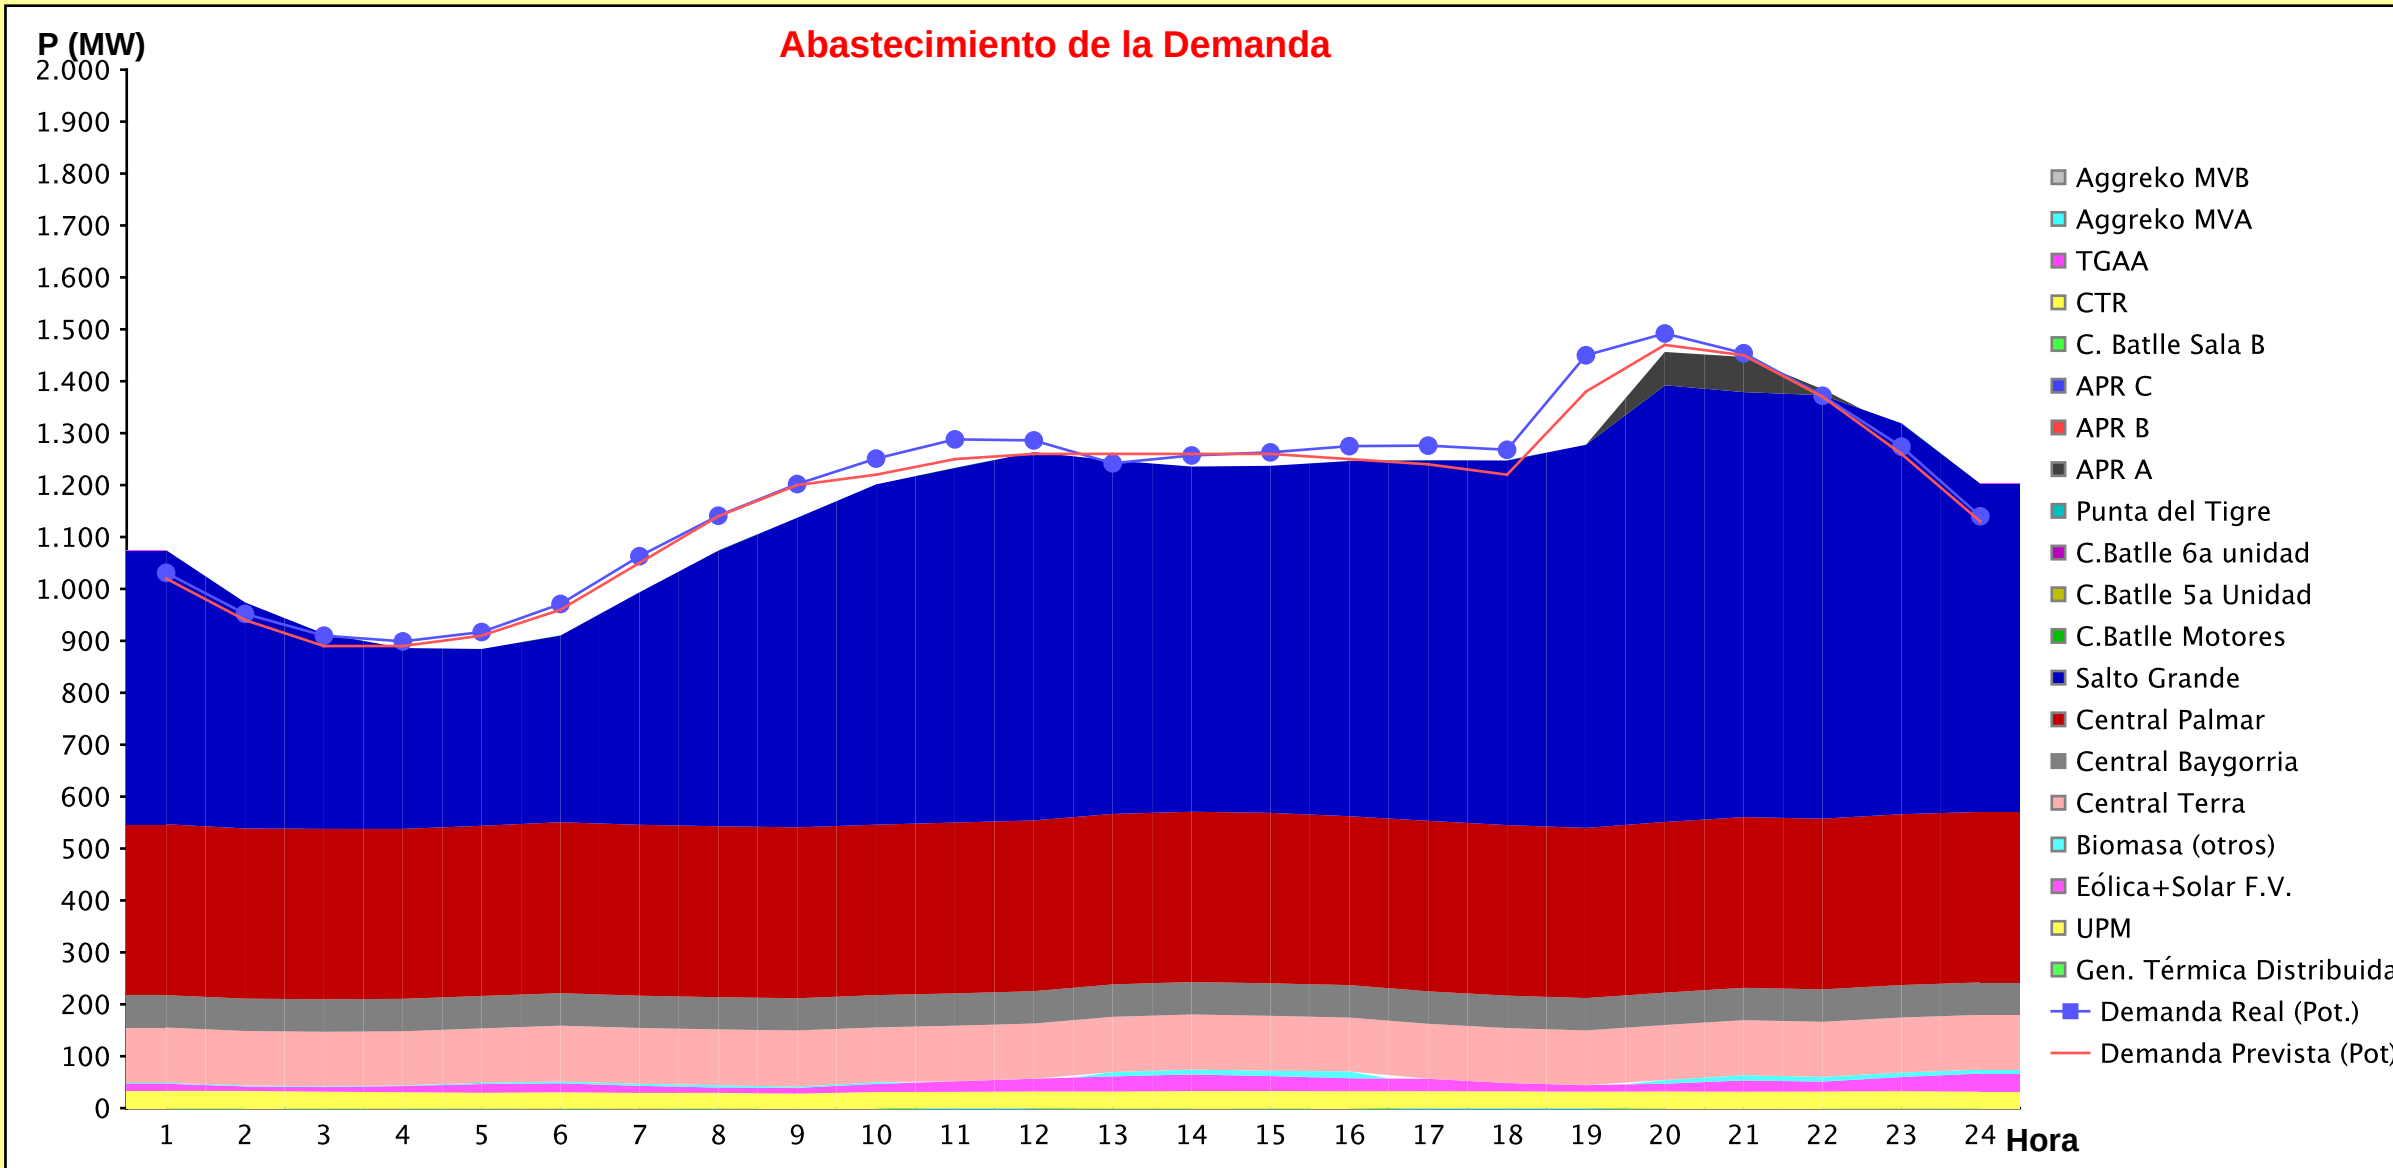



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1338,11 Hora 11:52
Potencia mínima:	893,37 Hora 04:16
Pico noche:	1516,23 Hora 19:32

Generación Media (MW)	
Eólica	19,3
Biomasa	56,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

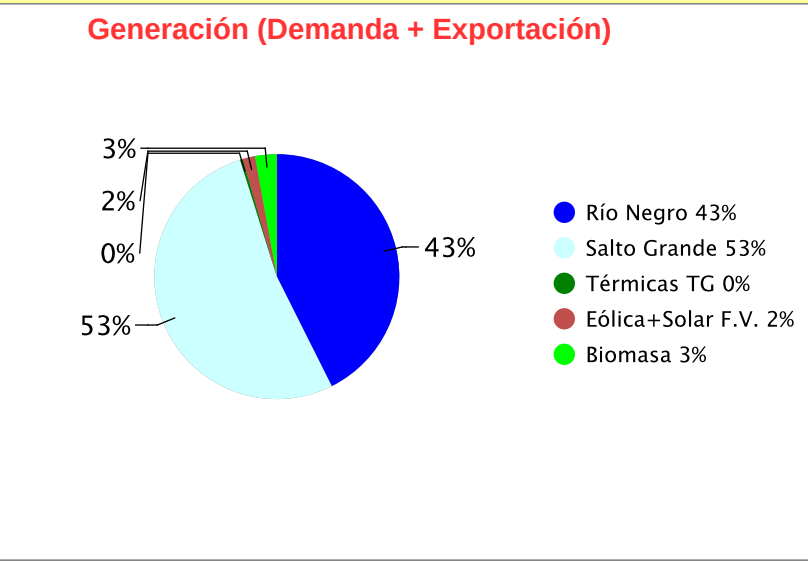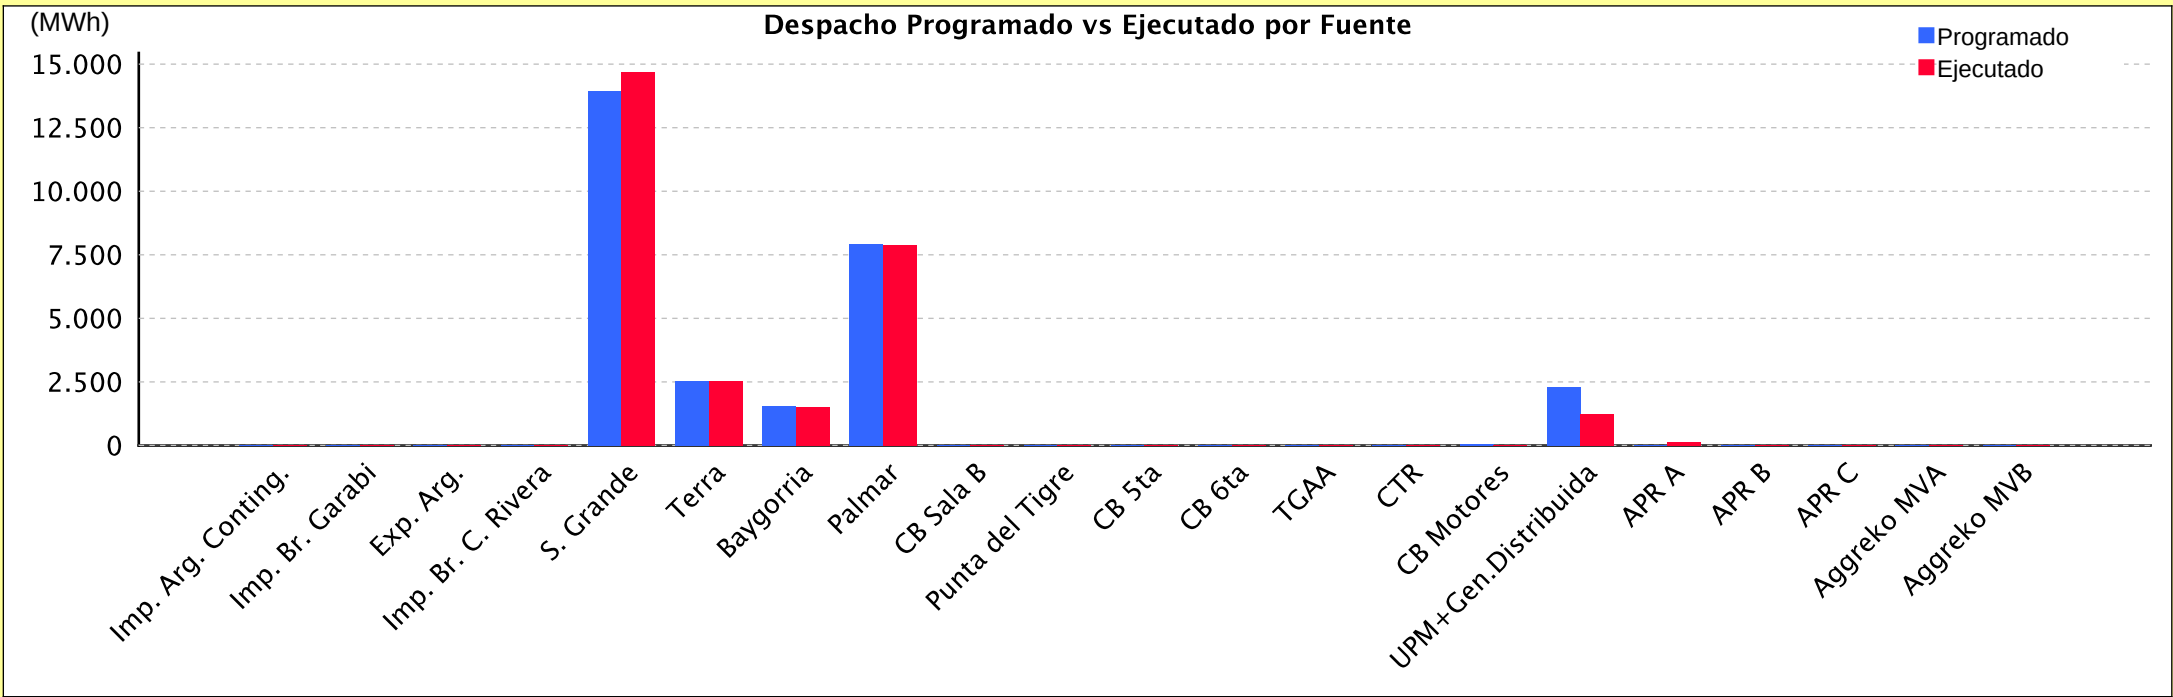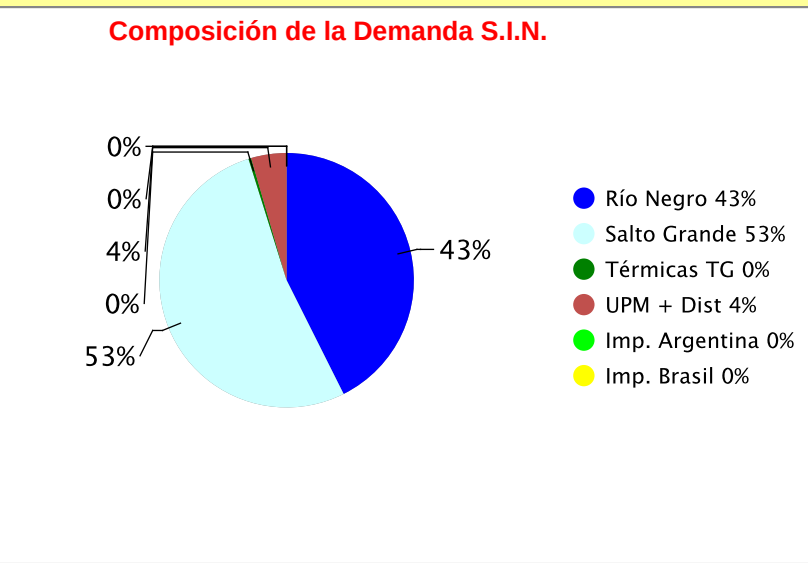



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

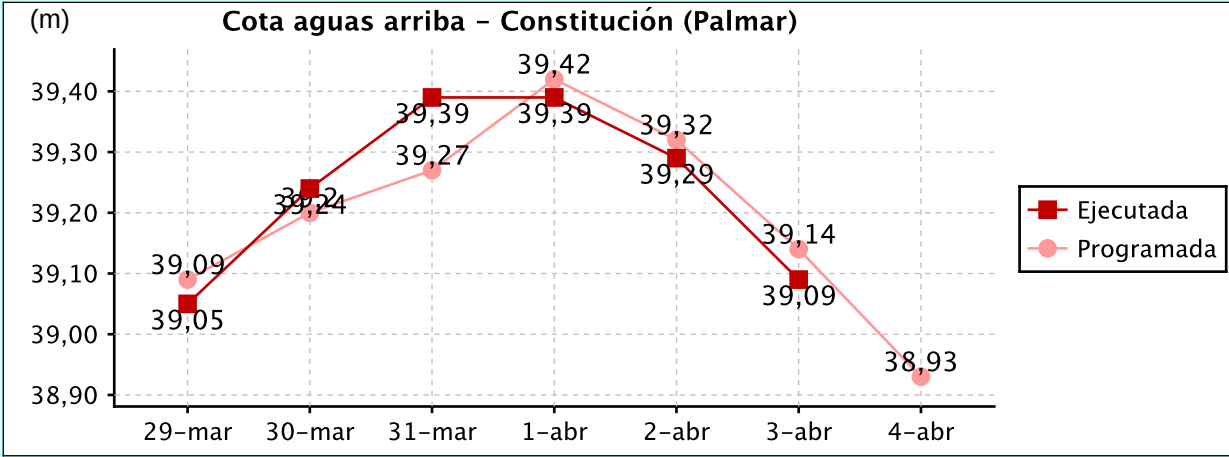
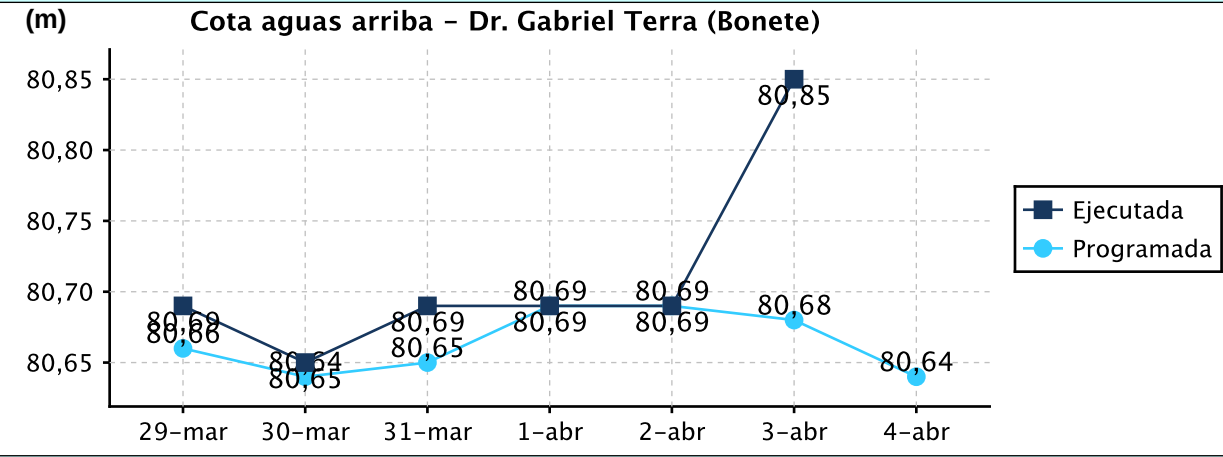


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,68	80,85
Baygorria	54,12	54,12
Palmar	39,14	39,09
SGU	34,94	34,84

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

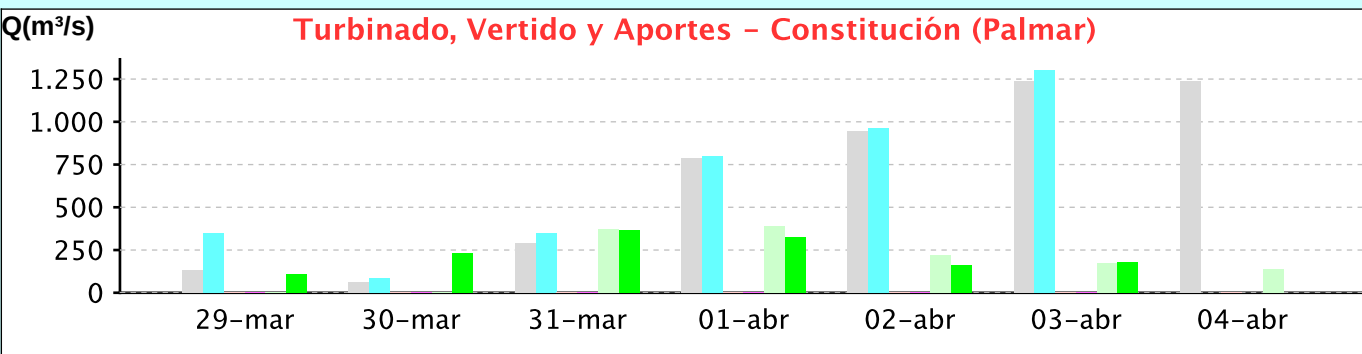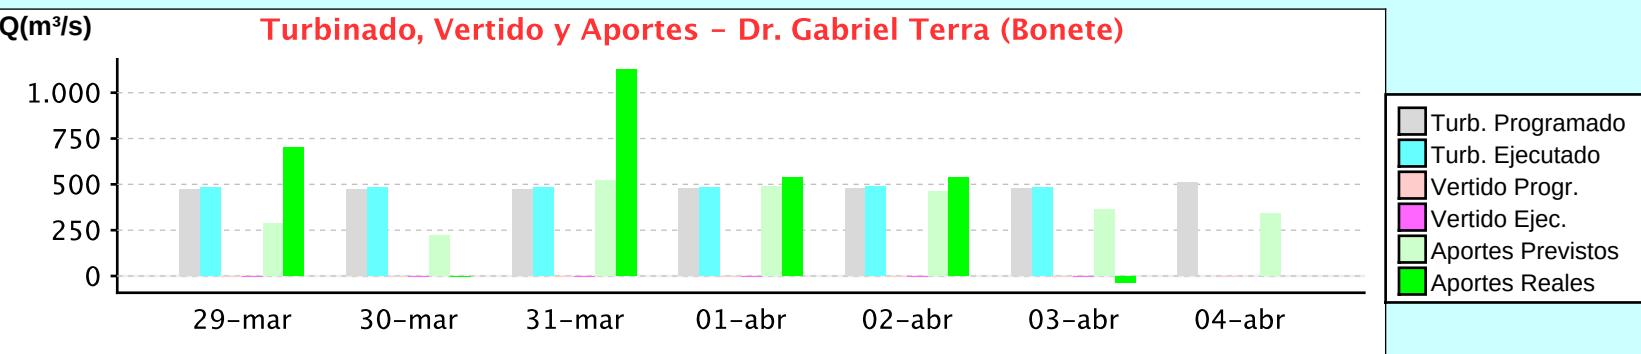

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

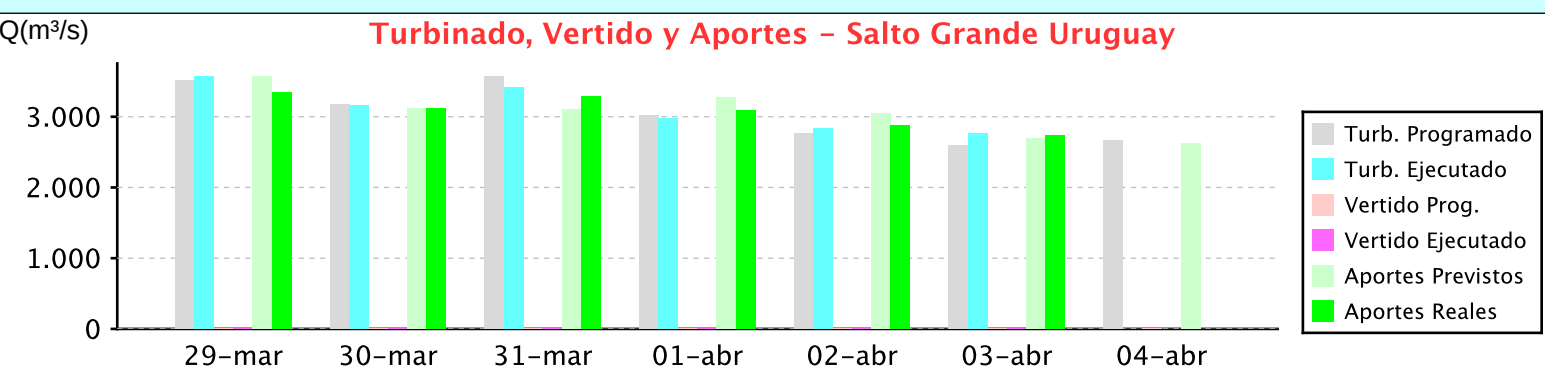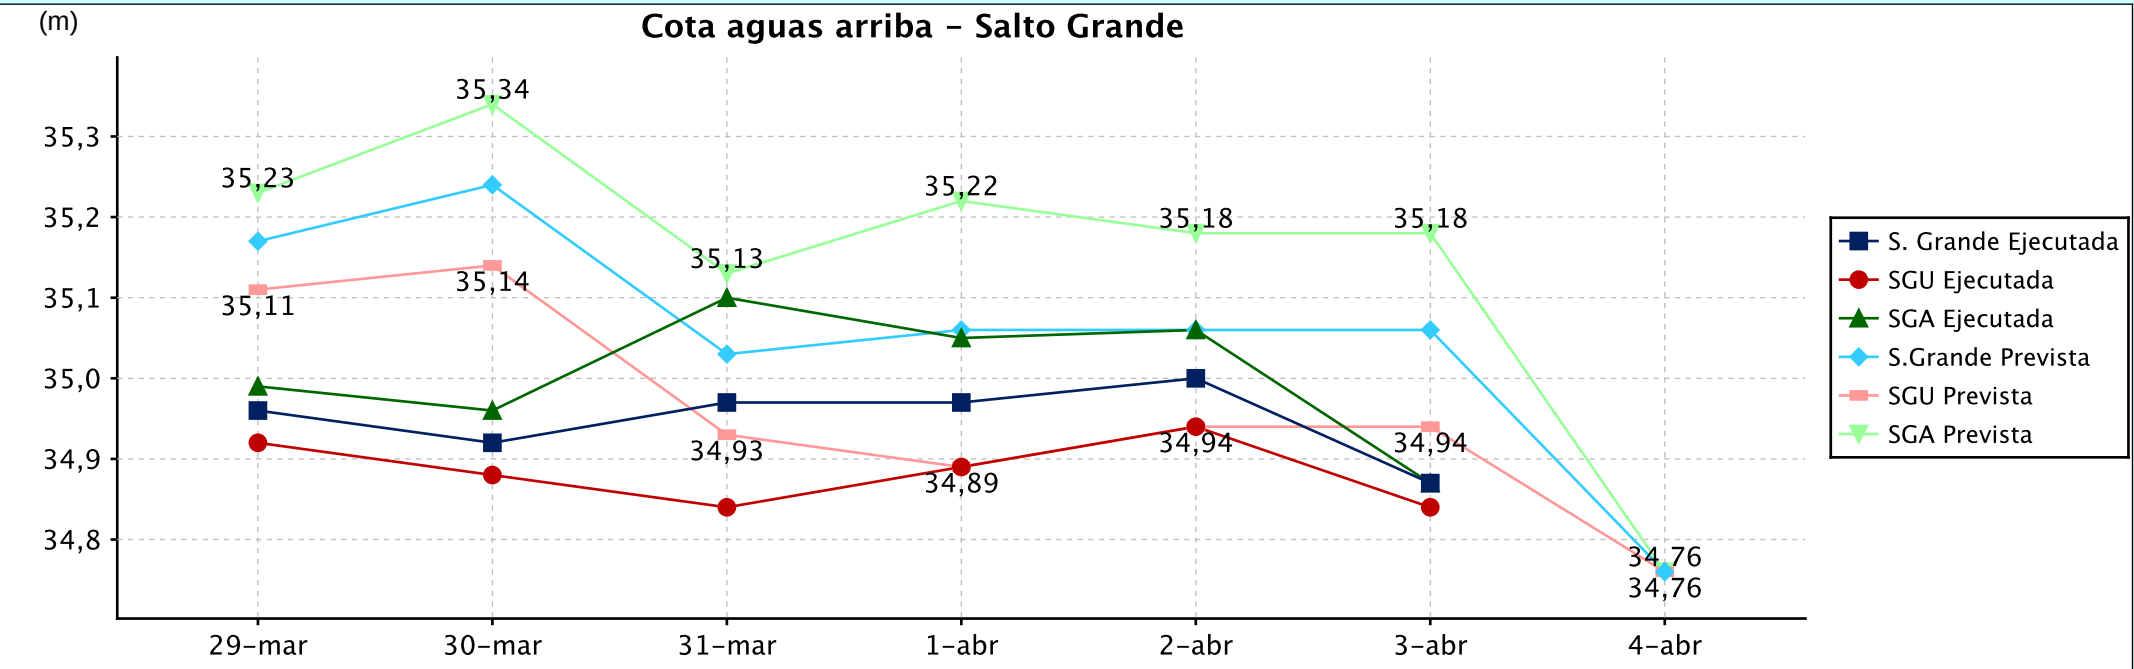

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,84
Cota Vista Arg	34,87
Cota real	34,87

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-690
---------------------------------	------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	478	482
Baygorria	516	491
Palmar	1.238	1.301
SGU	2.593	2.766

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	364	-34
Baygorria	0	18
Palmar	174	181
SGU	2.700	2.734

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
