



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 06 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-53
Central P. del Tigre	0
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.738
C. Baygorria	1.494
C. Palmar	7.803
C. Salto Grande	11.662
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.636
TOTAL Generación	24.268

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.268
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	24.190
Diferencia (MWh)	78
Ejecutada - Programada	0,32 %

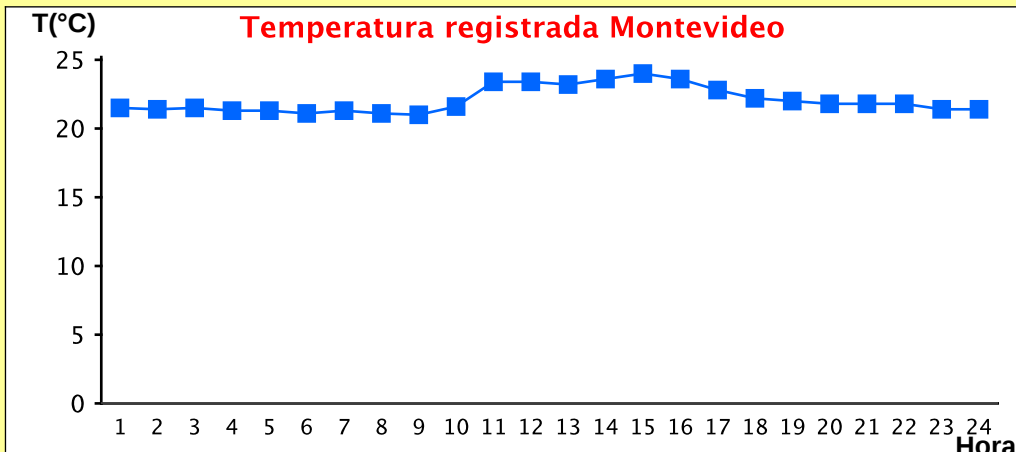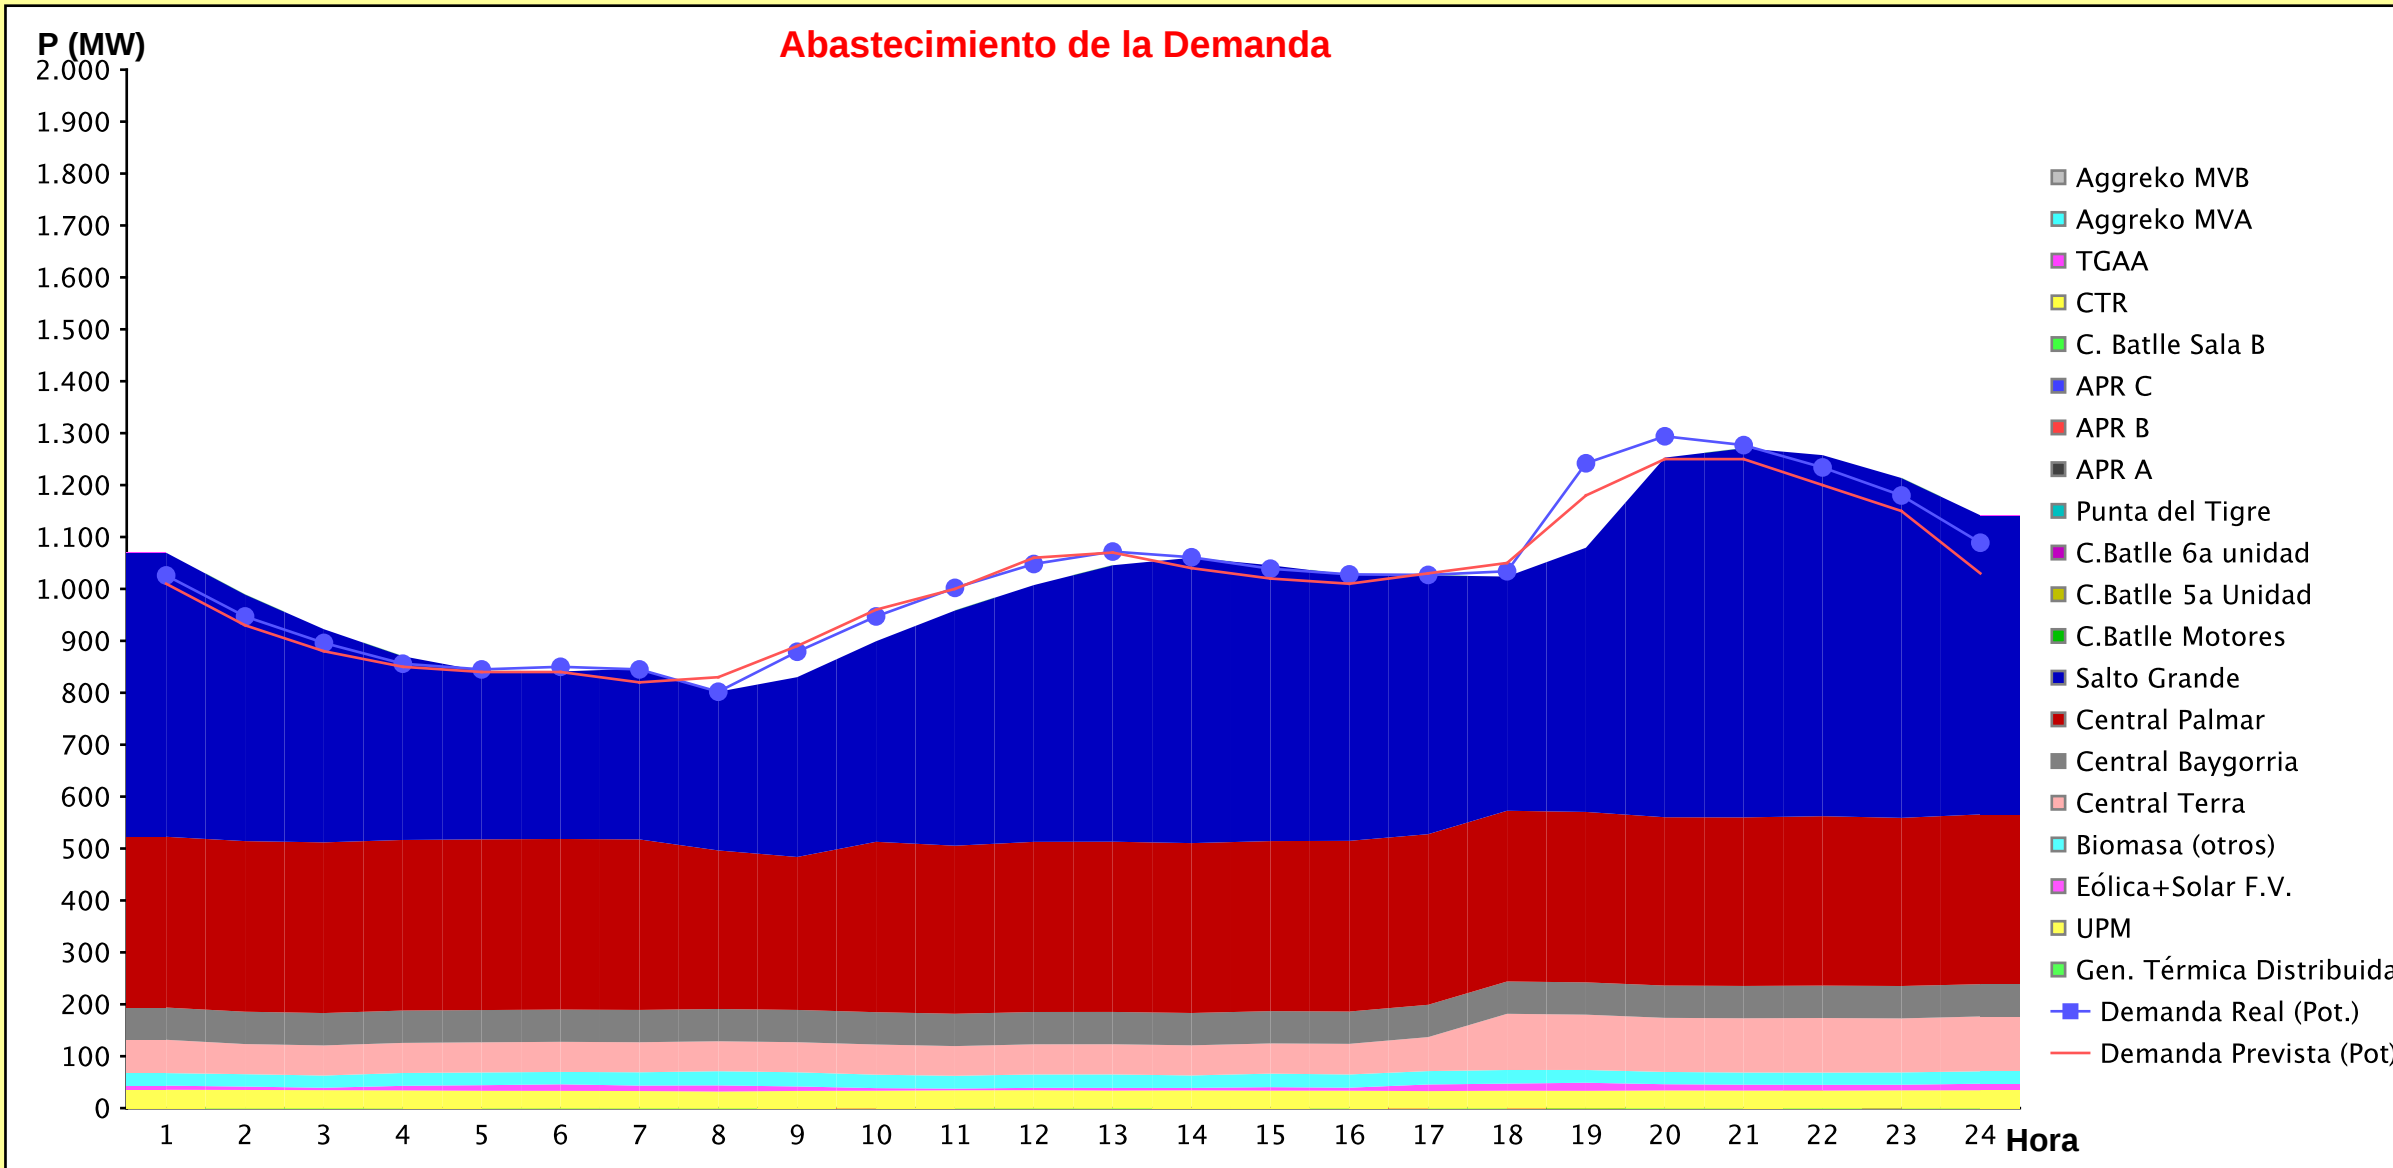



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1083,43 Hora 13:04
Potencia mínima:	798,01 Hora 07:49
Pico noche:	1303,96 Hora 20:19

Generación Media (MW)	
Eólica	9,3
Biomasa	66,1
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

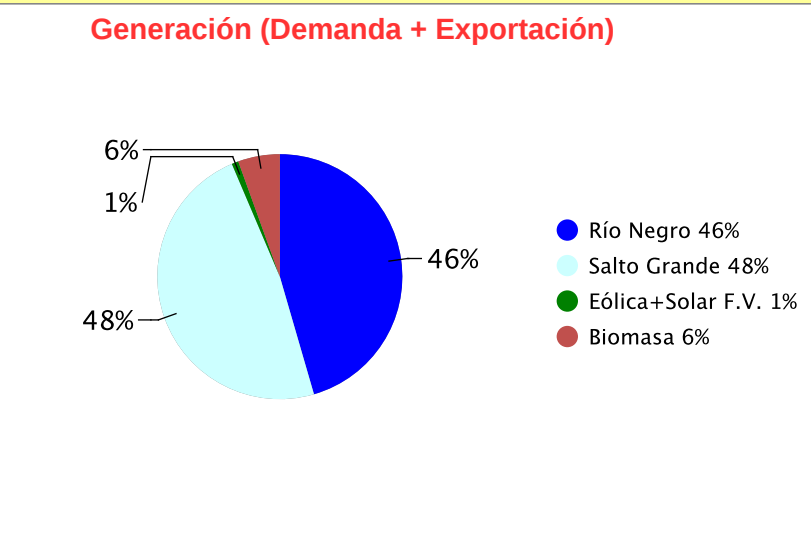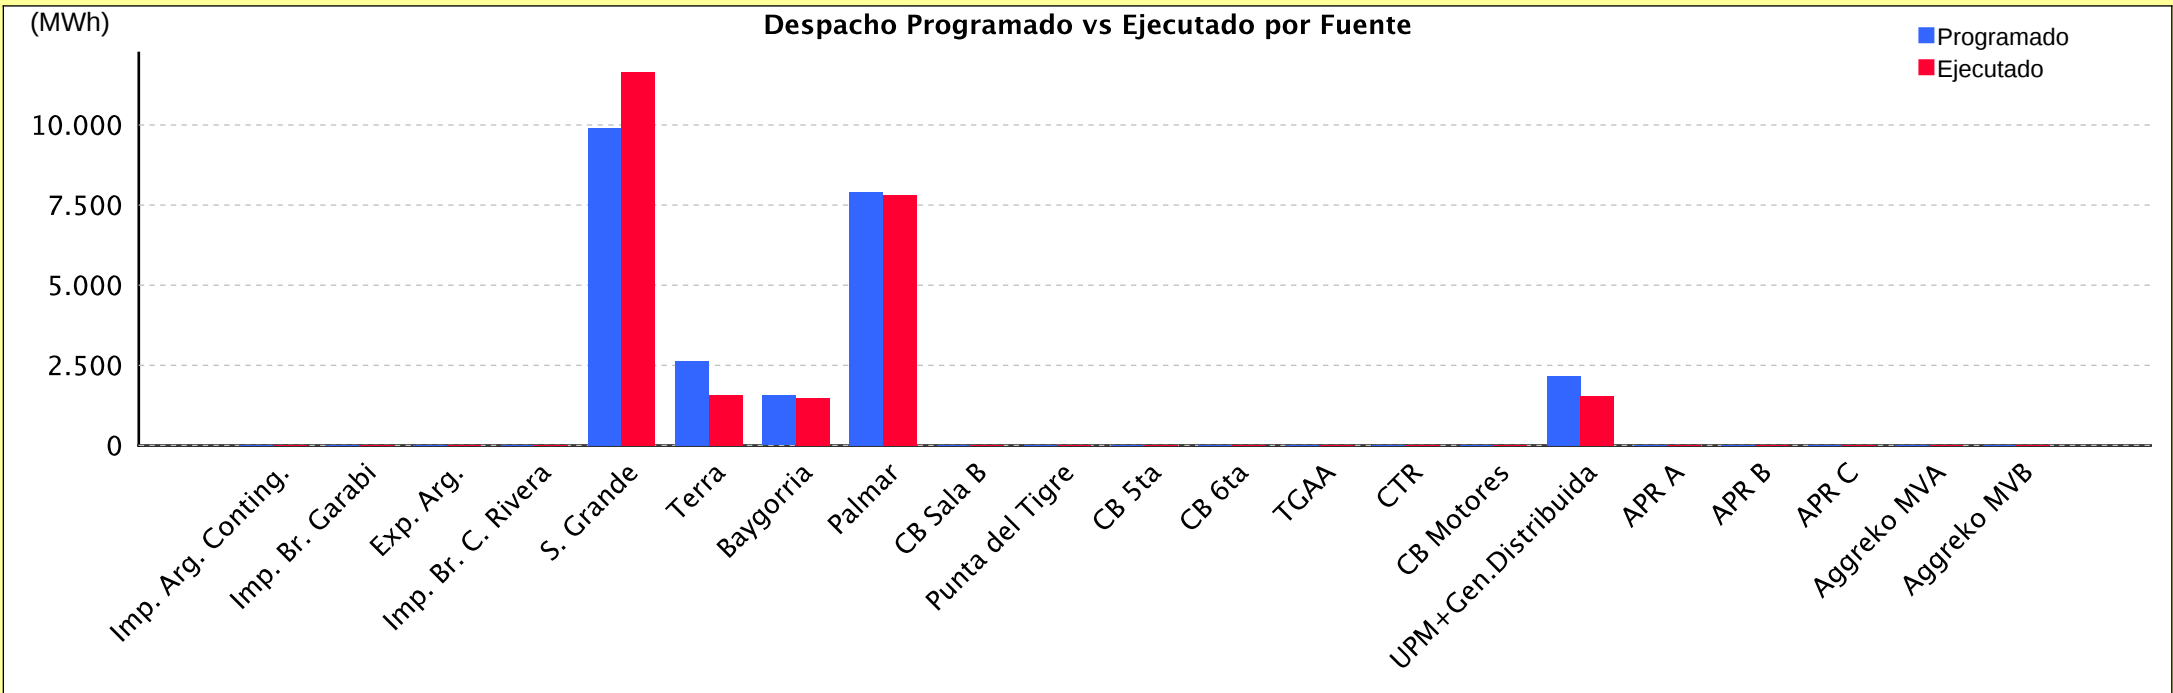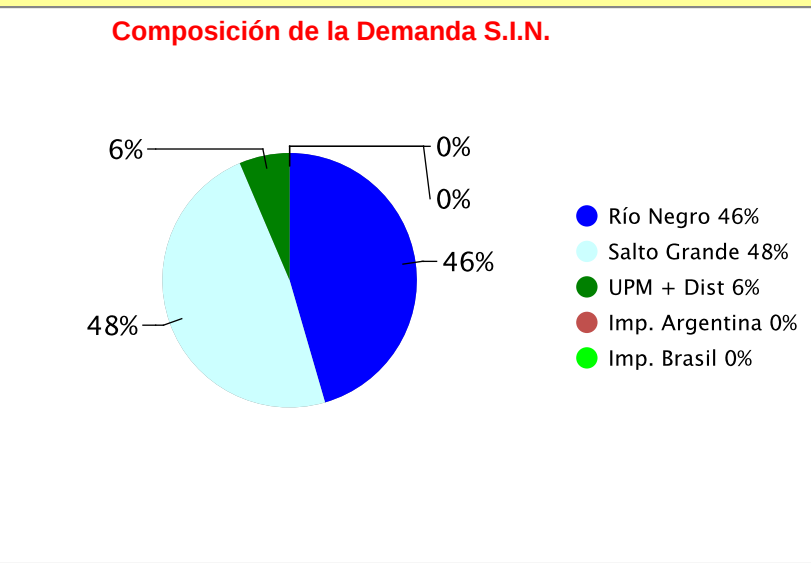



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

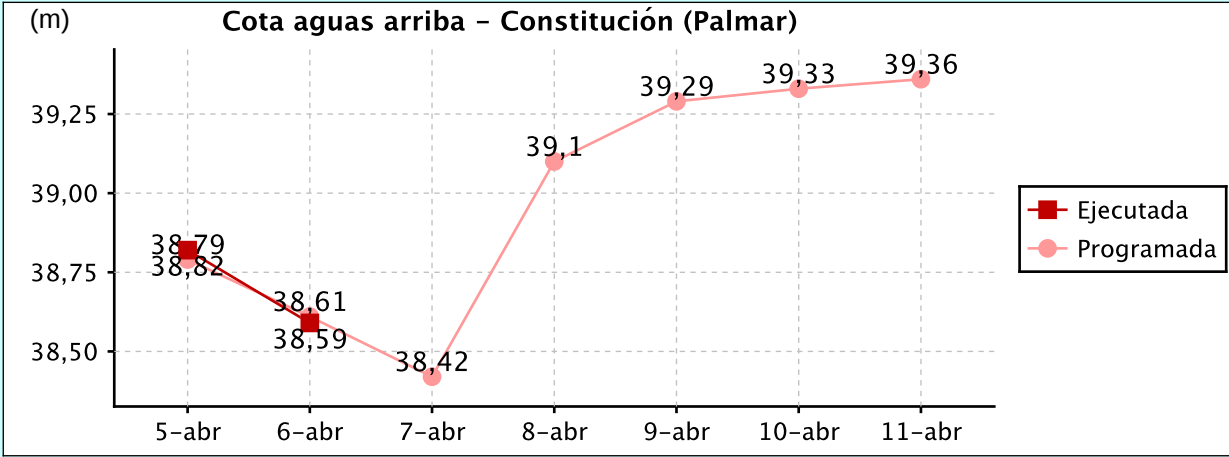
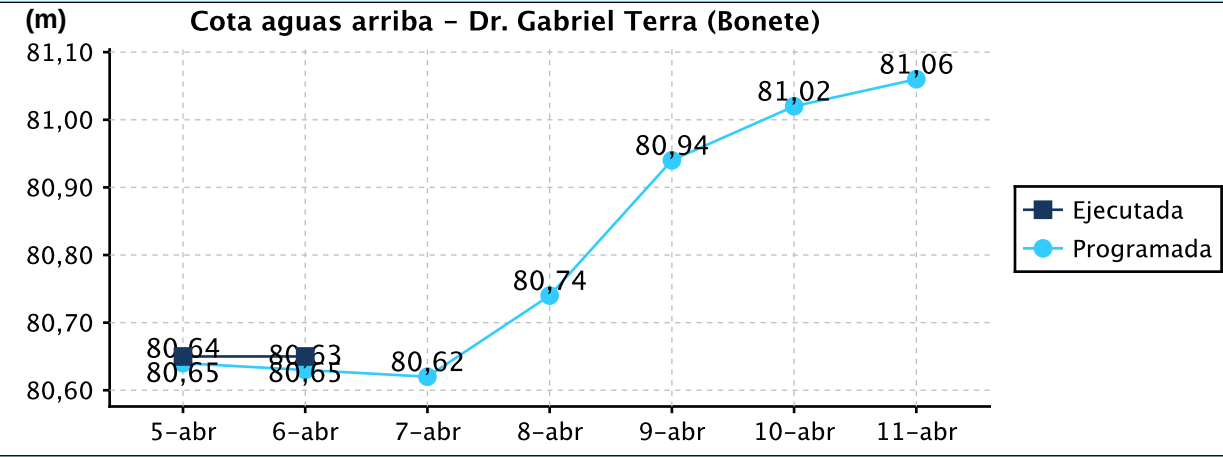


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,63	80,65
Baygorria	54,10	54,12
Palmar	38,61	38,59
SGU	34,90	34,68

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

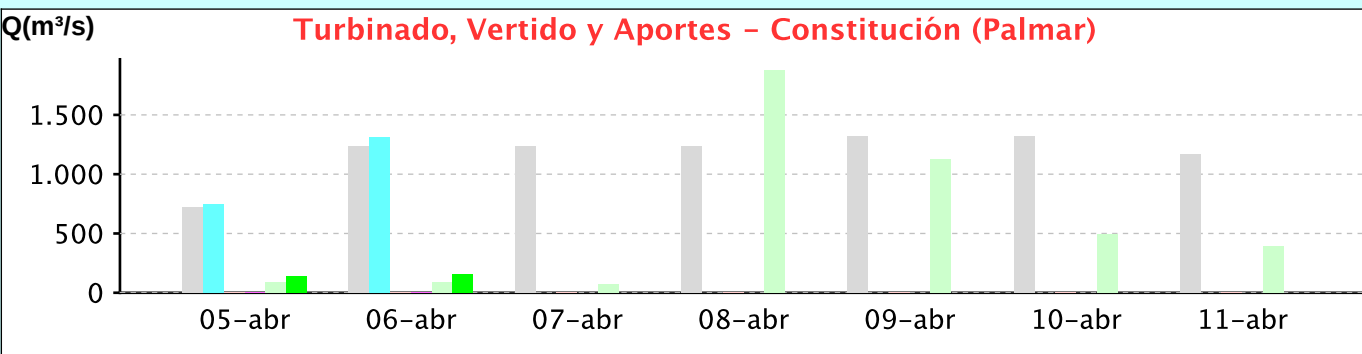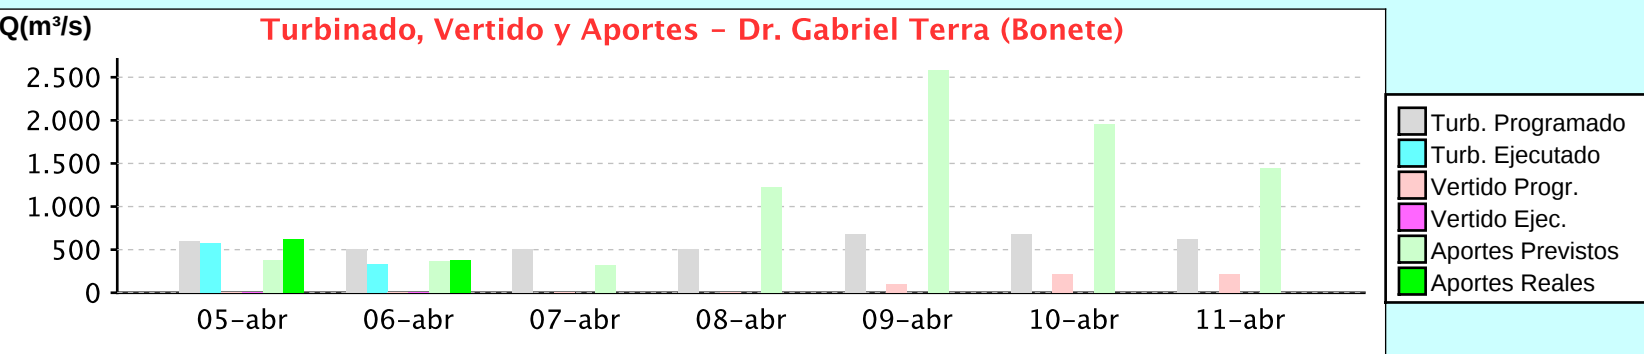

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

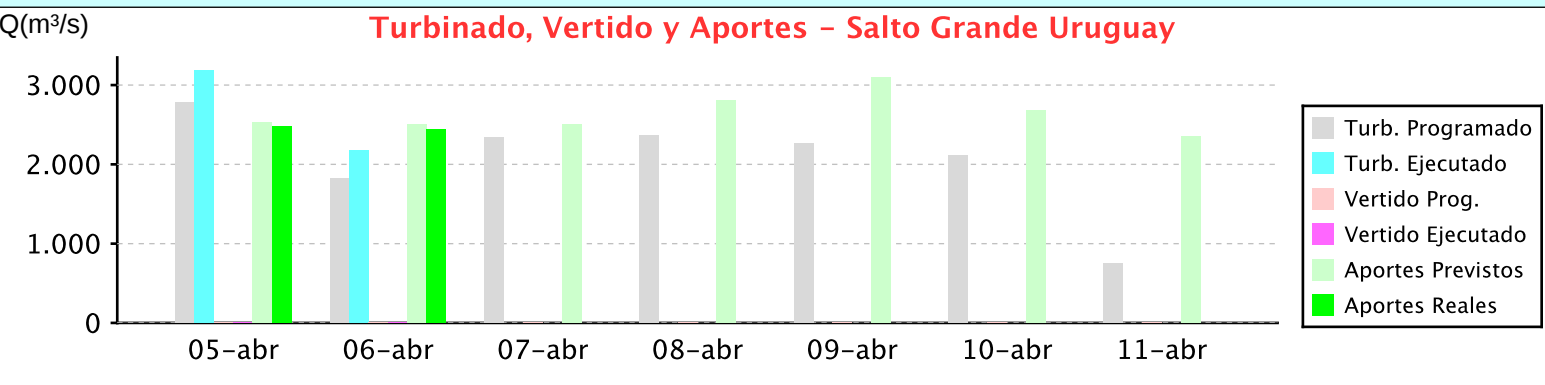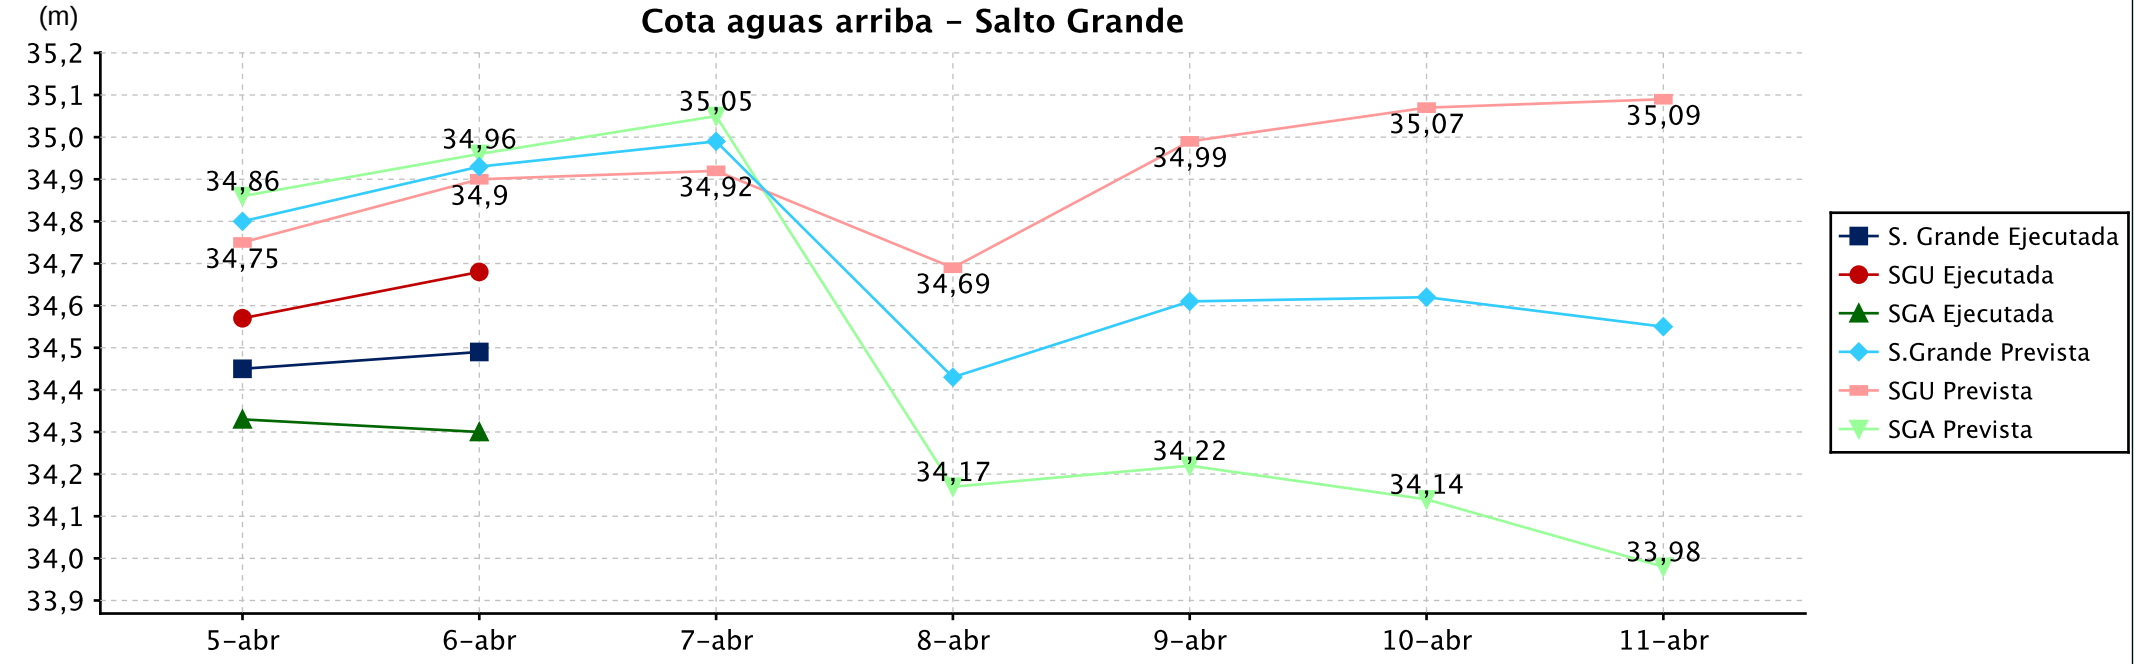

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,68
Cota Vista Arg	34,30
Cota real	34,49

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	8.414
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	501	326
Baygorria	516	474
Palmar	1.238	1.309
SGU	1.817	2.170

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	362	378
Baygorria	0	29
Palmar	85	159
SGU	2.500	2.439

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
