



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 07 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-4
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	0
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.560
C. Baygorria	1.488
C. Palmar	7.825
C. Salto Grande	14.117
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.901
TOTAL Generación	27.835

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.835
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.020
Diferencia (MWh)	815
Ejecutada - Programada	3,02 %

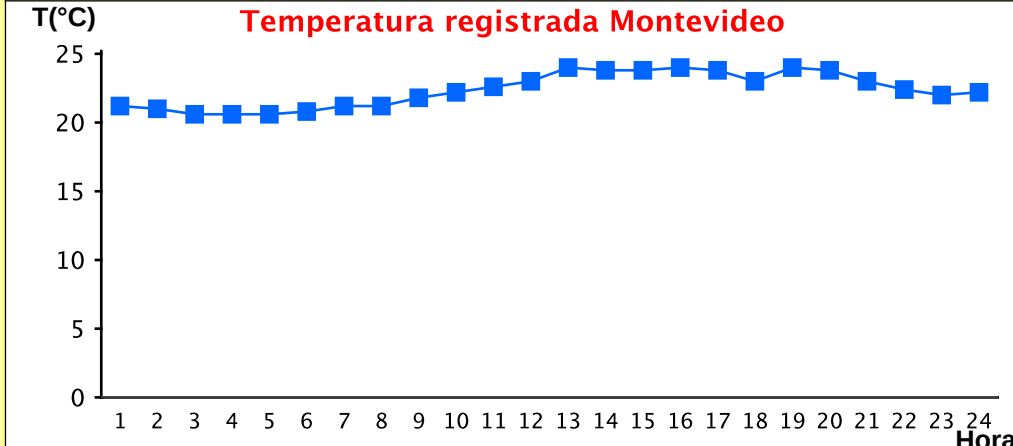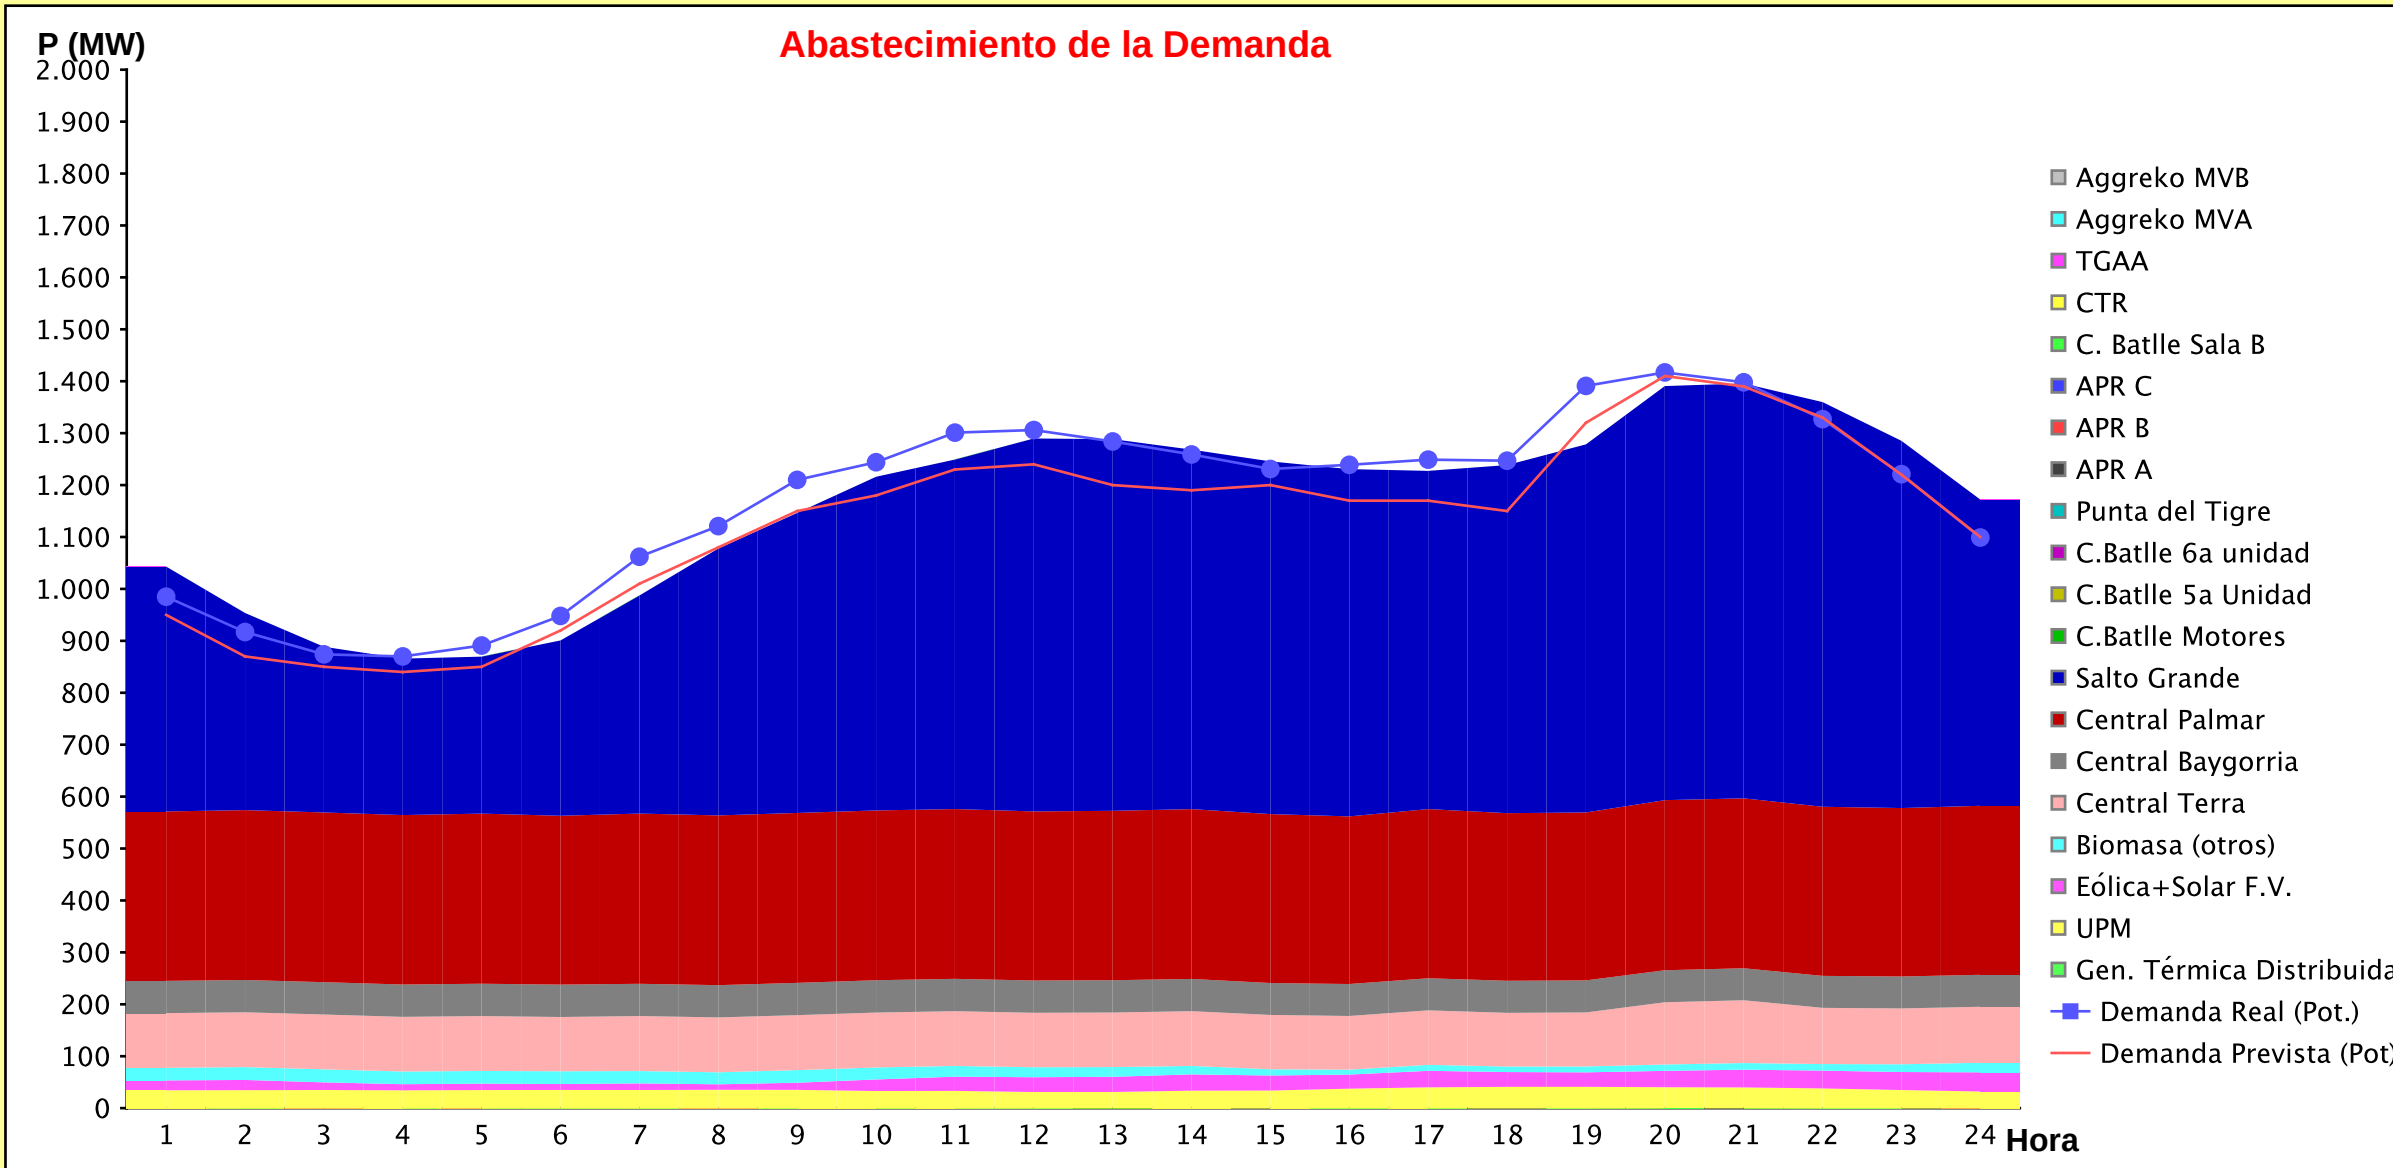



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1333,66 Hora 11:38
Potencia mínima:	870,5 Hora 03:41
Pico noche:	1474,03 Hora 20:19

Generación Media (MW)	
Eólica	24,5
Biomasa	64,7
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

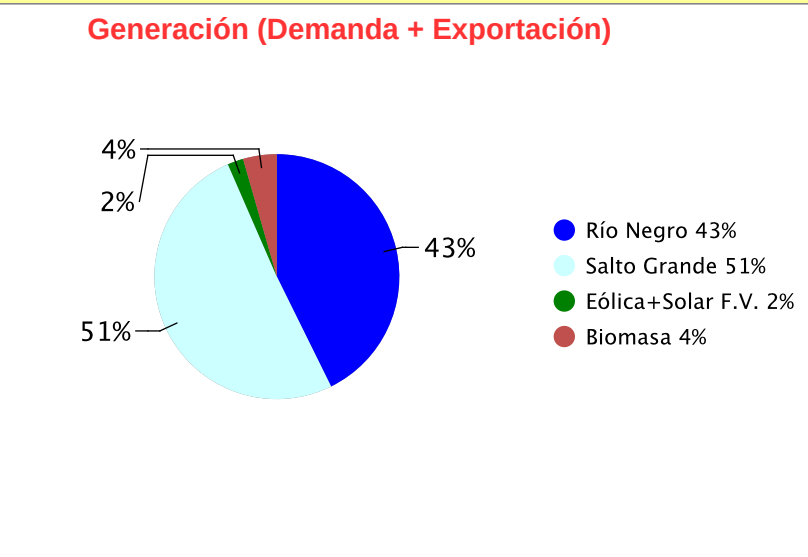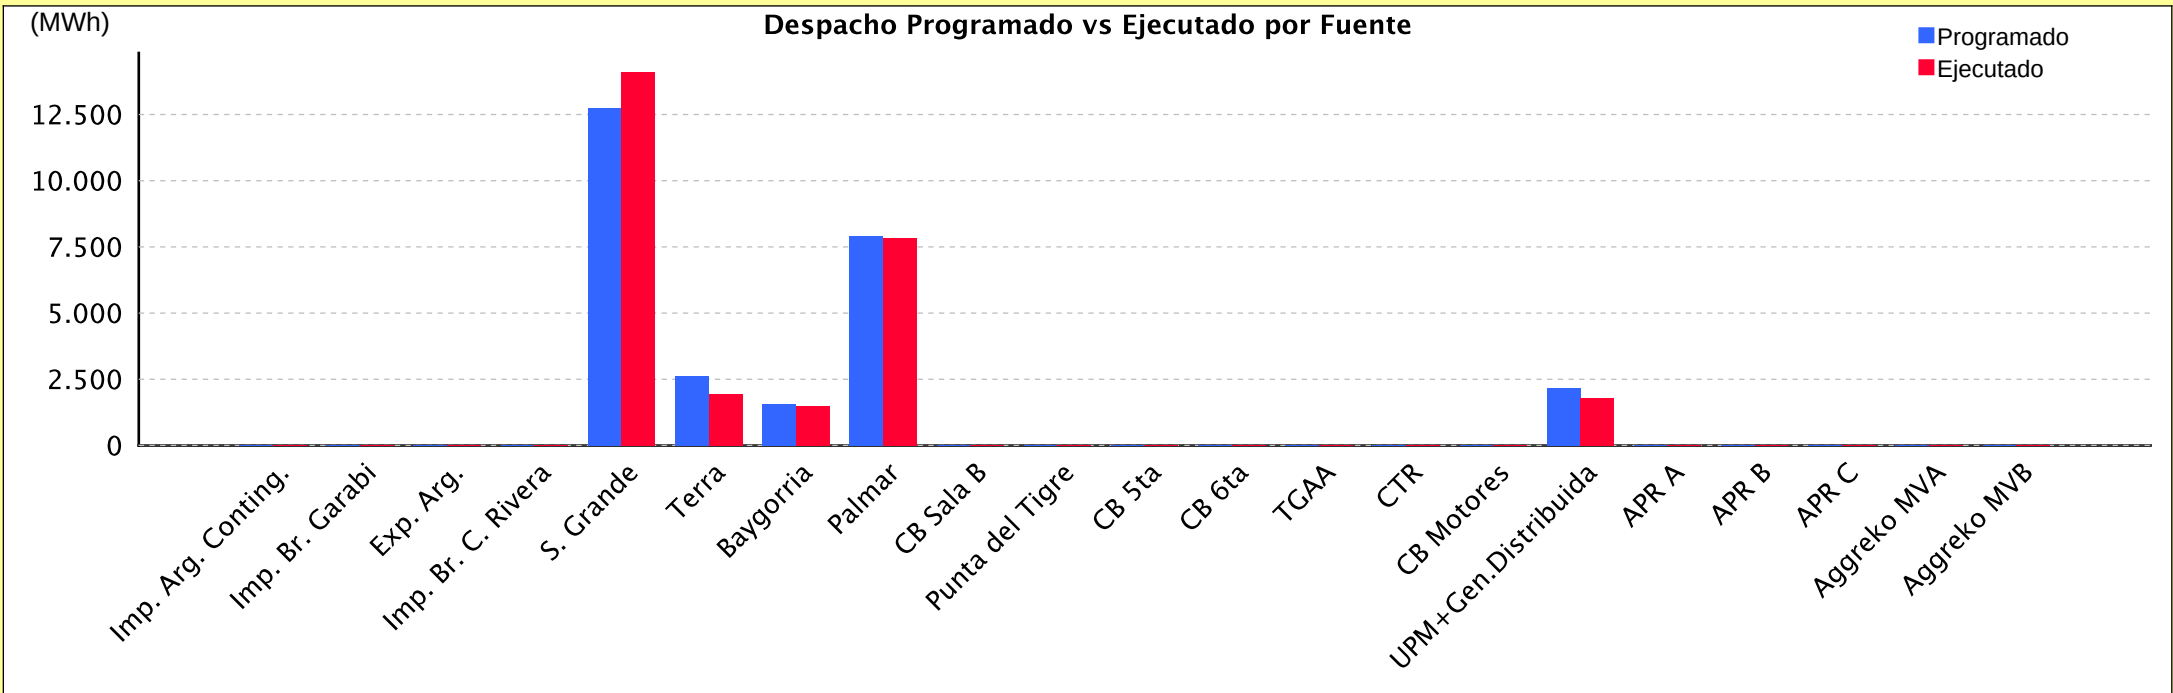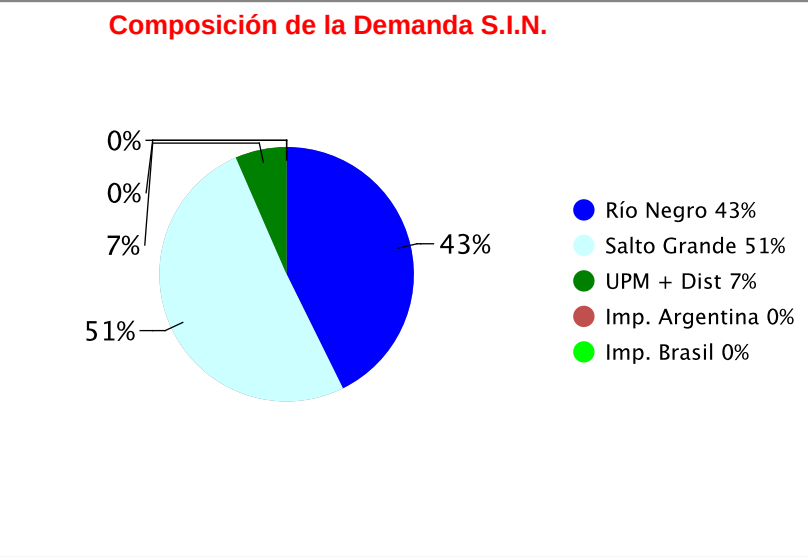



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

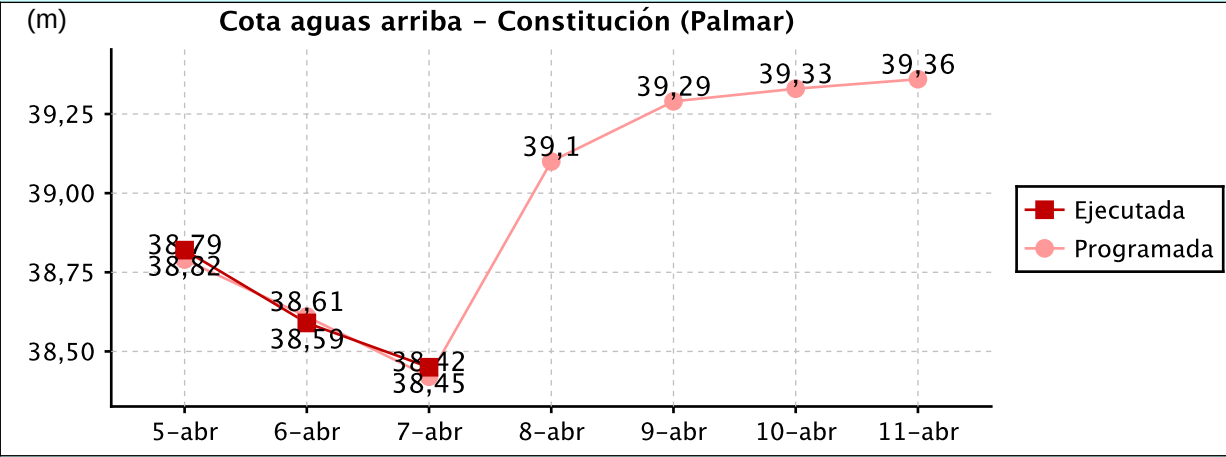
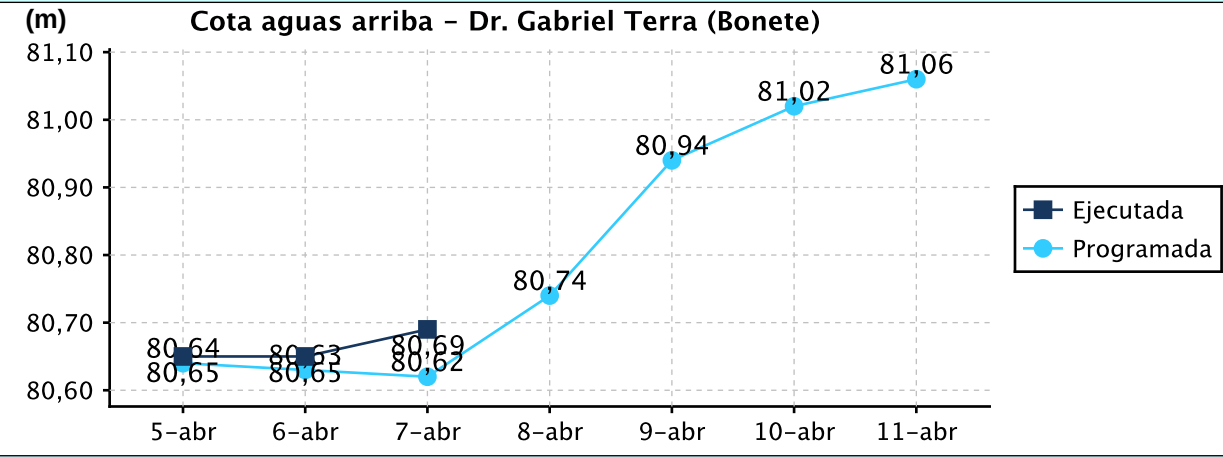


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,62	80,69
Baygorria	54,10	54,1
Palmar	38,42	38,45
SGU	34,92	34,65

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

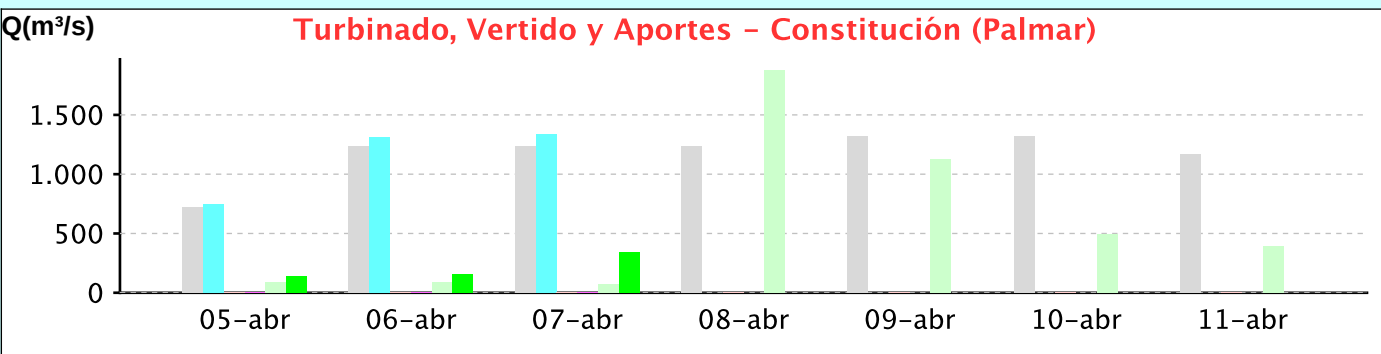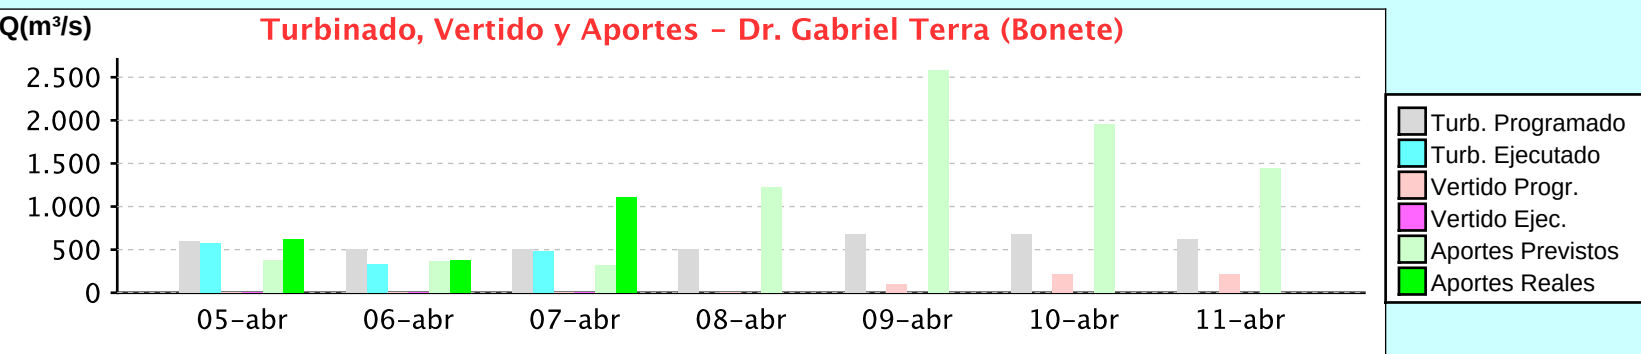

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

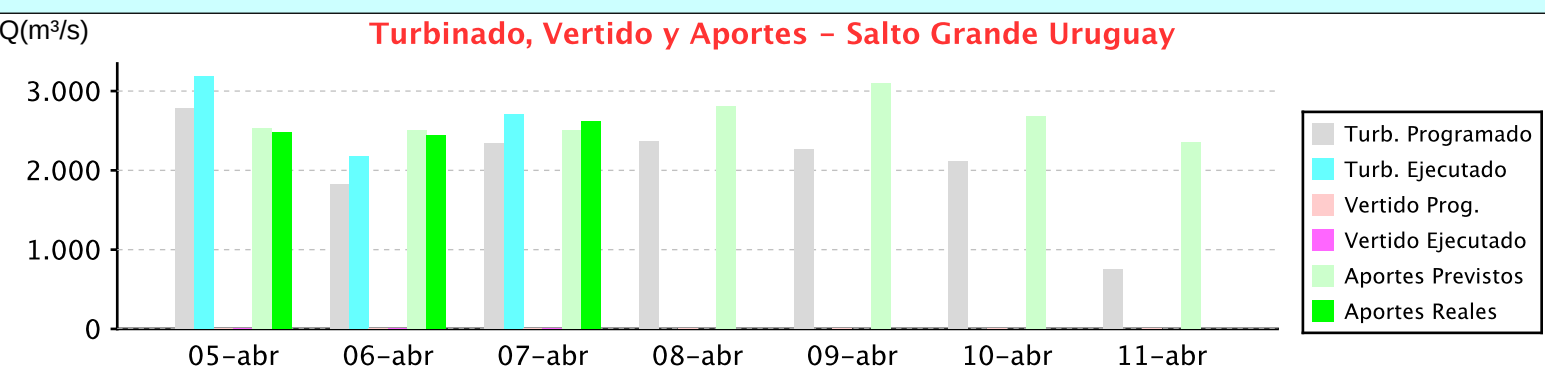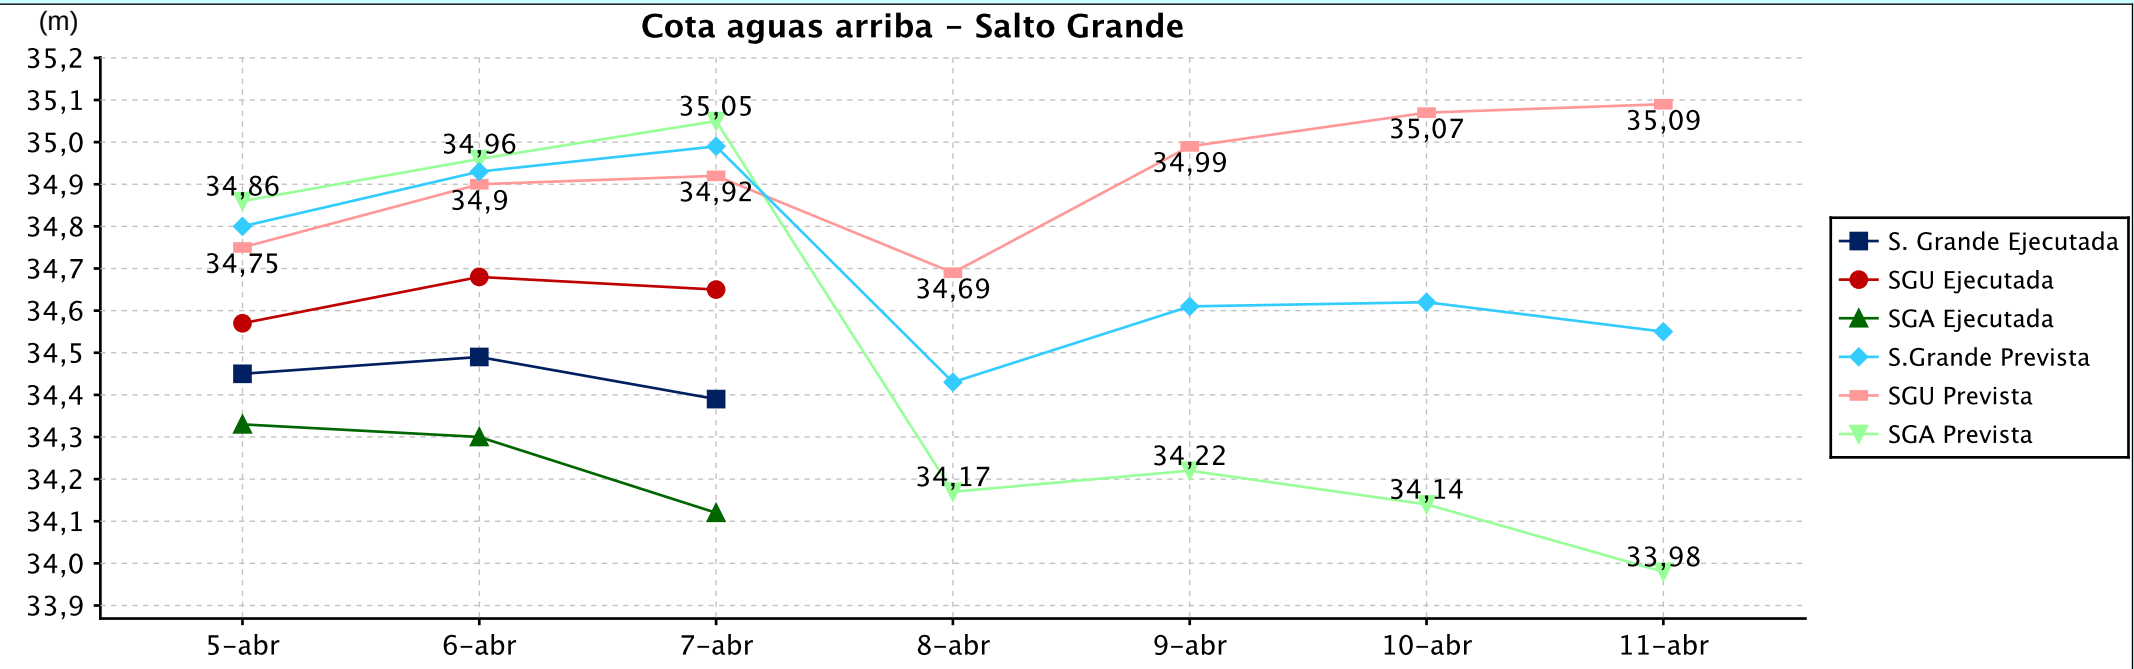

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,65
Cota Vista Arg	34,12
Cota real	34,39
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	11.620

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	501	486
Baygorria	516	473
Palmar	1.238	1.337
SGU	2.336	2.702

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	317	1.104
Baygorria	0	92
Palmar	68	345
SGU	2.500	2.612

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	119
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
