



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 08 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	34
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	38
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	0
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.074
C. Baygorria	1.449
C. Palmar	7.841
C. Salto Grande	13.577
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.430
TOTAL Generación	27.356

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.356
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.860
Diferencia (MWh)	-504
Ejecutada - Programada	-1,81 %

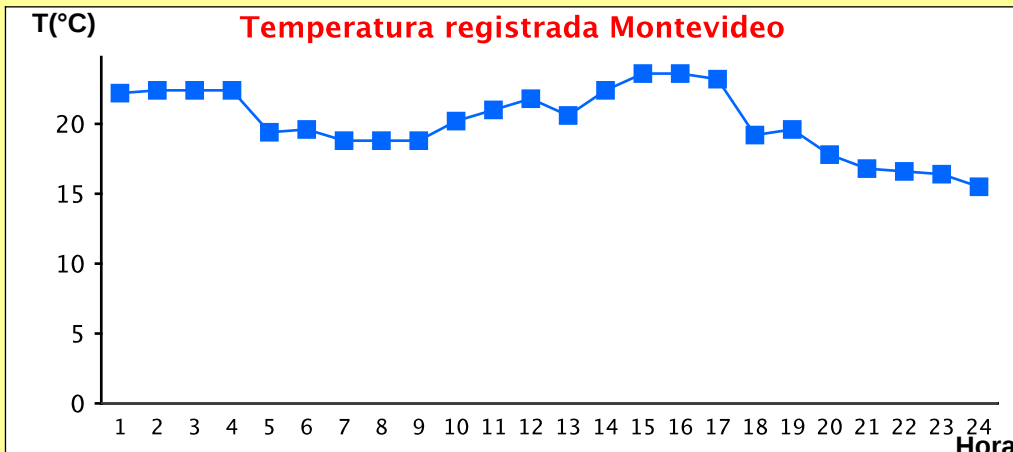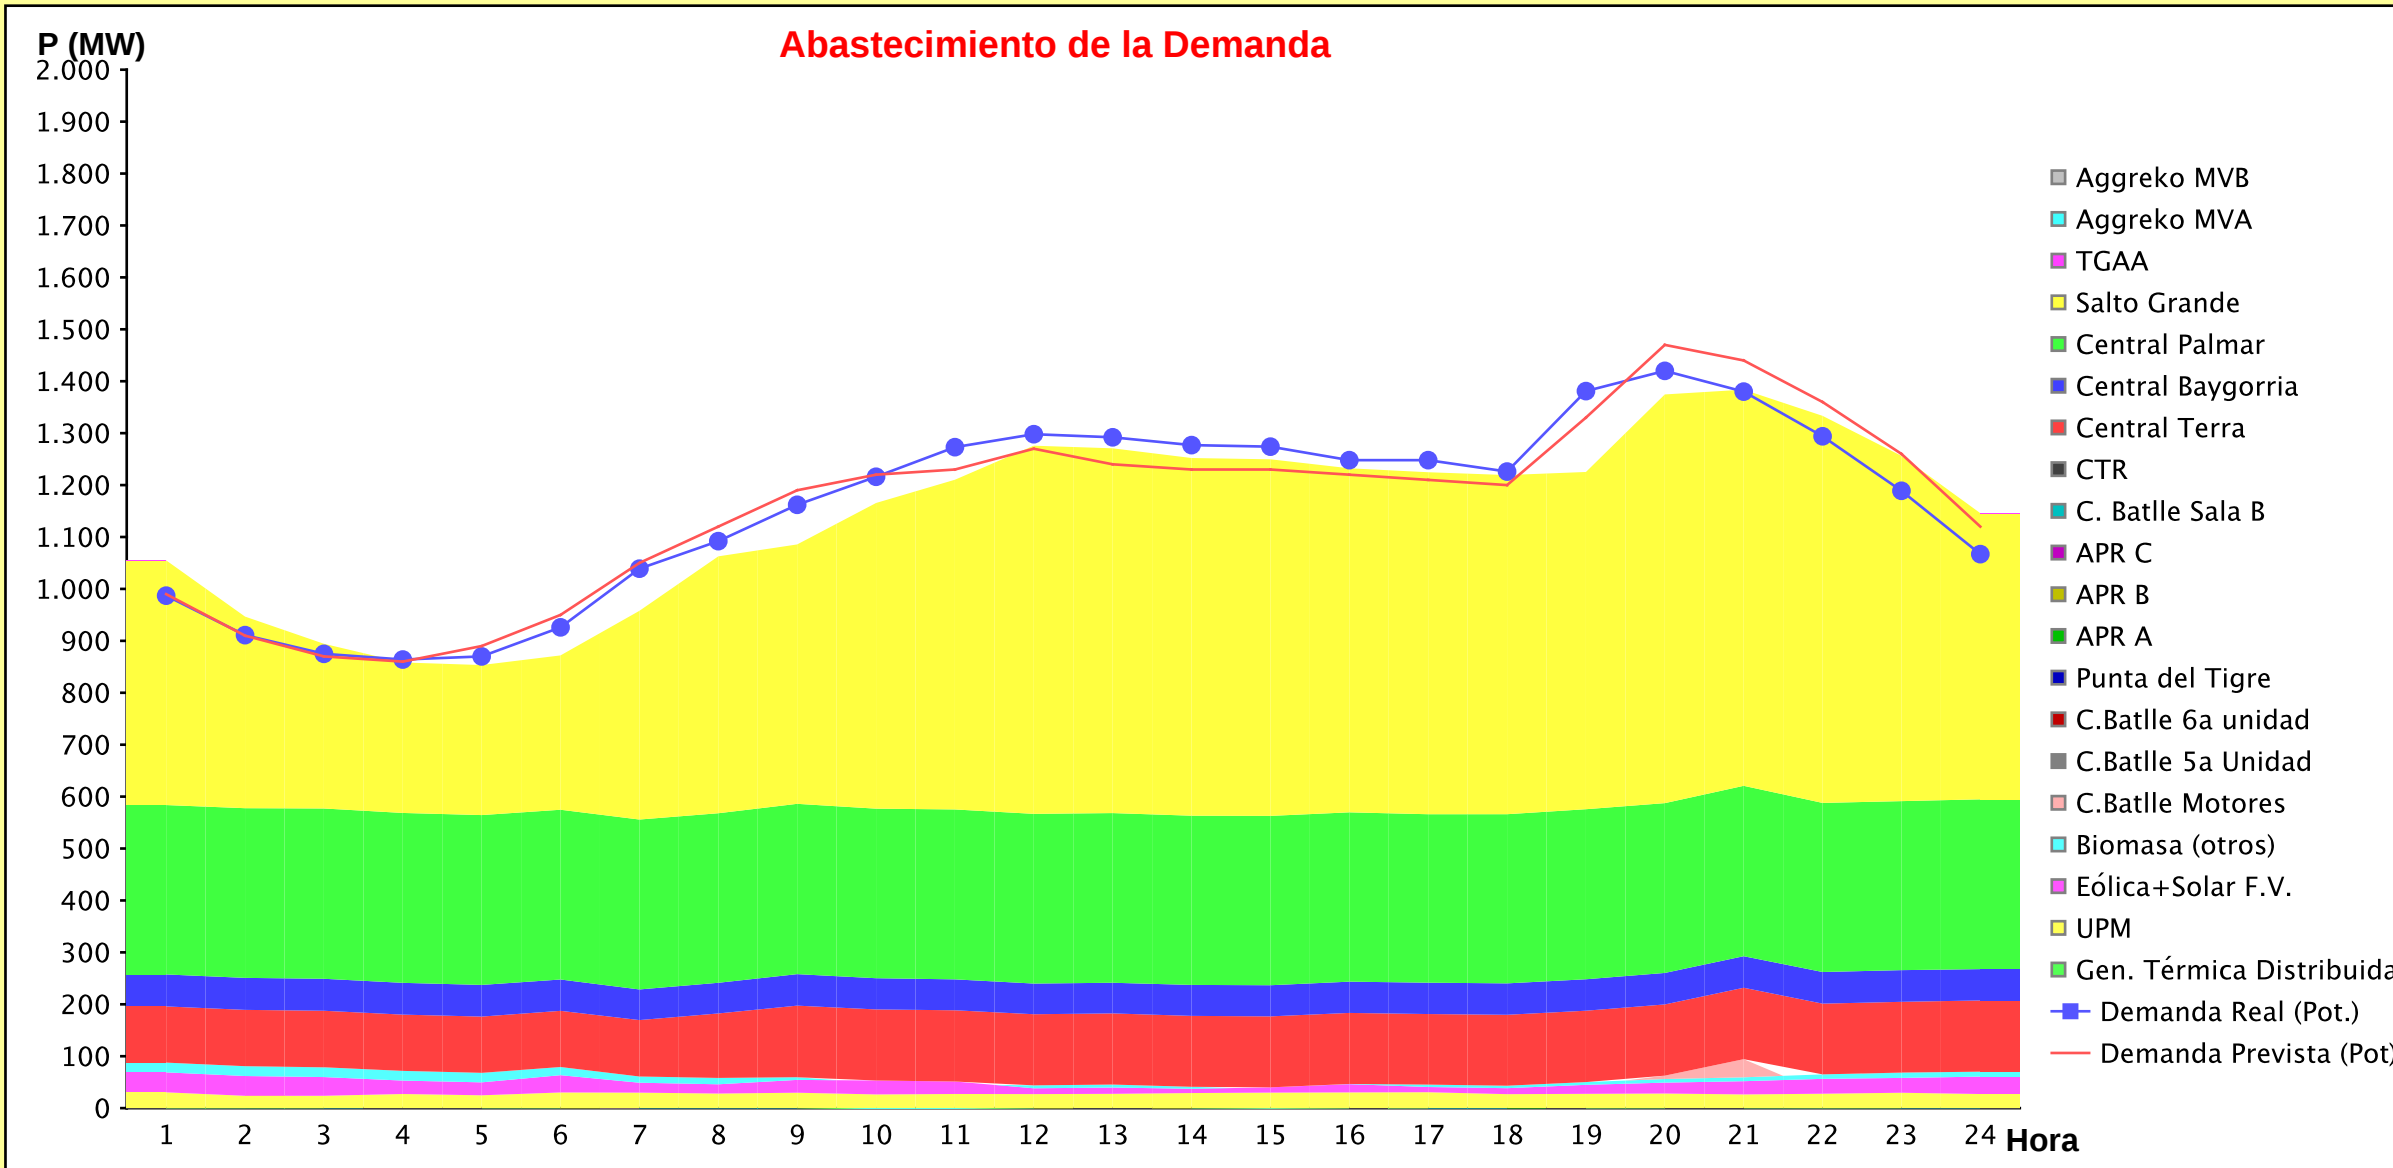



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1354,24 Hora 11:40
Potencia mínima:	894,75 Hora 04:14
Pico noche:	1443,94 Hora 19:34

Generación Media (MW)	
Eólica	23,0
Biomasa	52,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

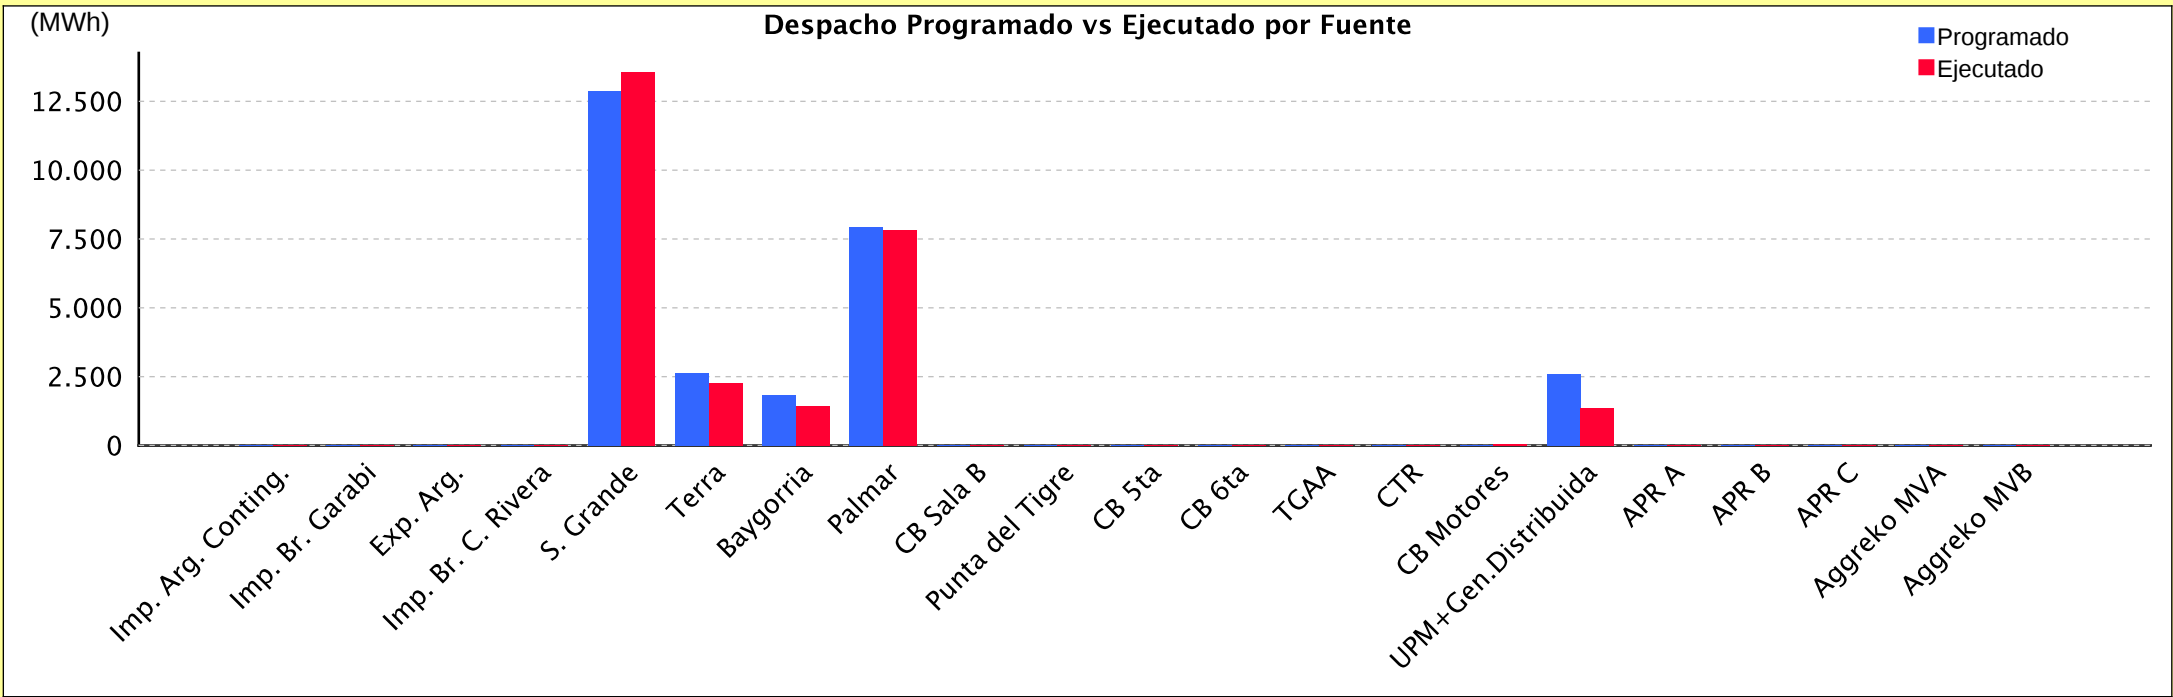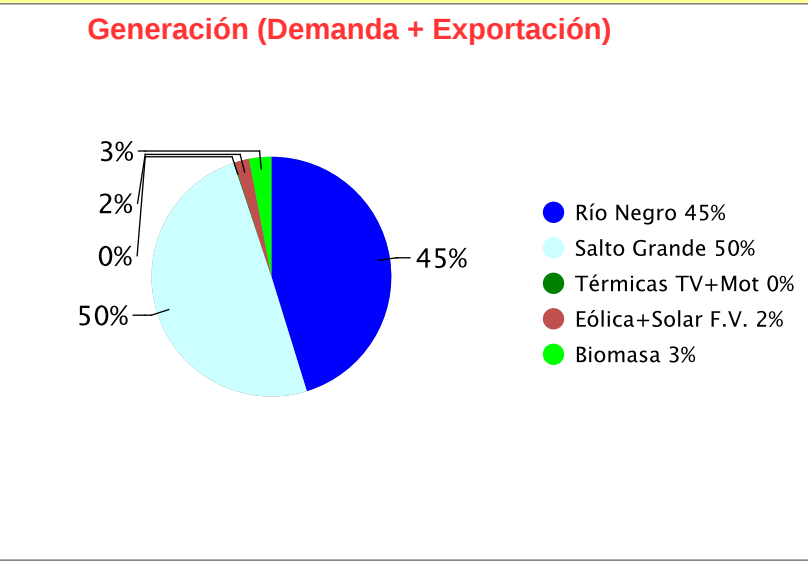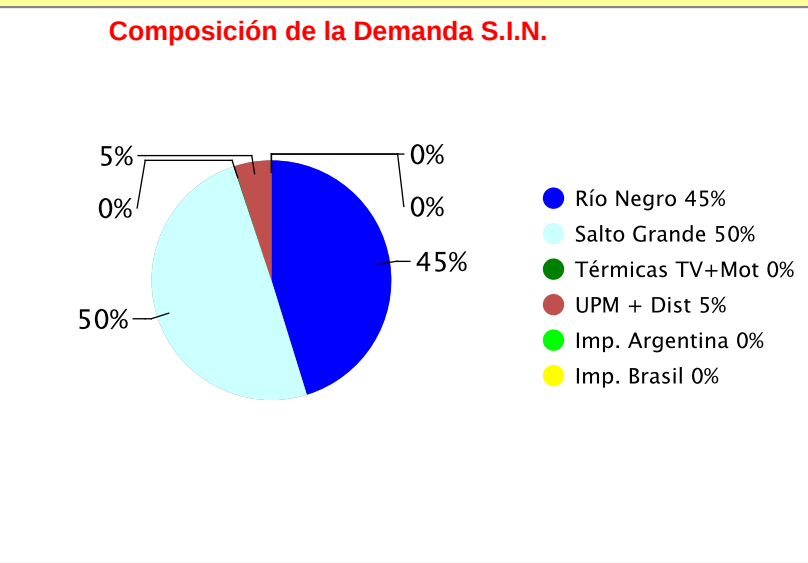



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

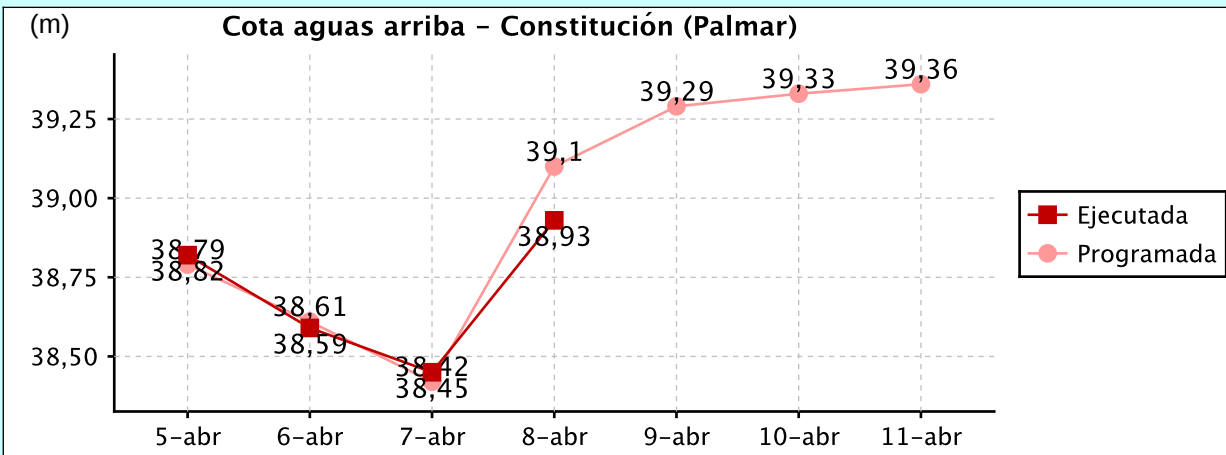
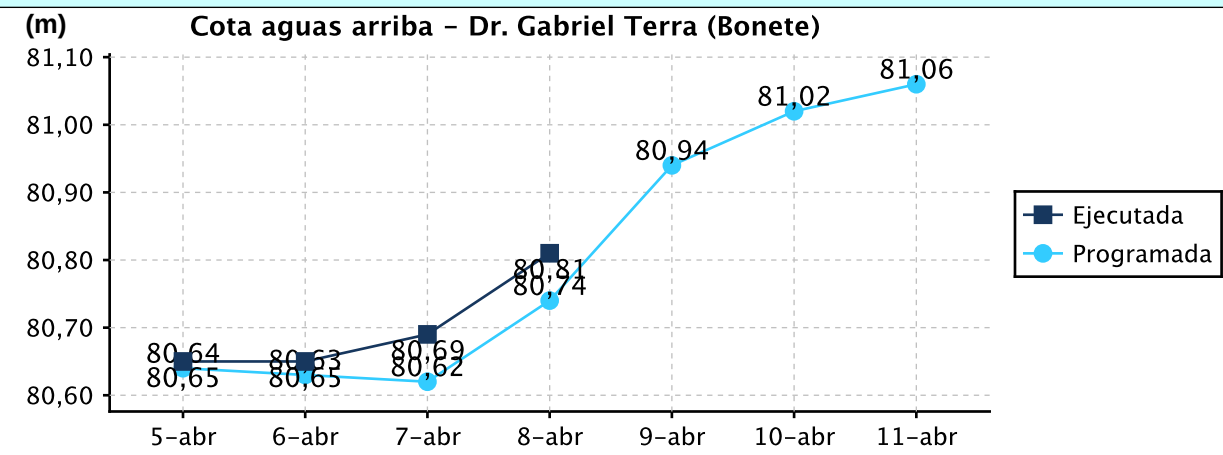


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,74	80,81
Baygorria	53,85	54,2
Palmar	39,10	38,93
SGU	34,69	34,84

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

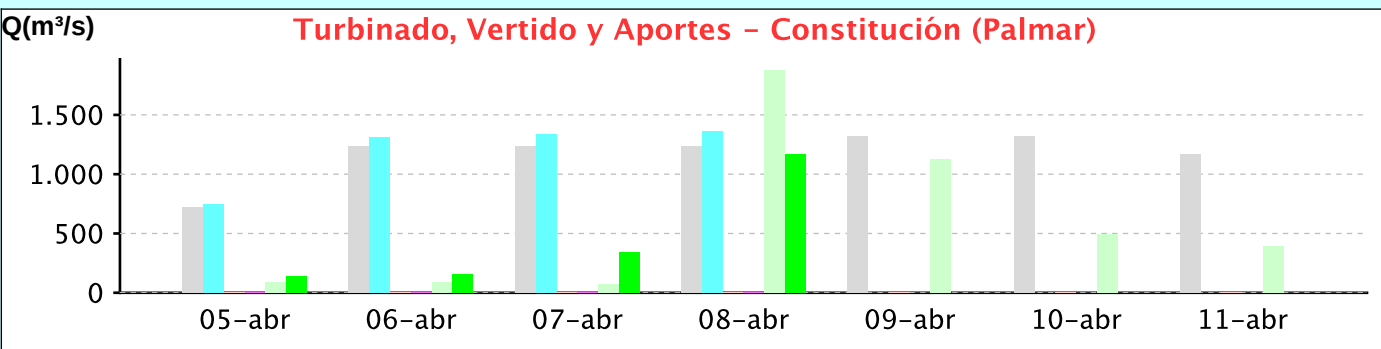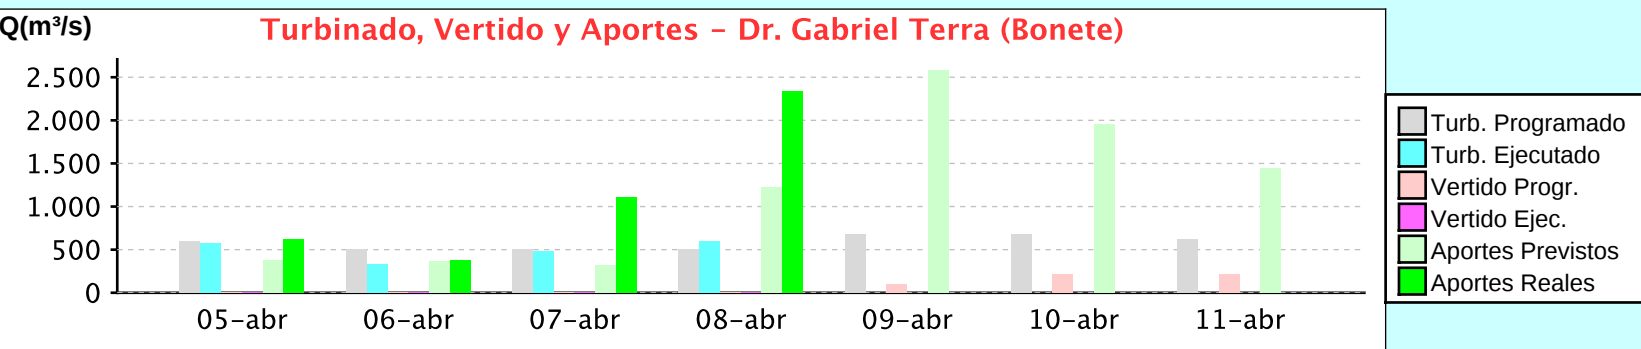

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

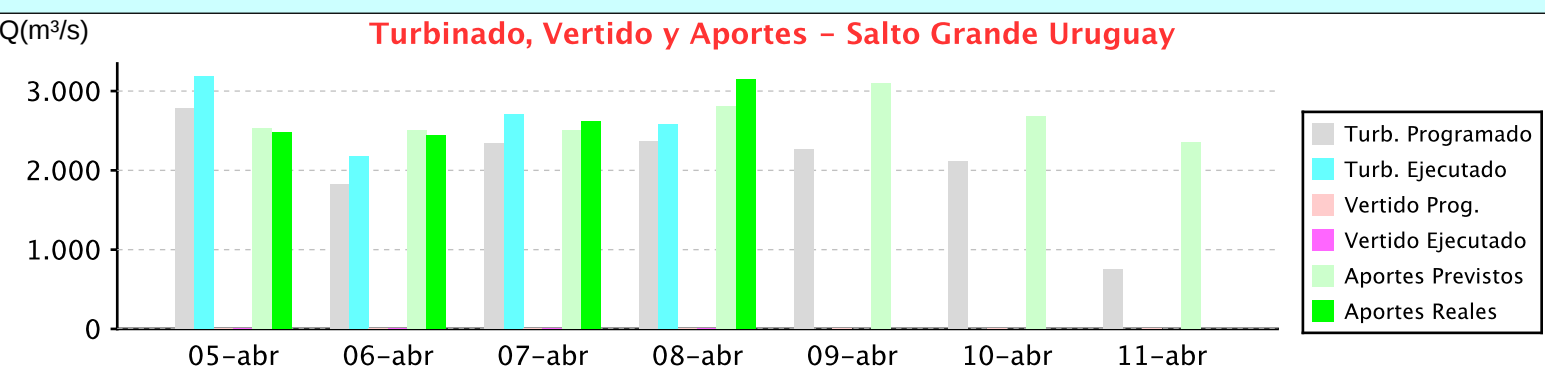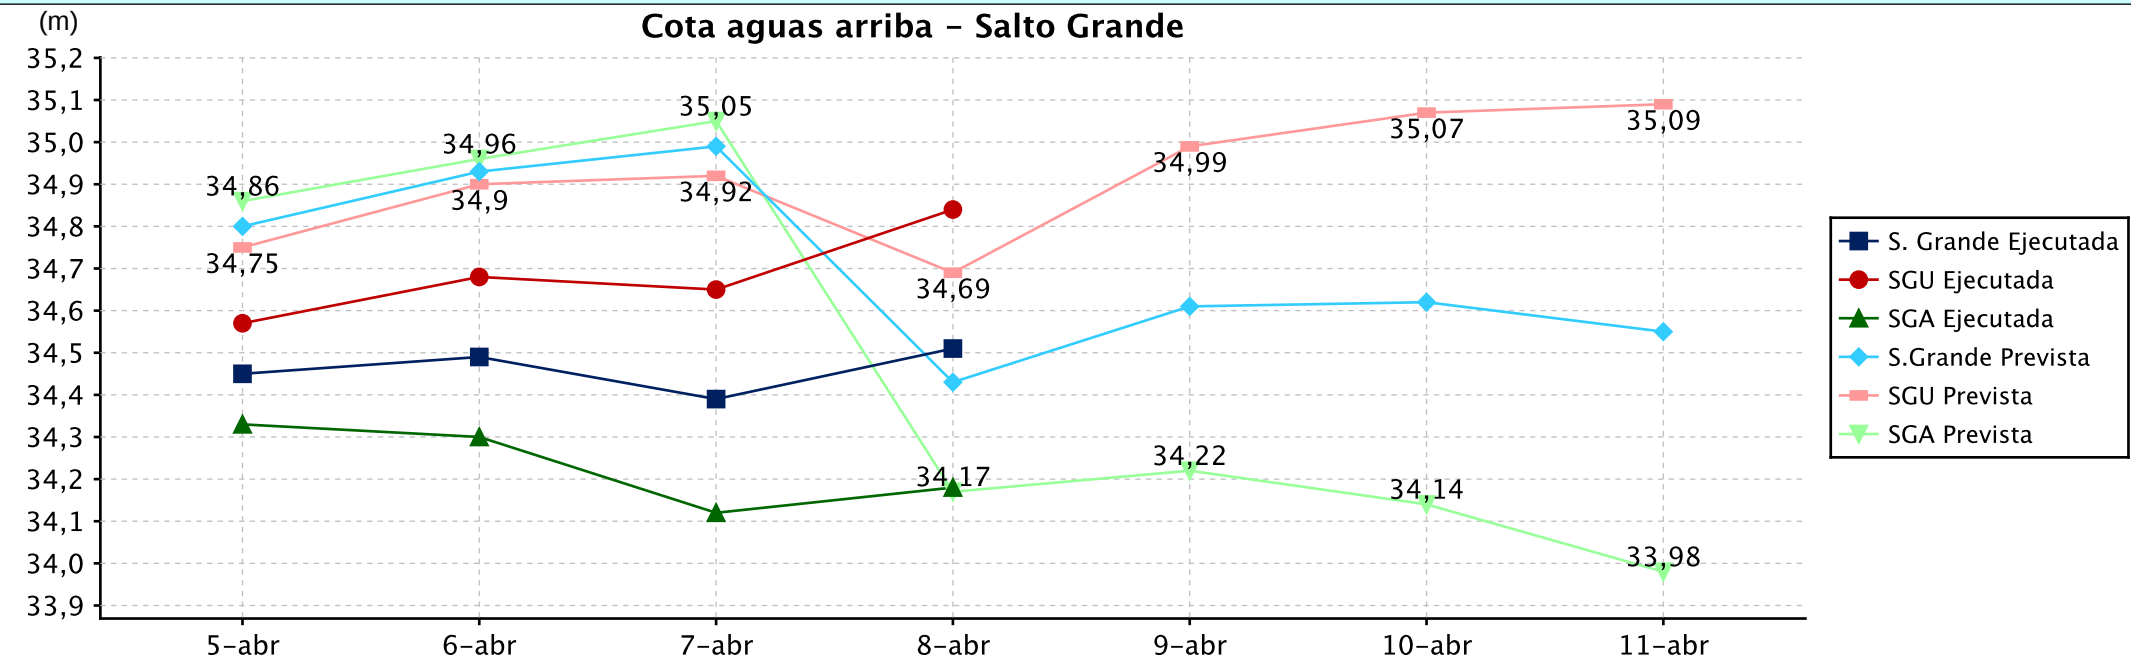

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,84
Cota Vista Arg	34,18
Cota real	34,51
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	14.669

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	501	596
Baygorria	605	517
Palmar	1.238	1.365
SGU	2.362	2.578

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.218	2.337
Baygorria	655	1.199
Palmar	1.875	1.169
SGU	2.800	3.142

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	1.000	1.143
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
