




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 12 de abril de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	12
Central La Tablada	-48
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-0
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.321
C. Baygorria	2.070
C. Palmar	7.897
C. Salto Grande	12.133
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.977
TOTAL Generación	27.351

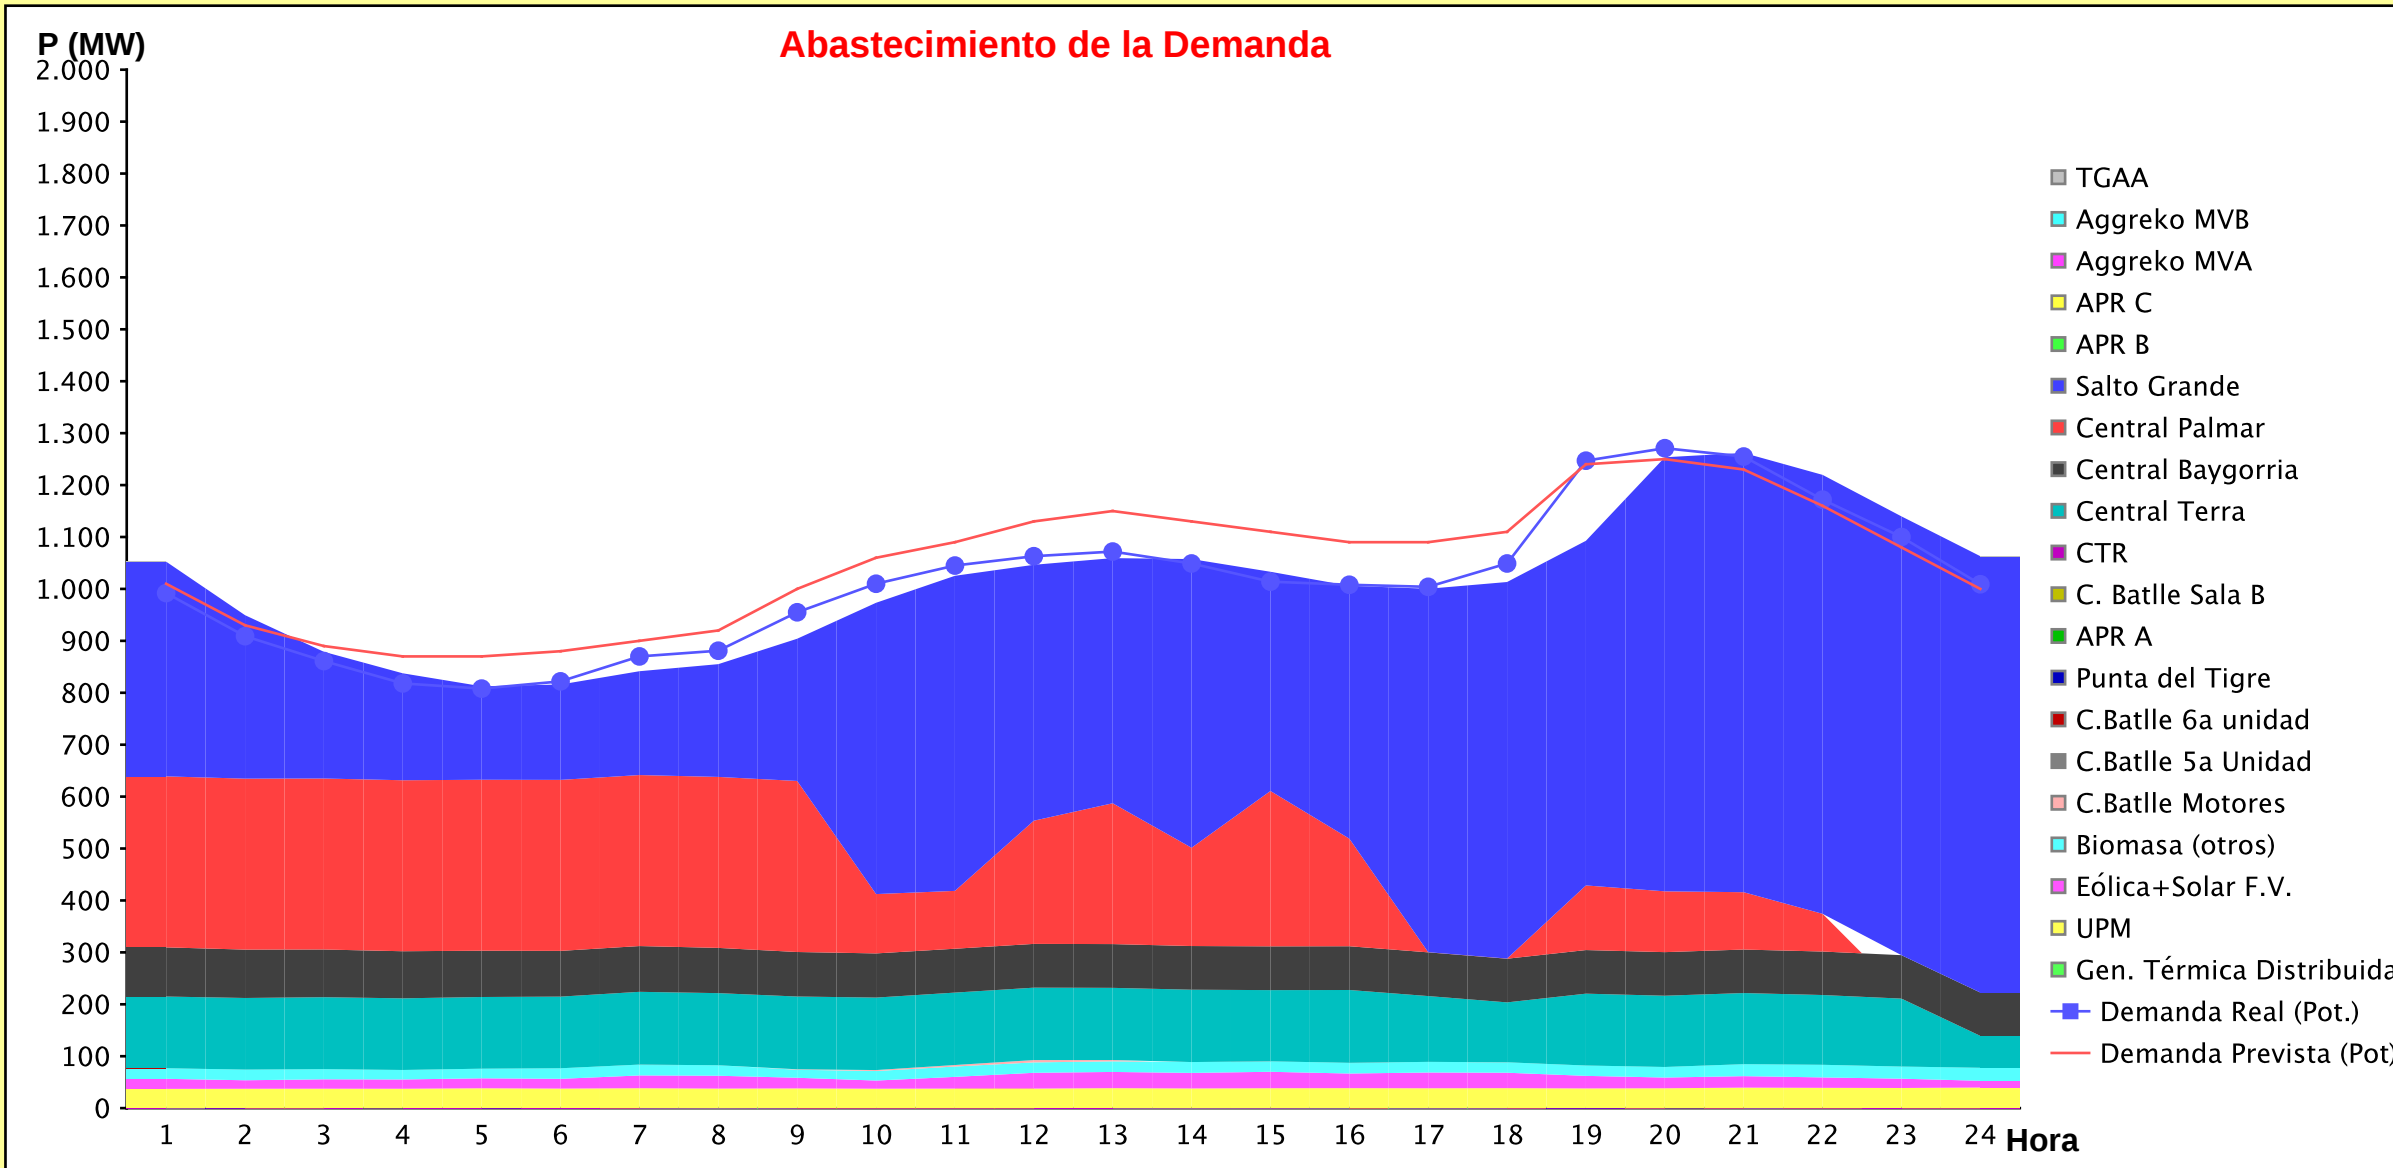

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.197
Hidráulica	3.197
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.197




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.154
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.190
Diferencia (MWh)	-1.036
Ejecutada - Programada	-4,11 %

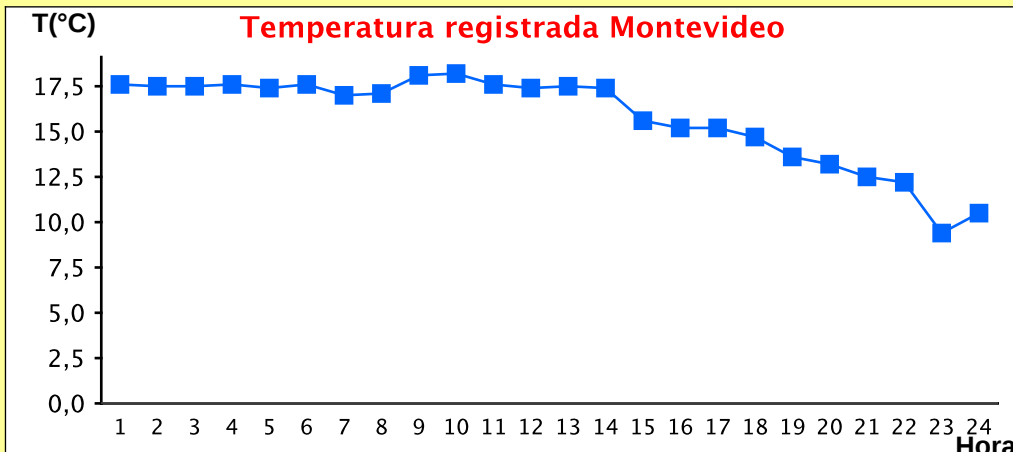



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1119,09 Hora 12:25
Potencia mínima:	843,54 Hora 04:58
Pico noche:	1327,16 Hora 19:41

Generación Media (MW)	
Eólica	23,0
Biomasa	64,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

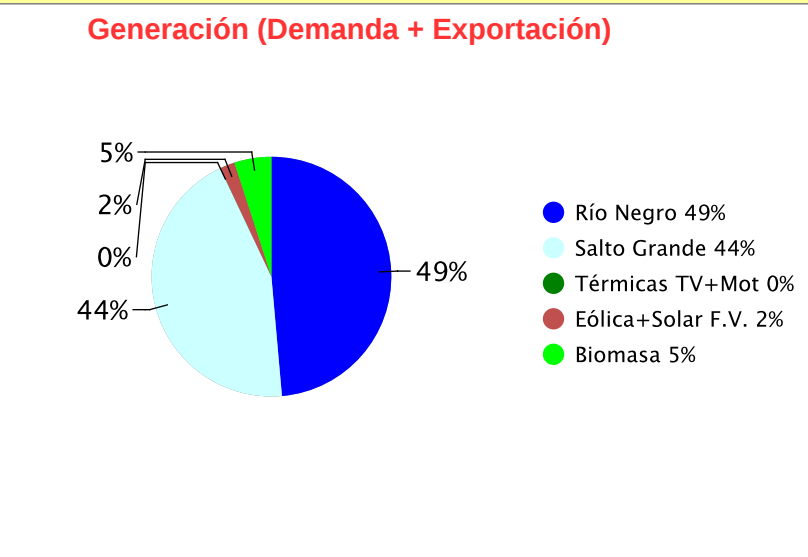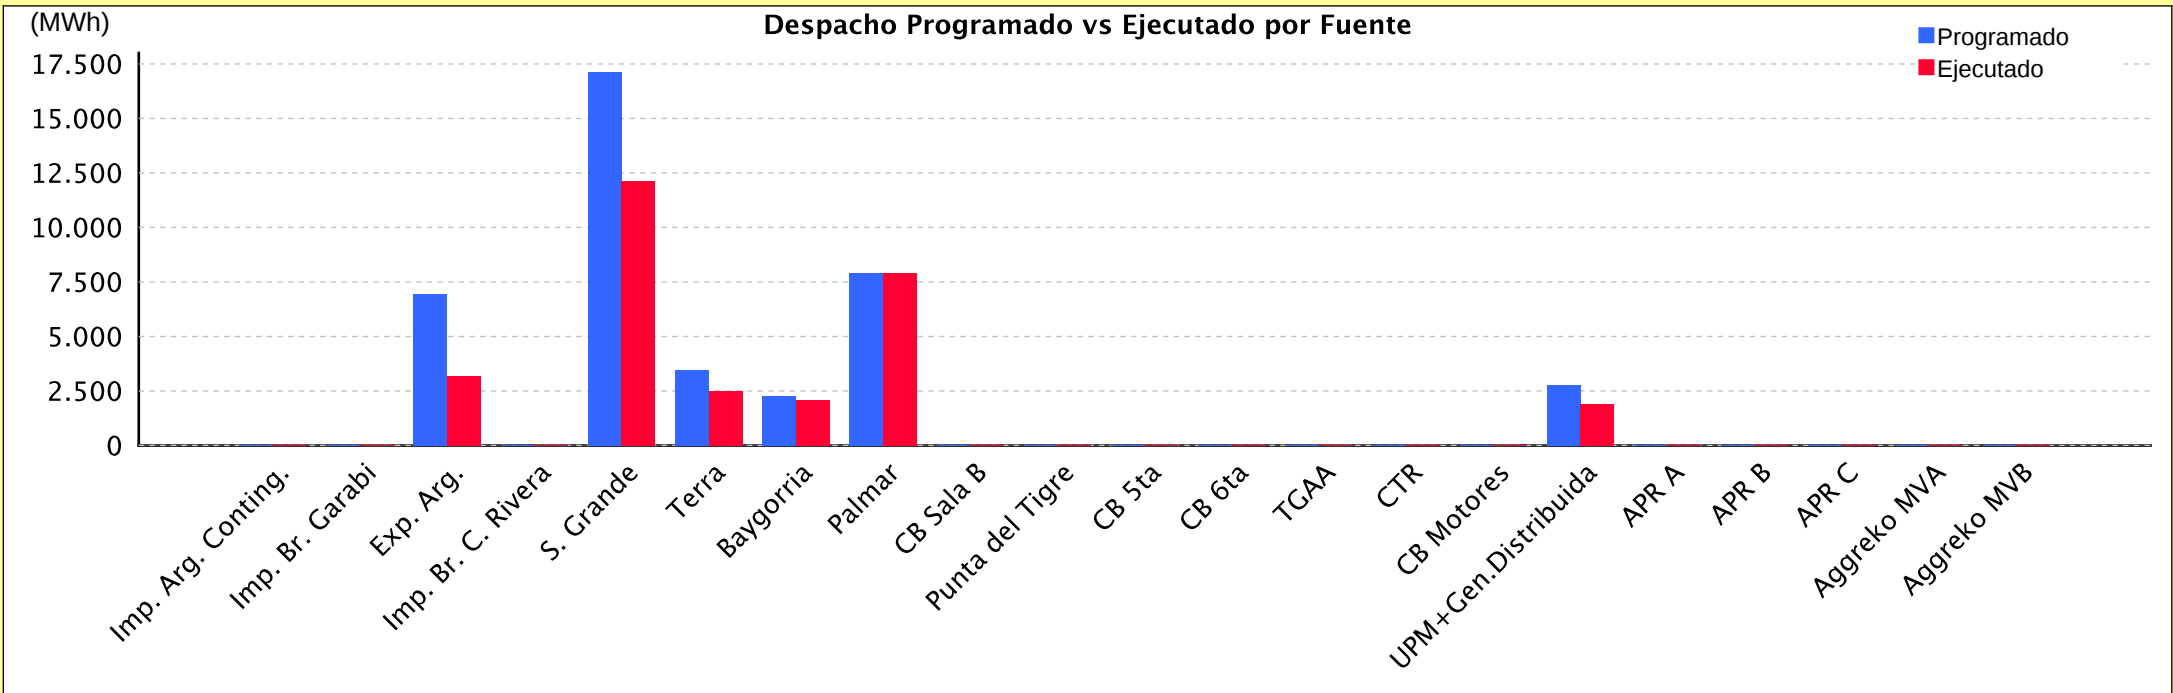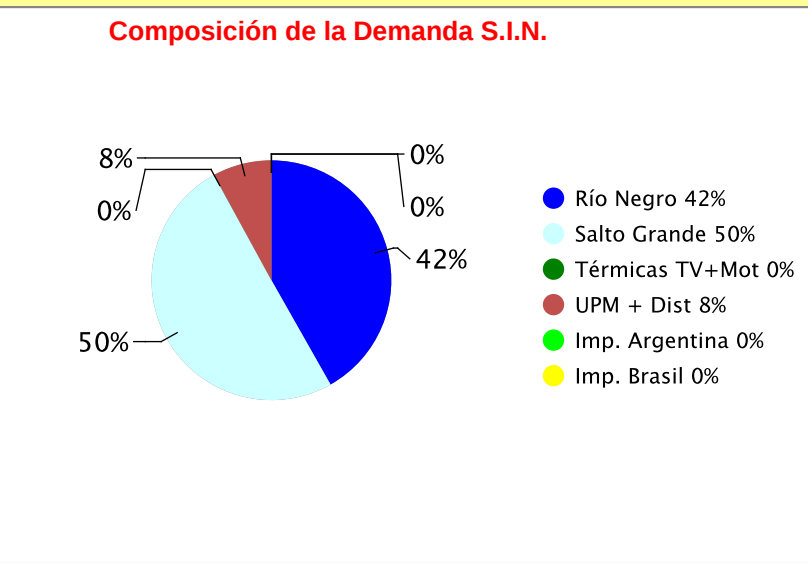



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

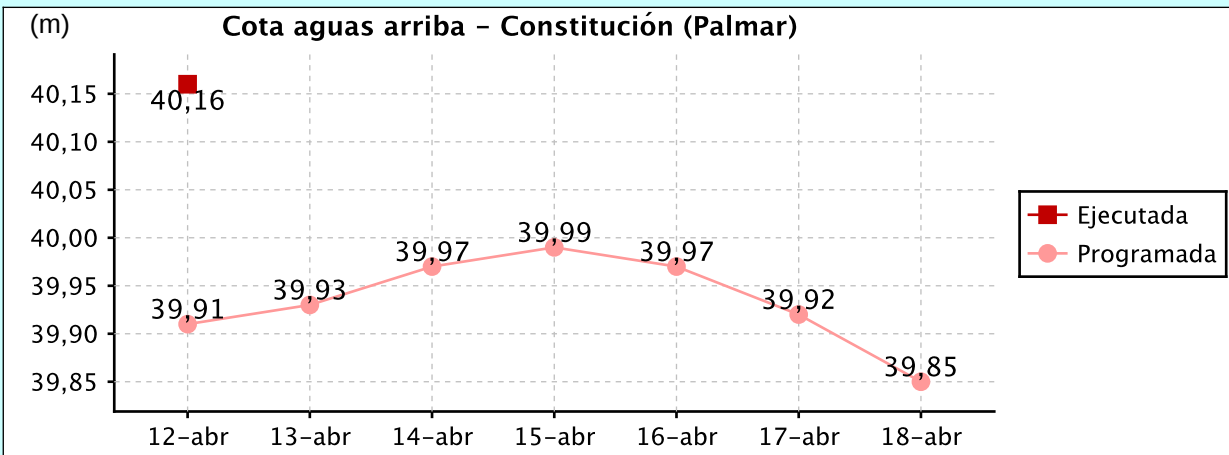
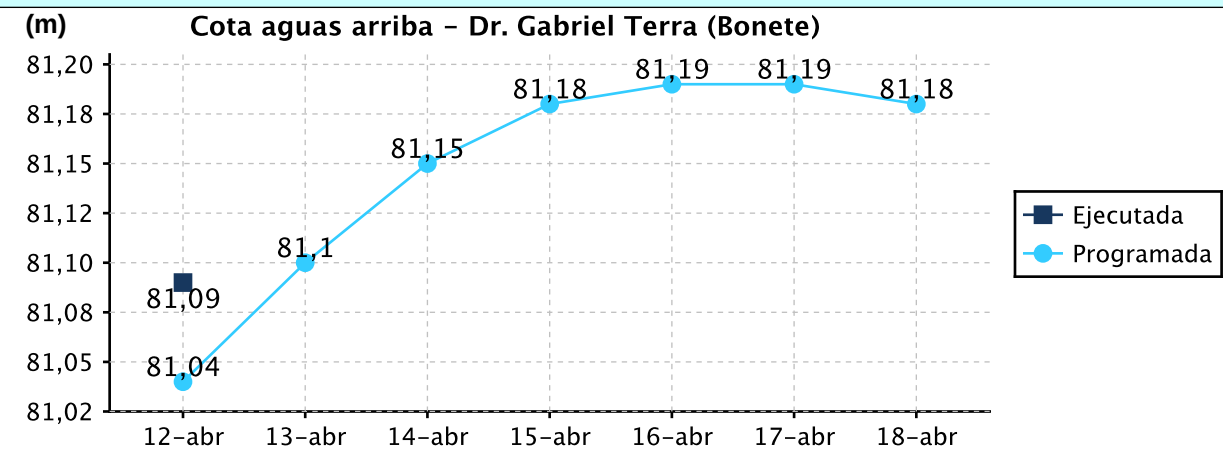


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,04	81,09
Baygorria	54,21	54,24
Palmar	39,91	40,16
SGU	35,40	35,77

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

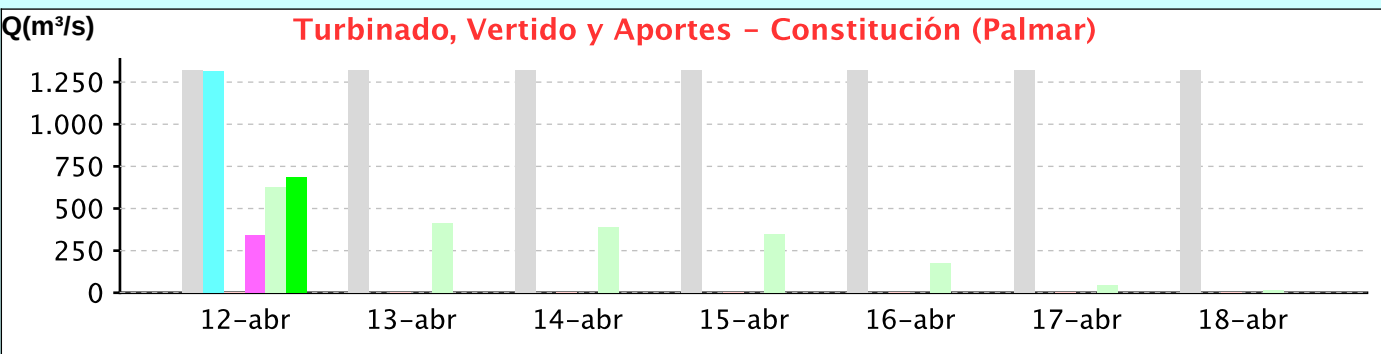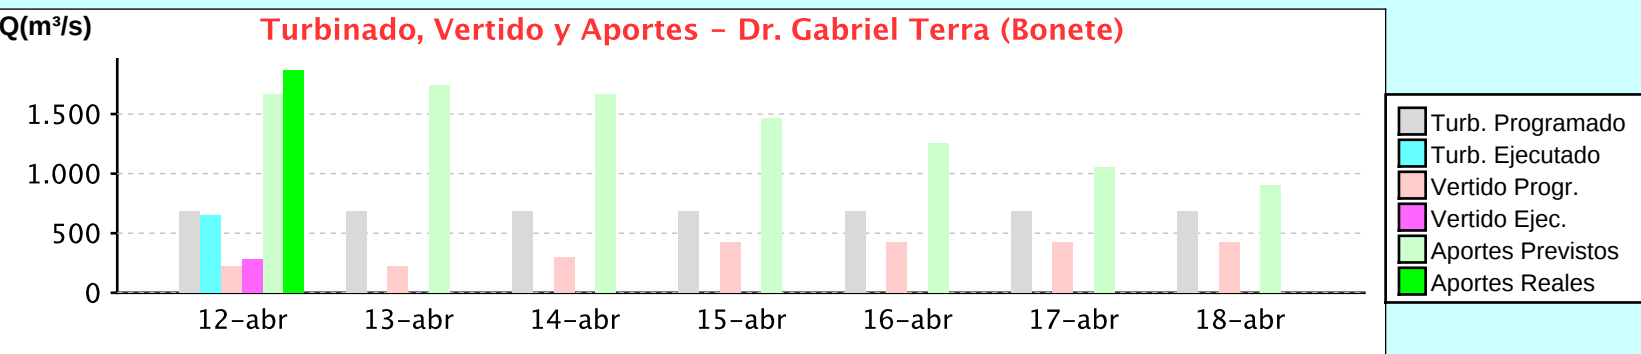

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

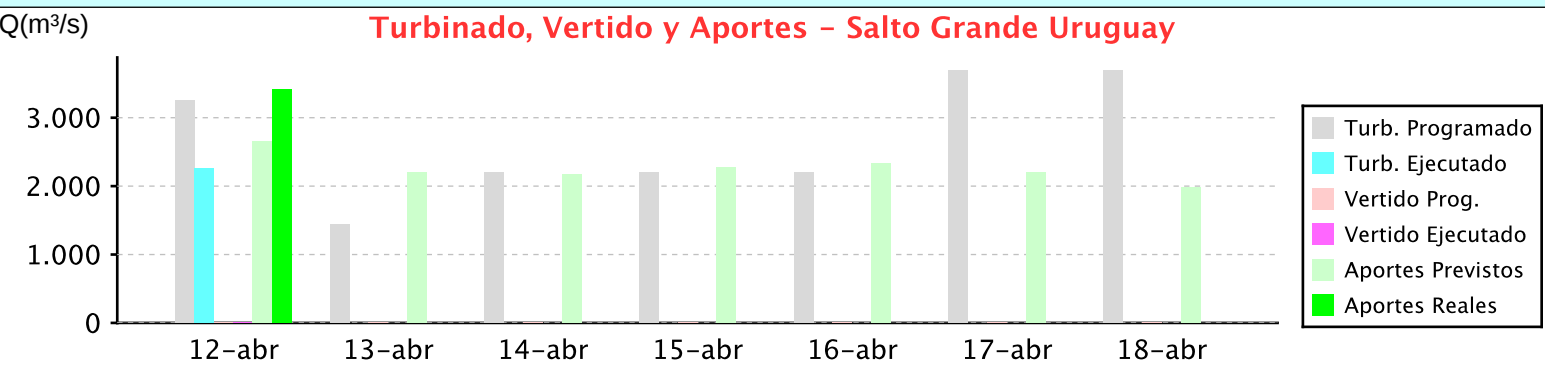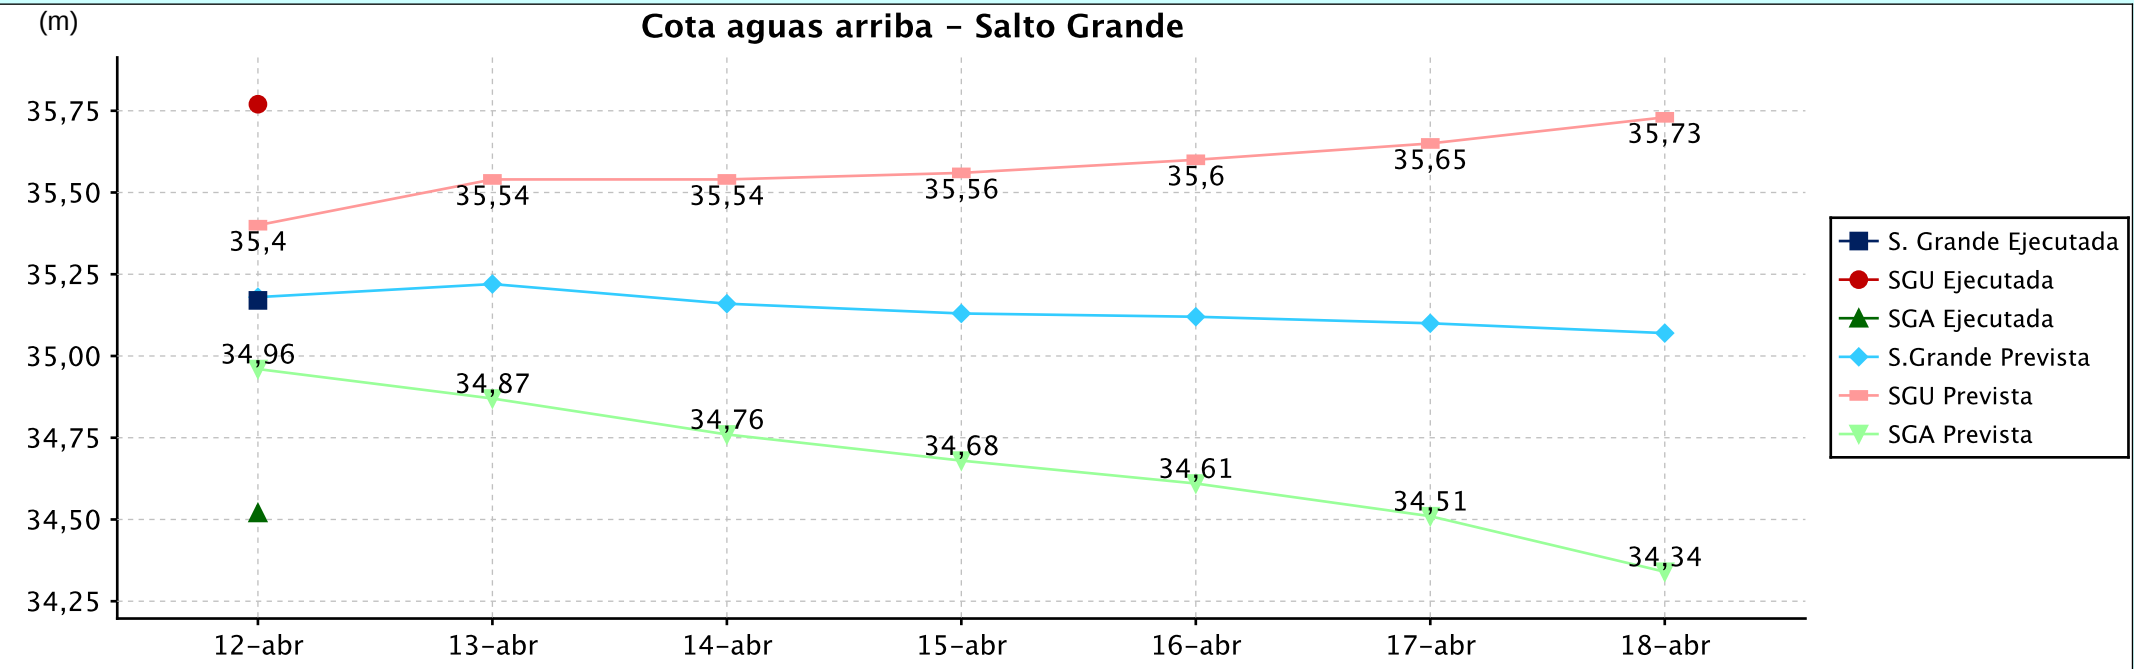

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,77
Cota Vista Arg	34,52
Cota real	35,17
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
29.761	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	652
Baygorria	754	804
Palmar	1.319	1.316
SGU	3.260	2.253

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.668	1.866
Baygorria	36	1.175
Palmar	629	688
SGU	2.650	3.418

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	282
Baygorria	150	1.192
Palmar	0	340
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 133,2 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
